

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: september 2021

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 10.11.2023

Predstaviteľ Zhotoviteľa : Ing. Antonio Melidoro

Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Milan Kubala, Matteo Foffani, Roman Skácel

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani , dátum 8. 10. 2021

Schválil za SD :

Ing. Milan Zvonár, , dátum 11. 10. 2021

OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	5
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	5
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	5
6.1. Zoznam Zmien:	5
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	5
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	5
7. Systém kvality:	5
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	5
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	5
8.2. Personál Zhotoviteľa:	5
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:	6
9.1. Bezpečnosť práce:	6
9.2. Ekologické vplyvy:	6
10. Finančné plnenie:	6
11. Fotodokumentácia:	7

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Príprava a aktualizácia potrebných podkladov a požiadaviek jednotlivých profesijných odborov pre práce na ďalšom stupni PD DSPRS a ich diskutovanie v rámci Projektanta a tiež Zhotoviteľa Aktualizácia koordinačných výkresov Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Pracovné stretnutia odborov v rámci projektových prác na PD DSPRS Priebežné technické odborové porady Zodpovedných projektantov so zainteresovanými zložkami Zhotoviteľa Spracúvanie podkladov pre Zhotoviteľa podľa záverov z priebežných odborových porád Správa dátového prostredia pre DSPRS na PW Spolupráca so Zhotoviteľom pre zabezpečenie ROV Doplnenie a odovzdanie dokumentácie pre búracie povolenie Príprava PD v stupni DSP pre objekt SO 01-37-03.2 a podanie PD na vyjadrenie správcu Príprava PD v stupni DSP pre časť stavby A.2.1.2 (UČS 12) a odovzdanie PD Objednávateľovi a Zhotoviteľovi v elektronickej podobe cez ProjectWise dňa 24.9.2021 Organizácia a účasť na poradách so Zhotoviteľom o systéme spracovania rozpočtov 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia harmonogramu postupu prác – MS Project Spracúvanie Správy o postupe prác Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov pre projektové práce na stupni PD DSPRS Organizácia a výkon priebežných technických odborových porád PD DSPRS so Zhotoviteľom v dňoch 9., 13., 14.9.2021 Organizácia a výkon porád so zložkami Projektanta k jednotlivým PS/SO Pracovné stretnutie so Zhotoviteľom k inžinierskej činnosti a majetkoprávnemu vysporiadaniu dňa 8.9 a 23.9.2021 Organizácia a výkon pracovnej rady k TNS Zohor so Zhotoviteľom a Objednávateľom dňa 10.9.2021 Organizácia porád so správcami objektov odboru 33 Organizácia záverečných porád k PD DSPRS s Objednávateľom Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DUR a ich prípadný dopad na spracovanie DSPRS Účasť na rokovaní v procese územných konaní Účasť na rokovaní s budúcimi správcami Účasť na rokovaní k BOZP a koordinácii činností u Zhotoviteľa dňa 7.9.2021 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO



	<ul style="list-style-type: none">• Organizácia a účasť na rokovaní k odstráneniu jestvujúceho mosta cez rieku Morava a prístupovým komunikáciám k mostu so Zhotoviteľom dňa 13.9.2021• Účasť na rokovaní s Objednávateľom k spracovaniu PD pre búracie povolenie a k odovzdaniu PD DSP pre časť A.2.1.2 a dňa 14.9.2021• Účasť na porade riadiaceho výboru so Zhotoviteľom dňa 21.9.2021• Implementácia opatrení podľa záverov z porady riadiaceho výboru• Účasť na rokovaní s SVP, š.p. v Malackách dňa 23.9.2021	
--	---	--

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	IČ okrem prieskumov <ul style="list-style-type: none">• Výkon IČ DSZ/DUR• Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR• Urgencie dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD pre vydanie ÚR• Sledovanie priebehu územných konaní• Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov• Pracovné stretnutie so Zhotoviteľom s predmetom: Prerokovanie PD pre búracie povolenie s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a organizáciami• Prerokovávanie jednotlivých PS/SO s dotknutými organizáciami v procese spracovania DSPRS• Prerokovanie spôsobu majetkoprávneho vysporiadania, ktoré je potrebné pre potreby stavby (dočasne prístupové komunikácie, stavenisko atď.)• Podanie žiadosti o vydanie búracieho povolenia dňa 21.9.2021	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none">• Realizácia doplnkového geodetického prieskumu v lokalite Morava• Prípravné práce k realizácii doplnkového geodetického prieskumu – vytyčovacej siete	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD

3. Realizácia Diela:

Aktuálne sa neaplikuje.

4. Vyhodnotenie prác:

Aktuálne sa neaplikuje.

5. Zmluva o Dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

6.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):

Uvedené v prílohe č.2

6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:

Aktuálne sa neaplikuje.

8.2.Personál Zhotoviteľa:

Aktuálne sa neaplikuje.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Dňa 29.3.2021 bola uzavretá písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Aktuálne sa neaplikuje.

Závažné nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Opakujúce sa nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Práce s osobitným nebezpečenstvom

Aktuálne sa neaplikuje.

C. Kontroly vykonané objednávateľom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

Aktuálne sa neaplikuje.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

10. Finančné plnenie:

K 30.09.2021 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie vo výške 3 481 711,50 EUR, bez DPH


11. Fotodokumentácia:



Obhliadka TNS Zohor



Obhliadka Zabzar žst. Kúty

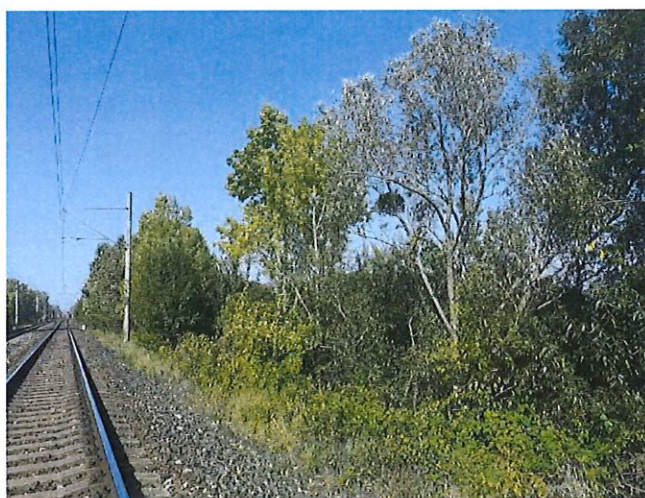

Miestna pochôdzka - výrub drevín UČS 11

Príloha č.1

Zoznam Zmien k 30.09.2021

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu (Lehota výstavby)</p> <p>Pokyn na Zmenu č.1 (Odsúhlasenie zmeny Lehoty výstavby)</p>	<p>07.10.2020</p> <p>21.10.2020</p>	<p>JVICM-VHS/20/0011</p> <p>230/2020-USPaR Ba</p>
2.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - odpoveď Objednávateľa</p>	16.10.2020	31562/2020/O220-7
3.	<p>Nárok č. 1 - EIA</p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu – EIA</p>	19.10.2020	JVICM-VHS/20/0014
4.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Dodatok č.1 k Hlavnej Zmluve (pripomienky Zhotoviteľa k Dodatku č.1)</p>	2.11.2020	JVICM-VHS/20/0018
5.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 (odpoveď Objednávateľa)</p>	04.11.2020	31562/2020/0220-15
6.	<p>Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</p> <p>Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</p>	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
7.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017</p>	13.11.2020	JVICM-VHS/20/0024

8.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 - stanovisko Objednávateľa	19.11.2020	31562/2020/0220-23
9.	Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC" Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
10.	Nárok č. 4 - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DUR Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - Vypracovanie DSZ/DUR na Časť A.2.1 a rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR	18.12.2020	JVICM-VHS/20/0046
11.	Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0105
12.	Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466	20.5.2021	JVICM-VHS/21/0139
13.	Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Oznámenie o rozhodnutí Stavebného dozora – zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73,210 a km 73,466	18.6.2021	053/2021-ÚS SpaR Ba/435
14.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti úradov, žiadosť o stretnutie	31.5.2021	JVICM-VHS/21/0144

15.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia - pripomienky a žiadosti obecného úradu BRODSKÉ k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR. Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.	15.6.2021	JVICM-VHS/21/0154
16.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora - napájanie zariadení v úseku Sekule - Kúty	18.2.2021	JVICM-VHS/21/0041
17.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Žiadosť o Zmenu v súlade s článkom 13 Osobitných podmienok Žltý FIDIC	12.7.2021	JVICM-VHS/21/0184
18.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Rozhodnutie Stavebného dozora - pokyn na Zmenu k napájaniu zariadení v úseku Sekule - Kúty	13.7.2021	064/2021-ÚS SPaR Ba/548
19.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Pokyn Stavebného dozoru – napájanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku Sekule – Kúty, cenový a časový dopad	21.7.2021	JVICM-VHS/21/0194
20.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Pripomienky a žiadosti Mestského úradu MALACKY k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR.	24.8.2021	JVICM-VHS/21/0226
21.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Stanovisko Objednávateľa k napájaniu zariadení v úseku Sekule - Kúty	1.7.2021	14812/2021/O220-113



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) k 30.09.2021

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Zmluvná pokuta (omeškanie s predložením správ o postupe prác)	24.11.2020	31562/2020/O220-25/716

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) k 30.09.2021

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 – EIA Oznámenie o uplatnení nároku (článok 20.1)	27.10.2020	JVICM-VHS/20/0016
2.	Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“ Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
3.	Nárok č. 1 – EIA EIA – Predloženie detailného nároku s podpornými podrobnosťami podstaty nároku a nárokovanej lehoty predĺženia a/alebo dodatočnej platby v súlade s podmienkami čl. 20.1 Zmluvných podmienok	10.11.2020	JVICM-VHS/20/0022
4.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 stanovisko Objednávateľa – odpoveď Zhotoviteľa	23.11.2020	JVICM-VHS/20/0025
5.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – stanovisko Objednávateľa k listu 4. JVICM-VHS 20/0025	25.11.2020	31562/2020/O220-27
6.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – odpoveď Zhotoviteľa	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028
7.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028

8.	Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“ Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
9.	Nárok č. 1 – EIA Nárok Zhotoviteľa č.1 (Záverečné stanovisko EIA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	23.12.2020	277/2020-USPaRBA
10.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Nárok Zhotoviteľa vo vzťahu k úprave Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny	4.1.2021	JVICM-VHS/21/0001
11.	Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DUR dokumentácie pre časť A.2.1 Vypracovanie DSZ a DÚR pre Časť A.2.1	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0005
12.	Nárok č. 4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DUR Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0006
13.	Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“ Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC	5.02.2021	JVICM-VHS/21/0026
14.	Nárok č. 1 – EIA Odpoveď na Váš list zo dňa 23.12.2020 – Nárok zhotoviteľa č. 1 (Záverečné stanovisko EIA)	8.1.2021	JVICM-VHS/21/0004

15.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Nárok Zhotoviteľa č.2 (Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	11.1.2021	003/2021-USPaR Ba
16.	Detailný nárok č. 3: - Vypracovanie DSZ a DUR na časť A.2.1. ŽST Kúty (mimo) – štátne hranice SR/ČR 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900) Detailný nárok č. 4: - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR	2.2.2021	JVICM-VHS/21/0021
17.	Nárok č.1 – EIA Odpoveď Stavebného dozora na list č. JVICM-VHS/21/0004, zo dňa 08.01.2021	04.02.2021	013/2021-ÚSPaR Ba/107
18.	Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DUR dokumentácie pre časť A.2.1 Doplnenie nároku č. 3: Vypracovanie DSZ a DUR na Časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900)	11.02.2021	JVICM-VHS/21/0034
19.	Nárok č.4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	24.02.2021	023/2021-ÚS SPaR Ba
20.	Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DUR na časť A.2.1. Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	17.3.2021	027/2021-ÚS SPaR Ba/154
21.	Nárok č. 5: Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC, Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre vydanie rozhodnutia SD v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	30.3.2021	030/2021 - ÚS SPaR Ba/ 192

22.	<p>Nárok Zhotoviteľa (Oznámenie podľa podčlánku 5.1 FIDIC)</p> <p>Odpoveď na list 030/2021-ÚS SPaR Ba / 192 zo dňa 30.3.2021 Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre Rozhodnutie Stavebného dozoru v zmysle podčl. 20.1. Zmluvných podmienok</p>	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0106
23.	<p>Nárok č.1 – EIA</p> <p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Výkaz výmer pre DSZ/DÚR</p>	23.4.2021	JVICM-VHS/21/0114
24.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti obce PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1</p>	14.6.2021	JVICM-VHS/21/0153
25.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Oznámenie o Nároku podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov VŠETKY ONESKORENÉ STANOVISKÁ ÚRADOV</p>	17.6.2021	JVICM-VHS/21/0156
26.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1</p>	25.6.2021	JVICM-VHS/21/0162

27.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia - Požiadavky obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR - Preposlanie odpovede Projektanta Obecnému úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK	29.6.2021	JVICM-VHS/21/0166
28.	Nárok č.1 – EIA NÁROK č. 1 – Zmeny zmluvného rozsahu prác zavedené EIA Priebežné predloženie Nároku č. 1 – ďalšie podporné dokumenty	2.7.2021	JVICM-VHS/21/0173
29.	Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Mostné objekty v km 73,210 a km 73,466 Odpoveď na list Stavebného dozoru 053/2021-ÚS SPaR Ba / 435, prijatý 18.6.2021: Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa Pod-článku 20.1	8.7.2021	JVICM-VHS/21/0178
30.	Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa pod-článku 20.1 – DETAILNÝ NÁROK	28.7.2021	JVICM-VHS/21/0202
31.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi "Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK"	8.7. 2021	JVICM-VHS/21/0181
32.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1	9.7.2021	JVICM-VHS/21/0182

33.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1	9.7.2021	JVICM-VHS/21/0183
34.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Detailný Nárok ohľadom dodatočných požiadaviek Obecného Úradu Brodské/Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.1	15.7.2021	JVICM-VHS/21/0191
35.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK	23.7.2021	JVICM-VHS/21/0197
36.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1	4. 8. 2021	JVICM-VHS/21/0208
37.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1	4. 8. 2021	JVICM-VHS/21/0209
38.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok FIDIC z dôvodu Oneskorenia spôsobeného úradmi – VŠEOBECNÝ	17.8.2021	JVICM-VHS/21/0224

	PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia		
39.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Oznámenie Zhotoviteľa o nároku podľa článku 20 Osobitných podmienok FIDIC - Oneskorenie spôsobené úradmi – Mesto MALACKY	31.8.2021	JVICM-VHS/21/0233
40.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1	9.9.2021	JVICM-VHS/21/0249
41.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Detailný Nárok ohľadom požiadaviek Mesta MALACKY podľa článku 20 Osobitných podmienok FIDIC - Oneskorenie spôsobené úradmi	14.9.2021	JVICM-VHS/21/0252
42.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Oznámenie o Nároku podľa pod- článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok FIDIC z dôvodu Oneskorenia spôsobeného úradmi – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia	16.9.2021	JVICM-VHS/21/0254
