

## „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Zmluva o Dielo č.:** 01/2017

**Predmet zmluvy:** vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

**Dielo:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
  - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
    - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
    - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
  - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), \*bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

## **Správa o postupe prác za obdobie: august 2024**

**Objednávateľ** : Železnice Slovenskej republiky  
**Zhotoviteľ** : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“  
**Lehota výstavby** : od 10.09.2020 do 31.12.2027  
**Predstaviteľ Zhotoviteľa** : Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa  
**Stavebný dozor** : Ing. Milan Zvonár

**Správu vypracovali:** Ing. Roman Skácel, PhD., Ing. Matteo Foffani,

**Schválil za Zhotoviteľa**

**Vedúci technického útvaru:** Ing. Matteo Foffani,

.., dátum 09. 09. 2024

**Schválil za SD :**

Ing. Milan Zvonár,...

.., dátum 14.9.2024

**OBSAH:**

<b>1. Projektová dokumentácia:</b>	<b>3</b>
<b>2. Inžinierska činnosť:</b>	<b>4</b>
<b>3. Realizácia Diela:</b>	<b>5</b>
<b>4. Vyhodnotenie prác:</b>	<b>5</b>
<b>5. Zmluva o Dielo a dodatky:</b>	<b>7</b>
<b>6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :</b>	<b>7</b>
6.1. Zoznam Zmien:	7
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	7
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	7
<b>7. Systém kvality:</b>	<b>7</b>
<b>8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:</b>	<b>7</b>
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	7
8.2. Personál Zhotoviteľa:	7
<b>9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:</b>	<b>8</b>
9.1. Bezpečnosť práce:	8
<b>10. Finančné plnenie:</b>	<b>12</b>
<b>11. Fotodokumentácia:</b>	<b>14</b>

## 1. Projektová dokumentácia:

### Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie</li> <li>Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW</li> <li>Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti</li> <li>Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2</li> <li>Komunikácia k rozpočtom so zástupcom Zhotoviteľa</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.2.	<b>Činnosť HIP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spracovanie Správy o postupe prác</li> <li>Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS</li> <li>Účasť na rokovaniach v procese územných konaní</li> <li>Účasť na rokovaniach s budúciimi správcami</li> <li>Účasť na rokovaniach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností</li> <li>Organizácia a účasť na rokovaniach so Zhotoviteľom a Objednávateľom</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.3.	<b>Činnosť Projektanta počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Zmeny PD počas realizácie</li> <li>Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Zmena dokumentácie TNS Kúty (zmena typu meniča)</li> <li>Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO



## 2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<b>IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS</li> <li>Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS</li> <li>Sledovanie priebehu územných konaní</li> <li>Doplňovanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov</li> <li>Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B</li> <li>Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02)</li> <li>Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV</li> <li>Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO, GEOKOD
2.2.	<b>Prieskumy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V mesiaci August 2024 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom</li> </ul>	REHING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO, GEOKOD
2.3.	<b>IČ počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie</li> <li>Účasť na riadiacom výbore</li> <li>Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO, GEOKOD

### **3. Realizácia Diela:**

V mesiaci august pokračovala v úseku Kúty – št. hr. SR/ČR nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV podľa ROV 180 Etapa A.

Dňa 21.8.2024 sa uskutočnila výluka nepárnej skupiny ŽST Kúty v dopravnej pauze 13:15 -15:00

V dňoch 24.8.2024 v čase od 7:20 h nepretržite do 15:50 h dňa 29.8.2024 ničkoľajka podľa ROV 180 Etapa B2, Etapa E2, Etapa Z2, Etapa Z9. Etapa E2 v posledný deň ničkoľajky do 11:00 hod.

### **4. Vyhodnotenie prác:**

#### **UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)**

##### **SO 10-32-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok – demontáž**

- Demontáž koľajových polí do km 70,720
- Odkop starého štrkového lôžka do km 71,500

##### **SO 10-36-01.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR**

- Preložka kábla v km 70,200 - 70,500

##### **SO 10-36-01.3 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka optického kábla ŽSR**

- Preložka kábla v km 70,200 - 70,500

##### **SO 10-35-01 Kúty – št.hr, trakčné vedenie**

- Demontáž trakčného vedenia
- Betonáž nových základov trakčných podpier pri TK-2

#### **UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)**

##### **SO 11-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok**

- Baranenie zápor HEB v ose koľají v km 71,600- 72,300
- Odkop starého štrkového lôžka a vkladanie pažiacej výdrevy do zápor HEB

**SO 11-32-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok – demontáž**

- Demontáž žel. zvršku v km 71,600- 72,750

**SO 11-33-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, podchod pre cestujúcich na ZAST Brodské v nžkm 71,722**

- Izolácia stropnej dosky
- Izolácia stien
- Betónová ochrana izolácie stien podchodu
- Betónová ochrana izolácie stropnej dosky podchodu
- Demontáž rozperného rámu
- Demontáž larsen
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-33-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, nový železničný most v nžkm 72,138 (podjazd Brodské)**

- Betonáž rímsy a realizácia izolačného súvrstvia
- Betónová ochrana izolácie stropnej dosky podjazdu
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)****SO 12-33-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v km 74,386**

- Montáž oc. konštrukcie mosta a pomocných konštrukcií
- Náter oc. konštrukcie mosta
- Zásyp opory č.1 SK strana
- Betonáž základu č.1 SK strana
- Debnenie a armovanie piliera č. 1 SK strana
- Búranie hláv pilót - základ č.2 CZ strana
- Armovanie základu č. 2 CZ strana
- Debnenie a betonáž základu č. 2 CZ strana
- Armovanie a debnenie piliera č. 2 CZ strana
- Debnenie a betonáž drieku opory č.2 CZ strana
- Oddebnenie drieku opory č.2 CZ strana
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-33-05 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba železničného mosta v km 74,497**

- Ochrana izolácie stien
- Práce prebiehali v zmysle HMG

## **5. Zmluva o Diele a dodatky:**

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

## **6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**

### **6.1.Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

### **6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):**

Uvedené v prílohe č.2

### **6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):**

Uvedené v prílohe č.3

## **7. Systém kvality:**

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

## **8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:**

### **8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:**

Uvedené v prílohe č.4

### **8.2.Personál Zhotoviteľa:**

Uvedené v prílohe č.4.



## **9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:**

### **9.1. Bezpečnosť práce:**

#### **A. Popis činnosti BOZP:**

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

#### **B. Plnenie Plánu BOZP stavby**

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci august bolo spracovaných 5 Správ z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.


V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:



a) Nezaistené pracovisko nad voľnou hĺbkou



b) Používanie nevhodných komunikácií – rebrík nezabezpečených podľa zásad BOZP

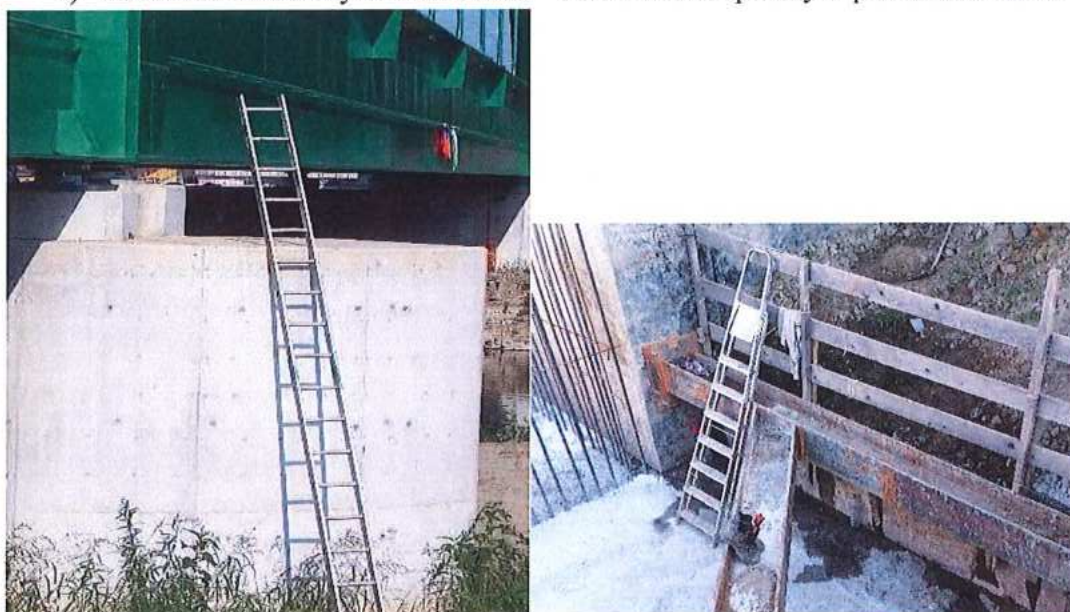

c) Chýbajúce zabezpečenie okrajov výkopov



d) Používanie komunikácií nezabezpečených podľa zásad BOZP



e) Prenášanie bremien nebezpečným spôsobom zavesenia



### Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

### C. Kontroly vykonané objednávateľom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

### D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období mimoriadne udalosti neboli zaznamenané.



## **E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác**

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľmi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľom. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

Koordinátor bezpečnosti Zhotoviteľa zorganizoval dňa 14.08.2024 stretnutie s pracovníkmi zhotoviteľa poverenými zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich z Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia. (Komisia BOZP stavby). Na Komisii BOZP bolo prerokované:

- povinnosti podzhotoviteľov vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, Plánu BOZP a predpisov ŽSR, najmä pri prácach na a v blízkosti prevádzkovaných koľají
- analyzovanie zistených nedostatkov z vykonaných kontrol stavenísk stavby koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa
- koordinácia budúcich činností Zhotoviteľa vzhľadom na kolízne miesta, miesta spoločných pracovísk, prístupové komunikácie,

Zo zasadnutia Komisie BOZP bol spracovaný samostatný zápis.

### **Ekologické vplyvy:**

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – vid' príloha č. 5.



## 10. Finančné plnenie:

### Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024

### Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024



K 31.08.2024 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 27 570 510,76 € bez DPH.
- stavby B vo výške 930 102,44 € bez DPH.

## 11. Fotodokumentácia



Izolácia stropnej dosky podchodu – penetračný náter – SO 11-33-01



Izolácia stropnej dosky podjazdu – SO 11-33-04





Montáž oc. konštrukcie – SO 12-33-04



Zásyp opory č.1 SK strana – SO 12-33-04





Debnenie piliera č.1 SK strana – SO 12-33-04



Búranie hláv pilót - základ č.2 CZ strana – SO 12-33-04





Ochrana izolácie stropnej dosky podchodu – SO 11-33-01



Ochrana izolácie stropnej dosky podjazdu – SO 11-33-04





Zásyp opory č.1 SK strana – SO 12-33-04



Debnenie a armovanie piliera č.1 SK strana – SO 12-33-04





Zabetónovaný driel opory č.2 CZ strana – SO 12-33-04




Ochrana izolácie – SO 12-33-05





Demontáž trakčného vedenia – SO 10-35-01

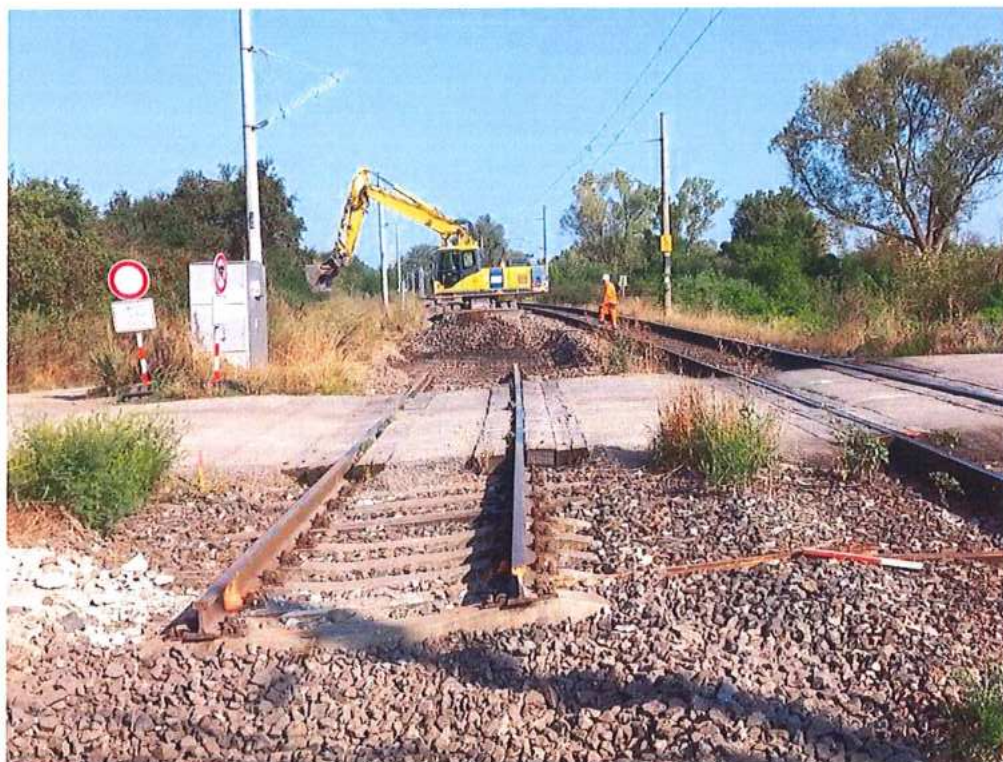

Odkop starého štrkového lôžka – SO 11-32-02





Demontáž larsen – SO 11-33-01



Montáž a náter oc. konštrukcie mosta – SO 12-33-04





Betonáž základu č.2 CZ strana – SO 12-33-04



Oddebnenie drieku opory č.2 CZ strana – SO 12-33-04





Demontáž koľajových polí do km 70,720 – SO 10-32-03



Odkop starého štrkového lôžka do km 71,500 – SO 10-32-03





Demontované trakčné podpery – SO 10-35-01



Nový základ trakčnej podpery – SO 10-35-01





Baranenie zápor HEB v ose koľají v km 71,600- 72,300 – SO 11-32-02



Vkladanie pažiacej výdrevy do zápor HEB – SO 11-32-02





Armovanie piliera č.1 SK strana – SO 12-33-04



Armovanie piliera č.2 CZ strana – SO 12-33-04





[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



## Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.08.2024-31.08.2024

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.			



## Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.08.2024-31.08.2024

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.			



**Príloha č.3**

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.08.2024-31.08.2024

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oznámenie Zhotoviteľa o priebežnom nároku - oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa článku 20.1 pre predĺženie Lehoty výstavby podľa článku 8.4 a 8.5 osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi	27.8.2024	JVICM-VHS/24/0265
2.			

#### Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

### Zariadenie Zhotoviteľa

#### SPOLU

Popis, druh	Množstvo
<b>STROJE</b>	
Dózer	1
Greader	1
Rýpadlo	8
Baranidlo pre Larseny	3
Búracie kladivo	1
Traktor CAT, JCB	1
Valec	2
Žeriav	2
Elektrocentrála	10
Čerpadlo na vodu	5
Ponorný vibrátor	11
Vibračná doska	1
Autožeriav	4
Mann s mech. Rukou	1
Nákladné auto TATRA 815	3
Nákladný automobil - náves	9
LOKO	5
Pracovný vlak TV	3
ŽDJ 5/3.1	2
Nákladný automobil + HR	5
Pracovný vlak TV-betonárka	1
UK 25	1
Dvojcestné rýpadlo	3
Manitou	3
Teleskopická pracovná plošina	2

### Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
<b>VLASTNÍ: Predstaviteľ zhotoviteľa:</b>	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulant	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5





[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



<b>CUDZÍ - subdodávateľia</b>	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	15
- Geodet	3
- Stavebný robotník - strojník, vodič	46
- Stavebný robotník	94
