

## „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Zmluva o Dielo č.:** 01/2017

**Predmet zmluvy:** vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

**Dielo:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
  - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
    - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
    - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
  - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), \*bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

## **Správa o postupe prác za obdobie: máj 2025**

**Objednávateľ** : Železnice Slovenskej republiky  
**Zhotoviteľ** : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“  
**Lehota výstavby** : od 10.09.2020 do 31.12.2027  
**Predstaviteľ Zhotoviteľa** : Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa  
**Stavebný dozor** : Ing. Milan Zvonár

**Správu vypracovali:** Ing. Andrej Paták, Ing. Matteo Foffani,

**Schválil za Zhotoviteľa**

**Vedúci technického útvaru:** Ing. Matteo Foffani, ..... , dátum 10.06.2025

**Schválil za SD :** Ing. Milan Zvonár, ..... , dátum.....

## OBSAH:

1. Projektová dokumentácia: .....	3
2. Inžinierska činnosť: .....	4
3. Realizácia Diela: .....	5
4. Vyhodnotenie prác: .....	6
5. Zmluva o Dielo a dodatky: .....	11
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch : .....	11
6.1. Zoznam Zmien: .....	11
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa): .....	11
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa): .....	11
7. Systém kvality: .....	11
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa: .....	11
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa: .....	11
8.2. Personál Zhotoviteľa: .....	11
9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov: .....	12
9.1. Bezpečnosť práce: .....	12
9.2. Ekologické vplyvy: .....	16
9.3. Evidencia odpadov: .....	16
10. Finančné plnenie: .....	18
11. Fotodokumentácia .....	20

## 1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie</li> <li>Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW</li> <li>Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti</li> <li>Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.2.	<b>Činnosť HIP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spracovanie Správy o postupe prác</li> <li>Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS</li> <li>Účasť na rokovaníach v procese územných konaní</li> <li>Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami</li> <li>Účasť na rokovaníach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností</li> <li>Organizácia a účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.3.	<b>Činnosť Projektanta počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Zmeny PD počas realizácie</li> <li>Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov</li> <li>Príprava rozpočtov A.1.4</li> <li>Príprava rozpočtov pre stavbu B a A.1.4</li> <li>Zpracovanie pripomienok na základe TSI</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO



## 2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<b>IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS</li> <li>Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS</li> <li>Sledovanie priebehu územných konaní</li> <li>Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov</li> <li>Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B</li> <li>Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02)</li> <li>Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV</li> <li>Spracovanie podkladov pre zabezpečenie MPV A.1.4 (UČS 04)</li> <li>Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV</li> <li>A.1.4 (UČS04) vydanie odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia DSPRS.</li> <li>Získanie SP pre SO 02-33-02, SO 02-37-03.2, SO 02-37-08</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
2.2.	<b>Prieskumy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V mesiaci máj 2025 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom</li> </ul>	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
2.3.	<b>IČ počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie</li> <li>Účasť na riadiacom výbore</li> <li>Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD



### 3. Realizácia Diela:

#### V zmysle ROV č. 410

- Zahájenie výluk podľa ROV 410 v nepárnej skupine koľají žst. Zohor bolo dňa 24.03.2025  
Trvanie do 13.10.2025

#### V zmysle ROV č.440

- Zahájenie výluky 2. TK v úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR dňa 31.03.2025 o 16:00 hod.  
Trvanie do 09.12.2025

#### V zmysle ROV č.460

- Dňa 01.05.2025 zahájenie denných výluk pre prípravné práce pred nepretržitou výlukou 2.TK v úseku DNV - Zohor podľa schváleného mesačného plánu výluk ŽSR (prekládky 6KV, káblov zab. zar. a rušenie PZZ v km 9,305 a 10,732, štetovnice v km 9,305, demontáž lávky D. Jazero)  
Prípravné práce ukončené dňa 23.05.2025
- Dňa 24.06.2025 - zahájenie nepretržitej výluky 2. TK v úseku DNV - Zohor podľa schváleného mesačného plánu výluk ŽSR  
Trvanie do 02.12.2025

#### Na stavbe evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti:

- odo dňa 20.03.2025 evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v koľaji č.1 úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR v km 68,090 - 74,466, pre rýchlosť 50 km/h.  
Predpokladané ukončenie dňa 09.12.2025
- odo dňa 24.03.2025 evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v staničnej koľaji č.2 žst. Zohor v km 12,100 - 13,200, pre rýchlosť 50 km/h.  
Predpokladané ukončenie dňa 13.10.2025
- 50 km/h okolo pracovného miesta v 2.TK úseku žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor v km 9,250 - 9,350 v denných hodinách, od 08:00 do 17:00 hod. v dňoch od 10.05.2025 s predpokladom do 21.05.2025.  
Ukončené dňa 23.05.2025
- 50 km/h okolo pracovného miesta v 2.TK úseku žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor v km 3,700 - 3,900 v denných hodinách, od 08:00 do 17:00 hod. v dňoch 10. - 15.05.2025, z dôvodu demontáže lávky a bezpečnosti cestujúcich  
Ukončené
- 50 km/h v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od km 3,780 (začiatok/koniec nástupiska na zást. D. Jazero) do km 4,300 v 1.TK a súčasne 2.TK, počnúc dňom 16.05.2025 o 08:00 hod. nepretržite, do ukončenia výstavby novej lávky pre peších v zástavke D. Jazero (predpoklad koniec roka 2025), z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pohybu cestujúcej verejnosti a pracovných miest v oblasti.  
Ukončené dňa 23.05.2024
- 50 km/h okolo pracovného miesta v 1.TK úseku žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor v km 1,600 - 11,700 v denných hodinách, od 07:30 do 17:30 hod. od 24.05.2025,  
V trvaní do 01.06.2025
- 50 km/h v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od km 3,780 (začiatok/koniec nástupiska na zást. D. Jazero) do km 4,300 v 1.TK, počnúc dňom 24.05.2025 o 08:00 hod. nepretržite, do ukončenia výstavby novej lávky pre peších v zástavke D. Jazero (predpoklad koniec roka 2025), z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pohybu cestujúcej verejnosti a pracovných miest v oblasti

## **Vyhodnotenie prác:**

### **UČS 1 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)**

#### **SO 01-31-01 Devínska Nová Ves - Zohor, výruby drevín**

- výruby

#### **SO 01-32-02 Devínska Nová Ves - Zohor, železničný spodok**

- realizácia dočasných komunikácií: rozprestretie GTX, realizácia zhutnených vrstiev zo štrkodrvy, pokládka cestných panelov

#### **SO 01-32-03 Devínska Nová Ves - Zohor, demontáž**

- podbíjanie oblúkov
- pálenie koľajníc

#### **SO 01-32-04 Devínska Nová Ves - Zohor, nástupištia**

- odstránenie oplatenia
- búranie nástupíšť

#### **SO 01-32-08 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 3,146**

#### **SO 01-32-09 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 3,552**

#### **SO 01-32-15 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 7,073**

#### **SO 01-32-16 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 8,034**

#### **SO 01-32-18 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 10,077**

#### **SO 01-32-20 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 10,490**

#### **SO 01-32-21 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 10,762**

#### **SO 01-32-22 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 11,058**

#### **SO 01-32-23 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 11,231**

#### **SO 01-32-24 Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 11,555**

#### **SO 01-33-12 Devínska Nová Ves - Zohor, rekonštrukcia žel.mosta v nžkm 7,834**

#### **SO 01-33-14 Devínska Nová Ves - Zohor, rekonštrukcia žel.mosta v nžkm 9,834**

#### **SO 01-33-15 Devínska Nová Ves - Zohor, rekonštrukcia žel.mosta v nžkm 9,973**

#### **SO 01-33-16 Devínska Nová Ves - Zohor, prestavba žel.mosta v nžkm 11,125**

- baranenie kontrastných HEB profilov

#### **SO 01-33-05 Devínske jazero**

- demolácia lávky
- demolácia základov lávky
- odvoz materiálu z demolácii

#### **SO 01-33-06 Nový cestný most na v žkm 4,995**

- pracovné plošiny pre pilotáž
- skúšobne pilóty
- zemné práce
- inštalácia štetovnic

**SO 01-33-13 Nový cestný most na III/1106 V žkm 9,306**

- pracovné plošiny pre pilotáž
- realizácia larsen
- skúšobne pilóty

**SO 01-35-01 Devínska Nová Ves - Zohor, trakčné vedenie**

- demontáž trakčného vedenia 2.TK

**SO 01-35-15 Devínska Nová Ves - Zohor, úpravy/preložky 6kV kábla**

- výkop káblovej ryhy TS 545 – 546, pokládka kábla, spätný zásyp

**SO 01-36-01.1 Devínska Nová Ves - Zohor, preložka DK ŽSR**

- prekládka DK - rezanie kábla, spojkovanie, meranie

**UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)****PS 02-21-02 ŽST Zohor, zabezpečenie stavebných postupov**

- montáž reléového stojana
- odvoz starých betónových žľabov

**SO 02-32-02 ŽST Zohor, železničný spodok**

- úprava prístupových ciest a zariadenia staveniska, pokládka panelov
- zemné práce
- realizácia záporového paženia, vrátane výdrevy

**SO 02-33-01 ŽST Zohor, podchod pre cestujúcich a verejnosť v nžkm 12,571**

- inštalácia štetovnic
- výkopy

**SO 02-33-02 ŽST Zohor, nový cestný most na obchvate obce Zohor v nžkm 12,880**

- príprava plošín pre pilotáž
- realizácia skúšobných pilot

**SO 02-34-02 ŽST Zohor, zariadenia pre kábelové trasy**

- zemné práce
- osadenie šachiet

**SO 02-35-01 ŽST Zohor, trakčné vedenie**

- montáž stožiarov, brán a napájacích prevesov, bezpečnostné nátery

**SO 02-35-06 ŽST Zohor, vonkajšie osvetlenie**

- demontáž základov osvetľovacích stožiarov, betonáž základov pre nové stožiare, výkop ryhy

**SO 02-35-15 ŽST Zohor, rozvod 6kV**

- výkop káblovej ryhy, pokládka chráničky



**SO 02-37-01 ŽST Zohor, odvedenie dažďových vôd**

- pokládka kanalizácie pod nástupišťom č.1

**UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)****PS 10-21-02 Kúty - Lanžhot, zabezpečenie stavebných postupov - časť SR**

- demontáž návestidiel

**PS 10-21-03 Kúty - Lanžhot, demontáž zabezpečovacieho zariadenia - časť SR**

- demontáž skríň UAB

**SO 10-32-02 Kúty- št. hranica SR/ČR, železničný spodok**

- odkop zeminy po ZP a odvoz na skládku
- navážanie štrkodrvy fr.0/63mm a zriadenie PŽS

**SO 10-32-03 Kúty- št. hranica SR/ČR, železničný zvršok -demontáž**

- odkop starého štrkového lôžka a odvoz na medziskládku

**SO 10-32-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, Prieput v km 70,556**

- vybúranie starého priepustu a odkop zeminy a odvoz na skládku
- betonáž podkladného betónu

**SO 10-34-01 Kúty št. hranica SR/ČR, Protihlukové steny**

- vŕtanie a betonáž pilot
- montáž panelov PHS

**SO 10-34-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, rozvodňa 27 kV (stavebná časť)**

- montáž obvodových stien
- príprava na liatie dosky

**SO 10-34-06 Kúty - št.hranica SR/ČR,stanovište transformátorov**

- odstránenie záťažovej dosky a rekultivácia výkopu
- príprava na liatie dosky

**SO 10-35-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, 2. časť**

- betonáž základov trakčných podpier, montáž stožiarov

**SO 10-38-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, spevnené plochy**

- sanácia zemnej pláne

**SO 10-38-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, preložka poľnej cesty**

- sanácia zemnej pláne

**UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)**

**SO 11-32-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný zvršok**

- realizácia vodorovného stuženia záporového paženia

**SO 11-32-02 Kúty št. hranica SR/ČR, železničný spodok**

- odkop zeminy po ZP a odvoz na skládku
- výmena podložia a zriadenie zemnej pláne
- navážanie štrkodrvy fr.0/63mm a zriadenie PŽS
- odkop zeminy a zriadenie drenáže

**SO 11-32-03 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný zvršok- demontáž**

- odkop starého štrkového lôžka a odvoz na medziskládku

**SO 11-32-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, nástupiská**

- pokládka zámkovej dlažby, dorezávanie dlažby, špárovanie pieskom

**SO 11-33-01 Kúty - št.hr. SR/ČR, podchod pre cestujúcich na zast. Brodské v nžkm 71,722**

- inštalácia štetovnic
- výkopy a preprava materiálu na skládku
- stužujúci rám paženia

**SO 11-33-04 Kúty - št.hr. SR/ČR, nový žel.most v nžkm 72,138 (podjazd Brodské)**

- dokončovacie práce podzemné steny
- zemné práce
- podkladný betón pre debnenie mostovky (Brodské - extravilán)

**SO 11-33-05 Kúty -Kúty - št.hranica SR/ČR, oporné múry pri MK v nžkm 72,138**

- realizácia betónových podpier a múrov
- čiastočné oddebnenie podpier (intravilán)
- odbúranie hláv podzemných stien (extravilán)
- podkladný betón pre debnenie rozperných trávov (extravilán)
- debnenie rozperných trávov (extravilán)
- vŕtanie a injektáž kotiev, debnenie rozperných trávov, armovanie

**SO 11-33-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, tesniaca vaňa pod MK v nžkm 72,138**

- zemné práce a odvoz výkopu na skládku

**SO 11-34-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, Protihlukové steny**

- osádzanie akustických panelov PHS

**SO 11-36-02.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka kábla Orange**

- odkopanie trasy HDPE rúr
- prehĺbenie trasy
- úprava káblovej trasy SITEL

**UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)**

**SO 12-32-02 Kúty št. hranica SR/ČR, železničný spodok**

- odkop zeminy po ZP a odvoz na skládku
- rozprestretie geotextílie
- zriadenie pláne železničného spodku zo štrkodrvy fr. 0/63 mm

**SO 12-32-03 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný zvršok- demontáž**

- odkop starého štrkového lôžka a odvoz na medziskládku
- demontáž PK na skládke

**SO 12-33-01 Kúty - št.hr. SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,232**

- demolácia opôr
- prípravne práce pre tryskovú injektáž
- trysková injektáž
- mikropilóty

**SO 12-33-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,489**

- demolácia opôr
- prípravné práce pre tryskovú injektáž
- trysková injektáž
- búranie betónu a výkopy základov

**Mimoriadna udalosť na UČS 10:**

- 31.5.2025 zrušenie mostnej rímsy so zábradlím a protidotykovou ochranou z cestného mosta na komunikácii I. triedy č.2 v úseku Kúty - Kopčany do koľajového priestoru



#### **4. Zmluva o Dielo a dodatky:**

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

#### **5. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**

##### **5.1.Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

##### **5.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):**

Uvedené v prílohe č.2

##### **5.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):**

Uvedené v prílohe č.3

#### **6. Systém kvality:**

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

#### **7. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:**

##### **7.1.Zariadenie Zhotoviteľ'a:**

Uvedené v prílohe č.4

##### **7.2.Personál Zhotoviteľ'a:**

Uvedené v prílohe č.4

## **8. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:**

### **8.1. Bezpečnosť práce:**

#### **A. Popis činnosti BOZP:**

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

#### **B. Plnenie Plánu BOZP stavby**

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci február boli spracované 4 Správy z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:



- a) Zatĺkanie Larsenovej steny v blízosti železnice bez hliadky.



- b) Práca bagra v blízosti vedenia VN bez dozoru.





c) Pohyb pracovníkov vo výške po neúplných podlahách bez istenia.



d) Nebezpečné nevysvahované výkopy.





- e) Nebezpečný nevysvahovaný výkop bez paženia so zosúvajúcou sa zeminou.



### **Práce s osobitným nebezpečenstvom**

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

### **C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP**

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávatel'a, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

### **D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie**

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti vo vzťahu k BOZP na stavenisku

### **E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác**

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľ'mi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľ'om. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľ'a a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

## **8.2. Ekologické vplyvy:**

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – vid' príloha č. 5.

## **8.3. Evidencia odpadov:**

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"



Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Mesiac:

05/2023

P.č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu	Názov PS/SO	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1	05.05.2023	Brodské	17 05 04	0		212,27	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
2	05.05.2023	Brodské	17 05 04	0		910,66	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
3	05.05.2023	Brodské	17 01 01	0		95,33	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
4	06.05.2023	Brodské	17 01 07	0		34,95	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
5	06.05.2023	Brodské	17 05 04	0		220,86	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
6	06.05.2023	Brodské	17 05 04	0		1521,76	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
7	07.05.2023	Zohor	17 05 04	0		375,14	SO 02 33 01	AFR GROUP, s.r.o. Jána Ondruša 19/C, Stupeva	R3
8	07.05.2023	Brodské	17 05 04	0		220,22	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
9	07.05.2023	Brodské	17 05 04	0		1468,09	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
10	12.05.2023	Brodské	17 05 04	0		252,11	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
11	12.05.2023	Brodské	17 05 04	0		1269,72	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
12	12.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		563,89	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
13	13.05.2023	Brodské	17 05 04	0		227,75	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
14	13.05.2023	Brodské	17 05 04	0		995,15	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
15	13.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1147,88	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
16	14.05.2023	Brodské	17 05 04	0		219,43	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
17	14.05.2023	Brodské	17 05 04	0		1427,71	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
18	14.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1170,04	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
19	15.05.2023	Brodské	17 05 04	0		218,22	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
20	15.05.2023	Brodské	17 05 04	0		354,19	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
21	15.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1136,44	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
22	16.05.2023	Brodské	17 05 04	0		128,48	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
23	16.05.2023	Kúty	17 05 04	0		785,49	SO 10 34 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
24	16.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1051,52	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
25	19.05.2023	Brodské	17 05 04	0		263,37	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
26	19.05.2023	Kúty	17 05 04	0		75,82	SO 10 34 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
27	19.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		906,47	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
28	19.05.2023	Zohor	17 05 04	0		1252,70	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
29	20.05.2023	Brodské	17 05 04	0		233,23	SO 11 33 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
30	20.05.2023	Kúty	17 05 04	0		114,65	SO 10 34 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
31	20.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		870,64	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
32	20.05.2023	Zohor	17 05 04	0		1314,64	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
33	21.05.2023	Brodské	17 05 04	0		606,49	SO 11 33 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
34	21.05.2023	Brodské	17 05 04	0		59,99	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
35	21.05.2023	Kúty	17 05 04	0		26,87	SO 10 34 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
36	21.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1308,38	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
37	21.05.2023	Zohor	17 05 04	0		1471,22	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
38	22.05.2023	Brodské	17 05 04	0		995,08	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
39	22.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1215,50	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
40	22.05.2023	Zohor	17 05 04	0		1507,48	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
41	23.05.2023	Brodské	17 01 07	0		490,24	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
42	23.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		881,69	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
43	26.05.2023	Brodské	17 05 04	0		73,29	SO 11 33 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
44	26.05.2023	Brodské	17 01 07	0		298,30	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
45	26.05.2023	Brodské	17 05 04	0		26,45	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
46	26.05.2023	Devínske jazero	17 01 01	0		118,46	SO 01 33 05	AFR GROUP, s.r.o. Jána Ondruša 19/C, Stupeva	R3
47	26.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1338,00	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
48	27.05.2023	Brodské	17 05 04	0		421,42	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
49	27.05.2023	Brodské	17 01 01	0		14,87	SO 11 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
50	27.05.2023	Brodské	17 01 01	0		48,30	SO 10 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
51	27.05.2023	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1320,32	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
52	28.05.2023	Kúty	17 05 04	0		288,45	SO 10 34 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
53	28.05.2023	Brodské	17 05 04	0		1730,30	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
54	29.05.2023	Brodské	17 05 04	0		672,59	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
55	29.05.2023	Brodské	17 05 04	0		1596,12	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
56	30.05.2023	Brodské	17 05 04	0		60,84	SO 11 33 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
57	30.05.2023	Brodské	17 05 04	0		403,17	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
58	30.05.2023	Devínske jazero	17 01 01	0		145,12	SO 01 33 05	AFR GROUP, s.r.o. Jána Ondruša 19/C, Stupeva	R3
59	30.05.2023	Brodské	17 05 04	0		1383,10	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3

Spracoval na základe podkladov poskytnutých:

Ing. Lukáš Hučko

Podpis:



## 9. Finančné plnenie:

### Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 667 718,54	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025
16/2024-A	11/2024	1 856 011,65	16.2.2025
1/2025-A	12/2024	11 113 697,95	30.3.2025
2/2025-A-CZ1	12/2024	36 082,96	18.4.2025
3/2025-A	02/2025	7 298 303,76	13.6.2025
5/2025-A	03/2025	5 106 862,27	15.7.2025



**Stavba B - fakturácia**

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024
17/2024-B	12/2024	892 751,19	29.3.2025

K 31.05.2025 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 65 655 458,15€ bez DPH.
- stavby B vo výške 1 822 853,63 € bez DPH.



## 10. Fotodokumentácia



UČS 12, Prístupová komunikácia ku koľaji č.2



UČS 12, Demolácia malých mostov



UČS 12, Plošiny pre injektáž



UČS 12, Trysková injektáž, mosty





UČS 12, Odťazenie koľajového kameniva



UČS 12, Odkop zeminy po zemnú pláň



UČS 12, Mobilizácia špeciálne zakladanie



UČS 12, Realizácia mikropilóty





UČS 12, Zakladanie mosty - mikropilóty



UČS 12, Ukončenie šacht KCHT



UČS 12, Úprava svahov od náletových drevín







UČS 12, Statické zaťažovacie skúšky zemnej pláne



UČS 12, Rozprestretie geotextílie a zriadenie pláne železničného spodku



UČS 12, Zriadenie pláne železničného spodku







UČS 11, Baranenie štetovnic podchod Brodské



UČS 11, Výkopy podchod Brodské



UČS 11, Rozperný rám podchod Brodské



UČS 11, Výkopy podchod Brodské





UČS 11, Budovanie prístupovej komunikácie a rampy podjazd



UČS 11, Kotvenie stien podjazd



UČS 11, Armovanie, debnenie stien podjazd



UČS 11, Rozperné trámy podjazd Brodské






UČS 11, Podjazd Brodské extravilán



UČS 11, Podjazd Brodské intravilán



UČS 11, Pokládka dlažby nástupisko Brodské

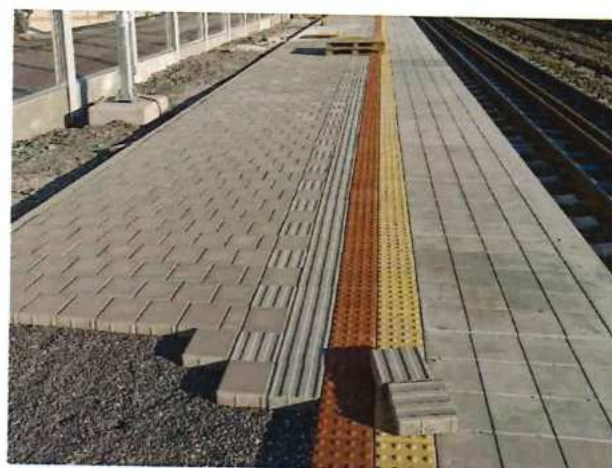

UČS 11, 10, Odřazení kořajového kameniva







UČS 11, 10, Odčazenie koľajového kameniva a zemín po zemnú pláň



UČS 11, 10, Odkop železničného spodku



UČS 11, Odkop zeminy a výmena škvarového podložia





UČS 10, 11, Triedenie koľajového kameniva



UČS 10, Odkop zeminy po zemnú pláň a vykonanie SZS



UČS 10, Zriadenie pláne PŽS







UČS 10, Demontáž návěstidiel



UČS 10, prípravné práce TNS Kúty



UČS 10, prístupová cesta TNS Kúty





UČS 10, Montáž stien TNS Kúty



UČS 10, Prípravné práce na priepuste č.7







UČS 02, Baranenie štetovnic podchod v žst Zohor



UČS 02, Výkopy podchod Zohor





UČS 02, Budovanie kanalizácie



UČS 02, Baranenie HEB, záporové paženie a odťazenie kameniva pod koľajou č. 1





UČS 02, Odraženie koľajového kameňa



UČS 02, Odkop zeminy po zemnú pláň



UČS 02, Zemné práce železničný







UČS 02, Šachty kábelovej trasy



UČS 02, Realizácia kábelových šácht



UČS 02, Betonáž základov trakčných podpier







UČS 02, Realizácia základov pre piliere



UČS 02, Mobilizácia a príprava pracovných plošín pre skúšobné pilóty



UČS 01, Prístupové komunikácie







UČS 01, Prístupové komunikácie



UČS 01, Prekládka kabeláže



UČS 01, Výruby





UČS 01, Osadenie zátarás na ceste III/1106



UČS 01, Demontáž lávky





UČS 01, Búranie základov lávka



UČS 01, Búranie základov



UČS 01, Demontáž trakčného vedenia



UČS 01, Rozoberanie nástupiska zástavka Devínske Jazero







UČS 01, Testovacie pilóty



UČS 0,1 Baranenie kontrastných HEB profilov pri priepustoch a mostoch





UČS 10, Zrútenie rímky mosta do koľajového priestoru

**Príloha č.1**

Zoznam Zmien za obdobie 01.05.2025-31.05.2025

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Oznámenie Zhotoviteľa - Likvidácia mostníc z objektov SO 12-33-01 a SO 12-33-02	12.5.2025	JVICM-VHS/25/0191





[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



## Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.05.2025-31.05.2025

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu

### Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.05.2025-31.05.2025

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	02.5.2025	VICM-VHS/25/0186
2.	Oznámenie o späťvzatí priebežného Nároku č. 5 – Hrúbka skrávky humusového horizontu	21.5.2025	JVICM-VHS/25/0202
3.	Oznámenie Zhotoviteľa o priebežnom Nároku č. 8 – Posunutie termínu výluky pre UČS 01, podľa podčlánku 20.1 pre predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 e) Osobitných zmluvných podmienok – Priebežný nárok	27.5.2025	JVICM-VHS/25/0212
4.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	30.5.2025	JVICM-VHS/25/0213



#### Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

#### Zariadenie Zhotoviteľa

Popis, druh	Množstvo
<b>STROJE</b>	
Rýpadlo	18
Búracie kladivo	5
Traktor CAT, JCB	6
Žeriav	1
Elektrocentrála	10
Čerpadlo na vodu	8
Ponorný vibrátor	5
Vibračná doska	1
Mikropilótová vrtná súprava	2
Pilotovacia súprava	2
<b>DOPRAVA</b>	
Autožeriav	8
Domiešavač	4
Mann s mech. Rukou	1
Nákladné auto TATRA 815	31
LOKO	3
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	14
Pracovný vlak TV-betonárka	2
DESEC	0
Manitou	1

#### Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
<b>VLASTNÍ: Predstavitel' zhotoviteľa:</b>	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulant	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5
<b>CUDZÍ - subdodávatelia</b>	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	22
- Geodet	11
- Stavebný robotník - strojník, vodič	90
- Stavebný robotník	94
