

## „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Zmluva o Dielo č.:** 01/2017

**Predmet zmluvy:** vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

**Dielo:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), \*bez ETCS Le
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 –
  - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 –

## Správa o postupe prác za obdobie: február 2022

**Objednávateľ** : Železnice Slovenskej republiky

**Zhotoviteľ** : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

**Lehota výstavby** : od 10.09.2020 do 10.11.2023

**Predstaviteľ Zhotoviteľa** : Ing. Antonio Melidoro

**Stavebný dozor** : Ing. Milan Zvonár

**Správu vypracovali:** Milan Kubala, Matteo Foffani, Roman Skácel

**Schválil za Zhotoviteľa**

**Vedúci technického útvaru:** Ing. Matteo Foffani, ..... , dátum 8. 3. 2022

**Schválil za SD :**

Ing. Milan Zvonár, ..... , dátum 10. 3. 2022



**OBSAH:**

<b>1. Projektová dokumentácia:</b>	<b>3</b>
<b>2. Inžinierska činnosť:</b>	<b>4</b>
<b>3. Realizácia Diela:</b>	<b>5</b>
<b>4. Vyhodnotenie prác:</b>	<b>5</b>
<b>5. Zmluva o Dielo a dodatky:</b>	<b>5</b>
<b>6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :</b>	<b>5</b>
<b>6.1. Zoznam Zmien:</b>	<b>5</b>
<b>6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):</b>	<b>5</b>
<b>6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):</b>	<b>6</b>
<b>7. Systém kvality:</b>	<b>6</b>
<b>8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:</b>	<b>6</b>
<b>8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:</b>	<b>6</b>
<b>8.2. Personál Zhotoviteľa:</b>	<b>6</b>
<b>9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:</b>	<b>6</b>
<b>9.1. Bezpečnosť práce:</b>	<b>6</b>
<b>9.2. Ekologické vplyvy:</b>	<b>7</b>
<b>10. Finančné plnenie:</b>	<b>7</b>
<b>11. Fotodokumentácia</b>	<b>8</b>

## 1. Projektová dokumentácia:

### Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie</li> <li>Správa dátového prostredia pre DSP a DSPRS na PW</li> <li>Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Analýza a zapracovanie doručených pripomienok Zhotoviteľa k PD DSPRS (poštou, elektronicky mailom a v prostredí Issues ProjectWise)</li> <li>Spolupráca so Zhotoviteľom pre zabezpečenie Búracieho povolenia na území ČR</li> <li>Vypracovanie hygienických správ - predikcií úrovne intenzity el. poľa pre stavbu B na základe požiadavky hlavnej hygieničky rezortu (MDV SR) vznesenej v rámci územného konania</li> <li>Odovzdanie digitálnej PD DSPRS pre časti A.2.1 a B.3.1 dňa 7.2.2022 so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa a pripomienkami plynúcimi z vydaných územných rozhodnutí na konferenčné prerokovanie, ktoré bude dňa 7.3.2022</li> <li>Analýza stanovísk odborných zložiek Objednávateľa doručených pred konferenčným prerokovaním stavby A.2.1 a B.3.1</li> <li>Pracovné rokovanie k harmonogramu projektových prác a inžinierskej činnosti so Zhotoviteľom dňa 10.2.2022</li> <li>Pracovné rokovanie k zakladaniu podjazdov v UČS 03 a 04 so Zhotoviteľom dňa 14.2.2022</li> <li>Pracovné rokovanie k Schvaľovaciemu rozhodnutiu MDV SR k časti stavby A.2.2 s Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 16.2.2022</li> <li>Zapracovanie pripomienok zo Schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR do PD DSPRS pre časť stavby A.2.2</li> <li>Aktualizácia koordinačných výkresov pre časť stavby A.2.2</li> <li>Príprava PD PDSRS pre časť stavby A.2.2 k odovzdaniu Zhotoviteľovi na kontrolu</li> <li>Pracovné rokovanie rozvodni Borský Sv. Jur s Objednávateľom a Zhotoviteľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. dňa 17.2.2022</li> <li>Pracovné rokovanie so Zhotoviteľom dňa 23.2.2022 k problémom pri IČ - Plavecký Štvrtok, zásahy na českej strane</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizácia harmonogramu postupu prác – MS Project</li> <li>Spracovanie Správy postupu prác</li> <li>Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DUR a ich prípadný dopad na spracovanie DSPRS</li> <li>Účasť na rokovaníach v procese územných konaní</li> <li>Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS</li> <li>Organizácia a účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom</li> <li>Organizácia a príprava na opakované konferenčné prerokovanie PD DSPRS pre časť stavby A.2.1 a B.3.1, ktoré je plánované na 7.3.2022</li> <li>Analýza stanovísk odborných zložiek Objednávateľa doručených pred konferenčným prerokovaním stavby A.2.1 a B.3.1</li> </ul>	
--	---	--

## 2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<p>IČ okrem prieskumov</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon IČ DSZ/DUR</li> <li>Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania PD DÚR</li> <li>Sledovanie priebehu územných konaní</li> <li>Doplňovanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov</li> <li>Výkon IČ DSP (pre stavbu A.2.1.2) - Prerokovanie DSP (vrátane odborného posudku ŽSR a schvaľovacieho rozhodnutia) na území SR</li> <li>Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.2.1.2 (UČS 12) a stavbu A.2.2 (UČS 10)</li> <li>Práce súvisiace s MPV a geometrickými plánmi</li> <li>Výkon IČ DSPRS - zabezpečenie všetkých potrebných doplnkových prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo doporučení expertov, ktoré z nich vyplývajú (realizácia doplnkového geodetického prieskumu v lokalite Morava - vytyčovací sieť)</li> <li>Výkon IČ pre odstránenie stavby na ČR strane – stavba A.2.1.2</li> <li>Výkon IČ pre odstránenie stavby na SR strane – stavba A.2.1.2</li> <li>Ukončenie časti Diela – IČ DSZ/DUR na stavbu A.2.2 a odovzdanie na JV ICM-VHS dňa 20.1.2022, doplnené na základe požiadavky Objednávateľa dňa 9.2.2022</li> <li>Právoplatnosť územného rozhodnutia pre časť stavby A.2.1.1 UČS 11 dňa 7.2.2022</li> <li>Ukončenie časti Diela – IČ DSZ/DUR na stavbu A.2.1.1 a odovzdanie na JV ICM-VHS dňa 9.2.2022</li> <li>Ukončenie časti Diela – IČ DSZ/DUR na stavbu A.2.1.2 a odovzdanie na JV ICM-VHS dňa 16.2.2022</li> <li>Účasť na územnom konaní pre stavbu A.1 UČS 03+04 – ústne pojednávanie dňa 22.2.2022</li> <li>24.2.2022 bolo ČR vydané búracie povolenie na most cez rieku Morava (nadobudnutie právoplatnosti sa predpokladá 14.03.2022)</li> </ul>	<p>úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD</p>

2.2.	<b>Prieskumy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon doplnkového prieskumu - vybudovanie vytyčovacej siete stavby s nútenou centráciou, prvej triedy presnosti - príprava podkladov a miestne šetrenia pre vyhotovenie vytyčovacej siete, realizácia bodov a potrebné merania, spracúvanie záverečných správ</li> <li>dňa 25.2.2022 odovzdaný na JV ICM-VHS „Doplnkový prieskum geodetický, vybudovanie vytyčovacej siete“ pre časť stavby A.2.1 a A.2.2 (1x CD s elaborátmi)</li> </ul>	REMING CONSULT- MORAVIA CONSULT- TRANS GEO, GEOKOD
------	---	--

### **3. Realizácia Diela:**

Dňa 28.1.2022 bolo na základe búracieho povolenia vydaného MDV SR č. 07038/2022/SŽDD/03791 odovzdané stavenisko: Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č.2 v úseku železničnej trate Kúty – Kúty štátna hranica, od žkm 73,800 – po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky.

Dňa 28.2.2022 bol udelený súhlas Stavebného dozora na zahájenie prác na:

- SO 12-33-04 Kúty – SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 74,410 (ev.km 74,386) – prístupová cesta
- SO 12-31-01 Kúty – SR/ČR – výruby drevín.

### **4. Vyhodnotenie prác:**

Aktuálne sa neaplikuje.

### **5. Zmluva o Dielo a dodatky:**

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

### **6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**

#### **6.1.Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

#### **6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):**

Uvedené v prílohe č.2

### **6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):**

Uvedené v prílohe č.3

## **7. Systém kvality:**

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

## **8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:**

### **8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:**

Aktuálne sa neaplikuje.

### **8.2. Personál Zhotoviteľa:**

Aktuálne sa neaplikuje.

## **9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:**

### **9.1. Bezpečnosť práce:**

#### **A. Popis činnosti BOZP:**

Dňa 29.3.2021 bola uzavretá písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK.

#### **B. Plnenie Plánu BOZP stavby**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Závažné nedostatky:**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Opakujúce sa nedostatky:**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Práce s osobitným nebezpečenstvom**

Aktuálne sa neaplikuje.

#### **C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP**

Aktuálne sa neaplikuje.

#### **D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie**



V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

**E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác**

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.

**9.2. Ekologické vplyvy:**


Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

**10. Finančné plnenie:**

K 28.02.2022 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie vo výške 3 456 787,50 EUR, bez DPH



## 11. Fotodokumentácia

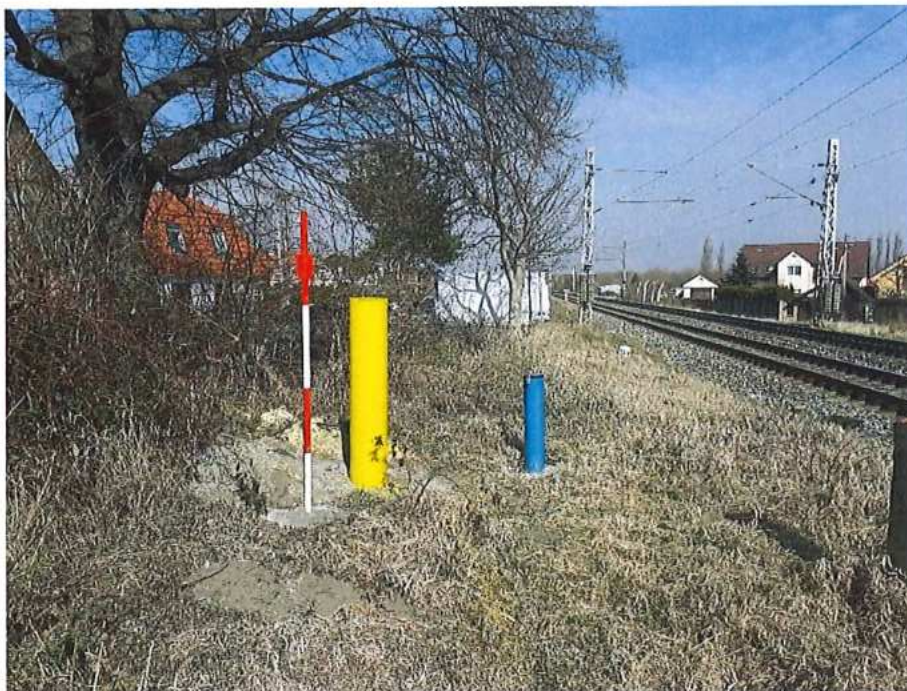

Bodovanie ZVS – Malacky km. 25,880



Bodovanie ZVS – Malacky žkm. 25,140





Bodovanie ZVS – Malacky km. 24,865



Bodovanie ZVS – Malacky km. 23,825

# Príloha č.1

Zoznam Zmien k 28.02.2022

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu (Lehota výstavby).</p> <p>Pokyn na Zmenu č.1 (Odsúhlasenie zmeny Lehoty výstavby).</p>	<p>07.10.2020</p> <p>21.10.2020</p>	<p>JVICM-VHS/20/0011</p> <p>230/2020-USPaR Ba</p>
2.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - odpoveď Objednávateľa.</p>	16.10.2020	31562/2020/O220-7
3.	<p><b>Nárok č. 1 - EIA</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu – EIA.</p>	19.10.2020	JVICM-VHS/20/0014
4.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č.1 k Hlavnej Zmluve (pripomienky Zhotoviteľa k Dodatku č.1).</p>	2.11.2020	JVICM-VHS/20/0018
5.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 (odpoveď Objednávateľa).</p>	04.11.2020	31562/2020/0220-15
6.	<p><b>Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</b></p> <p>Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC".</p>	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
7.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017.</p>	13.11.2020	JVICM-VHS/20/0024



8.	<b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b>  Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 - stanovisko Objednávateľa.	19.11.2020	31562/2020/0220-23
9.	<b>Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</b>  Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok.	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
10.	<b>Nárok č. 4 - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DÚR</b>  Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - Vypracovanie DSZ/DÚR na Časť A.2.1 a rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR.	18.12.2020	JVICM-VHS/20/0046
11.	<b>Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466.	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0105
12.	<b>Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466.	20.5.2021	JVICM-VHS/21/0139
13.	<b>Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Oznámenie o rozhodnutí Stavebného dozora – zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73,210 a km 73,466.	18.6.2021	053/2021-ÚS SPaR Ba/435
14.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti úradov, žiadosť o stretnutie.	31.5.2021	JVICM-VHS/21/0144



15.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia - pripomienky a žiadosti obecného úradu BRODSKÉ k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR. Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.	15.6.2021	JVICM-VHS/21/0154
16.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora - napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty.	18.2.2021	JVICM-VHS/21/0041
17.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Žiadosť o Zmenu v súlade s článkom 13 Osobitných podmienok Žltý FIDIC.	12.7.2021	JVICM-VHS/21/0184
18.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Rozhodnutie Stavebného dozora - pokyn na Zmenu k napájaniu zariadení v úseku Sekule – Kúty.	13.7.2021	064/2021-ÚS SPaR Ba/548
19.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Pokyn Stavebného dozoru – napájanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku Sekule – Kúty, cenový a časový dopad.	21.7.2021	JVICM-VHS/21/0194
20.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Pripomienky a žiadosti Mestského úradu MALACKY k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR.	24.8.2021	JVICM-VHS/21/0226
21.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Stanovisko Objednávateľa k napájaniu zariadení v úseku Sekule – Kúty.	1.7.2021	14812/2021/O220-113
22.	<b>Nárok č. 9 – Zmena polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves</b>  Žiadosť o vydanie Pokynu na zmenu.	29.10.2021	JVICM-VHS/21/0289

23.	<b>Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot</b>  Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora.	22.2.2021	JVICM-VHS/21/0048
24.	<b>Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot</b>  Žiadosť o predloženie ponuky - úprava systému ETCS L2 na úseku štátna hranica SR/ČR – Lanžhot.	19.10.2021	087/2021-USPaR BA
25.	<b>Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot</b>  Odpoveď na list 087/2021-ÚS SPaR Ba/843, doručený dňa 19.10.2021.	25.10.2021	JVICM-VHS/21/0283
26.	<b>Nárok č. 9 – Zmena polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves</b>  Rozhodnutie Stavebného dozora - Pokyn na Zmenu polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves.	16.11.2021	097/2021-ÚS SPaR Ba/945
27.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b>  Oznámenie podľa čl. 8.3 Špeciálnych zmluvných podmienok Žltý FIDIC.	8.11.2021	JVICM-VHS/21/0299
28.	<b>Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu</b>  Posúdenie úpravy pracoviska výpravcu v ŽST Zohor – odpoveď Zhotoviteľa	12.11.2021	JVICM-VHS/21/0308
29.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b>  Žiadosť o vydanie Pokynu na Zmenu, podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok žltý FIDIC  - Zabezpečenie procesu EIA na území Českej republiky	31.1.2022	JVICM-VHS/22/0038

30.	<p><b>Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu</b></p> <p>Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora, podľa čl. 13 Osobitných podmienok – Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu na prízemie budovy RZZ Zohor, (Projektantova Žiadosť o vydanie pokynu č. 11)</p>	26.1.2022	JVICM-VHS/22/0022
31.	<p><b>Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu</b></p> <p>Žiadosť o predloženie ponuky - premiestnenie priestorov dispozičného výpravcu na prízemie budovy RZZ Zohor</p>	7.2.2022	013/2022-ÚS SPaR Ba/64
32.	<p><b>Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu</b></p> <p>Odpoveď na list Stavebného dozora č. 013/2022-ÚS SPaR Ba/69 – premiestnenie priestorov dispozičného výpravcu na prízemie budovy RZZ Zohor - Predloženie cenovej ponuky.</p>	17.2.2022	JVICM-VHS/22/0061
33.	<p><b>Nárok č. 13 - Nedostatky v „Zápise z odovzdania a prevzatia staveniska stavby“ - Most Morava</b></p> <p>ODOVZDÁVANIE STAVENISKA OBJEDNÁVATEĽOM - Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR ( sžkm 72,750 – 74,900), Železničný most v žkm 74,386, Niekoľko pripomienok a úvah</p>	24.2.2022	JVICM-VHS/22/0070
34.	<p><b>Nárok č. 15 – Koordinácia výluk s českou stranou</b></p> <p>BÚRANIE MOSTA CEZ RIEKU MORAVA , VÝLUKA KOĽAJE č. 2 – postupy búrania mosta</p>	27.1.2022	JVICM-VHS/22/0032



35.	<b>Nárok č. 15 – Koordinácia výluk s českou stranou</b>  Žiadosť o Pokyn alebo Rozhodnutie podľa čl. 13 alebo čl. 3.5 Osobitných zmluvných podmienok Fidic , Odkaz na náš list JVICM-VHS/22/0032 zo dňa 27.1.2022	16.2.2022	JVICM-VHS/22/0058
36.	<b>Nárok č. 15 – Koordinácia výluk s českou stranou</b>  Žiadosť o Pokyn alebo Rozhodnutie Stavebného dozoru týkajúce sa postupu stavebných prác (a výluk) z dôvodu obmedzenia z českej strany (tretia strana), podľa podčl. 3.3, 3.5, čl. 13. Osobitných zmluvných podmienok	21.2.2022	JVICM-VHS/22/0066
37.	<b>Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu</b>  Žiadosť o úpravu cenovej ponuky - zmena umiestnenia dispozičného výpravcu RZZ Zohor	21.2.2022	13150/2022/O220-279/3769



[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



**Príloha č.2**

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) k 28.02.2022

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Zmluvná pokuta (omeškanie s predložením správ o postupe prác).	24.11.2020	31562/2020/O220-25/716

### Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) k 28.02.2022

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	<b>Nárok č. 1 – EIA</b> Oznámenie o uplatnení nároku (článok 20.1).	27.10.2020	JVICM-VHS/20/0016
2.	<b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b> Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“.	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
3.	<b>Nárok č. 1 – EIA</b> EIA – Predloženie detailného nároku s podpornými podrobnosťami podstaty nároku a nárokovanej lehoty predĺženia a/alebo dodatočnej platby v súlade s podmienkami čl. 20.1 Zmluvných podmienok.	10.11.2020	JVICM-VHS/20/0022
4.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 stanovisko Objednávateľa – odpoveď Zhotoviteľa.	23.11.2020	JVICM-VHS/20/0025
5.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – stanovisko Objednávateľa k listu č. JVICM-VHS 20/0025.	25.11.2020	31562/2020/O220-27
6.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – odpoveď Zhotoviteľa.	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028
7.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty.	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028



8.	<p><b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b></p> <p>Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok.</p>	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
9.	<p><b>Nárok č. 1 – EIA</b></p> <p>Nárok Zhotoviteľa č.1 (Záverečné stanovisko EIA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.</p>	23.12.2020	277/2020-USPaRBA
10.	<p><b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Nárok Zhotoviteľa vo vzťahu k úprave Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny.</p>	4.1.2021	JVICM-VHS/21/0001
11.	<p><b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR dokumentácie pre časť A.2.1</b></p> <p>Vypracovanie DSZ a DÚR pre Časť A.2.1.</p>	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0005
12.	<p><b>Nárok č. 4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DÚR</b></p> <p>Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR.</p>	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0006
13.	<p><b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b></p> <p>Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC.</p>	5.02.2021	JVICM-VHS/21/0026
14.	<p><b>Nárok č. 1 – EIA</b></p> <p>Odpoveď na Váš list zo dňa 23.12.2020 – Nárok Zhotoviteľa č. 1 (Záverečné stanovisko EIA)</p>	8.1.2021	JVICM-VHS/21/0004

15.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b>  Nárok Zhotoviteľa č.2 (Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	11.1.2021	003/2021-ÚSPaR Ba
16.	<b>Detailný nárok č. 3: - Vypracovanie DSZ a DÚR na časť A.2.1. ŽST Kúty (mimo) – štátne hranice SR/ČR 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)</b>  Detailný nárok č. 4: - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR.	2.2.2021	JVICM-VHS/21/0021
17.	<b>Nárok č.1 – EIA</b>  Odpoveď Stavebného dozora na list č. JVICM-VHS/21/0004, zo dňa 08.01.2021.	04.02.2021	013/2021-ÚSPaR Ba/107
18.	<b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR dokumentácie pre časť A.2.1</b>  Doplnenie nároku č. 3: Vypracovanie DSZ a DÚR na Časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900).	11.02.2021	JVICM-VHS/21/0034
19.	<b>Nárok č.4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR</b>  Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	24.02.2021	023/2021-ÚS SpaR Ba
20.	<b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR na časť A.2.1.</b>  Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	17.3.2021	027/2021-ÚS SpaR Ba/154
21.	<b>Nárok č. 5: Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC,</b>  Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre vydanie rozhodnutia SD v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	30.3.2021	030/2021 – ÚS SpaR Ba/ 192

22.	<p><b>Nárok Zhotoviteľa (Oznámenie podľa podčlánku 5.1 FIDIC)</b></p> <p>Odpoveď na list 030/2021-ÚS SpaR Ba /192 zo dňa 30.3.2021 Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1. Zmluvných podmienok.</p>	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0106
23.	<p><b>Nárok č.1 – EIA</b></p> <p><b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Výkaz výmer pre DSZ/DÚR.</p>	23.4.2021	JVICM-VHS/21/0114
24.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti obce PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii</p> <p>Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1.</p>	14.6.2021	JVICM-VHS/21/0153
25.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Oznámenie o Nároku podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov</p> <p><b>VŠETKY ONESKORENÉ STANOVISKÁ ÚRADOV.</b></p>	17.6.2021	JVICM-VHS/21/0156
26.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii</p> <p>Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1.</p>	25.6.2021	JVICM-VHS/21/0162



27.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia – Požiadavky obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR - Preposlanie odpovede Projektanta Obecnému úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK.	29.6.2021	JVICM-VHS/21/0166
28.	<b>Nárok č.1 – EIA</b>  NÁROK č. 1 – Zmeny zmluvného rozsahu prác zavedené EIA Priebežné predloženie Nároku č. 1 – ďalšie podporné dokumenty.	2.7.2021	JVICM-VHS/21/0173
29.	<b>Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Mostné objekty v km 73,210 a km 73,466 Odpoveď na list Stavebného dozoru 053/2021-ÚS SpaR Ba / 435, prijatý 18.6.2021: Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa Pod-článku 20.1.	8.7.2021	JVICM-VHS/21/0178
30.	<b>Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa pod-článku 20.1 – DETAILNÝ NÁROK.	28.7.2021	JVICM-VHS/21/0202
31.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  „Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK“.	8.7. 2021	JVICM-VHS/21/0181
32.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	9.7.2021	JVICM-VHS/21/0182

33.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.</p>	9.7.2021	JVICM-VHS/21/0183
34.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Detailný Nárok ohľadom dodatočných požiadaviek Obecného Úradu Brodské/Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.1.</p>	15.7.2021	JVICM-VHS/21/0191
35.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK.</p>	23.7.2021	JVICM-VHS/21/0197
36.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.</p>	4. 8. 2021	JVICM-VHS/21/0208
37.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.</p>	4. 8. 2021	JVICM-VHS/21/0209

38.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok FIDIC z dôvodu Oneskorenia spôsobeného úradmi – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.</p>	17.8.2021	JVICM-VHS/21/0224
39.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Oznámenie Zhotoviteľa o nároku podľa článku 20 Osobitných podmienok FIDIC – Oneskorenie spôsobené úradmi – Mesto MALACKY.</p>	31.8.2021	JVICM-VHS/21/0233
40.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.</p> <p>Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.</p>	9.9.2021	JVICM-VHS/21/0249
41.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Detailný Nárok ohľadom požiadaviek Mesta MALACKY podľa článku 20 Osobitných podmienok FIDIC – Oneskorenie spôsobené úradmi.</p>	14.9.2021	JVICM-VHS/21/0252
42.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok FIDIC z dôvodu Oneskorenia spôsobeného úradmi – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.</p>	16.9.2021	JVICM-VHS/21/0254



43.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	8.10.2021	JVICM-VHS/21/0267
44.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	15.10.2021	JVICM-VHS/21/0273
45.	<b>Nárok Zhotoviteľa č. 6 - Zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73.210 and km73.466</b>  Rozhodnutie SD v zmysle podčl. 20.1 Zmluvných podmienok.	11.11.2021	094/2021-ÚSPaR Ba/932
46.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Žiadosť Objednávateľa o doplnenie priebežného Nároku – oneskorená právoplatnosť ÚR žiadosť o objasnenie a hyperlinky ku dokumentom.	25.10.2021	14812/2021/O220-150
47.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.	5.11.2021	JVICM-VHS/21/0298
48.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b> Stanovisko Objednávateľa k UČS12 v priebežnom Nároku – oneskorenie právoplatnosti ÚR. ( Odpoveď na časť nášho listu JVICM-VHS/21/0273.)	12.11.2021	24832/2021/O220-68
49.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia Obec Brodské) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1.	12.11.2021	092/2021-ÚSPaR Ba/933

	Vydanie územného rozhodnutia Mestský úrad STUPAVA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1.		
51.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Informácia Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1 Zmluvných podmienok (Odpoveď na list JVICM-VHS/21/0298).		095/2021-ÚSPaR Ba/937
52.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	12.11.2021	JVICM-VHS/21/0310
53.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Odpoveď Zhotoviteľa na list Stavebného dozora 095/2021-ÚSPaR Ba/937, ktorý bol doručený dňa 12.11.2021 (ďalej len List)	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0318
54.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.	1.12.2021	JVICM-VHS/21/0326
55.	<b>Nárok č. 11 – Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b>  Zhotoviteľovo oznámenie podľa čl. 20.1 Všeobecných podmienok.	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0315
56.	<b>Nárok Zhotoviteľa č. 6 - Zmena svetlosti otvorov na mostných</b>	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0314

	<b>objektoch v km 73.210 and km73.466</b>  Odpoveď Zhotoviteľa na list Stavebného dozora č. 094/2021-ÚSPaR Ba/932, ktorý bol doručený dňa 10.11.2021 poštou.		
57.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa podčlánku 20.1	3.12.2021	JVICM-VHS/21/0329
58.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia	15.12.2021	JVICM-VHS/21/0336
59.	<b>Nárok č. 11 – Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b>  Stanovisko Objednávateľa k neúplnosti požiadaviek DÚR	3.12.2021	24832/2021/O220/75
60.	<b>Nárok č. 11 – Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b>  PRIEBEŽNÝ NÁROK, Odpoveď na list Objednávateľa 24832/2021/O220/75	9.12.2021	JVICM-VHS/21/0332
61.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b>	21.12.2021	JVICM-VHS/21/0341



61.	<p><b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b></p> <p>Neúplnosť dokumentácie DÚR (2004) – Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavby A.2.A. a B.3.A na českom území - Problémy so získaním búracieho povolenia pre most Morava, PRIEBEŽNÝ NÁROK</p>	21.12.2021	JVICM-VHS/21/0341
62.	<p><b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b></p> <p>Stanovisko Objednávateľa k neúplnosti požiadaviek DÚR priebežného nároku</p>	14.1.2022	29946/2022/O220-2
63.	<p><b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území – PRIEBEŽNÝ NÁROK</b></p> <p>Odpoveď Zhotoviteľa na list Objednávateľa č. 29946/2022/O220-2 zo dňa 14.1.2022</p>	17.1.2022	JVICM-VHS/22/0013
64.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.</p> <p>Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.</p>	11.1.2022	JVICM-VHS/22/0005
65.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.</p>	14.1.2022	JVICM-VHS/22/0007

	Oznámenie Zhotoviteľa o nároku č. 14 - Chýbajúca zmluva o pripojení medzi ZSD a Investorom – pre stavbu A.2.2 (= UČS 10), podľa čl. 20 Osobitných zmluvných podmienok FIDIC		
67.	<p><b>Nárok č. 13 - Nedostatky v „Zápise z odovzdania a prevzatia staveniska stavby“ - Most Morava</b></p> <p>ODOVZDANIE STAVENISKA OBJEDNÁVATEĽOM - Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900) Železničný most v žkm 74,386 1. časť na území Slovenskej republiky, Zhotoviteľovo Oznámenie o nároku č. 13</p>	24.2.2022	JVICM-VHS/22/0071
68.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.</p> <p>Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.</p>	16.2.2022	JVICM-VHS/22/0059
69.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.</p>	17.2.2022	JVICM-VHS/22/0060



## BUDOVANIE ZVS na trati DNV (mimo) – Malacky a Kúty – štátna hranica

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**1, Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

**Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Február 2022** – spracovanie zameraných dát, vyhotovenie výsledného elaborátu ZVS pre obe stavby.

**2, Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky sžkm 1,384 - sžkm 25,670

**Február 2022** - ku dňu 28.02.2022 bolo dokončené stabilizovanie pilierov a pažníc popri trati v celom úseku. Boli označené signálnymi tyčami. ( v k.ú. Plavecký Štvrtok už boli aj niektoré odcudzené). Prebehlo zameranie bodov metódou GNSS – SKPOS-cm, v 3. TP.

V Bratislave 01.03.2022

Ing. Michaela Čuchtová (GEOKOD, s.r.o.)



obr. 1 , úsek DNV - Malacky, Plaveký Štvrtok žkm 18.65, pilier- bod ZVS



obr. 2 , úsek DNV - Malacky, žst. Zohor žkm 12.43, pilier- bod ZVS





obr. 3 , úsek DNV - Malacky, žkm 8.48, pažnica- bod ZVS



obr. 4 , úsek DNV - Malacky, žkm 1.73, pilier- bod ZVS

