

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: jún 2022

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 10.11.2023

Predstaviteľ Zhotoviteľa : Ing. Antonio Melidoro

Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Roman Skácel, Matteo Foffani,

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani, dátum 8. 7. 2022

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár, dátum 19.7. 2022



OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	5
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	6
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	6
6.1. Zoznam Zmien:	6
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	6
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	6
7. Systém kvality:	7
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	7
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	7
8.2. Personál Zhotoviteľa:	7
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:	7
9.1. Bezpečnosť práce:	7
9.2. Ekologické vplyvy:	10
10. Finančné plnenie:	10
11. Fotodokumentácia	11

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavbu A1 a A22 Príprava PD DSPRS pre stavbu A.2.2 k odovzdaniu Zhotoviteľovi na kontrolu Odovzdanie PD DSPRS pre stavbu A.2.2 Zhotoviteľovi dňa 13.6.2022 a zapracúvanie pripomienok Zhotoviteľa Odovzdanie PD DSPRS pre stavbu A.2.2 Objednávateľovi (ŽSR) na konferenčné prerokovanie dňa 28.6.2022 Projektové práce - DSPRS stavby A.1 Terénne práce pre výrub drevín – stavba A.1, UČS01 a 02 Dopracovanie na žiadosť Objednávateľa (ŽSR), príprava a expedícia digitálnej a tlačenej formy PD DSPRS pre stavbu B.3.1 a PS 10-21-02 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia harmonogramu postupu prác v programe MS Project Spracovanie Správy postupu prác Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DUR a ich prípadný dopad na spracovanie DSPRS Účasť na rokovaníach v procese územných konaní Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami Účasť na kontrolnom dni stavby Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS Organizácia a účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom Organizácia a príprava odovzdania digitálnej PD DSPRS pre stavbu A.2.2 Rokovanie so zástupcami NOBO pre posúdenie TSI Príprava PD DSPRS pre stavbu A.2.2 k odovzdaniu Zhotoviteľovi na kontrolu Technická porada k riešeniu 110kV prípojky BSJ - TNS Kúty s odbornými zložkami Projektanta v dňoch 3.6.2022 a 16.6.2022 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO

<ul style="list-style-type: none"> • Technická porada k riešeniu 110kV prípojky BSJ - TNS Kúty s odbornými zložkami Objednávateľa a ZSD dňa 28.6.2022 • Odovzdanie PD DSPRS pre stavbu A.2.2 Zhotoviteľovi dňa 13.6.2022 a zapracúvanie pripomienok Zhotoviteľa • Odovzdanie PD DSPRS pre stavbu A.2.2 Objednávateľovi (ŽSR) na konferenčné prerokovanie dňa 28.6.2022 • Dopracovanie na žiadosť Objednávateľa (ŽSR), príprava a expedícia digitálnej a tlačenej formy PD DSPRS pre stavbu B.3.1 a PS 10-21-02 • Príprava a organizácia konferenčného prerokovania PD DSPRS pre stavbu A.2.2 s Objednávateľom (ŽSR), ktoré je zvolané na 28.7.2022 	
---	--

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<p>IČ okrem prieskumov</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výkon IČ DSZ/DUR • Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD • Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS • Sledovanie priebehu územných konaní • Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov • Výkon IČ DSP (pre stavbu A.2.1.2) - Prerokovanie DSP (vrátane odborného posudku ŽSR a schvaľovacieho rozhodnutia) na území SR • Výkon IČ DSP (pre stavbu A.2.1.2) - Účasť na stavebnom konaní • Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.2.1.2 (UČS 12), stavbu A.2.1.1 (UČS 11) a stavbu A.2.2 (UČS 10) • Práce súvisiace s MPV • Spracovanie geometrických plánov • Výkon IČ DSPRS - zabezpečenie všetkých potrebných doplnkových prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo doporučení expertov, ktoré z nich vyplývajú – príprava podkladov a práce na zabezpečení pyrotechnického prieskumu 	<p>úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO, GEOKOD</p>
2.2.	<p>Prieskumy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spracúvanie podkladov a práce na zabezpečení pyrotechnického prieskumu a zazmluvnení odbornej spoločnosti, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti 	<p>REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO, GEOKOD</p>

3. Realizácia Diela:

Dňa 28.1.2022 bolo na základe búracieho povolenia vydaného MDV SR č. 07038/2022/SŽDD/03791 odovzdané stavenisko: Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č.2 v úseku železničnej trate Kúty – Kúty štátna hranica, od žkm 73,800 – po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky.

Do 31.5.2022 bol udelený súhlas Stavebného dozoru na zahájenie prác na:

- SO 12-31-01 Kúty – SR/ČR – výruby drevín.
- SO 12-33-04 Kúty – SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 74,410 (ev.km 74,386) + prístupová cesta
- SO 12-35-01 št. hranica SR/ČR trakčné vedenie 1 časť

V priebehu mesiaca jún 2022 bola zdemontovaná oceľová konštrukcia mosta SO 33-12-04 (most cez rieku Morava). Ako bolo dohodnuté na stretnutí dňa 10.08.2021 (za účasti Objednávateľa, zástupcov odboru ŽSR MO, Projektanta, zhotoviteľ Investora - firma Eurosteel Capital, s.r.o.), oceľová konštrukcia bola rozrezaná na kusy podľa predloženého Technologického postupu, výkresov a výpočtov na demontáž mosta Morava. Prvky boli uskladnené na stavenisku (SK a CZ strana) a správcovi mostného objektu bolo oznámené, kedy môže likvidátor kovového odpadu (t. j. Zhotoviteľ Investora) začať svoju činnosť.

Práce boli vykonávané v nepretržitej výluke 2.traťovej koľaje + TV v úseku žst. Kúty SK – žst. Lanžhot CZ podľa ROV 490 Etapa A.

Na stavbe bolo prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v koľaji č. 1, popri pracovnom mieste v oblasti hraničného mosta cez rieku Morava, v čase 5:00 – 22:00 hod do 03.06.2022. Od 04.06.2022 od 06:00 do 21:00 hod. Prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti bolo po demolácii mostnej konštrukcie zrušené 22.06.2022.

4. Vyhodnotenie prác:

SO 12-33-04.1 Prístupová cesta

- údržba prístupovej komunikácie SK
- kosenie
- prístupová komunikácia CZ – vybudovanie
- údržba prístupovej komunikácie SK a CZ
- práce prebiehali v zmysle HMG

SO 12-33-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386)

- označenie budúcich rezov pre rezanie konštrukcie mosta a vyznačenie miest pre uchytenie bremena pred rezaním
- lešenárske práce

- statická príprava
- zahájenie demontáže mosta v zmysle TP rezaním
- prerezanie mostného poľa č.10 v zmysle TP a jeho postupná demontáž na stranu SK
- demontáž mosta v zmysle TP rezaním SK
- ukončenie demontáže mosta na SK strane
- demontáž pílma na SK strane a prevoz a postavenie na strane CZ
- zriadenie platformy pre žeriav na CZ strane
- demontáž žeriavu na strane SK
- presun žeriavu na stranu CZ a jeho postavenie
- lešenárske práce
- demontáž mosta v zmysle TP rezaním na CZ strane
- demontáž mostnej konštrukcie bola ukončená 20.06.2022 v celej dĺžke
- lešenárske práce
- demontáž pílma na strane CZ
- demontáž žeriavu na strane CZ
- práce prebiehali v zmysle HMG

Zhotoviteľ Investora - firma Eurosteel Capital, s.r.o.

- likvidácia starej mostnej konštrukcie na SK strane rozpálením
- odvoz rozpálenej mostnej konštrukcie do šrotu (SK strana)

5. Zmluva o Diele a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

6.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):

Uvedené v prílohe č.2

6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4

8.2.Personál Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1.Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR. V súčasnosti je predložený na schválenie jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

V priebehu mesiaca boli vykonávané práce pri budovaní núdzového prístupu pod mostom na CZ strane. A pokračovali práce búrania mosta na koľaji č. 2 (SO 12.33.04) - prípravné práce pred demontážou oceľovej mostnej konštrukcie.

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli predložené.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. Zistené nedostatky sú riešené priamo na mieste zistenia, z inšpekcií staveniska boli spracované Správy na týždennej báze.

Vymedzenie staveniska, bezpečnostné značenie, dočasné dopravné značenie - Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po

jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska , najmä na miesta priamej stavebnej činnosti. Priestory manipulačnej plochy a komunikácií boli dočasne vymedzené bezpečnostnou páskou



Prerušovanie prác počas prechodu vlakov po koľaji č. 1



Po demontáži zabezpečenie pracoviska zábradlí

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na použitie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách

Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení, neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií.

V sledovanom období v oblasti BOZP neboli zistené závažnejšie porušenia Zhotoviteľom.

Závažné porušenia BOZP boli na stavenisku zaznamenané u zhotoviteľa Objednávateľa Eurosteel Capital s.r.o. pri delení oceľových častí demolovaného mosta – bez OOPP a bez bezpečných pracovných postupov a napriek dennodenným výzvam ich práce prebiehali bez rešpektovania základných pravidiel BOZP:



Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou (boli vykonané opatrenia v zmysle schválených TP v súlade s požiadavkami súvisiacich predpisov)

C. Kontroly vykonané objednávateľom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa bez písomného záznamu. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľmi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľom.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

10. Finančné plnenie:

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ cez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022

Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ cez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021

K 30.06.2022 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie :

- stavby A vo výške 7 001 556,90 €, bez DPH.
- stavby B vo výške 290 253,00 €, bez DPH.

Zoznam vyzískaného materiálu: Uvedené v prílohe č.5

11. Fotodokumentácia



Príprava na demontáž MK



Budovanie prístupovej komunikácie CZ



Zahájenie demontáže MK



Pokračovanie demontáže MK



Pokračovanie demontáže MK



Pokračovanie demontáže MK na SK strane



Ukončenie demontáže MK na SK strane



Príprava na demontáž MK na CZ strane



Pokračovanie demontáže MK na CZ strane




Pokračovanie demontáže MK na CZ strane



Pokračovanie demontáže MK na CZ strane



Pokračovanie demontáže MK na CZ strane

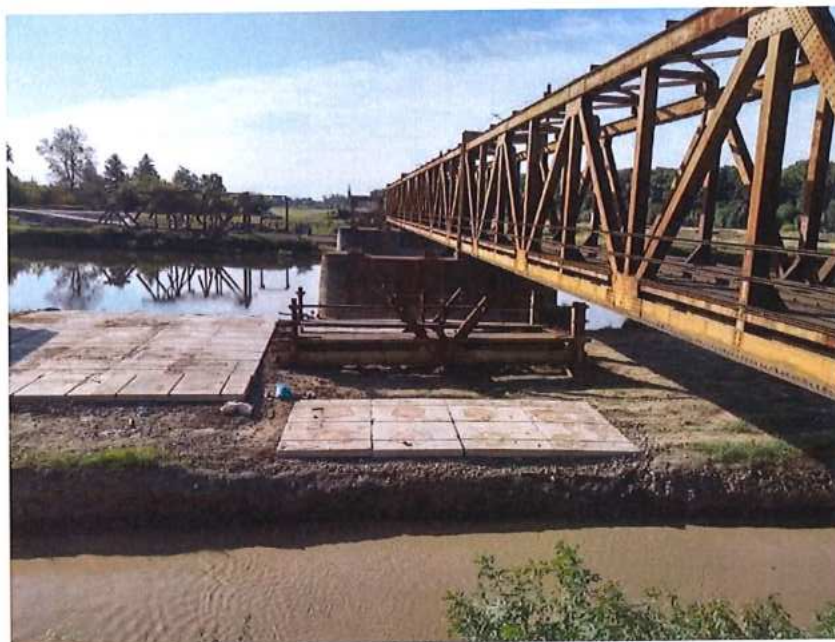

Ukončenie demontáže MK na CZ strane



Príprava na odvoz MK na SK strane



Odvoz MK na SK strane



Odvezená MK na SK strane



Odvezená MK na SK strane

Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 1.6.2022-30.6.2022

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu Odpoveď Zhotoviteľa na list Objednávateľa č. 13150/2022/O220-323-11880, doručený 6.6.2022 – Žiadosť o úpravu ponuky - Vyňatie položiek 71, 72, 73, 77	10.6.2022	JVICMVHS-22-0213
2.	Nárok č. 19 - Žiadosť Zhotoviteľa o Pokyn na zmenu , podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok – úprava spätného okruhu TRAKT 2 a IHL	13.6.2022	JVICMVHS-22-0214



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 1.6.2022-30.6.2022

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.			

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 1.6.2022-30.6.2022

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 7 – Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k DSZ/DÚR. Odpoveď Zhotoviteľa na list Investora č. 13150/2022/O220-293/5723 (zamietnutie nároku), doručený 28.3.2022 – preposlanie vyjadrenia Projektanta Oznámenie Zhotoviteľa o Priebežnom nároku	2.6.2022	JVICM-VHS-22-0206
2.	Nárok č. 7 - VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia	10.6.2022	JVICMVHS-22-0212
3.	Priebežný Nárok Zhotoviteľa č. 11 - Neúplnosť dokumentácie DÚR (2004): - chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.1 a B.3.1 - zabezpečenie procesu EIA na území Českej republiky	29.6.2022	JVICMVHS-22-0237
4.	Žiadosť o začatie rokovaní o uzatvorení dodatku k Zmluve o dielo (Covid , war – impact to the project)	27.6.2022	JVICM-VHS/22/0233



Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU

Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Valec	1
Žeriav	1
Nákladné auto TATRA 815	1

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstavitel' zhotoviteľa:	
THP - Hlavný stavbyvedúci	1
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	5
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulant	2
- Ekonóm	2
- Tlmočník	3
CUDZÍ - subdodávateľia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	2
- Geodet	2
- Stavebný robotník - strojník, vodič	3
- Stavebný robotník	19

Príloha č.5

Zoznam vyzískaného materiálu:

Zoznam demontovaného materiálu

Stavba: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
objekt: SO 12-35-01 Kúty - št. hranica SR/ČR trakčné vedenie

p.č.	materiál	množstvo	použitelnosť		miesto dodania	dátum dodania	odovzdáť		prevziať		poznámka
			možnosť použitia	emná jednotka			meno	podpis	meno	podpis	
1	TD Cu 100mm ²	422	farebný odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
2	NL Fe 70mm ²	422	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
3	Príd.lano Fe 70mm ² (7 ks)	84	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
4	nástavec do kotvenia Fe 70 mm ²	69.5	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
5	lanítko Cu 10	65	farebný odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
6	veľiková svorka Cu	130	farebný odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
7	rameno L1-L3	4	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
8	bočný držiak	4	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
9	plastový izolátor	14	plastový odpad	ks	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
10	návesť pre el. prevádzku	2	kovový odpad	ks	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
11	TB 245/8m	2	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
12	T 245/8m	1	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
13	T 219/8m	1	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	
14	brána typ 23L	26.8	kovový odpad	t	SEE Východné	29.4.2022	51702666	6/10/1	17632666	1727	

Elektrotechnická Praha a.s.

Príloha číslo 8223/1
010 08 Žilina
IČ 4020032247
701/2
