

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
 - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
 - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
 - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: november 2024

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 31.12.2027

Predstaviteľ Zhotoviteľa : Juraj Cabaďaj, Ing. Zdeněk Kachyňa

Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Ing. Roman Skácel, PhD., Ing. Matteo Foffani,

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani, , dátum 09.12. 2024

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár, , dátum 12.12. 2024

OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	5
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	10
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	10
6.1. Zoznam Zmien:	10
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	10
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	10
7. Systém kvality:	11
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	11
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	11
8.2. Personál Zhotoviteľa:	11
9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:	11
9.1. Bezpečnosť práce:	11
9.2. Ekologické vplyvy:	13
9.3. Evidencia odpadov:	14
10. Finančné plnenie:	15
11. Fotodokumentácia:	17

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.2.	Činnosť HIP <ul style="list-style-type: none"> Spracovanie Správy o postupe prác Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS Účasť na rokovaníach v procese územných konaní Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami Účasť na rokovaníach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností Organizácia a účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.3.	Činnosť Projektanta počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa Zmeny PD počas realizácie Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov Príprava rozpočtov A.1.4 Konferenčné prerokovanie B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2 sa uskutočnilo dňa 19.11.2024 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV) <ul style="list-style-type: none"> • Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS • Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD • Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS • Sledovanie priebehu územných konaní • Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov • Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B • Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02) • Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV • Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none"> • V mesiaci November 2024 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom 	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.3.	IČ počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> • Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie • Účasť na riadiacom výbore • Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD

3. Realizácia Diela:

V mesiaci november pokračovala v úseku Kúty – št. hr. SR/ČR nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV podľa ROV 180 Etapa A.

V dňoch 11. - 13.11.2024 výluka podľa etapy B5 (TK2 bez TV), ničkoľajka od 00:00 do 04:00 hod.

V dňoch 18. a 20.11.2024 výluka podľa etapy B5 (TK2 bez TV), dňa 19.11.2024 (TK 2 +TV), ničkoľajka od 00:00 do 04:00 hod.

Dňa 30.11.2024 ničkoľajka - súčasne etapa A, B3, E3, Z3 od 11:20 do 19:00 hod.

Výluky podľa ROV č. 110 (súčasne etapa A, A1) pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 1. TK, so zahájením odo dňa 4.11.2024 v denných výlukách od 08:30 hod. do 20:30 hod.

Výluky podľa ROV č. 270 súčasne etapa A, A1 + etapa A3 v dňoch 11., 12. a 14, 15.11.2024, pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 2. TK, so zahájením odo dňa 11.11.2024 v denných výlukách od 07:30 hod. do 19:30 hod.

Výluky podľa ROV č. 270 súčasne etapa A, A1 v dňoch 18., 19. a 20.11.2024, pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 2. TK, so zahájením odo dňa 18.11.2024 v denných výlukách od 07:30 hod. do 19:30 hod.

Výluky podľa ROV č. 270, súčasne etapa A, A1 v dňoch 26.11.2024 - 01.12.2024, pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 2. TK, v denných výlukách od 07:30 hod. do 19:30 hod.

Výluka Zohor k.č.4, 6, 8, výh.č.16 + TV 4-18 so zahájením odo dňa 18.11.2024 od 7:30 nepretržite podľa ROV 270 etapa B

Počas uvedeného obdobia nedošlo k mimoriadnej udalosti.

4. Vyhodnotenie prác:

UČS 1 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

SO 01-31-01 Devínska Nová Ves - Zohor, výrubu drevín

- Výrubu drevín
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 01-35-01 Devínska Nová Ves - Zohor, trakčné vedenie

- Betonáž základov trakčných podpier pri 1.TK
- Montáž stožiarov pre 1.TK.
- Betonáž základov trakčných podpier pre 2.TK.
- Montáž stožiarov pre 2.TK.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)**SO 02-35-01 ŽST Zohor, trakčné vedenie**

- Betonáž základov trakčných podpier v párnej skupine koľají.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)**PS 10-21-02 Kúty – Lanžhot , zabezpečenie stavebných postupov, časť SR**

- Odkopanie starej trasy, pokládka súhlasového kábla UAB v žkm 72,055-72,354, zásyp ryhy.
- Úpravy PZZ G1 , zrušenie vonkajších prvkov prístupného zab. zar PZZ G1, zrušenie reléového domčeka PZZ
- Práce prebiehali v zmysle HMG

PS 10-21-03 Kúty - Lanžhot, demontáž zabezpečovacieho zariadenia - časť SR

- Demontáž vnútorného výstroja PZZ G1
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-01 Kúty -št. hranica SR/ČR, železničný zvršok

- Navážanie koľajového kameňa fr. 32/63mm , predštrkovanie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- Navážanie štrkodrvy fr.0/63mm a zriadenie PŽS
- Zriadenie spevnenej priekopy "J"
- Zriadenie drenáže
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-04 Kúty- št. hranica SR/ČR , káblová chráničková trasa

- Odkop ryhy, pokládka a spätný zásyp KCHT
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 69,130 (ev.km 69,109)

- Armovanie a betonáž základov
- Armovanie a betonáž stien
- Armovanie a betonáž stropnej dosky
- Lepenie izolácie stien
- Zriadenie prechodových oblastí zo štrkodrvy fr. 0/63mm
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 69,301 (ev.km 69,279)

- Betonáž základu a osadenie rúr
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 70,556 (ev.km 70,535)

- Betonáž základu a osadenie rúr
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-35-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, trakčné vedenie

- Betonáž základov trakčných podpier pre 1.TK
- Montáž trakčných podpier pre 1.TK
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-35-13 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV

- Pokládka 6kV kábla od spojky žkm 70,350 po TS 716.
- Výkop kábovej ryhy 6kV kábla medzi TS 715 a 716.
- Pokládka kábla medzi TS 715 a 716, spojovanie/montáž koncoviek 6kV kábla medzi TS 717 – 716 - 715, napäťové skúšky.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-01.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR

- Odkopanie starej trasy, výkop novej ryhy, preloženie do novej ryhy, naspojovanie, zasyp ryhy, geodetické zameranie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-01.3 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka OK ŽSR

- Odkopanie starej trasy, výkop novej ryhy, rezanie rezervnej HDPE, vytiahnutie rezervy z romoldu, preloženie do novej ryhy, naspojovanie HDPE, zasyp ryhy, geodetické zameranie.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)

PS 11-22-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, rozhlasové zariadenie

- Priečny prekop a pokládka rúr 2x FKKVR 110 pre rozhlasové zariadenie na nástupišti
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-32-01 Kúty št. hranica SR/ČR železničný zvršok

- Predštrkovanie koľ. kameň 32/63mm
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-32-04 Kúty -št.hranica SR/ČR Brodské, nástupiská

- Odkop štrkodrvy a zriadenie vankúša
- Montáž debnenia základového pásu a betonáž
- Demontáž debnenia, penetračný náter
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-32-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, káblová chráničková trasa

- Odkop ryhy a pokládka KCHT
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-34-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, protihlukové steny

- Vrtanie a betonáž pilót
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-35-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, rozvody NN

- Výkop káblovej ryhy, pokládka káblovodu
- Pokládka káblov, záhrn ryhy, zapojenie rozvádzačov
- Vykonanie revízie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-35-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, prípojka NN

- Výkop káblovej ryhy, pokládka káblovodu
- Pokládka káblov, záhrn ryhy, zapojenie rozvádzačov
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-35-10 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, vonkajšie osvetlenie

- Výkop káblovej ryhy, pokládka káblovodu
- Pokládka káblov, záhrn ryhy
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-35-16 Kúty -št.hranica SR/ČR Brodské, technologický kontajner pre meranie a DOO, uzemňovacia sieť

- Vykonanie revízie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-36-01.3 – Kúty – št. hranica SR/ČR , preložka OK ŽSR

- Odkopanie starej trasy, výkop novej ryhy, rezanie rezervnej HDPE, vytiahnutie rezervy z romoldu, preloženie do novej ryhy, naspojovanie HDPE, zásyp ryhy, geodetické zameranie.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

SO 12-32-01 Kúty-št.hranica SR/ČR železničný zvršok

- Predštrkovanie a pokládka podvalov
- Montáž koľaj. polí
- Demontáž časti paženia
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 12-32-02 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný spodok

- Dosypanie a úprava PŽS zo štrkodrvy fr.0/63mm
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 12-33-03 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba mosta v km 74,306

- Armovanie a debnenie stien a stropu
- Betonáž stien a stropu + rímsa
- Oddebnenie stien a stropu
- Izolácia rámu + ochrana izolácie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 12-33-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v km 74,386

- Demontáž pom. konštrukcií pre výsuv oc. konštrukcie mosta
- Rozbíjanie betónových základov v násype
- Rozdelenie konštrukcie na 3 dilatačné celky
- Montáž vrchnej časti ložísk na spodnú pásnicu
- Dosypanie a hutnenie prechodovej oblasti na CZ strane
- Podlievanie ložísk na CZ strane
- Príprava na spustenie MK
- Podlievanie ložísk na SK strane
- Osadenie dilatácie
- Armovanie záv. múrika op.č.1
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 12-33-05 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba železničného mosta v km 74,497

- Dosypanie a hutnenie prechodových oblastí
- Betonáž krídla + rímsa
- Izolácia rámu - pen. náter
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 12-35-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, trakčné vedenie

- Betonáž základov trakčných podpier v oblasti vysunutého mosta cez rieku Morava.
- Montáž napájacieho prevesu TP 223-224.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

5. Zmluva o Diele a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**6.1. Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):

Uvedené v prílohe č.2

6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4

8.2. Personál Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4.

9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:

9.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci november boli spracované 4 Správy z inšpekcii staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej

práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:

- a) Používanie komunikácií nezabezpečených podľa zásad BOZP



- b) Chýbajúce zabezpečenie stien a okrajov výkopov



- c) Zakázaná manipulácia pri práci so zdvíhacím zariadením



d) Nezaistené pracovisko v zmysle predpisu ŽSR Z2



Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP . Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľ'mi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľ'om. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – viď príloha č. 5.

9.3.Evidencia odpadov:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

11/2024

Mesiac:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Por.č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y.kód	Hmotnosť odpadu	Názov PS/SO	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1.	18.11.2024	Kúty - Brodské	17 01 01	O		42,88	SO 10 32 06	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Levčre	V
2.	18.11.2024	Kúty - Brodské	17 01 01	O		65,10	SO 10 32 07	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Levčre	V
3.	19.11.2024	Kúty - Brodské	17 01 01	O		25,98	SO 10 32 07	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Levčre	V
4.	19.11.2024	Kúty - Brodské	17 01 01	O		60,86	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Levčre	V
5.	19.11.2024	Brodské	17 01 01	O		66,14	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Levčre	V
6.	19.11.2024	Kúty - Brodské	17 01 01	O		109,68	SO 10 32 05	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Levčre	V
7.	19.11.2024	Brodské	17 01 01	O		281,48	SO 11 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Levčre	V
8.	22.11.2024	Brodské	17 01 06	N	9	190,36	SO 11 32 02	BTT s.r.o., Cerová 481, 906 33	R 5
9.	25.11.2024	Brodské	17 01 06	N	9	584,30	SO 11 32 02	BTT s.r.o., Cerová 481, 906 33	R 5
10.	26.11.2024	Brodské	17 01 06	N	9	592,62	SO 11 32 02	BTT s.r.o., Cerová 481, 906 33	R 5
11.	27.11.2024	Brodské	17 01 06	N	9	244,46	SO 11 32 02	BTT s.r.o., Cerová 481, 906 33	R 5
12.	27.11.2024	Kúty - Brodské	17 01 06	N	9	230,10	SO 10 32 02	BTT s.r.o., Cerová 481, 906 33	R 5
13.	28.11.2024	Kúty - Brodské	17 01 06	N	9	624,64	SO 10 32 02	BTT s.r.o., Cerová 481, 906 33	R 5
14.	29.11.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	O		473,82	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Levčre	V
15.	29.11.2024	Kúty - Brodské	17 01 06	N	9	119,26	SO 10 32 02	BTT s.r.o., Cerová 481, 906 33	R 5
16.									
17.									

Spracoval na základe podkladov subdodávateľa: Ing. Lukáš Hučko

Podpis:

27.11.2024
Ing. Lukáš Hučko
ICM s.r.o.
27.11.2024

10. Finančné plnenie:

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,69	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 663 947,08	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025

Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024

K 30.11.2024 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 40 240 728,10 € bez DPH.
- stavby B vo výške 930 102,44 € bez DPH.

11. Fotodokumentácia



Zemná pláň (stat. zat. skúška) – SO 10 -32-02



Pláň žel. spodku (stat. zat. skúška) – SO 10 -32-02




Pláň žel. spodku – SO 10 -32-02



Pláň žel. spodku (stat. zať. skúška) – SO 12 -32-02



Priepust v nžkm 70,556 (ev.km 70,535) – SO 10-34-07

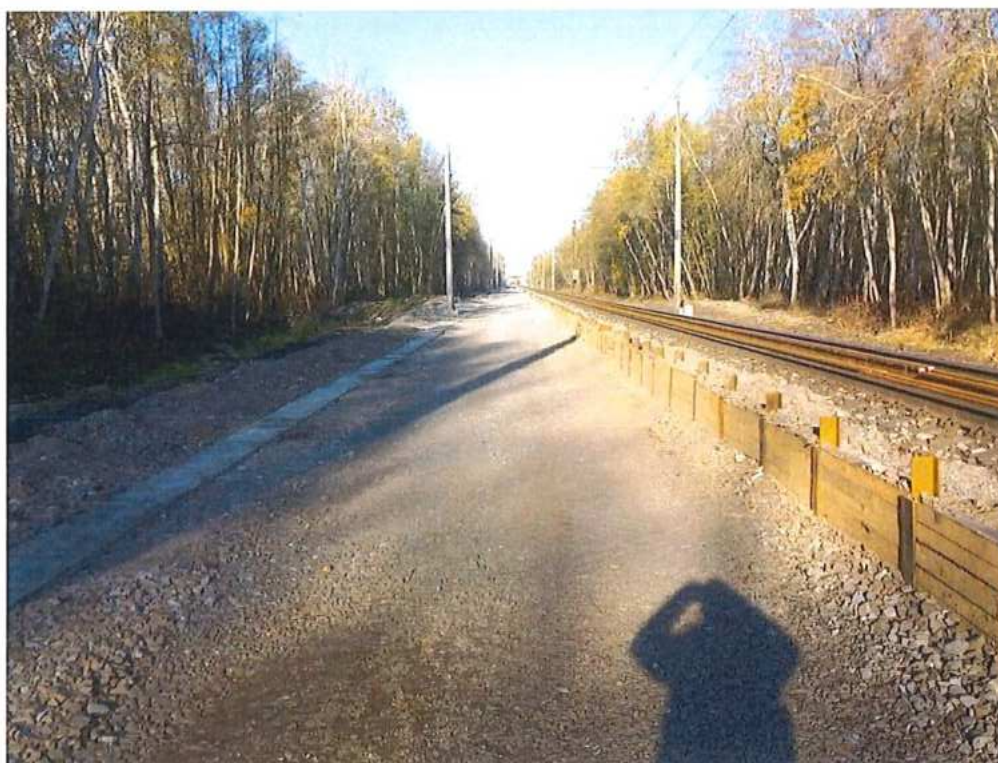

Navážanie štrkodrvy fr.0/63mm a zriadenie PŽS - SO 10-32-02



Zriadenie spevnenej priekopy "J" - SO 10-32-02



Uzavretie žel. priecestia a cesty III/1129 v obci Brodské



Armovanie a debnenie stien a stropu - SO 12-33-03



Zriadenie podkladnej vrstvy z kameniva fr. 32/63 - SO 10-32-01



Realizácia priepustu - SO 10-32-05



Realizácia priepustu - SO 10-32-06



Realizácia priepustu - SO 10-32-07



Debnenie a betonáž základu nástupišt'a - SO 11-32-04



Rozkladanie podvalov a koľajníc - SO 12-32-01



Rozkladanie podvalov a koľajníc - SO 12-32-01



Demontáž paženia - SO 12-32-01



Statická skúška - SO 12-32-02



Sypanie prechodových oblastí pri priepuste č.5 - SO 10-32-02



Zriadenie spevnenej priekopy "J" - SO 10-32-02



Vŕtanie pilót pre PHS - SO 11-34-04



Armovanie a debnenie záverného múrika pri opore č.1 - SO 12-33-04



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.11.2024-30.11.2024

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.			



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.11.2024-30.11.2024

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Oznámenie o nároku Objednávateľa č.1 v zmysle podčlánku 2.5. Všeobecných podmienok	14.11.2024	11850/2024/O220-543/24214



Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.11.2024-30.11.2024

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa článku 20.1 pre predĺženie Lehoty výstavby podľa článku 8.4 a 8.5 osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	29.11.2024	JVICM-VHS/24/0375

Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU

Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Dózer	1
Rýpadlo	12
Vrtná súprava pre pilóty, miktopilóty a trysk. injektáž	2
Búracie kladivo	4
Traktor CAT, JCB	6
UNC	1
Valec	3
Žeriav	1
Elektrocentrála	11
Čerpadlo na vodu	8
Ponorný vibrátor	6
Vibračná doska	1
DOPRAVA	4
Autožeriav	2
Domiešavač	2
Nákladné auto TATRA 815	5
Nákladný automobil - náves	1
LOKO	5
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	7
Pracovný vlak TV-betonárka	2
Dvojcestné rýpadlo	3
Manitou	2

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstavitel' zhotoviteľa:	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulant	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



CUDZÍ - subdodávateľia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	14
- Geodet	5
- Stavebný robotník - strojník, vodič	32
- Stavebný robotník	83
