

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
 - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
 - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
 - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: marec 2025

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky
Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“
Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 31.12.2027
Predstavitel' Zhotoviteľa : Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa
Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Ing. Andrej Paták, Ing. Matteo Foffani,

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani, , dátum 09.04.2025

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár, , dátum.....

OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	6
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	10
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	10
6.1. Zoznam Zmien:	10
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	10
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	10
7. Systém kvality:	10
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	10
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	10
8.2. Personál Zhotoviteľa:	10
9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:	11
9.1. Bezpečnosť práce:	11
9.2. Ekologické vplyvy:	15
9.3. Evidencia odpadov:	15
10. Finančné plnenie:	17
11. Fotodokumentácia:	19

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	Činnosť HIP <ul style="list-style-type: none"> Spracovanie Správy o postupe prác Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS Účasť na rokovaníach v procese územných konaní Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami Účasť na rokovaníach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností Organizácia a účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.3.	Činnosť Projektanta počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa Zmeny PD počas realizácie Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov Príprava rozpočtov A.1.4 Príprava rozpočtov pre stavbu B a A.1.4 Zapracovanie pripomienok na základe TSI 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV) <ul style="list-style-type: none"> • Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS • Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD • Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS • Sledovanie priebehu územných konaní • Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov • Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B • Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02) • Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV • Spracovanie podkladov pre zabezpečenie MPV A.1.4 (UČS 04) • Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV • A.1.4 (UČS04) vydanie odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia DSPRS. • Získanie SP pre SO 02-33-02, SO 02-37-03.2, SO 02-37-08 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none"> • V mesiaci marec 2025 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom 	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.3.	IČ počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> • Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie • Účasť na riadiacom výbore • Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD

3. Realizácia Diela:

V zmysle ROV č. 401

- bola dňa 15.12.2024 o 00:00 hod. zahájená nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV v úseku žst. Kúty – št.hr SR/ČR podľa etapy A s trvaním do 20.03.2025 do 12:00 hod.

Výluky podľa ROV č. 403:

- dňa 07.02.2025 zahájené výluky v párnej skupine koľaje a ukončené dňa 05.03.2025

V zmysle ROV č. 407

- bola zahájená dňa 20.03.2025 výluka traťového zab. zar. (TZZ) v úseku Kúty - št. hr. SR/ČR s predpokladaným ukončením dňa 31.03.2025 o 16:00 hod.

- bola dňa 21.03.2025 uskutočnená výluka TZZ podľa etapy Z5 v úseku Kúty – Sekule za účelom prekládky DK v oblasti TNS Kúty

V zmysle ROV č. 410

- zahájenie výluk podľa ROV 410 v nepárnej skupine koľají žst. Zohor bolo dňa 24.03.2025. Trvanie do 13.10.2025

V zmysle ROV č. 421

- odo dňa 10.03.2025 boli uskutočňované výluky staničného zab. zar. (SZZ) v žst. Kúty s predpokladaným ukončením dňa 19.03.2025. Výluky z dôvodu vis maior (nepredpokladateľný stav starých kábelových vedení) boli ukončené dňa 23.03.2025

Na stavbe evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v koľaji č. 2 úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR v km 68,090 - 74,466, pre rýchlosť 50 km/h. Predpokladané ukončenie dňa 31.03.2025

Na stavbe odo dňa 20.03.2025 evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v koľaji č.1 úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR v km 68,090 - 74,466, pre rýchlosť 50 km/h. Predpokladané ukončenie dňa 09.12.2025.

Pri prácach na UČS 02 sme v 8. týždni evidovali POTR:

V 1.TK Malacky - Zohor a čiastočne 1. staničnej koľaji žst. Zohor od km 13,200 do km 13,800 v denných hodinách od 08:00 do 17:00 hod. v dňoch 03. a 04.03..2025, 50 km/h popri pracovnom mieste.

Vyhodnotenie prác:

UČS 1 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

SO 01-31-01 Devínska Nová Ves - Zohor, výruby drevín

- výruby drevín

SO 01-32-02 Devínska Nová Ves - Zohor, železničný spodok

- realizácia prístupových ciest a ZS pri TK2

SO 01-35-15 Devínska Nová Ves - Zohor, úpravy/preložky 6kV kábla

- realizácia riadených pretlakov, výkop káblvej ryhy, vytvorenie pieskového lôžka v ryhe, pokládka káblov TS 553-554, TS 548-549, zásyp káblvej ryhy

UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)

SO 02-31-01 ŽST Zohor, výruby drevín

- výruby drevín

SO 02-32-02 ŽST Zohor

- skladovacie priestory
- realizácia prístupových ciest a ZS

SO 02-35-01 ŽST Zohor, trakčné vedenie

- betonáž základov trakčných podpíer
- montáž vyvesení brán, montáž konzol SIK, stavba stožiarov a líšt, číslovanie stožiarov
- vkladanie deličov 1A a 8A, demontáž TV v nepárnej skupine, montáž vyvesenia brán, montáž odpojovačov

SO 02-35-11 ŽST Zohor, úprava NN rozvodov

- realizácia dočasnej prípojky pre stavadlá St1 a St2

SO 02-35-15 Žst. Zohor, úpravy/preložka 6kV kábla

- výkop káblvej ryhy, realizácia riadených pretlakov

SO 02-36-01.2 Žst. Zohor, preložka MK ŽSR

- prípravné práce na prekládku MK - výkopy, sondovanie kábla

UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

PS 10-21-01 Kúty - Lanžhot, traťové zabezpečovacie zariadenie - časť SR

- montáž technológie pre EAB v TD Brodské, montáž návěstídiel pre EAB, montáž transformátorov v mieste izolovaných stykov
- oživovanie a skúšanie zariadenia vrátane väzby na SZZ ŽST Kúty

PS 10-22-01 Kúty št. hranica SR/ČR, výstavba optorúr

- zaťahovanie HDPE rúr do KCHT

PS 10-22-03 Kúty št. hranica SR/ČR, miestna kabelizácia

- zaťahovanie MK 15XN do KCHT

SO 10-32-02 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný spodok

- zriadenie spevnenej priekopy a úprava svahov

SO 10-32-05, SO 10-32-06, SO 10-32-07 Kúty- št. hranica SR/ČR , priepusty

- betónáž prahov a zriadenie kamenného obkladu na vyústení
- zriadenie retenčných vsakovacích nádrží

SO 10-34-01 Kúty-št.hranica SR/ČR, protihlukové steny

- montáž PHS

SO 10-34-05 - Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 27 kV (stavebná časť)

- zemné práce

SO 10-35-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, trakčné vedenie

- regulácia TV
- napäťové skúšky, rýchla pantografová skúška

SO 10-35-13 Kúty - št.hranica ČR/SR, úprava rozvodov VN 6kV

- realizácia riadeného pretlaku, výkop káblovej ryhy, pokládka kábla
- montáž koncoviek TS 714-715, montáž spojok medzi TS 715-716

SO 10-36-01.1 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka DK ŽSR

- prípravné práce na výluku DK - výkop novej ryhy, uloženie kábla do novej ryhy, zásyp ryhy
- výluka DK - rezanie kábla, prepoj. na nový kábel v areáli TNS, meranie DK

UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)**PS 11-22-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, rozhlasové zariadenie**

- osádzanie prefabrikovaných základov do nástupišťa zast. Brodské
- zaťahovanie kabeláže do KCHT pre rozhlasový systém

PS 11-22-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, informačné zariadenie

- zaťahovanie kabeláže do KCHT pre informačné zariadenie

PS 11-23-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, NZE (dieselagregát)

- testovanie nového dieselagregátu

PS 11-27-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, EZS

- montáž kabelizácie pre EZS
- oživenie a skúšanie EZS

PS 11-27-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, kamerový systém

- zaťahovanie kabeľáže do KCHT pre kamerový systém

SO 11-23-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, NZE (dieselagregát)

- osadenie dieselagregátu, pokládka káblov

SO 11-32-02 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný spodok

- zriadenie nespevnenej priekopy

SO 11-32-04 Kúty - št. hranica SR/ČR , Brodské nástupište

- montáž obrubníkov a dosypanie podkladných vrstiev pod zámkovú dlažbu
- zriadenie nástupišt'a

SO 11-33-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, podchod pre cest. na ZAST Brodské v nžkm 71,722

- izolovanie spodnej stavby

SO 11-33-05 - Kúty - št.hranica SR/ČR, op.múry pri MK v nžkm 72,138

- výkopy, betonáže oporných múrov, zemné práce

SO 11-34-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, protihlukové steny

- montáž PHS

SO 11-35-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, trakčné vedenie

- regulácia TV, náter stožiarov
- napäťové skúšky, rýchla pantografová skúška

SO 11-35-06 - Kúty - št.hranica SR/ČR, tesniaca vaňa pod MK v nžkm 72,138

- zemné práce

SO 11-35-12 Kúty - št.hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV

- montáž koncoviek TS 721-722

SO 11-35-20.1 Kúty - št.hranica SR/ČR, preložky NN ZSDis pri podjazde v nžkm 72,138

- montáž nových podperných stĺpov

SO 11-36-01.1 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka DK ŽSR

- prípravné práce na výluku DK - výkop novej ryhy, uloženie kábla do novej ryhy, zásyp ryhy
- prekládka DK okolo podjazdu v Brodskom - rezanie kábla, prepoj. nový kábel v novej polohe, meranie DK

SO 11-36-01.3 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka OK ŽSR

- oprava poškodených HDPE rúr

UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

PS 12-27-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, EZS

- oživenie a skúšanie EZS

PS 12-29-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, meranie spotreby trakcie

- pokládka káblov

SO 12-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- vováranie lepených izolovaných stykov
- budovanie spevnenej priekopy

SO 12-32-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, káblková chráničková trasa

- montáž káblových šachiet od TK2 a TK1 v km 74,200

SO 12-33-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410

- betonáž základov
- obloženie svahov kamenným obkladom
- úprava svahov železničného násypu

SO 12-35-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, 1.časť

- napäťové skúšky, rýchla pantografová skúška

SO 12-35-07 Kúty – št. hranica SR/ČR, technologický kontajner, uzemňovacia sieť

- pokládka uzemňovacej pásoviny

Technické prehliadky a hlavné prehliadky mostov vrátane zaťažovacích skúšok na objektoch UČS 10, UČS 11 a UČS 12.

4. Zmluva o Dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č. 1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č. 2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č. 3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č. 4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č. 5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č. 6 bol podpísaný 28.6.2024.

5. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

5.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č. 1

5.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):

Uvedené v prílohe č. 2

5.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):

Uvedené v prílohe č. 3

6. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

7. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:

7.1.Zariadenie Zhotoviteľ'a:

Uvedené v prílohe č. 4

7.2.Personál Zhotoviteľ'a:

Uvedené v prílohe č. 4

8. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:

8.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVCM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci február boli spracované 4 Správy z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:

- a) Výkopy a betónovanie oporných stien bez zabezpečenia zábradlím, alebo prekrytia nebezpečných výkopov.



b) Chýba zabezpečenie výkopov zábradlím



c) Práca bez viest a prilieb.



d) Výkop prístupný verejnosti bez zabezpečenia zábradlím.



Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávatel'a, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP . Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti vo vzťahu k BOZP na stavenisku

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľ'mi na pravidelných koordináčnych poradách organizovaných Zhotoviteľ'om. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľ'a a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

8.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – vid' príloha č. 5.

8.3. Evidencia odpadov:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

03/2025

Mesiac:

Mezročná tabuľka evidencie odpadov stavby "ZSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Por. č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu	Názov PS/SO	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1.	03.03.2025	Brodské	17 05 04	0		268,99	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
2.	04.03.2025	Brodské	17 05 04	0		27,26	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
3.	04.03.2025	Brodské	17 05 04	0		110,47	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
4.	05.03.2025	Brodské	17 05 04	0		44,86	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
5.	05.03.2025	Brodské	17 05 04	0		130,49	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
6.	06.03.2025	Brodské	17 05 04	0		51,99	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
7.	06.03.2025	Brodské	17 05 04	0		56,70	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
8.	07.03.2025	Brodské	17 05 04	0		64,48	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
9.	10.03.2025	Brodské	17 05 04	0		266,00	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
10.	10.03.2025	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1027,36	50 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
11.	11.03.2025	Brodské	17 05 04	0		25,67	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
12.	11.03.2025	Brodské	17 05 04	0		135,26	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
13.	11.03.2025	Kúty - Brodské	17 05 04	0		995,10	50 10 34 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
14.	12.03.2025	Brodské	17 05 04	0		55,00	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
15.	13.03.2025	Kúty - Brodské	17 05 04	0		481,32	50 10 34 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
16.	14.03.2025	Kúty - Brodské	17 05 04	0		594,84	50 10 34 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
17.	17.03.2025	Brodské	17 05 04	0		27,03	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
18.	18.03.2025	Brodské	17 05 04	0		91,37	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
19.	19.03.2025	Brodské	17 05 04	0		156,48	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
20.	20.03.2025	Brodské	17 05 04	0		50,00	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
21.	20.03.2025	Brodské	17 05 04	0		275,13	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
22.	21.03.2025	Brodské	17 05 04	0		230,90	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
23.	21.03.2025	Brodské	17 05 04	0		142,44	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
24.	24.03.2025	Kúty	17 05 04	0		422,34	50 10 34 06	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
25.	24.03.2025	Brodské	17 05 04	0		139,44	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
26.	24.03.2025	Brodské	17 05 04	0		31,24	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
27.	25.03.2025	Brodské	17 05 04	0		519,63	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
28.	25.03.2025	Brodské	17 05 04	0		305,75	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
29.	26.03.2025	Brodské	17 01 01	0		22,42	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
30.	26.03.2025	Brodské	17 05 04	0		591,54	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
31.	27.03.2025	Brodské	17 05 04	0		367,54	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
32.	27.03.2025	Kúty - Brodské	17 05 04	0		356,42	50 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
33.	31.03.2025	Brodské	17 05 04	0		35,84	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
34.	31.03.2025	Brodské	17 05 04	0		906,40	50 11 33 05	CHELINA GBELV s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5

Spracoval na základe podkladov subdodávateľov :

Podpis:

Ing. Lukáš Hučko



9. Finančné plnenie:

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 663 947,08	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025
16/2024-A	11/2024	2 072 074,54	16.2.2025
1/2025-A	12/2024	11 113 697,95	30.3.2025
2/2025-A-CZ1	12/2024	36 082,96	18.4.2025

Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024
17/2024-A	12/2024	892 751,19	29.3.2025


K 31.03.2025 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 53 462 583,55 € bez DPH.
- stavby B vo výške 1 822 853,63 € bez DPH.

10. Fotodokumentácia



UČS 12, Záťažové skúšky

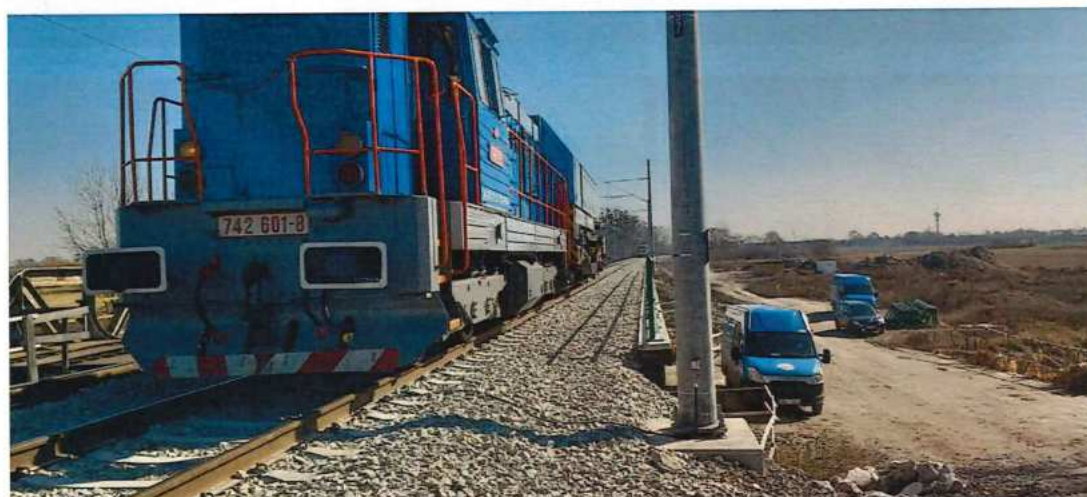

UČS 12, Závažové skúšky



UČS 12 Budovanie múrikov



UČS 12 Obloženie svahov kameňom



UČS 12 Zriadenie šachty pri pretlakoch



UČS 12 Vodivé prepojenie zábradlí a ukofajnenie



UČS 12 Kamenná dlažba, čelá priepustov



UČS 11 Nástupisko – pokládka obrubníků



UČS 10, 11 – Montáž panelov PHS



UČS 11 Izolovanie spodnej stavby



UČS 11 Prístupové komunikácie



UČS 10 Betonáž čela odtoku





UČS 10-12, Montáž LIS



UČS 10, Výkop priekop



UČS 10, Budovanie priekop





UČS 02, Pokládka káblov, pretlak



UČS 02, Zohor – Betonáž základov TP



UČS 02, Zohor, búranie spevnených plôch



UČS 02 Zohor, demontáž prístrešku





UČS 02 ŽST Zohor – demontáž TV



UČS 01 Odhumusovanie



UČS 01 Prístupové komunikácie





UČS 01, Výruby



UČS 01 – Budovanie prístupových ciest



UČS 02 – Výruby

Príloha č. 1

Zoznam Zmien za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Oznámenie Zhotoviteľa v súlade s podčl. 4.12 Osobitných zmluvných podmienok - nelegálne skládky odpadu pozdĺž stavby, UCS 02 – žiadosť o pokyn Stavebného dozoru	10.3.2025	JVICM-VHS/25/0104
2.	Oznámenie Zhotoviteľa v súlade s podčl. 4.12 Osobitných zmluvných podmienok – nelegálne skládky odpadu pozdĺž stavby na UČS 01 a UČS 02 - žiadosť o pokyn Stavebného dozoru	18.3.2025	JVICM-VHS/25/0117
3.	Oznámenie Zhotoviteľa – Likvidácia odpadového materiálu Objednávateľa/ŽSR na UČS 02 - Žiadosť Zhotoviteľa o vydanie pokynu Stavebného dozoru	24.3.2025	JVICM-VHS/25/0126



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č. 2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.03.2025-31.03.2025

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.03.2025-31.03.2025

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	3.3.2025	JVICM-VHS/25/0094
2.	Priebežný nárok – Kolízia PHS a kábla 6kV – I. doplnenie	4.3.2025	JVICM-VHS/25/0100
3.	Nárok č. 2 po podpise Dodatku č. 6 - predloženie konečného Nároku v súlade s podčlánkom 20.1 Osobitných zmluvných podmienok Mimoriadne nepriaznivé klimatické a hydrologické podmienky	11.3.2025	JVICM-VHS/25/0108
4.	Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku č. 4 v súlade s podčlánkom 20.1 osobitných zmluvných podmienok - Demontáž koľajovej konštrukcie a likvidácia odpadu na UČS 02	12.3.2025	JVICM-VHS/25/0110
5.	Priebežný Nárok č. 5 – Hrúbka skrývky humusového horizontu – I. doplnenie	14.3.2025	JVICM-VHS/25/0111
6.	Stanovisko Objednávateľa k žiadosti o vydanie Pokynu – kolízia PHS a IS ŽSR	13.3.2025	10565/2025/O220-601
7.	Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku č. 6 – Nepredvídateľné fyzické podmienky na UČS 10 – vysoká hladina podzemnej vody (HPV)	19.3.2025	JVICM-VHS/25/0120
8.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	31.3.2025	JVICM-VHS/25/0136

Príloha č. 4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU

Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Rýpadlo	14
Búracie kladivo	3
Traktor CAT, JCB	2
Žeriav	0
Elektrocentrála	5
Čerpadlo na vodu	4
Ponorný vibrátor	5
Vibračná doska	1
DOPRAVA	4
Autožeriav	1
Domiešavač	1
Mann s mech. Rukou	0
Nákladné auto TATRA 815	8
LOKO	3
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	5
Pracovný vlak TV-betonárka	2
DESEC	0
Manitou	1

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstaviteľ zhotoviteľa:	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Pripravár, kalkulát	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočnícky a sekretariát	5
CUDZÍ - subdodávatelia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	10
- Geodet	7
- Stavebný robotník - strojník, vodič	39
- Stavebný robotník	72
