

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
 - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
 - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
 - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 – 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: august 2025

Objednávateľ	:	Železnice Slovenskej republiky
Zhotoviteľ	:	„Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“
Lehota výstavby	:	od 10.09.2020 do 31.12.2027
Predstaviteľ Zhotoviteľa	:	Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa
Stavebný dozor	:	Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Ing. Andrej Paták, Ing.

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani, , dátum 09.09.2025

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár, , dátum.....



OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	6
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	11
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	11
6.1. Zoznam Zmien:	11
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):	11
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):	11
7. Systém kvality:	11
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:	11
8.1. Zariadenie Zhotoviteľ'a:	11
8.2. Personál Zhotoviteľ'a:	11
9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:	12
9.1. Bezpečnosť práce:	12
9.2. Ekologické vplyvy:	15
9.3. Evidencia odpadov:	15
10. Finančné plnenie:	17
11. Fotodokumentácia:	19

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Riešenie zmien PD na základe požiadaviek Zhotoviteľa Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu realizácie, MPV a inžinierskej činnosti Účasti na miestnych šetreniach v mieste stavby 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	<p>Činnosť HIP</p> <ul style="list-style-type: none"> Spracovanie Správy o postupe prác Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS Účasť na rokovaniach v procese územných konaní Účasť na rokovaniach s budúcimi správcami Účasť na rokovaniach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností Účasť na rokovaniach so Zhotoviteľom a Objednávateľom Účasť na koordinačných poradách s podzhotoviteľmi Zhotoviteľa stavby 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.3.	<p>Činnosť Projektanta počas realizácie stavby</p> <ul style="list-style-type: none"> Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa Zmeny PD počas realizácie Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov Príprava rozpočtov A.1.4 Vyjadrenie k zmenovej dokumentácii počas realizácie 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMI CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV) <ul style="list-style-type: none"> Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS Sledovanie priebehu územného konania na UČS 03 a stavebných konaní pre stavbu A.1.1 (UČS 01), stavbu A.1.2 (UČS 02) a stavby B Doplňanie návrhov na vydanie územného rozhodnutia UČS 03 a stavebných povolení podľa požiadaviek úradov Činnosti súvisiace s konaním na stavbu UČS 03 Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01), stavbu A.1.2 (UČS 02) a stavby B Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), stavby B za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV UČS 01 a stavby B 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none"> V mesiaci 08/2025 boli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom 	REHING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
2.3.	IČ počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie Účasť na riadiacom výbore Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD

3. Realizácia Diela:

V zmysle ROV č. 410

- Zahájenie výluk podľa ROV 410 v nepárnej skupine koľají žst. Zohor bolo dňa 24.03.2025
Trvanie do 13.10.2025

V zmysle ROV č.440

- Zahájenie výluky 2. TK v úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR dňa 31.03.2025 o 16:00 hod.
Trvanie do 09.12.2025

V zmysle ROV č.460

- Dňa 24.06.2025 - zahájenie nepretržitej výluky 2. TK v úseku DNV - Zohor podľa schváleného mesačného plánu výluk ŽSR
Trvanie do 02.12.2025

Na stavbe evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti:

- odo dňa 20.03.2025 evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v koľaji č.1 úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR v km 68,090 - 74,466, pre rýchlosť 50 km/h.
Predpokladané ukončenie dňa 09.12.2025
- odo dňa 24.03.2025 v staničnej koľaji č.2 žst. Zohor v km 12,100 - 13,200, pre rýchlosť 50 km/h.
Predpokladané ukončenie dňa 13.10.2025
- 50 km/h okolo pracovného miesta v 1.TK úseku žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor v km 1,405 - 11,750 v denných hodinách, od 07:00 do 21:00 hod. od 02.06.2025, v trvaní do 02.12..2025
- 50 km/h v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od km 3,780 (začiatok/koniec nástupiska na zást. D. Jazero) do km 4,300 v 1.TK, počnúc dňom 24.05.2025 o 08:00 hod. nepretržite, do ukončenia výstavby novej lávky pre peších v zást. D. Jazero (predpoklad koniec roka 2025), z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pohybu cestujúcej verejnosti a pracovných miest v oblasti

Vyhodnotenie prác:

UČS 01 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

PS 01-21-04 Devínska Nová ves-Zohor, zabezpečenie stavebných postupov

- ochrana káblov

SO 01-32-02 Devínska Nová ves-Zohor, žel. spodok

- úprava prístupovej cesty Devínske jazero
- odkopávka železničného spodku, rýh
- realizácia záporového paženia, výdrevy, vodorovného vystuženia vrátane vrchného kotvenia
- dodanie a vykládka žľabov UCB
- stabilizácia zemnej pláne
- statické zaťažovacie skúšky
- polozenie geosyntetiky (geotextília, geomreža), návoz vrstiev železničného spodku

SO 01-32-03 Devínska Nová ves-Zohor, žel. zvršok , demontáž

- odstránenie koľajového lôžka
- doprava vybúraných hmôt
- recyklácia

SO 01-32-04 Devínska Nová ves-Zohor, ZAST. Devínske Jazero, nástupištia

- búranie konštrukcií z prostého betónu
- vybúranie kovových madiel a zábradlí
- doprava a premiestnenie vybúraných hmôt

SO 01-32-06 - Devínska Nová Ves - Zohor, Káblová chráničková trasa

- odkopávka a pokládka KCHT

SO 01-32-9 až 25 (okrem 8,23,24) Devínska Nová ves-Zohor, priepusty

- realizácia priepustov

SO 01-33-03 Devínska Nová ves-Zohor, úprava železničného mosta v nžkm 2,663

- inštalácia paženia

SO 01-33-05 Devínska Nová ves-Zohor, zast. Devínske jazero, lávka pre cestujúcich

- debnenie, armovanie, betonáž výťahových šácht
- zásyp základov lávky

SO 01-33-06 Devínska Nová ves-Zohor, nový cestný most v nžkm 4,995

- inštalácia štetovnic
- zemné práce pod dozorom archeológa
- príprava pilotovacej plošiny

01-33-12 Devínska Nová ves-Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 7,834

- inštalácia horizontálneho paženia a tiahla
- osadenie dočasného potrubia do potoka
- búranie mostovky a opôr-fáza 1
- výkopy
- realizácia mikropilót

01-33-14 Devínska Nová ves-Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 9,834

- výkopy
- osadenie dočasného potrubia do potoka
- búranie mostovky a opôr-fáza 1

SO 01-33-15 Devínska Nová ves-Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 9,973

- výkopy, zabezpečenie výkopu
- čiastočná demolácie-fáza 1

01-33-16 Devínska Nová ves-Zohor, prestavba železničného mosta v nžkm 11,125

- inštalácia LARSEN
- búranie mostovky -fáza 1
- búranie opôr
- výkopy

SO 01-34-02 Devínska Nová ves-Zohor, protihlukové steny

- vrty pilót
- realizácia výstuže pilót betónovaných do zeme
- zhotovenie výplne pilót z betónu triedy 20/25
- presun hmôt z dielcov prefabrikovaných zo ŽB

SO 01-35-16 Devínska Nová ves-Zohor, úprava rozvodov NN, ŽSR

- obetónovanie existujúcich NN káblov

SO 01-37-03.2 Devínska Devínska Nová Ves - Zohor, preložky, úprava a ochrany vodovodov, vodovod DN 150 nžkm 3,557

- vytyčenie stavby, sietí, výkop štartovacích jám
- pretlak, pokládka vodovodu

UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)**PS 02-21-01 ŽST Zohor, staničné zabezpečovacie zariadenie**

- pokládka chráničiek pre káble

PS 02-21-02 ŽST Zohor, zabezpečenie stavebných postupov

- montáž reléového stojana
- prepájanie káblov

SO 02-32-02 ŽST Zohor, žel. spodok

- obetónovanie funkčných križujúcich káblov
- odťaženie žel. spodku
- pokládka geotextílie, geomreže koľaj č. 1, 3, 5
- statické zaťažovacie skúšky k.č.1, 3, 5, odbočka Záhorská Ves
- stabilizácia zemnej pláne k.č.1
- realizácie vrstiev železničného spodku

SO 02-32-03 ŽST Zohor, žel. zvršok - demontáž

- odťaženie žel. spodku
- doprava a presun sutiny

SO 02-32-06 ŽST Zohor, nástupištia

- debnenie + betonáž základu + zásyp
- dodanie a montáž nástupištných prefabrikátov

SO 02-33-01 ŽST Zohor, podchod pre cestujúcich a verejnosť v nžkm 12,571

- armovanie, debnenie, betonáž základová doska - etapa 1
- odstránenie spodného rozperného rámu, izolácie
- armovanie a debnenie spodnej dosky

SO 02-33-02 Žst Zohor, nový cestný nadjazd na obchvate obce Zohor v nžkm 12,880

- realizácia pilot
- práce na realizácii pilót sú pozastavené z dôvodu neočakávaných geolog. pomerov
- rieši sa zmena projektu zakladania mosta, nové technické riešenie

SO 02-34-02 ŽST Zohor, zariadenia pre kabelové trasy

- zemné práce, výkop a osadenie šácht kábelovodu
- búranie betónov, odvoz sute
- realizácia kábelovodu vrátane obsypu, zásypu
- pokládka geotextílie

SO 02-34-03 ŽST Zohor, zastrešenie nástupíšť

- zemné práce, výkop pre pätky
- úprava základovej škáry, hutnenie vankúšov
- viazanie výstuže, betonáž pätiiek

SO 02-34-06 ŽST Zohor, PHS

- zemné práce
- príprava pláne pre vŕtanie pilót

SO 02-35-01 ŽST Zohor, trakčné vedenie

- betonáž základov, stavba stožiarov, montáž brán, prevesovanie TV na nové brány
- demontáž starých brán a starých TP
- montáž pohonov, odpojovačov, pohyblivých kotvení
- bezpečnostné nátery

-

SO 02-35-06 ŽST Zohor, vonkajšie osvetlenie

- betonáž základov pre osvetľovacie veže

SO 02-37-01 ŽST Zohor, odvedenie dažďových vôd

- pokládka vsaku

UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

SO 10-32-01 Kúty-št.hranica SR/ČR, železničný zvršok

- sypanie , rozprestretie a hutnenie koľajového kameniva fr. 32/36mm

SO 10-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- odkop ryhy a zriadenie otvorenej spevnenej priekopy
- zriadenie prechodových oblastí na priepuste 05 + PŽS
- vytiahnutie larzen a HEB, rušenie záporového paženia a odvoz na skládku (oblasť priepustu)

SO-10-34-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, budova napájacej stanice

- montáž prefa
- montáž KZS

SO-10-34-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 27 kV (stavebná časť)

- montáž soklu
- montáž KZS
- realizácia PSV prác

SO-10-35-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, 2. časť

- betonáž základov

SO-10-35-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, Úprava TV v ŽST Veľké Leváre, pripojenie SpS na TV

- montáž prefa
- montáž KZS

UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)

SO 11-32-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok

- sypanie, rozprestretie a hutnenie koľajového kameniva fr.32/63mm

SO 11-32-04 Kúty-št.hranica SR/ČR, zastávka Brodské - nástupište

- spätný zásyp štrkodrvou a montáž konzolových dosiek
- montáž prístreškov

SO 11-33-01 Kúty - št.hr. SR/ČR, podchod pre cestujúcich na zast. Brodské v nžkm 71,722

- armovanie, debnenie, stien žb tubusu podchodu
- debnenie, výstuž, betonáž žb. stropu

SO 11-33-04, nový železničný most v nžkm 72,138(podjazd Brodské)

- izolácie mostovky
- zvislá izolácia opôr mosta
- prechodové oblasti
- debnenie a betonáž rímsy
- kotvenie PHS stĺpov

SO 11-33-06 Kúty - št.hr. SR/ČR, tesniaca vaňa pod MK v nžkm 72,138

- výkopy - DC5, DC6
- čerpanie vody
- prípravné práce pre podkladový betón DC5, DC6
- podkladový betón

SO 11-35-10 Kúty - št.hr. SR/ČR, vonkajšie osvetlenie pri podjazde v nžkm 72,138

- výkopy pre základy osvetľovacích stožiarov

UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)**SO 12-33-01 Kúty - št.hr. SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,232**

- betonáž záverné múriky a krídla opôr
- debnenie, betonáž podložiskové bloky
- inštalácia ložísk
- inštalácia ocelových nosníkov mostovky
- realizácia prechodových oblastí
- inštalácia strateného debnenia
- armovanie mostovky

SO 12-33-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,489

- osadenie ložísk
- prípravné práce pre montáž ocelových nosníkov-podporná konštrukcia
- zváranie, montáž ocelových nosníkov
- inštalácia ocelových nosníkov mostovky
- realizácia prechodových oblastí
- inštalácia strateného debnenia
- armovanie mostovky

SO 12-33-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410

- obklad pilierov kameňmi

SO 12-38-01.02 Kúty - št.hranica SR/ČR, úprava spevnenej komunikácie cez Moravu v nžkm 74,497

- zemné práce

4. Zmluva o Dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

5. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

5.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

5.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):

Uvedené v prílohe č.2

5.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):

Uvedené v prílohe č.3

6. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

7. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:

7.1.Zariadenie Zhotoviteľ'a:

Uvedené v prílohe č.4

7.2.Personál Zhotoviteľ'a:

Uvedené v prílohe č.4

8. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:

8.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci február boli spracované 4 Správy z inšpekcií staveniska na týždennej báze.


Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:

- a) Práca žeriavu a betonážnej pumpy v nebezpečnej vzdialenosti od prevádzkovej železnice bez postavenej hliadky

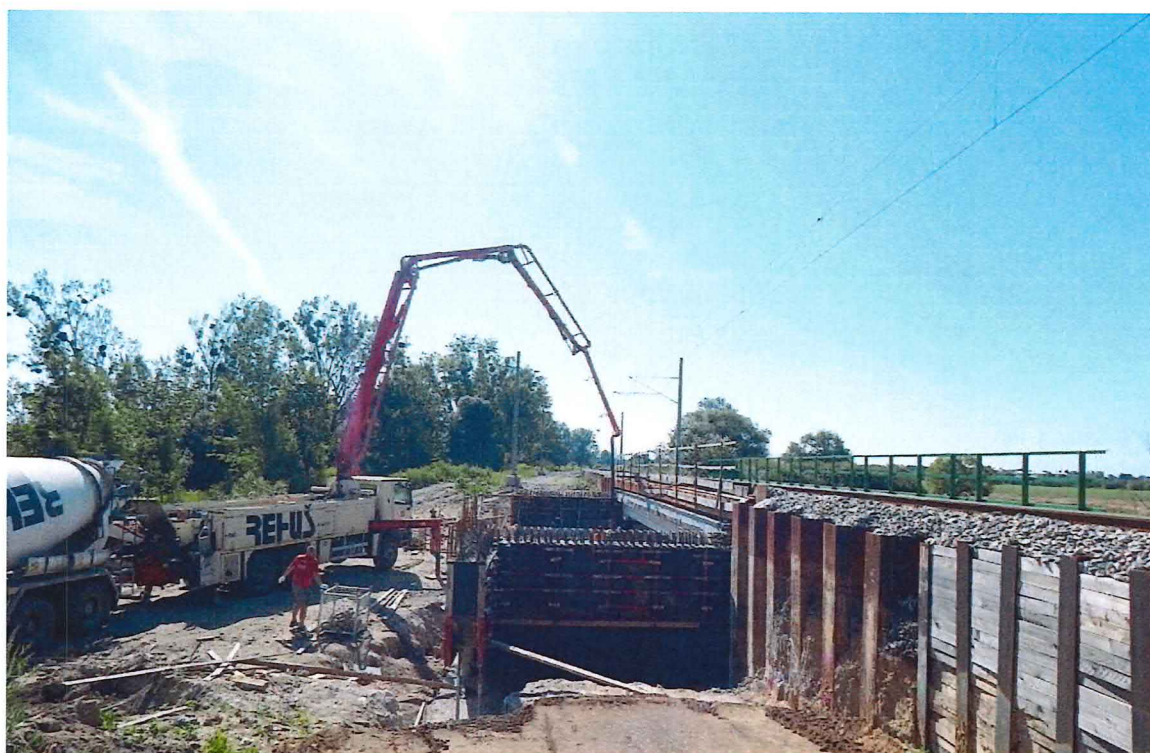

- b) Práca vo výške na nekompletných závesných lávkach – nekompletné podlahy a nekompletné zábradlia



- c) Práca vo výške bez zábradlia, alebo istenia pracovníkov pri práci, neporiadok, nebezpečné výstupy na pracovisko



Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti vo vzťahu k BOZP na stavenisku

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľ'mi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľ'om. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

8.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – viď príloha č. 5.

8.3. Evidencia odpadov:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Mesiac:

08/2023

P.č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Yrôd	Hmotnosť	Názov PS/SO	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1	01.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		1407,50	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
2	04.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		359,90	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
3	04.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		2185,66	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
4	05.08.2023	Brodské	17 03 04	O		25,67	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
5	05.08.2023	Brodské	17 01 07	O		79,88	SO 12 33 04	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
6	05.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		310,80	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
7	05.08.2023			O		126,40	SO 12 33 04	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
8	05.08.2023			O		2053,74	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
9	06.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		192,80	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
10	06.08.2023	Lanžhot	17 01 01	O		238,20	SO 12 33 04	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
11	06.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		1837,14	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
12	07.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		370,00	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
13	07.08.2023	Lanžhot	17 01 01	O		48,90	SO 12 33 04	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
14	07.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		1923,24	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
15	08.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		568,70	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
16	08.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		2069,72	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
17	11.08.2023	Brodské	17 03 04	O		341,10	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
18	11.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		369,60	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
19	11.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		1940,98	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
20	12.08.2023	Brodské	17 03 04	O		496,32	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
21	12.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		308,90	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
22	12.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		2268,26	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
23	13.08.2023	Brodské	17 03 04	O		710,92	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
24	13.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		328,70	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
25	13.08.2023	Zohor	17 01 01	O		516,04	SO 02 31 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
26	13.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		2248,60	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
27	14.08.2023	Brodské	17 03 04	O		653,11	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
28	14.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		359,80	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
29	14.08.2023	Zohor	17 01 01	O		223,97	SO 02 31 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
30	14.08.2023	DNV - Zohor	17 01 01	O		30,76	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
31	14.08.2023	DNV - Zohor	17 01 01	O		26,56	SO 01 32 21	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
32	14.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		1689,44	SO 01 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
33	14.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		719,96	SO 01 32 06	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
34	14.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		82,90	SO 01 32 09	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
35	14.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		239,56	SO 01 32 21	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
36	14.08.2023	DNV - Zohor	17 03 04	O		149,56	SO 01 32 22	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
37	15.08.2023	Brodské	17 01 01	O		144,36	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
38	15.08.2023	Brodské	17 03 04	O		330,47	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
39	15.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		351,20	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
40	15.08.2023	Zohor	17 01 01	O		390,62	SO 02 31 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
41	15.08.2023	Zohor	17 03 04	O		2044,10	SO 02 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
42	18.08.2023	Brodské	17 03 04	O		589,39	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
43	18.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		351,60	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
44	18.08.2023	Zohor	17 01 01	O		201,63	SO 02 31 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
45	18.08.2023	Zohor	17 03 04	O		1199,70	SO 02 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
46	19.08.2023	Brodské	17 03 04	O		383,47	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
47	19.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		392,70	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
48	19.08.2023	Lanžhot	17 01 01	O		58,40	SO 12 33 04	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
49	19.08.2023	Zohor	17 03 04	O		652,86	SO 02 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
50	20.08.2023	Brodské	17 03 04	O		578,65	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
51	20.08.2023	Zohor	17 03 04	O		1082,86	SO 02 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
52	21.08.2023	Brodské	17 03 04	O		793,07	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
53	21.08.2023	Zohor	17 03 04	O		377,10	SO 02 32 02	TZAM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
54	22.08.2023	Brodské	17 03 04	O		793,87	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
55	23.08.2023	Brodské	17 03 04	O		687,06	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
56	23.08.2023	Lanžhot	17 03 04	O		133,90	SO 12 32 02	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
57	23.08.2023	Lanžhot	17 01 01	O		119,20	SO 12 33 04	Stavební firma plus s.r.o., Hodonín	BR3
58	23.08.2023	Zohor	17 01 01	O		79,97	SO 02 31 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
59	23.08.2023	DNV - Zohor	17 03 02	O		52,73	SO 01 33 13	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
60	26.08.2023	Brodské	17 03 04	O		925,47	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
61	26.08.2023	DNV - Zohor	17 01 01	O		218,99	SO 01 33 13	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
62	26.08.2023	Zohor	17 01 01	O		59,81	SO 02 31 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
63	26.08.2023	DNV - Zohor	17 03 02	O		56,91	SO 01 33 13	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
64	27.08.2023	DNV - Zohor	17 01 01	O		108,60	SO 01 33 16	AFR GROUP s.r.o. Jána Ondruša 19/C, Stupeva	R3
65	27.08.2023	Brodské	17 03 04	O		809,56	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
66	27.08.2023	DNV - Zohor	17 03 02	O		138,83	SO 01 33 13	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
67	28.08.2023	Brodské	17 03 04	O		662,50	SO 11 33 06	CHIELNA GBELY s.r.o. Naftárska 963, Gbely	R3
68	28.08.2023	DNV - Zohor	17 03 02	O		28,29	SO 01 33 13	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
69	28.08.2023	Zohor	17 02 03	O		2,40	SO 02 31 01	FCC Slovensko, Bratislavská 18, Zohor	D1

Spracoval na základe podkladov subdodávateľov: Ing. Lukáš Hučko

Podpis:



9. Finančné plnenie:

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 667 718,54	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025
16/2024-A	11/2024	1 856 011,65	16.2.2025
1/2025-A	12/2024	11 113 697,95	30.3.2025
2/2025-A-CZ1	12/2024	36 082,96	18.4.2025
3/2025-A	02/2025	7 298 303,76	13.6.2025
5/2025-A	03/2025	5 106 852,27	15.7.2025
6/2025-A	04/2025	6 193 973,58	4.8.2025
7/2025-A	05/2025	4 990 540,24	14.9.2025
9/2025-A	06/2025	9 890 066,74	5.10.2025

Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024
17/2024-A	12/2024	892 751,19	29.3.2025
8/2025-B	05/2025	2 483 529,77	15.9.2025

K 31.07.2025 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 86 730 028,71 € bez DPH.
- stavby B vo výške 4 306 383,40 € bez DPH.


10. Fotodokumentácia



UČS 12, Osádzanie ložísk a ocelejovej mostovky



UČS 12 Montáž strateného debnenia a kontrolné meranie, mosty

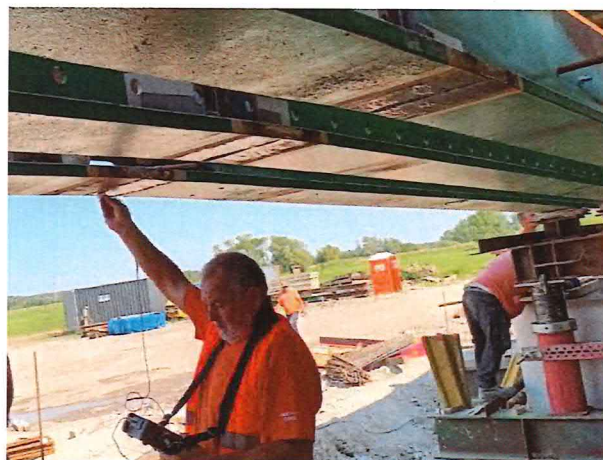

UČS 12 Realizácia prechodových oblastí, mosty



UČS 12, Stratené debnenie a armovanie, mosty





UČS 12, Vyťahovanie štetovnic, mosty



UČS 12, Debnenie a armovanie mostovky



UČS 11, Armovanie a debnenie stien, podchod



UČS 11, Betonáž stien, podchod






UČS 11, Debnenie stropu, podchod



UČS 11, Výkopy, podjazd

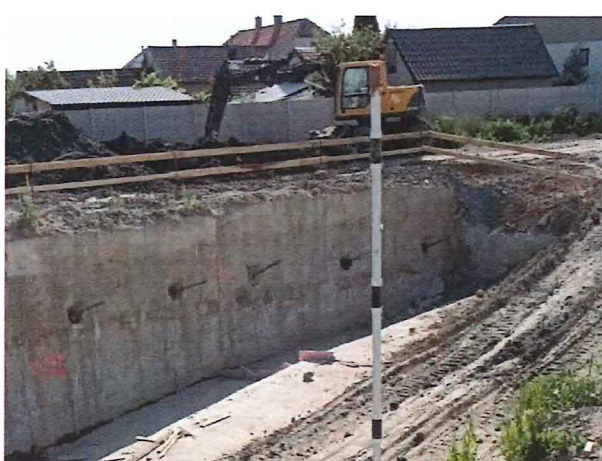

UČS 11, Betonáž podkladovej dosky, podjazd



UČS 11, Zásypy, nástupiská



UČS 11, Montáž konzol. dosiek - nástupisko



UČS 11, Montáž prístreškov




UČS 10, Odkopy ryhy pre spevnené priekopy







UČS 10, Realizácia spevnených priekop

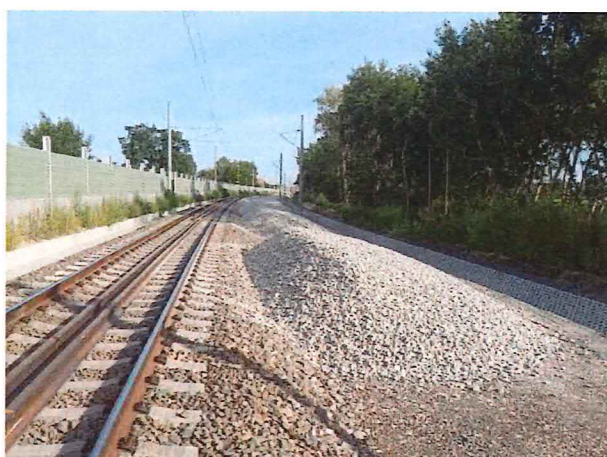


UČS 10, Sypanie a rozprestretie kameniva železničného zvršku

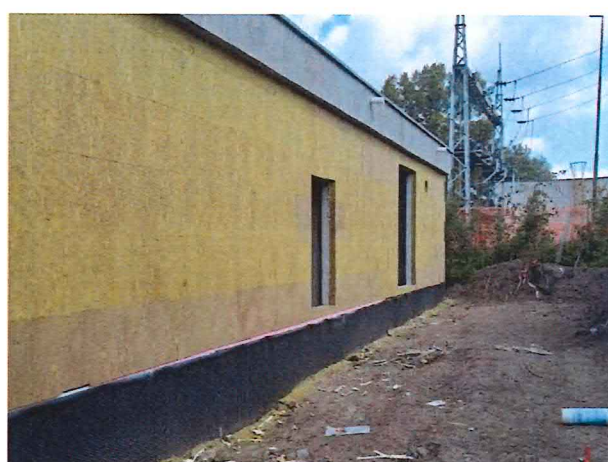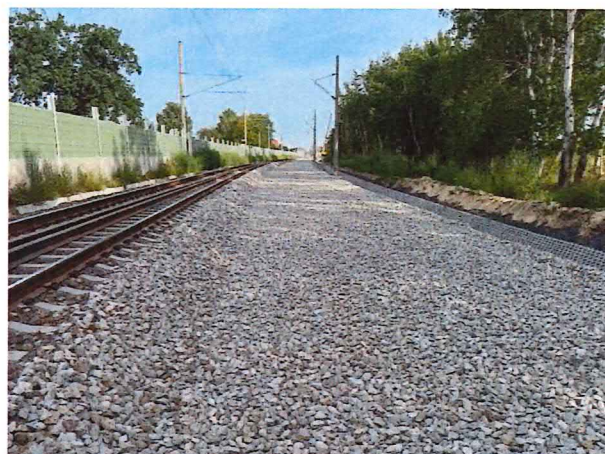

UČS 10, Montáž kontaktný zatepľovací systém, TNS



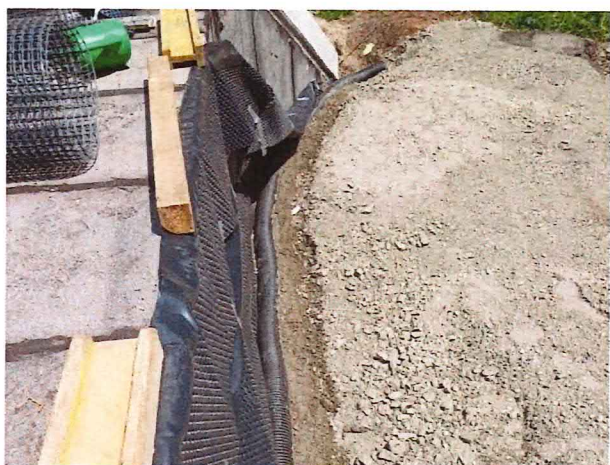

UČS 10, Prechodové oblasti, priepust



UČS 02, Betonáž základovej dosky 1.etapa, podchod



UČS 02, Odstránenie spodného rozperného rámu, a spodná izolácia podchodu




UČS 02, Armovanie základov výťahových šachtiet, podchod




UČS 02, Armovanie spodnej dosky, podchod




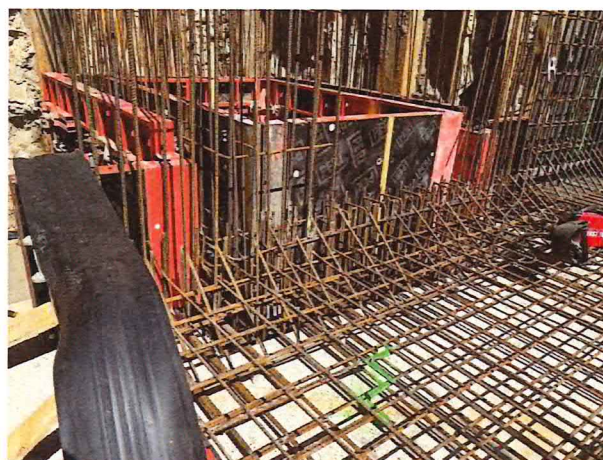

UČS 02, Armovanie a debnenie - podchod

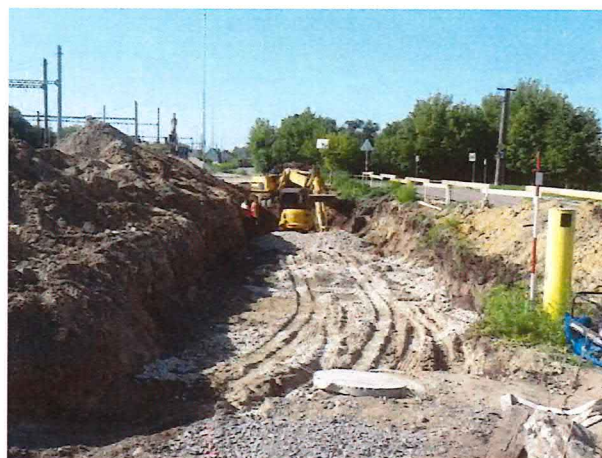


UČS 02, Kanalizačný vsak

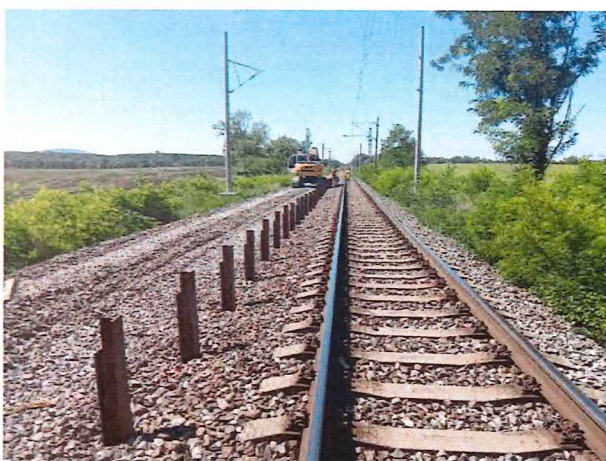


UČS 01, Realizácia záporového paženia



UČS 01, Realizácia záporového paženia, priepusty

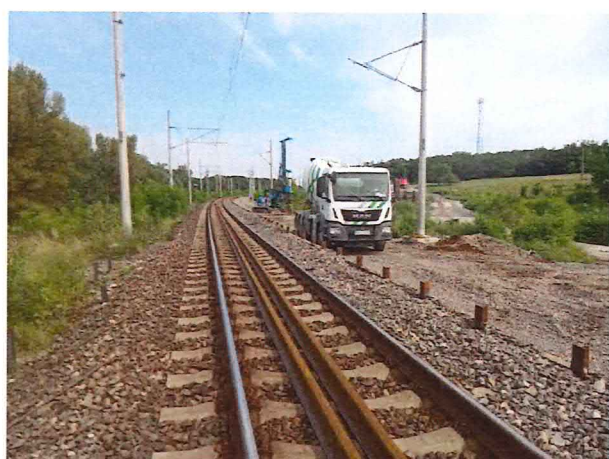

UČS 01, Realizácia pilót pre PHS

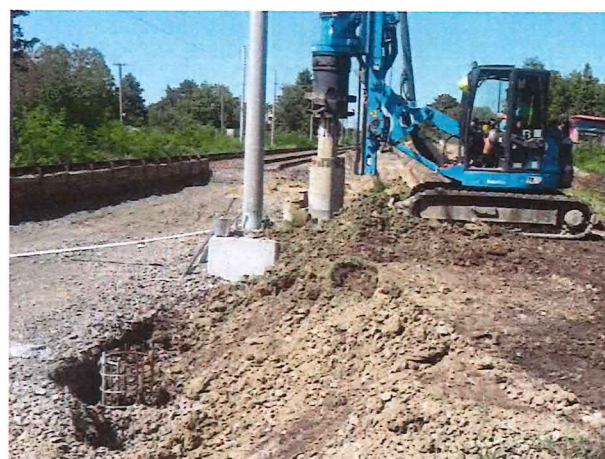

UČS 01, Odkopy pre priekopy






UČS 01, Búracie práce, železničný most



UČS 01 Dočasné zatrubňovanie priepustov a mostov

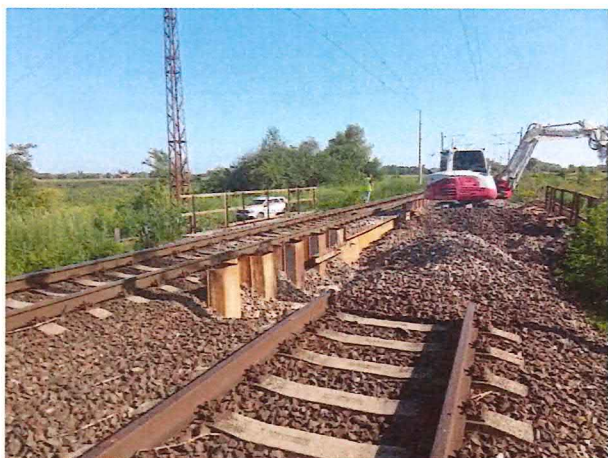


UČS 01, Odkop železničného kameňa a búracie práce, most



UČS 01, Výkopy, železničný most




UČS 01, Búranie, železničný most

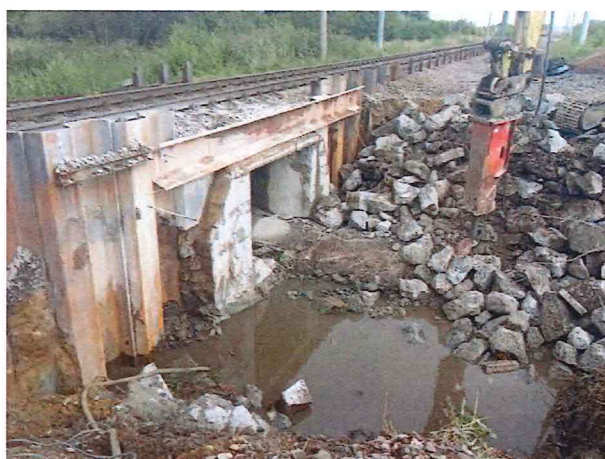



UČS 01, Inštalácia štetovnic, cestný most

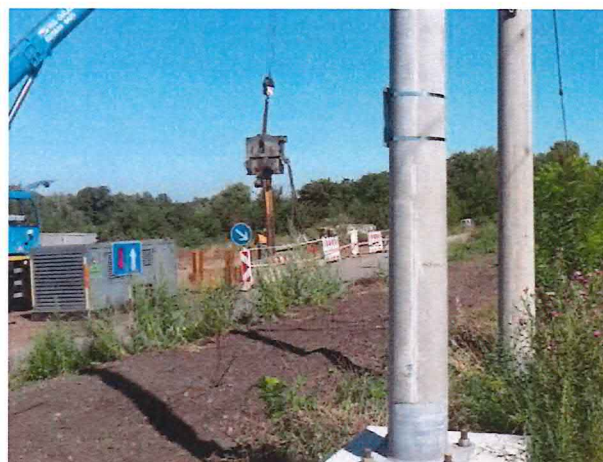

UČS 01, Čerpanie vody - mosty



UČS 01, Realizácia mikropilót - mosty



UČS 01, Armovanie, debnenie a betonáž výťahových šacht, lávka pre cestujúcich



UČS 01, Armovanie, debnenie a betonáž výtáhových šácht, lávka pre cestujúcich



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.08.2025-30.08.2025

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.08.2025-30.08.2025

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.08.2025-30.08.2025

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa pod- článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	30.8.2025	JVICM-VHS/25/0310

Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

Zariadenie Zhotoviteľa

Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Rýpadlo	20
Búracie kladivo	7
Traktor CAT, JCB	9
Žeriav	7
Elektrocentrála	14
Čerpadlo na vodu	15
Ponorný vibrátor	13
Vibračná doska	3
Mikropilótová vrtná súprava	2
Pilotovacia súprava	2
DOPRAVA	
Autožeriav	6
Domiešavač	10
Mann s mech. Rukou	0
Nákladné auto TATRA 815	27
LOKO	5
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	15
Pracovný vlak TV-betonárka	2
DESEC	0
Manitou	1

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstaviteľ zhotoviteľa:	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	5
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulát	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	4
- Tlmočnícky a sekretariát	5
CUDZÍ - subdodávatelia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	18
- Geodet	12
- Stavebný robotník - strojník, vodič	88
- Stavebný robotník	114
