



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com

V Bratislave, dňa 08.02.2021, naše číslo JVICM-VHS/21/0029



ŽSR Generálne riaditeľstvo Odbor investorský	
Dátum: 11-02-2021	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Objednávateľovi:
Železnice Slovenskej republiky
GR, Odbor investorský
Ing. Štefan Sedláček
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

To the Client:
Železnice Slovenskej republiky
GR, Odbor investorský
Ing. Štefan Sedláček
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Predmet: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate
Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR “
Správa o postupe prác (čl. 4.21 FIDIC Zmluvy)

Subject: „ŽSR, Modernisation of the railway track
Devínska Nová Ves-state border SK/CZ “
Progress Report (art. 4.21 FIDIC Contract)


Vážený Objednávateľ,

Dear Employer,

Na základe Zmluvy o dielo č. 01/2017 zo dňa
9.9.2020 Vám podľa Osobitných podmienok
zmluvy – článok 4 podčlánok 4.21 odovzdávame
„Správu o postupe prác“ za január 2021
schválenú stavebným dozorom.
S pozdravom

On the basis of the Contract for Works No. 01/2017
dated 9.9.2020, according to the Specific Conditions
of the Contract – clause 4, subclause 4.21 we submit
„Progress Report“ for January 2021 approved by
Engineer.
Best regards

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ŽSR	
- 8. 02. 2021	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



Príloha:
2x Správa o postupe prác za január
1xCD

Appendix:
2x Progress Report for January
1xCD

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: január 2021

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 10.11.2023

Predstaviteľ Zhotoviteľa : Edoardo Ruggia

Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Edoardo Ruggia, Milan Kubala, Antonio Melidoro

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Antonio Melidoro

.., dátum... 05/02/2021

Schválil za SD :

Ing. Milan Zvonár,....

.., dátum... 5.2.2021



OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	3
3. Realizácia Diela:	4
4. Vyhodnotenie prác:	4
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	4
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	4
6.1. Zoznam Zmien:	4
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):	4
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):	4
7. Systém kvality:	4
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:	4
8.1. Zariadenie Zhotoviteľ'a:	4
8.2. Personál Zhotoviteľ'a:	4
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:	5
9.1. Bezpečnosť práce:	5
9.2. Ekologické vplyvy:	5
10. Finančné plnenie:	5
11. Fotodokumentácia:	6

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Zameriava sa hlavne na rekognoskáciu terénu a prieskum na celej stavbe Spracovanie aktualizácie prehľadu priepustov a mostov, podľa požiadavky Združenia z pracovnej porady zo dňa 15.12.2020 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Technické pracovné porady v dňoch 12.1., 22.1., 26.1., 29.1. 2021 Príprava podkladov na priebežnú pracovnú poradu s Investorom. Porada sa uskutoční 1.2.2021 Spracovanie dokumentov „Žiadosť o vydanie pokynu č.1 v ráttane samostatného vysvetlenia, Žiadosť o vydanie pokynu č.2 v ráttane samostatného vysvetlenia, Žiadosť o vydanie pokynu č. 3, Žiadosť o vydanie pokynu č. 4“ Spracovanie systému kódovania dokumentov, spracovanie vzoru pre rohové rozpisky projektovej dokumentácie 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1	<ul style="list-style-type: none"> Geodetické zameranie, spracovávanie dát a tvorba modelu terénu. Výkon geodetických prác (Príloha č.4), zabezpečovanie mapových a geodetických podkladov Podávanie žiadostí o zakreslenie inžinierskych sietí Podávanie žiadostí správcovi inžinierskych sietí o vytýčenia sietí v ich správe Analýza poskytnutých informácií o existencii inžinierskych sietí, sumarizácia poskytnutých zakresov jestvujúcich inžinierskych sietí od jednotlivých správcov a ich prekreslenie do digitálneho tvaru Vytýčovanie inžinierskych sietí Zahájenie prác na stavebno-technickom prieskume mostov spol. Geoexperts s.r.o. Termín spracovania prieskumu je do 28.2.2021. Zrealizovaný orientačný inžinierskogeologický prieskum (mimo osový geotechnický prieskum - most cez rieku Morava (stavba A2.1 – len mostný objekt) Komunikácia so stavebným úradom Senica 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO, GEOKOD



3. Realizácia Diela:

Aktuálne sa neaplikuje.

4. Vyhodnotenie prác:

Aktuálne sa neaplikuje.

5. Zmluva o Dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

6.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):

Uvedené v prílohe č.2

6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:

Aktuálne sa neaplikuje.

8.2.Personál Zhotoviteľa:

Aktuálne sa neaplikuje.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Aktuálne sa neaplikuje.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Aktuálne sa neaplikuje.

Závažné nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Opakujúce sa nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Práce s osobitným nebezpečenstvom

Aktuálne sa neaplikuje.

C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

Aktuálne sa neaplikuje.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

10. Finančné plnenie:

K 31.01.2021 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie vo výške 0,00 € bez DPH.

11. Fotodokumentácia:



Geologické práce – realizácia Dynamickej penetrácie



Geologické práce – realizácia Dynamickej penetrácie



Geologické práce – realizácia Dynamickej penetrácie



Geologické práce – realizácia Dynamickej penetrácie



Geodetické práce súvisiace s vytyčovaním 6kV kábla - 14.1.2021



Geodetické práce súvisiace s vytyčovaním 6kV kábla - 14.1.2021



Geodetické práce súvisiace s vytyčovaním 6kV kábla - 14.1.2021



Geodetické práce súvisiace s vytyčovaním 6kV kábla - 14.1.2021



Geodetické práce súvisiace s vytyčovaním 6kV kábla - 14.1.2021



Geodetické práce - Vytyčovanie potrubí SPP – Malacky - 21.1.2021



Geodetické práce - Vytýčovanie sietí ŽSR, OR TT, EaE – DNV (mimo) - 25.1.2021



Geodetické práce - Vytýčovanie sietí ŽSR, OR TT, správa budov – Zohor - 26.1.2021



Geodetické práce - Vytyčovanie sietí ŽSR, OR TT, EaE – DNV (mimo) - 28.1.2021

Príloha č.1

Zoznam Zmien k 31.01.2021

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu (Lehota výstavby)	07.10.2020	JVICM-VHS/20/0011
	Pokyn na Zmenu č.1 (Odsúhlasenie zmeny Lehoty výstavby)	21.10.2020	230/2020-USPaR Ba
2.	Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu – EIA	19.10.2020	JVICM-VHS/20/0014
3.	Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - Vypracovanie DSZ/DUR na Časť A.2.1 a rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR	18.12.2020	JVICM-VHS/20/0046



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) k 31.01.2021

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Zmluvná pokuta (omeškanie s predložením správ o postupe prác)	24.11.2020	31562/2020/O220-25/716



Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) k 31.01.2021

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	EIA	27.10.2020	JVICM-VHS/20/0016
2.	Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028
3.	Vypracovanie DSZ a DÚR pre Časť A.2.1	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0005
4.	Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0006



SPRÁVA O GEODETICKEJ ČINNOSTI

Stavba: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR (žkm 1,3 – 24,9 a 69,5 – 74,5)

Zhotoviteľ: GEOKOD, s.r.o., Žitná 21, 831 06 Bratislava

Predmet a postup prác

V mesiaci január 2021 sme na základe objednávky pokračovali s výkonom geodetických a kartografických prác pre vyhotovenie projektovej dokumentácie „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ (žkm 1,3 – 24,9 a 69,5 – 74,5).



V mesiaci január boli vykonané nasledovné práce :

- V týždni 4.1. – 10.1. sme domerali úsek Kúty – štátna hranica (žkm 69,0 – 74,5). Domeranie zastávky Brodské, priepusty v žkm 69,0 – 71,0 a železničný prejazd v Brodskom. Po domeraných dát sme spracovali kresbu v prostredí Bentley. Vytlačili sme si mapu a tú následne kontrolovali v teréne a prípadne sme domerali chýbajúce bodové prvky polohopisu. *Príloha č. 1*
- Dňa 11.01. 2021 sme odovzdali zameranie úseku Kúty – štátna hranica žkm 69,0 – 74,5.
- Od 11.01 – 31.1. Sme domerali okolie staničnej budovy v Malackách a Zohore. Domerali sme priepusty a mosty v žkm 8,0 – 12,0. Zameranie cestného nadjazdu v žkm 20,85. Zpracovali sme do kresby a vytlačili mapu, ktorú sme následne kontrolovali v teréne a domerali potrebné polohopisné a výškopisné prvky.
- Súbežne s kontrolou výkresov sme zamerali koľaje a polohopis na trati zo ŽST Zohor smerom na Záhorskú Ves a smerom na Jablonové. Oba úseky zhruba po žkm 1.750. Domeranie koľaje 101 v ŽST Zohor po bránu. Zpracovanie do celkovej situácie
- Od 23.1. – 26.1. Zameranie územia v žkm 40.4 – 41.6 úsek ŽST Devínska Nová Ves – meranie pre novú kabelizáciu + okolie staničnej budovy.

V Bratislave, dňa 02.02.2021

za spracovateľov : Ing. Michaela Čuchtová

Príloha č. 1 Vyhodenie mapy do terénu a následná kontrola v teréne

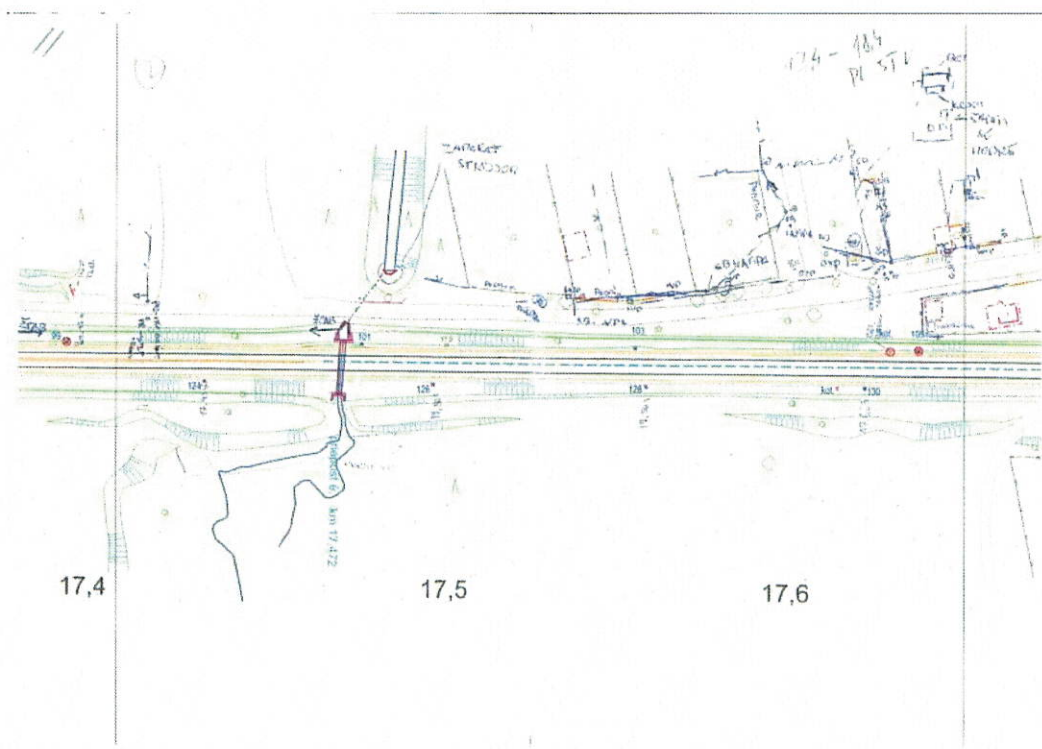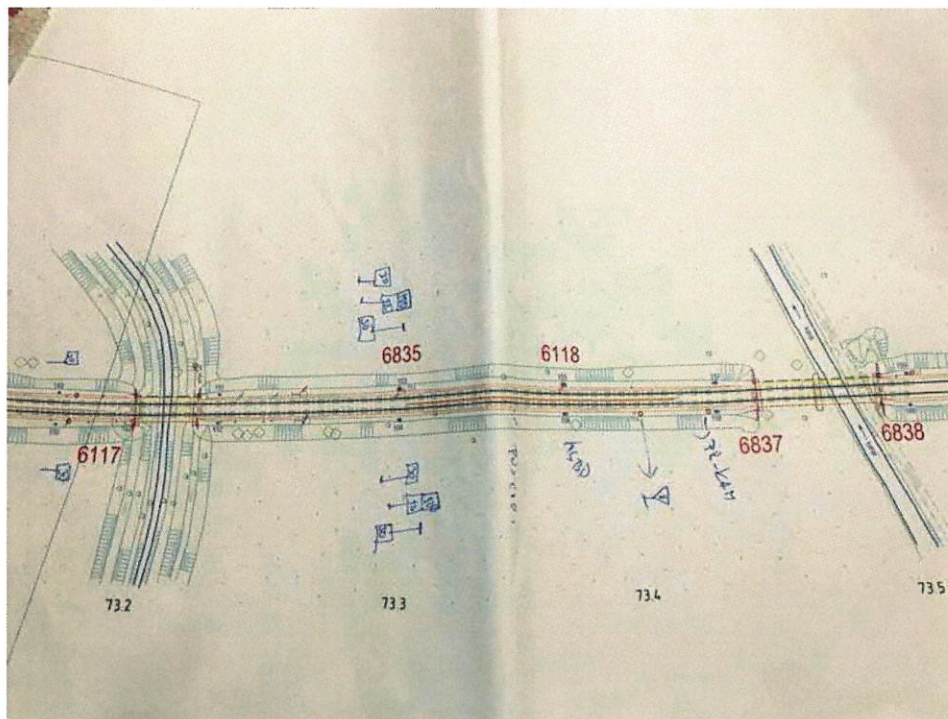

Domeranie chýbajúcich prvkov polohopisu

