

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: február 2021

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 10.11.2023

Predstaviteľ Zhotoviteľa : Edoardo Ruggia

Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Edoardo Ruggia, Milan Kubala, Antonio Melidoro

Schválil za Zhotoviteľa
Vedúci technického útvaru: Ing. Antonio Melidoro

dátum.....

01/03/2021

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár,.....

dátum.....

8.3.2021



OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	3
3. Realizácia Diela:	4
4. Vyhodnotenie prác:	4
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	4
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	4
6.1. Zoznam Zmien:	4
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	4
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	4
7. Systém kvality:	4
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	4
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	4
8.2. Personál Zhotoviteľa:	5
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:	5
9.1. Bezpečnosť práce:	5
9.2. Ekologické vplyvy:	5
10. Finančné plnenie:	5
11. Fotodokumentácia:	6

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Zameriavame hlavne na rekognoskácia terénu a prieskum na celej stavbe Spracovanie záverečnej správy orientačného inžiniersko-geologického prieskumu (AZ GEO) pre výhľadovú konštrukciu mosta cez rieku Morava Miestne šetrenie so správcom objektov TNS Zohor, SpS Moravský sv. Ján, SpS Kúty I., SpS Kúty II. Vykonané dňa 17.2.2021 Obhliadka územia - navrhované TNS Kúty, SpS Veľké Leváre 17.2.2021 Obhliadka objektov určených pre asanovanie 19.2.2021 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Priebežná pracovná porada (online) s Investorom dňa 1.2.2021 Spracovanie záznamu z porady (finálne odoslaný 9.2.2021) Aktualizácia harmonogramu postupu prác, podľa požiadavky Zhotoviteľa, ku dňu 9.2.2021 – MS Project Technické pracovné porady v dňoch 22.2.2021, 26.2.2021 Spracovanie dokumentov „žiadost' o vydanie pokynu SD č.1 až č.10“; dokumenty boli spracované ako samostatné žiadosti 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> Geodetické zameranie, spracovávanie dát a tvorba modelu terénu. Výkon geodetických prác, zabezpečovanie mapových a geodetických podkladov Ukončené vytyčovanie inžinierskych sietí v úseku A2 Podávanie žiadostí o zakreslenie inžinierskych sietí Podávanie žiadostí správcom inžinierskych sietí o vytýčenia sietí v ich správe Analýza poskytnutých informácií o existencii inžinierskych sietí, sumarizácia poskytnutých zákresov jestvujúcich inžinierskych sietí od jednotlivých správcom a ich zakreslenie do digitálneho tvaru Vytyčovanie inžinierskych sietí Udelenie výluky pre úsek A2.1 vydalo OR Trnava - od 15.3.2021 Podanie žiadosti dňa 3.2.2021 o koľajové a napäťové výluky pre úsek A1 a A2.2; komisia pre udelenie výluk zasadala dňa 10.2.2021 Zaslanie listov dňa 18.2.2021 na GR ŽSR a OR Trnava vo veci povolenia vstupov na pozemky pre geologické spoločnosti Geoexperts a CADECO, vrátane žiadosti podanej na OR Trnava za účelom prenajatia techniky na výkon osového geotechnického prieskumu IGHP (mimoosový prieskum) 	<p>úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO, GEOKOD</p> <p>AZ-GEO, s.r.o.</p> <p>CADECO, a.s.</p> <p>Geoexperts, s.r.o.</p>

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Realizácia stavebno-technického prieskumu mostov• Koordinačná porada dňa 10.2.2021 so zástupcami Správy železníc ČR, projektantom Žltý FIDIC a prizvanými zástupcami ŽSR• Pracovná online porada so zástupcami mesta Malacky dňa 5.2.2021• Komunikácia a koordinačná pracovná porada v online priestore so starostom obce Plavecký Štvrtok dňa 17.2.2021 | |
|---|--|

3. Realizácia Diela:

Aktuálne sa neaplikuje.

4. Vyhodnotenie prác:

Aktuálne sa neaplikuje.

5. Zmluva o Dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

6.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):

Uvedené v prílohe č.2

6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:

Aktuálne sa neaplikuje.

8.2. Personál Zhotoviteľa:

Aktuálne sa neaplikuje.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Aktuálne sa neaplikuje.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Aktuálne sa neaplikuje.

Závažné nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Opakujúce sa nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Práce s osobitným nebezpečenstvom

Aktuálne sa neaplikuje.

C. Kontroly vykonané objednávateľom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

Aktuálne sa neaplikuje.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

10. Finančné plnenie:

K 28.02.2021 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie vo výške 0,00 € bez DPH.

11. Fotodokumentácia:



Proces vytyčovania inžinierskych sietí - 5. 2. 2021 ŽSR, OR TT, sekcia OZT - stanica Brodské



Proces vytyčovania inžinierskych sietí - 5. 2. 2021 ŽSR, OR TT, sekcia OZT - stanica Brodské
strana 6 z 14



Proces vytyčovania inžinierskych sietí - 10. 2. 2021 ŽSR, OR TT, sekcia OZT – Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR



Proces vytyčovania inžinierskych sietí - 10. 2. 2021 ŽSR, OR TT, sekcia OZT – Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR



Proces vytyčovania inžinierskych sietí - 10. 2. 2021 ŽSR, OR TT, sekcia OZT – Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR



Proces vytyčovania inžinierskych sietí – NN káblov – EOv, napájania v stanici Zohor, zhlavie Malacky




Proces vytyčovania inžinierskych sietí – NN káblov – EOv, napájania v stanici Zohor, zhlavie Malacky



Miestne šetrenie jestvujúci areál TNS Zohor – 17.2.2021



Miestne šetrenie jestvujúci areál TNS Zohor – 17.2.2021

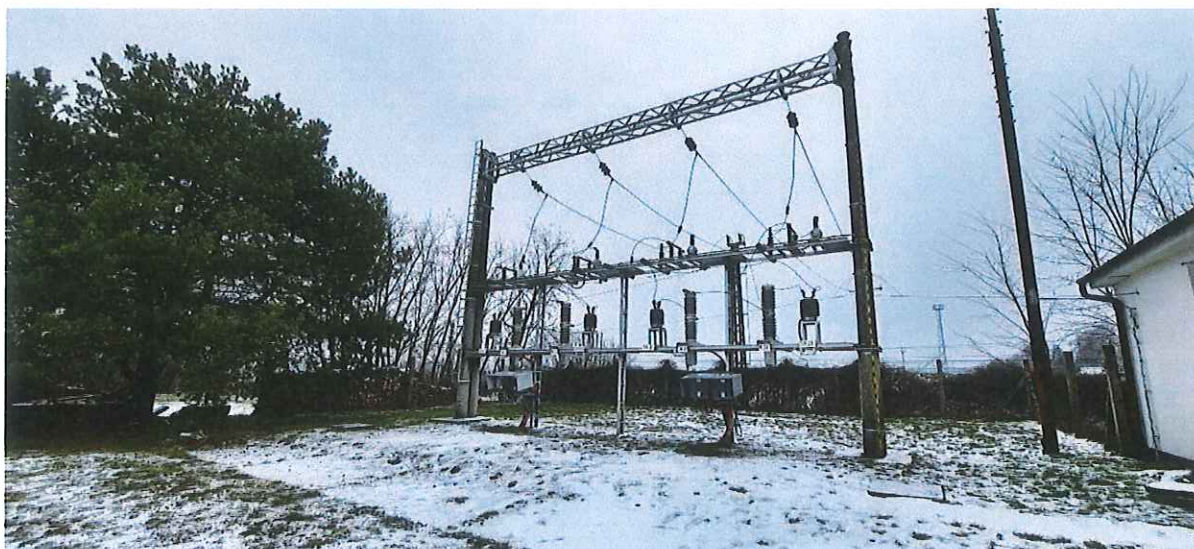

Miestne šetrenie jestvujúci areál Spínacia stanica Moravský svätý Ján – 17.2.2021




Miestne šetrenie jestvujúci areál Spínacia stanica Kúty I. – 17.2.2021



Miestne šetrenie jestvujúci areál Spínacia stanica Kúty II. – 17.2.2021



Miestne šetrenie ŽST Zohor – 19.2.2021

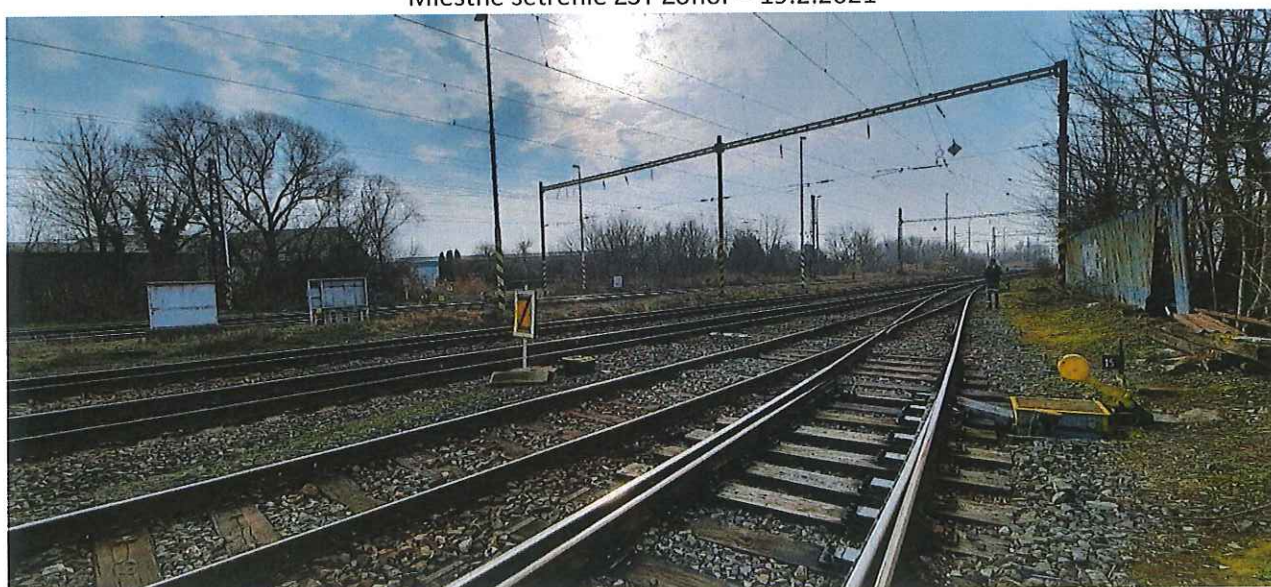

Miestne šetrenie ŽST Zohor – 19.2.2021

Príloha č.1

Zoznam Zmien k 28.02.2021

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu (Lehota výstavby)	07.10.2020	JVICM-VHS/20/0011
	Pokyn na Zmenu č.1 (Odsúhlasenie zmeny Lehoty výstavby)	21.10.2020	230/2020-USPaR Ba
2.	Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu – EIA	19.10.2020	JVICM-VHS/20/0014
3.	Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - Vypracovanie DSZ/DUR na Časť A.2.1 a rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR	18.12.2020	JVICM-VHS/20/0046



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) k 28.02.2021

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Zmluvná pokuta (omeškanie s predložením správ o postupe prác)	24.11.2020	31562/2020/O220-25/716



Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) k 28.02.2021

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	EIA	27.10.2020	JVICM-VHS/20/0016
2.	Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028
3.	Vypracovanie DSZ a DÚR pre Časť A.2.1	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0005
4.	Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0006
5.	Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC	05.02.2021	JVICM-VHS/21/0026
