

HARMONOGRAM pre roky 2021-2023

REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE 2. etapa

Základné východiská pre spracovanie harmonogramu:

- trojročné obdobie realizácie prác (2021-2023) so začiatkom – jarná až letná sezóna (apríl 2021) a ukončením jeseň/zima 2023, max. s vypratáním staveniska a úpravou nádvoría do otvorenia letnej sezóny 04/2024.
- v r. 2021 bude prístupný ešte horný hrad vrátane západných palácov s kaplnkou, s uzatvorením nádvoría, kde bude mať dodávateľ zariadenie staveniska a skládku materiálu, a kde budú prebiehať aj stavebné a reštaurátorské práce za súčasnej realizácie pamiatkových výskumov (architektonicko-historického a archeologického)
- v r. 2022 západné paláce nebudú prístupné, t. j. , horný hrad bude prístupný iba po kapitánsky dom a prístupná bude kruhová veža, z ktorej bude možný pohľad na zostávajúcu časť hradu. Po dohode s dodávateľom stavebných prác je možné práce organizovať tak, aby boli najprv zrealizované práce na hornej terase, ktorá bude verejnosti čiastočne sprístupnená počas hlavnej letnej turistickej sezóny a spodné časti palácov (prízemie a suterén) budú uzatvorené počas celého roku 2022, kedy bude prebiehať ich obnova s prístupom z oploteného staveniska – zo severnej strany.
- románsky palác bude prístupný až po jeho obnove, t.j. celkovom ukončení prác 2. etapy stavby, t.j. od r. 2023, resp. letnej sezóny od 04/2024
- minimalizovať dĺžku postaveného lešenia
- stavebné a reštaurátorské práce je možné realizovať iba počas letnej sezóny, t. j. apríl – október, pokiaľ to teplotné podmienky dovoľia.

Predpokladané práce pre rok 2021:

Objekt SO. 02 ešte bude prístupný verejnosti počas letnej turistickej sezóny v r. 2021.

Románsky palác – SO.01

A/ interiérová stavba

1. bezpečnostné opatrenia, zariadenie staveniska


- realizácia potrebnej výdrevy/vystuženía a zabezpečenie bezpečnosti stavby a pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na jeho obnove


2. obnova klenby nad 1. podlažím

- realizácia archeologického výskumu a postupné rovnomerné odstraňovanie násypov z klenby nad 1. podlažím, obnaženie rubu klenby a jej postupná statická sanácia (rubovej a lícnej strany), pričom sa predpokladá aj premurovanie kamenných častí stredových pilierov v 1. podlaží, poškodených častí murív, ako aj tých častí klenieb, u ktorých bude zistený stav, ktorý neumožní sanáciu, ale vyžiada si rekonštrukciu. Predpokladá sa ukončenie týchto prác v r. 2021 spolu s úpravou zvislých murív pre osadenie, ako aj samotné osadenie oceľových nosníkov, ktoré budú niesť podlahu 2. NP
- realizácia dočasného prekrytia podlahy s odvedením vody na zimu 2021/2022 (nutná ochrana obnovennej klenby).

B/ exteriérová stavba

1. postavenie lešenia pre práce realizované v r. 2021:

- lešenie pre reštaurátorskú a stavebnú obnovu exteriéru (otvory, fasády, koruna) – lešenie z vnútra nádvoría 

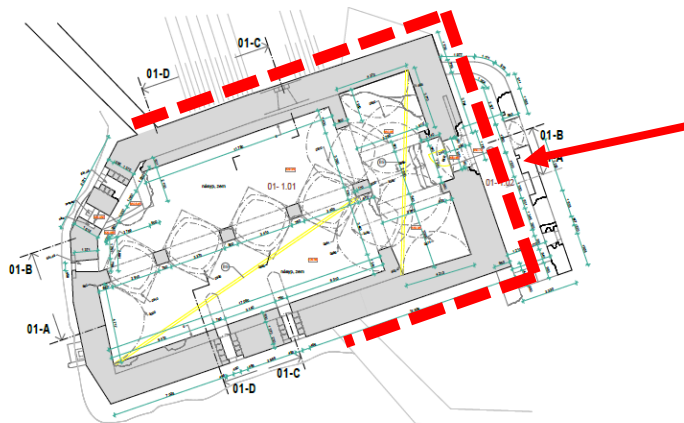

Murivá renesančnej schodiskovej prístavby
Objekt SO.05 a

2. **Reštaurátorské práce** – obnova povrchov stien a otvorov (združené okná, arkier, rekonštrukcia - portály) a fasády (omietky, kameň) v rozsahu postaveného lešenia.
3. **Stavebné práce** – zamurovanie sekundárnych otvorov, premurovanie koruny muriva.

C/ extravilán

SO.05a – úpravy plôch nádvorja

- sanácia ruiny južnej steny (renesančná schodisková prístavba pred románskym palácom)

Stavebný objekt SO.06:

- Sanácia brala
- Sanácia exteriérových stien – západné paláce (severozápadná časť od kruhovej červenej veže – pokračovanie prác z r. 2019/2020 – realizovaných z rom. predhradia)

Ukočenie stavebného objektu v roku 2021.

Západné paláce – SO.02

Stavebné práce

Výmena strechy nad kaplnkou a jej odvodnenie (napojením na pripravenú ležatú dažďovú kanalizáciu v rámci 1. etapy stavby)

- Koordinácia prác s reštaurátorskými prácami – premurovanie narušenej koruny murív na terase západných palácov
- Postavenie lešenia k realizovaným prácam

Reštaurátorské práce:

– sanácia murív a koruny stien z terasy **postupne čiastočným uzavretím** / ohradením priestoru pred vstupom návštevníkov – pokračovanie sanácie murív, ich korún a pôvodných omietok realizovaných na kapitálskom dome v r. 2019 a v podbrání v r. 2020 (počas 1. etapy obnovy).

- Reštaurovanie exteriéru kaplnky.

Súbežne prebiehajúce výskumy:

Archeologický výskum:

SO.01 románsky palác

Práce v interiéri románskeho paláca, násypy nad klenbou nad 1. N.P

Architektonicko – historický výskum :

SO.01 románsky palác


Práce v exteriéri románskeho paláca, kde bude postavené lešenie a súbežne budú prebiehať reštaurátorské práce, spolupráca pri realizácii archeologického výskumu.

Predpokladané práce pre rok 2022: Počas uzatvorenia objektov SO.01 a SO.02 počas celého roku 2022.

Románsky palác – SO.01

Interiér stavby

- realizácia archeologického výskumu v suteréne a postupné rovnomerné odstraňovanie násypov z podláh v 1. podlaží,
- **postavenie lešenia pre práce realizované v r. 2022** po celom obvode v interiéri paláca:
- lešenie pre reštaurátorskú a stavebnú obnovu exteriéru (otvory, steny, koruna) – lešenie vo vnútri paláca s dočasným prekrytím strieškou pre nepretržitú realizáciu prác počas celej sezóny **— — —**

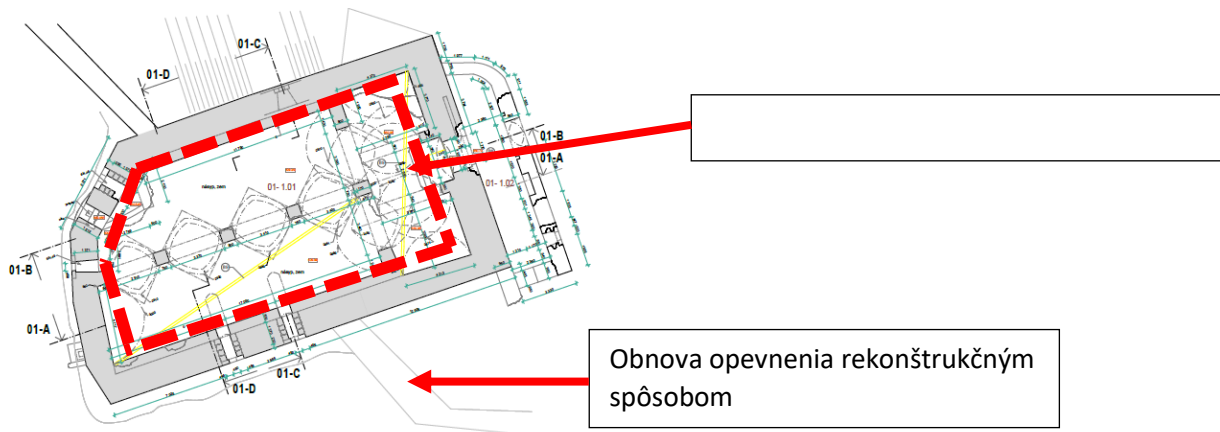

Reštaurátorské práce – obnova stien a otvorov (zdužené okná, arkier, rekonštrukcia - portály) zo strany interiéru paláca ako v 1., tak aj v 2. NP (omietky, kameň). **Ukončenie reštaurátorských prác v interiéri paláca.**

Stavebné práce – zamurovanie sekundárnych otvorov, koruna muriva po celom obvode paláca

- **Oceľová konštrukcia (OK)** príprava pre prekrytie membránou a súvisiace klampiarske práce.
- **Inštalčné rozvody** (dažďová voda, silnoprúd, slaboprúd, uzemnenie OK).

Západné paláce s kaplnkou – SO.02

Stavebné práce – kompletná obnova západných palácov a kaplnky v zmysle PD vrátane nových inštalácií (dažďová voda, silnoprúd, slaboprúd), nové povrchy a výplne.

Reštaurátorské práce – sanácia murív a klenieb v suteréne, prízemí, v interiéri a exteriéri palácov, na terasách a v kaplnke, obnova všetkých kamenných prvkov, ostení a omietok určených na reštaurovanie.

Ukončenie reštaurátorských prác na objekte.

SO.05a – úpravy plôch nádvorja

Spevnené a zelené plochy v mieste nástupu turistov k podbrániu pred Kapitánskym domom pre nerušený vstup návštevníkov do západných palácov z tohto priestoru.

Obnova opevnenia medzi románskym palácom a západnými palácami.

SO.11 – slaboprúdové rozvody, 2. časť

Exteriérové rozvody s ukončením prác (vonkajších rozvodov a inštalácií v jednotlivých objektoch) do konca letnej turistickej sezóny vrátane sfunkčnenia kamerového systému pred zimnou sezónou. **Ukončenie stavebného objektu v r. 2022.**

Súbežne prebiehajúce výskumy:

Archeologický výskum:

SO.01 románsky palác

Práce v interiéri románskeho paláca, podlahy v 1. NP.

SO.02 západné paláce

Práce v interiéri a na terasách západných palácov objekt SO.02, násypy nad klenbou nad 1. NP .

SO.05 spevnené plochy na nádvorí

Práce pri vstupe na nádvorie (severovýchodne od kapitánskeho domu) počas doby uzatvorenia vrchného nádvoria a obnovy opevnenia medzi románskym palácom a západnými palácami.

Architektonicko – historický výskum:

SO.01 románsky palác

Práce v interiéri románskeho paláca, kde bude postavené lešenie a súbežne budú prebiehať reštaurátorské práce, spolupráca pri realizácii archeologického výskumu.

SO.02 západné paláce

Práce v interiéri palácov a kaplnky na miestach postaveného lešenia a v súčinnosti s realizátormi archeologického výskumu.

SO.05 spevnené plochy na nádvorí

Práce v súčinnosti s archeológmi v mieste odkrytých murív a nálezových situácií na nádvorí.

Diagnostika materiálov:

SO.01 románsky palác

SO.02 západné paláce s kaplnkou

Po postavení lešenia budú odobraté vzorky stavebných materiálov na ich diagnostiku.

Predpokladané práce pre rok 2023:

Objekt SO. 02 opätovne prístupný verejnosti počas letnej turistickej sezóny v r. 2023.

Románsky palác – SO.01

Interiér stavby


- Realizácia a ukončenie stavebných prác v interiéri paláca (povrchy, podlahy, inštalácie vrátane koncových zariadení a osvetlenia, výplňové konštrukcie, interiérové schodisko so zábradlím)
- Realizácia textilnej predpätej membrány.


Exteriér stavby

- Realizácia prístupového schodiska so zábradlím a jeho prepojenie s terasami objektu SO.02.

Extravilán:

postavenie lešenia pre práce realizované v r. 2023:

- lešenie pre reštaurátorskú a stavebnú obnovu exteriéru (otvory, fasády, koruna) – zo strany extravilánu hradu 

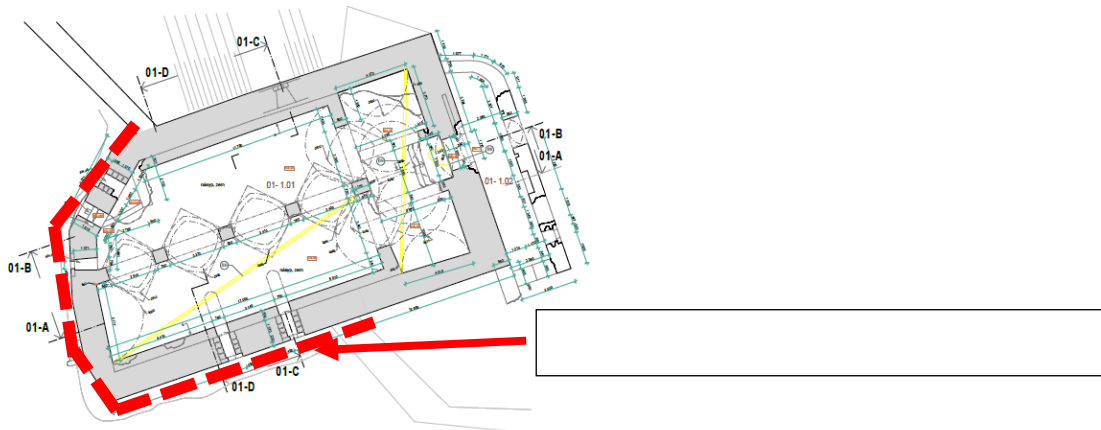

4. **Reštaurátorské práce** – obnova otvorov (združené okná, arkier) a fasád (omietky, kameň), severná a severozápadná stena zo strany extravilánu.
5. **Stavebné práce** – zamurovanie sekundárnych otvorov, koruna muriva

Ukončenie objektu paláca do konca r. 2023.

Západné paláce – SO.02

Stavebné práce

- kompletizácia, montáž koncových zariadení v interiéri (slaboprúd, silnoprúd, osvetlenie) v zmysle PD do začiatku letnej turistickej sezóny.
- realizácia prístupového schodiska so zábradlím na terasu zo severnej strany a jeho prepojenie s objektom SO.01 – románskym palácom.

Prístupenie a ukončenie objektu paláca s kaplnkou do začiatku letnej turistickej sezóny v r. 2023.

SO.05a – úpravy plôch nádvorja

Práce na spevnených plochách, odvedení dažďových vôd a zelené plochy.

Montáž dočasného oplotenia pre vymedzenie koridorov a oddelenie východných palácov.

Ukončenie prác na stavebnom objekte do konca r. 2023, maximálna doba pre vypratanie staveniska je do začiatku letnej turistickej sezóny v r. 2024.

Súbežne prebiehajúce výskumy:

Archeologický výskum:

SO.05 spevnené plochy na nádvorí

Práce pri realizácii úprav na hornom nádvorí a odvedení dažďových vôd.

Architektonicko – historický výskum

SO.01 románsky palác

Práce v exteriéri románskeho paláca (zo strany extravilánu), kde bude postavené lešenie a súbežne budú prebiehať reštaurátorské práce.

SO.05 spevnené plochy na nádvorí

Práce v súčinnosti s archeológmi v mieste odkrytých murív na nádvorí.

Diagnostika materiálov:

SO.01 románsky palác

Po postavení lešenia budú odobraté vzorky stavebných materiálov na ich diagnostiku.

Spracovala: Ing. arch. Magdalénma Janovská, GP
Levoča, 21.9.2020
