


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

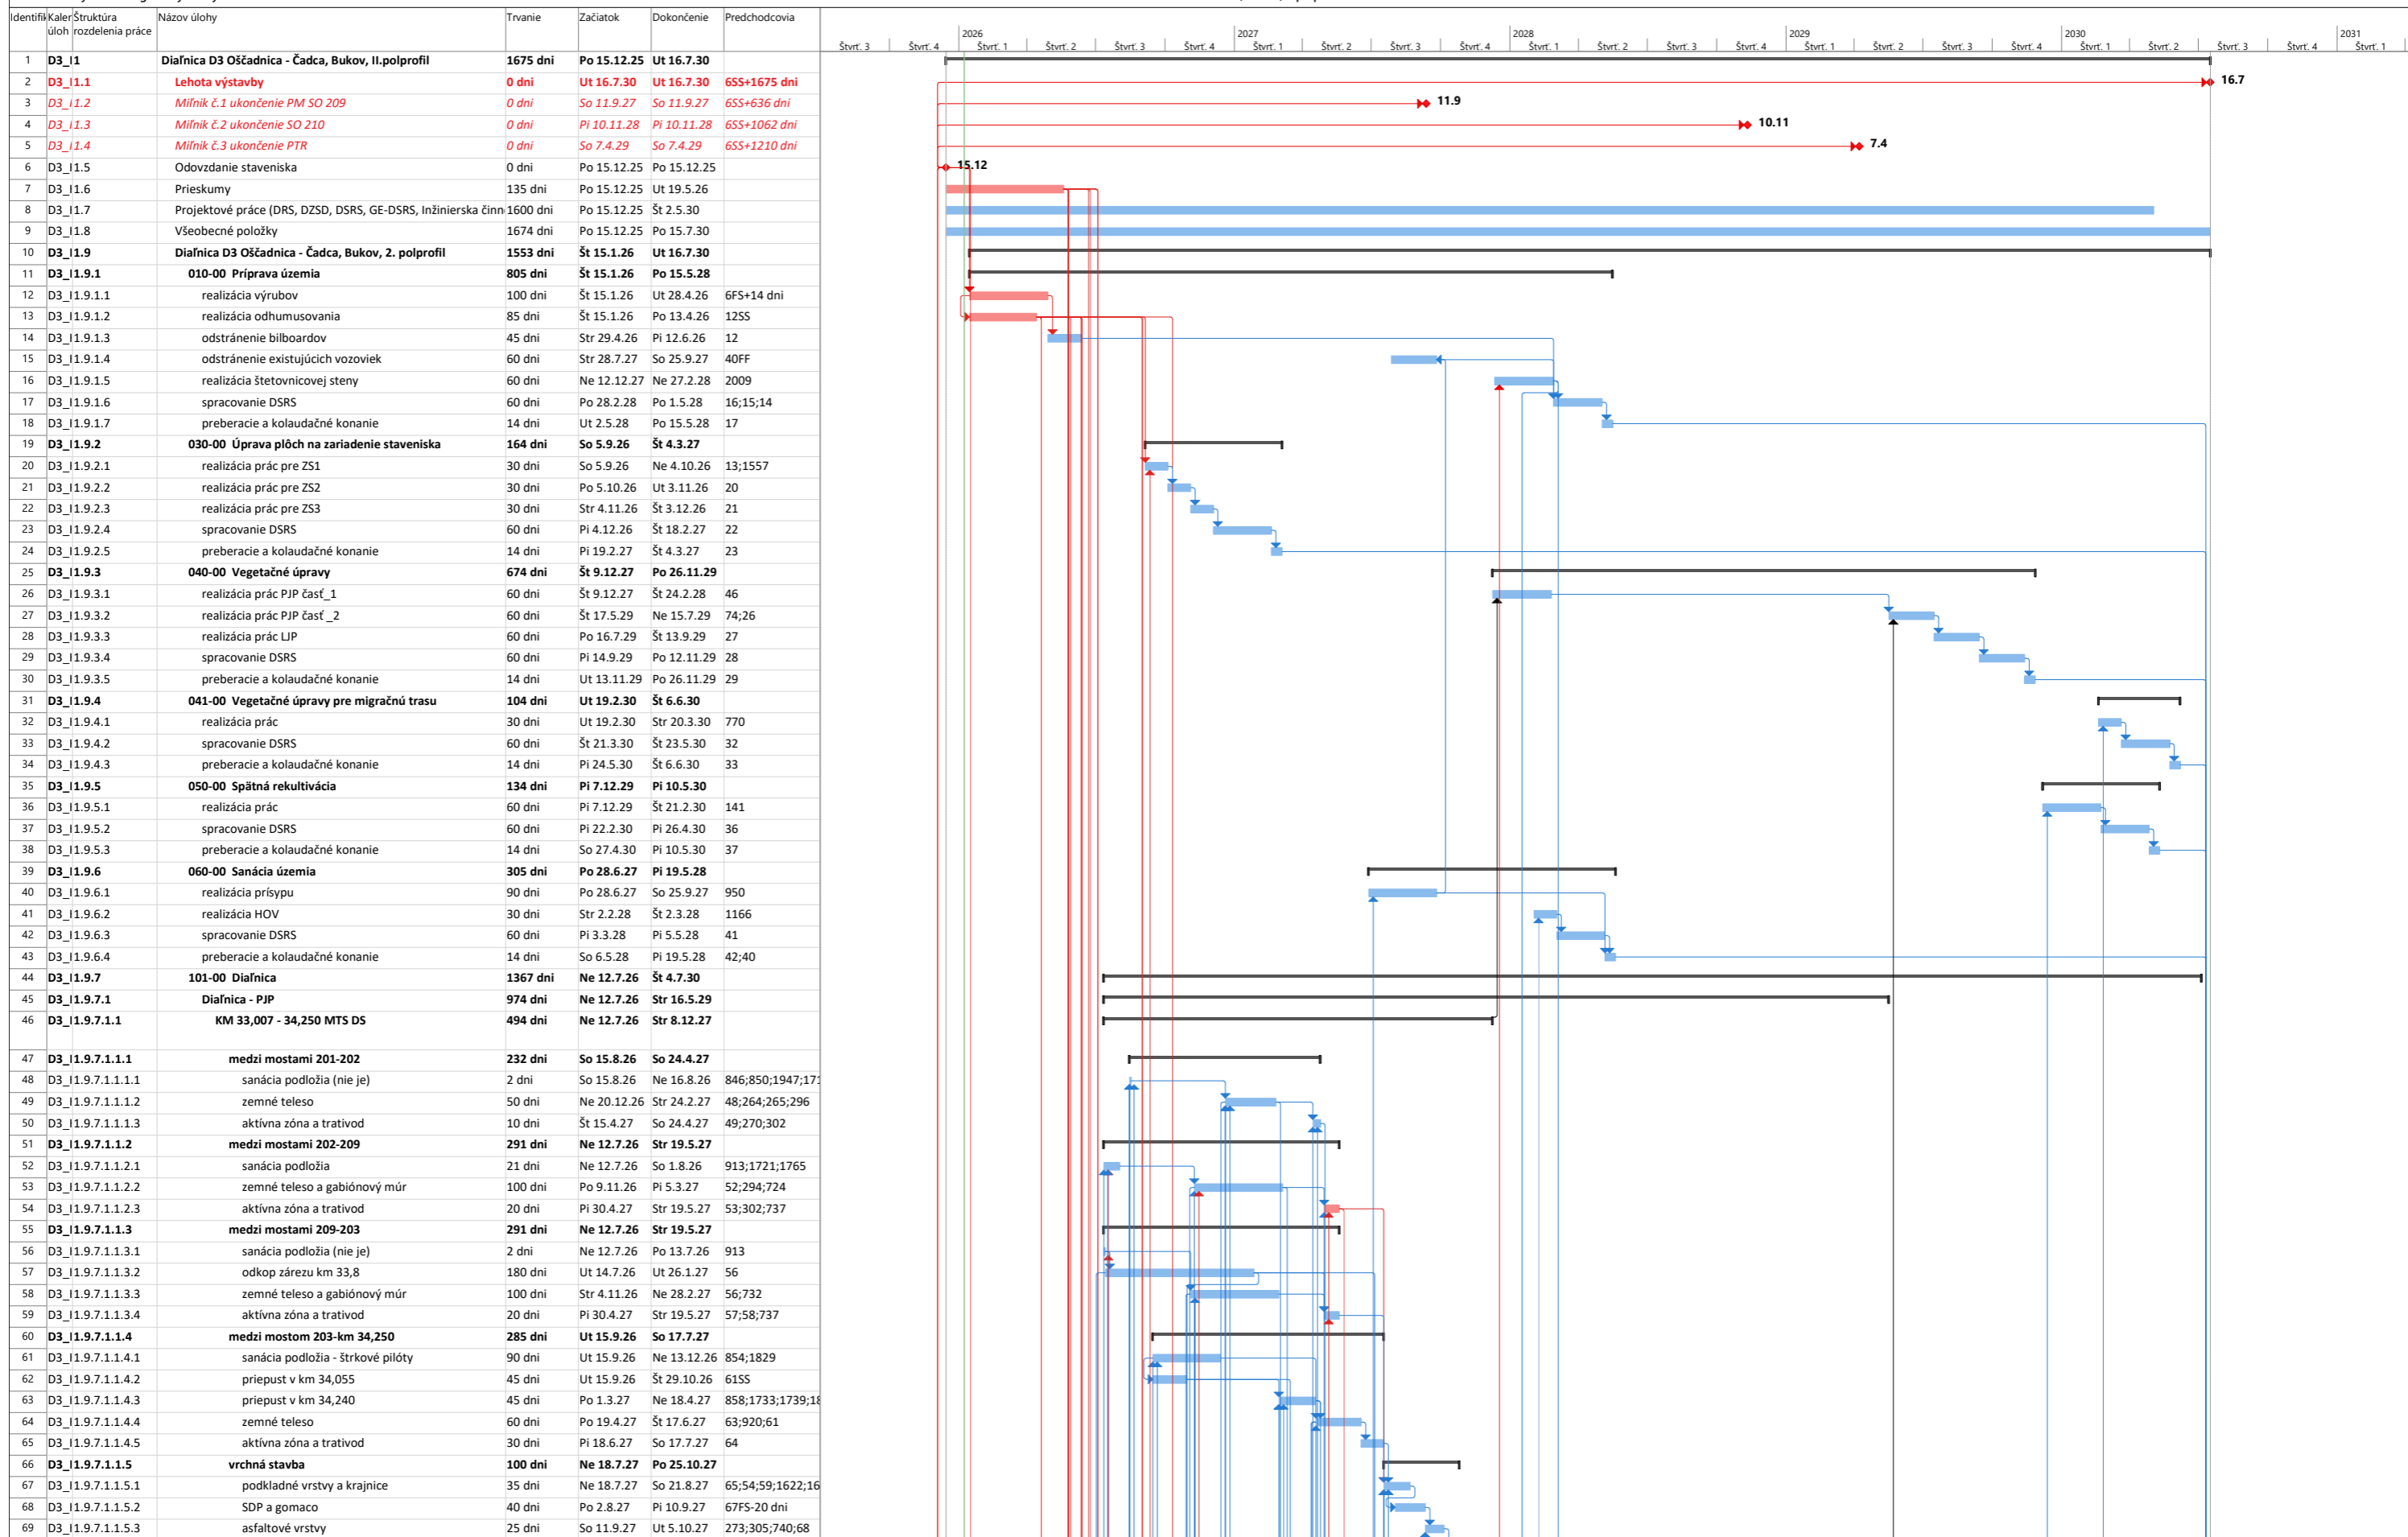


Harmonogram služieb a prác

- Úloha: Rozdeliť (blue bar), Súhrn (dotted line)
- Medzník: Medzník (black bar), Neaktívny medzník (grey bar)
- Súhrn projektu: Súhrn (black bar), Neaktívna úloha (grey bar)
- Manuálna úloha: Manuálna úloha (blue bar), Iba trvanie (black bar)
- Manuálny súhrn: Manuálny súhrn (blue bar), Iba začiatok (black bar), Iba dokončiť (black bar)
- Externé úlohy: Externé úlohy (grey bar), Externý medzník (grey bar)
- Termín: Termín (green diamond), Kritické (red diamond)
- Kritické rozdelenie: Kritické rozdelenie (red bar), Manuálny priebeh (blue bar)


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

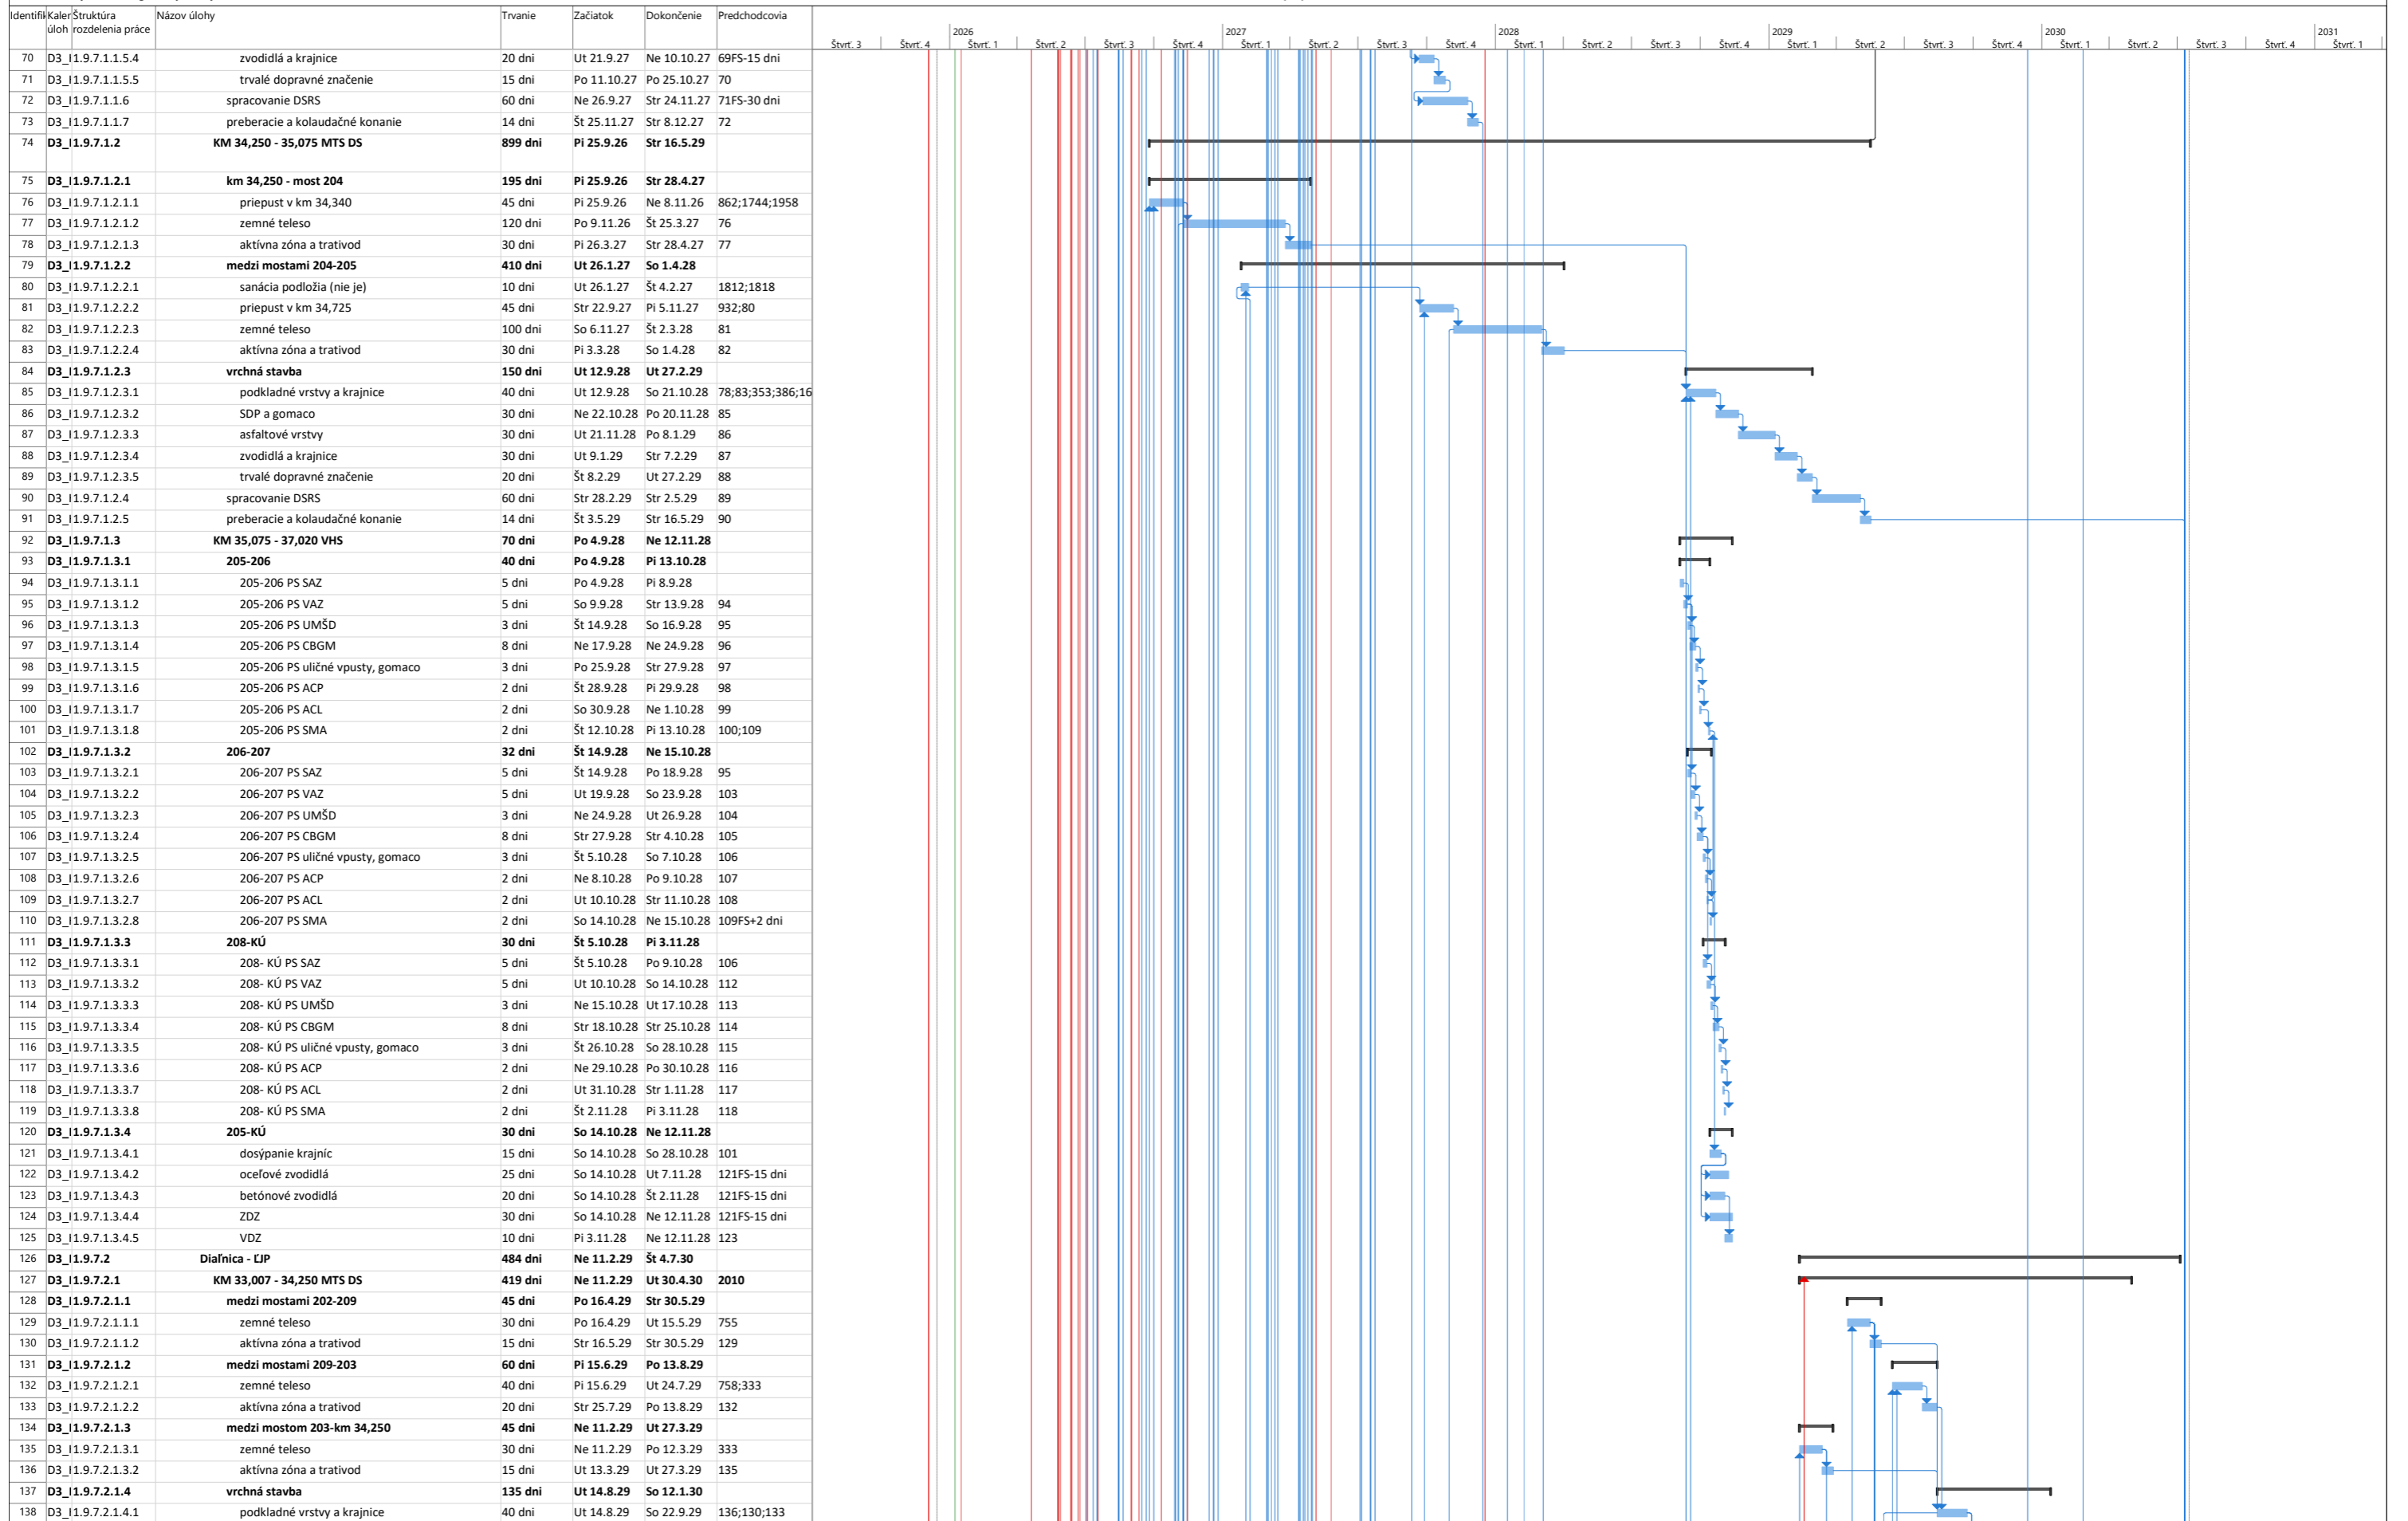



2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

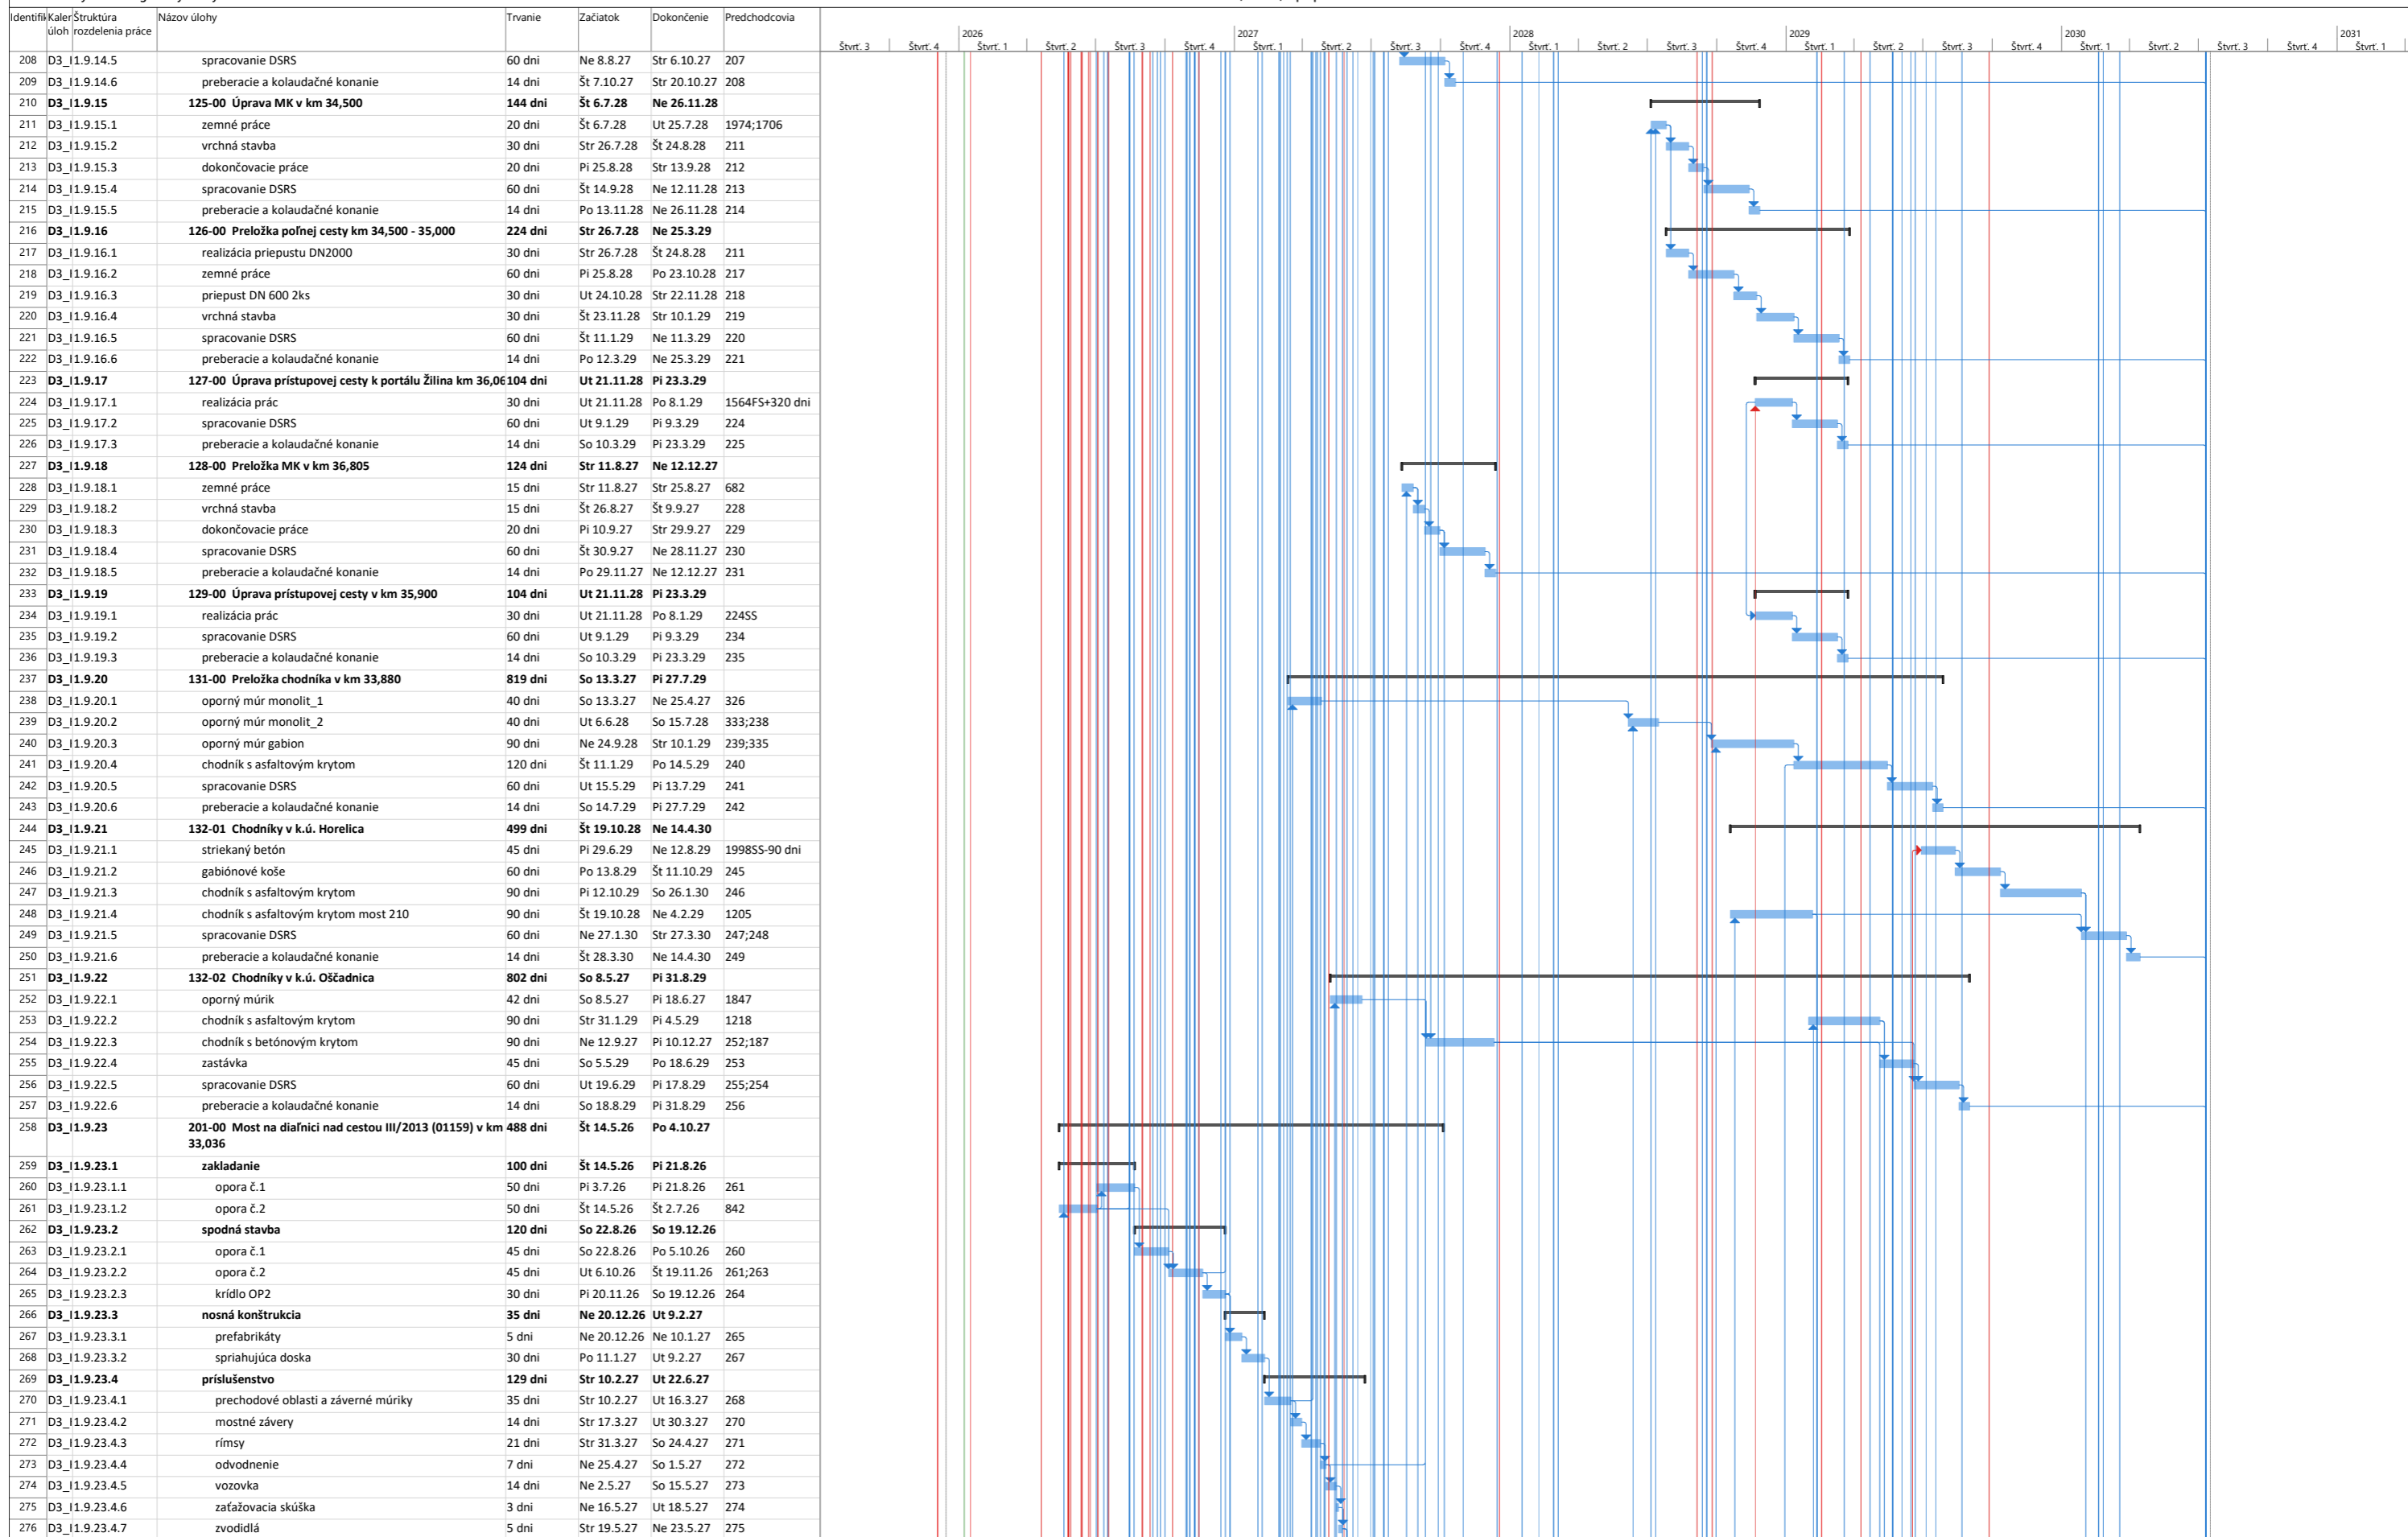



2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

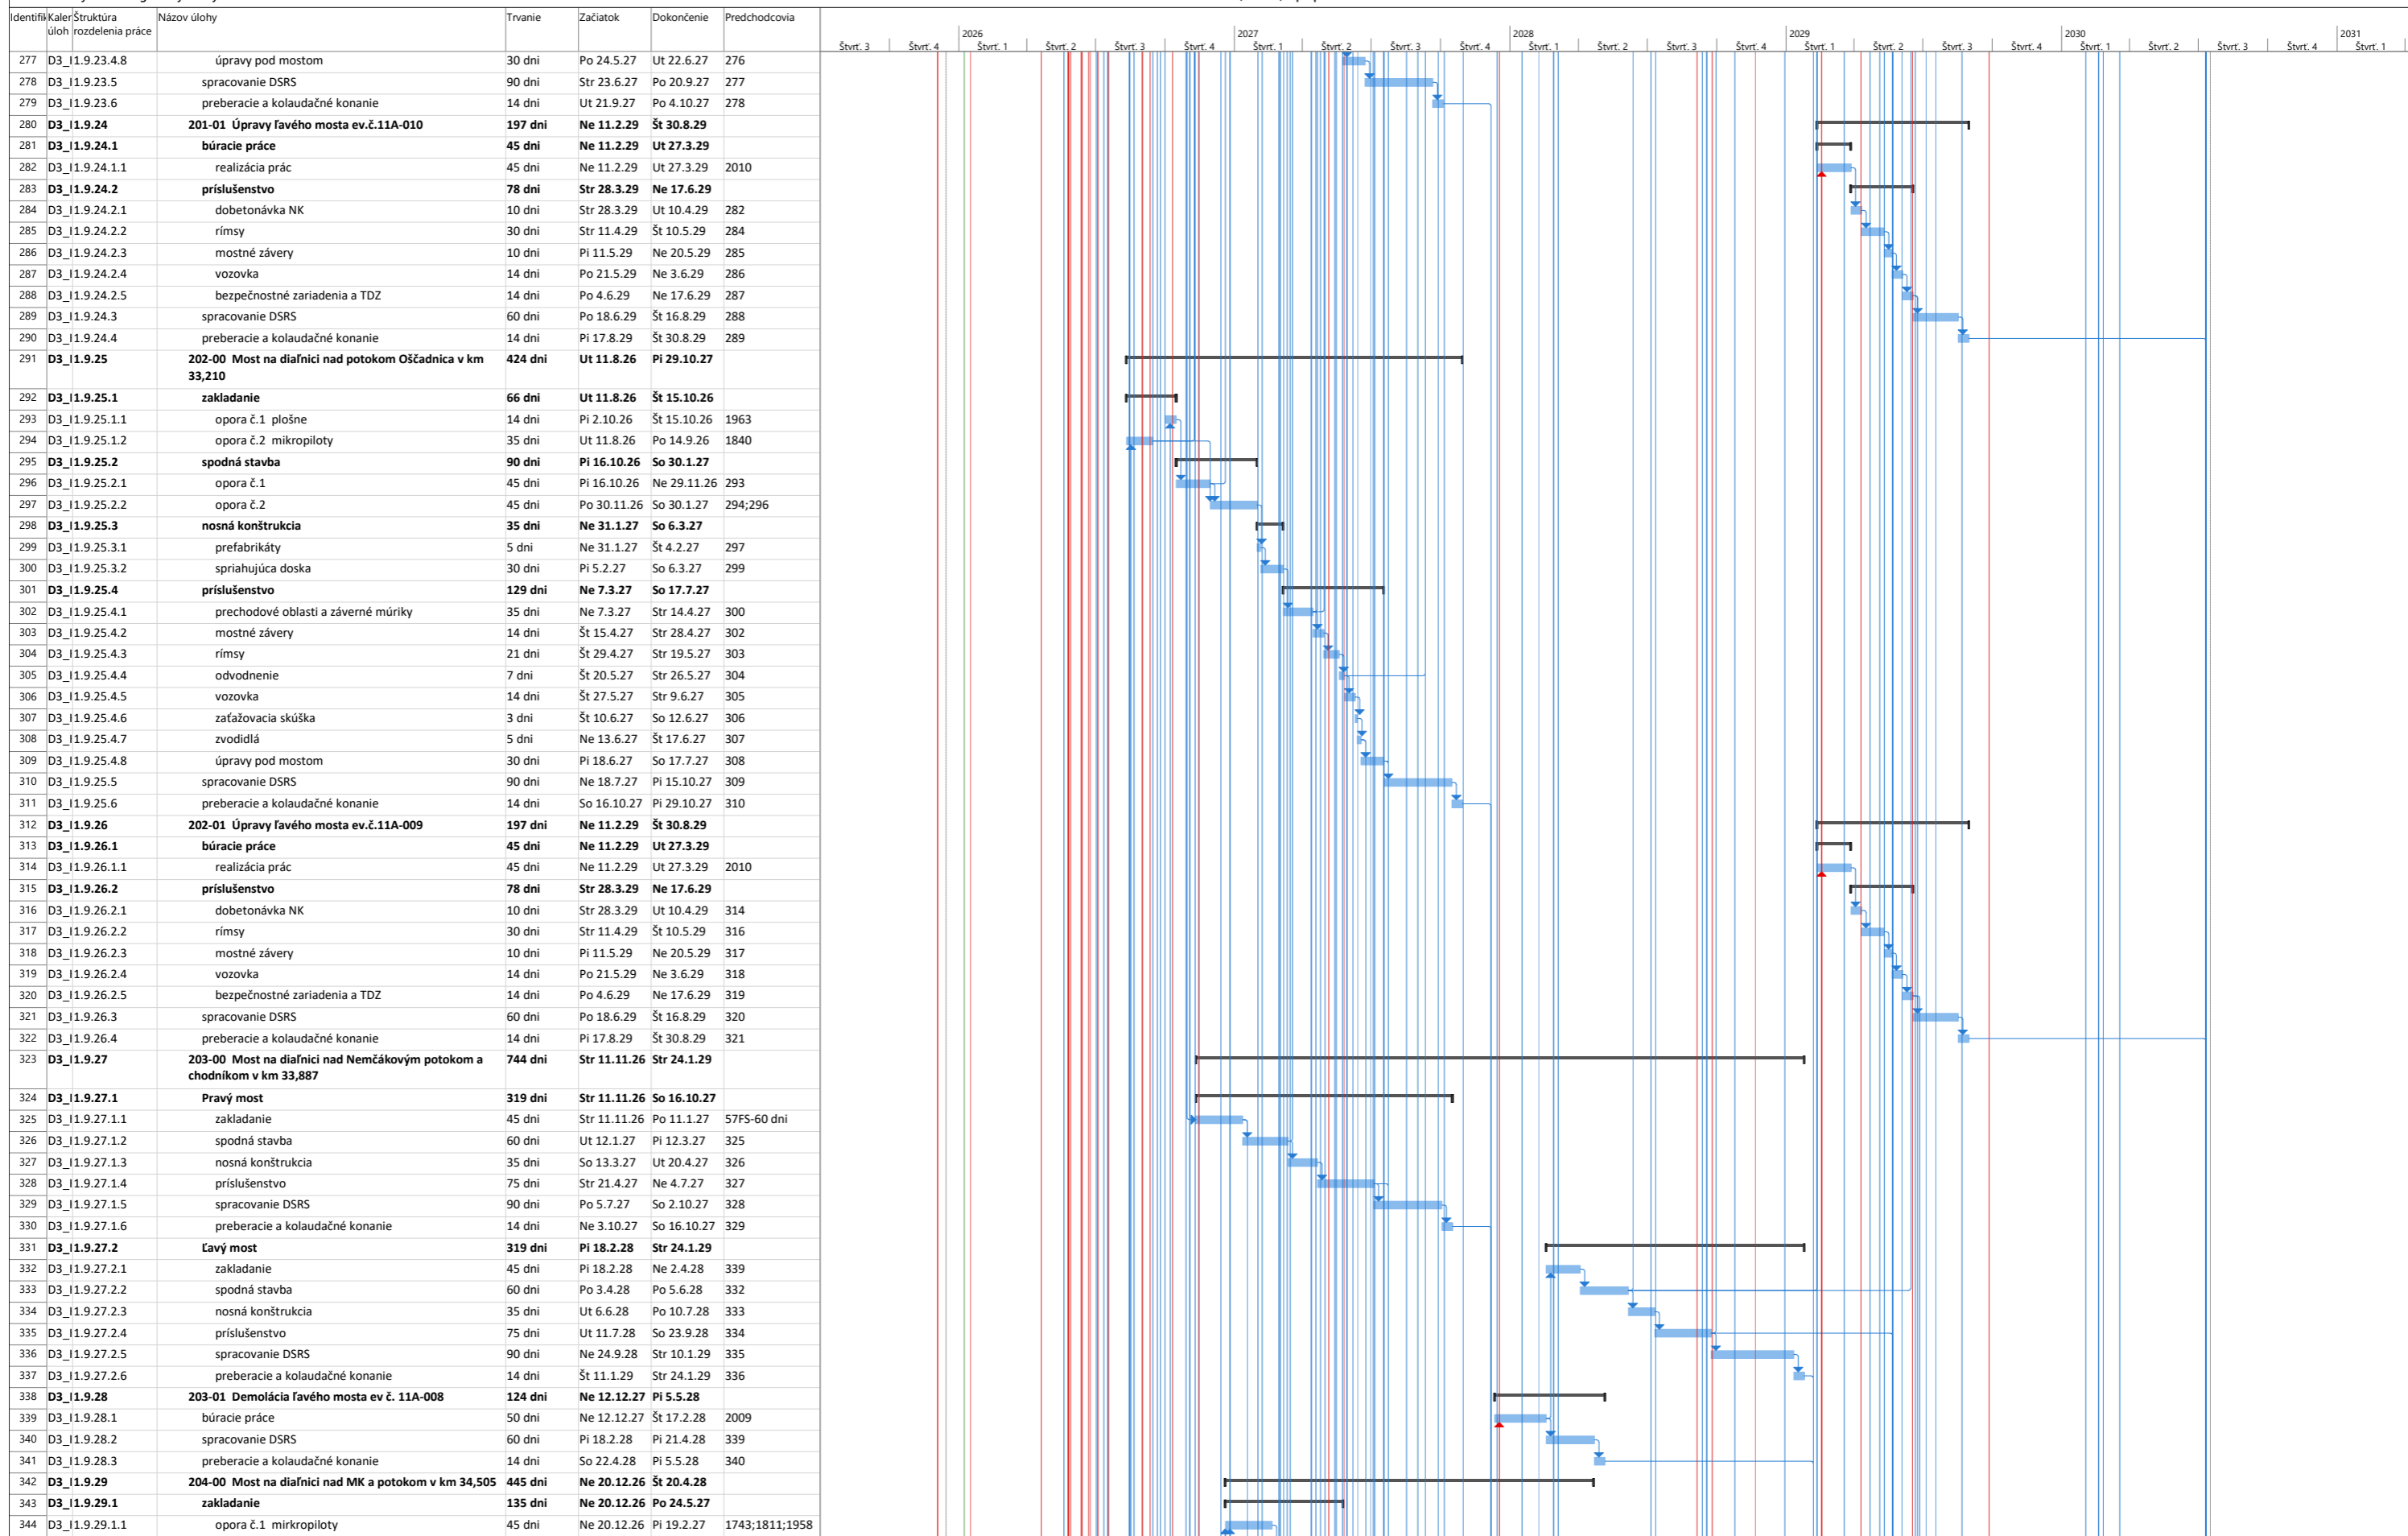


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

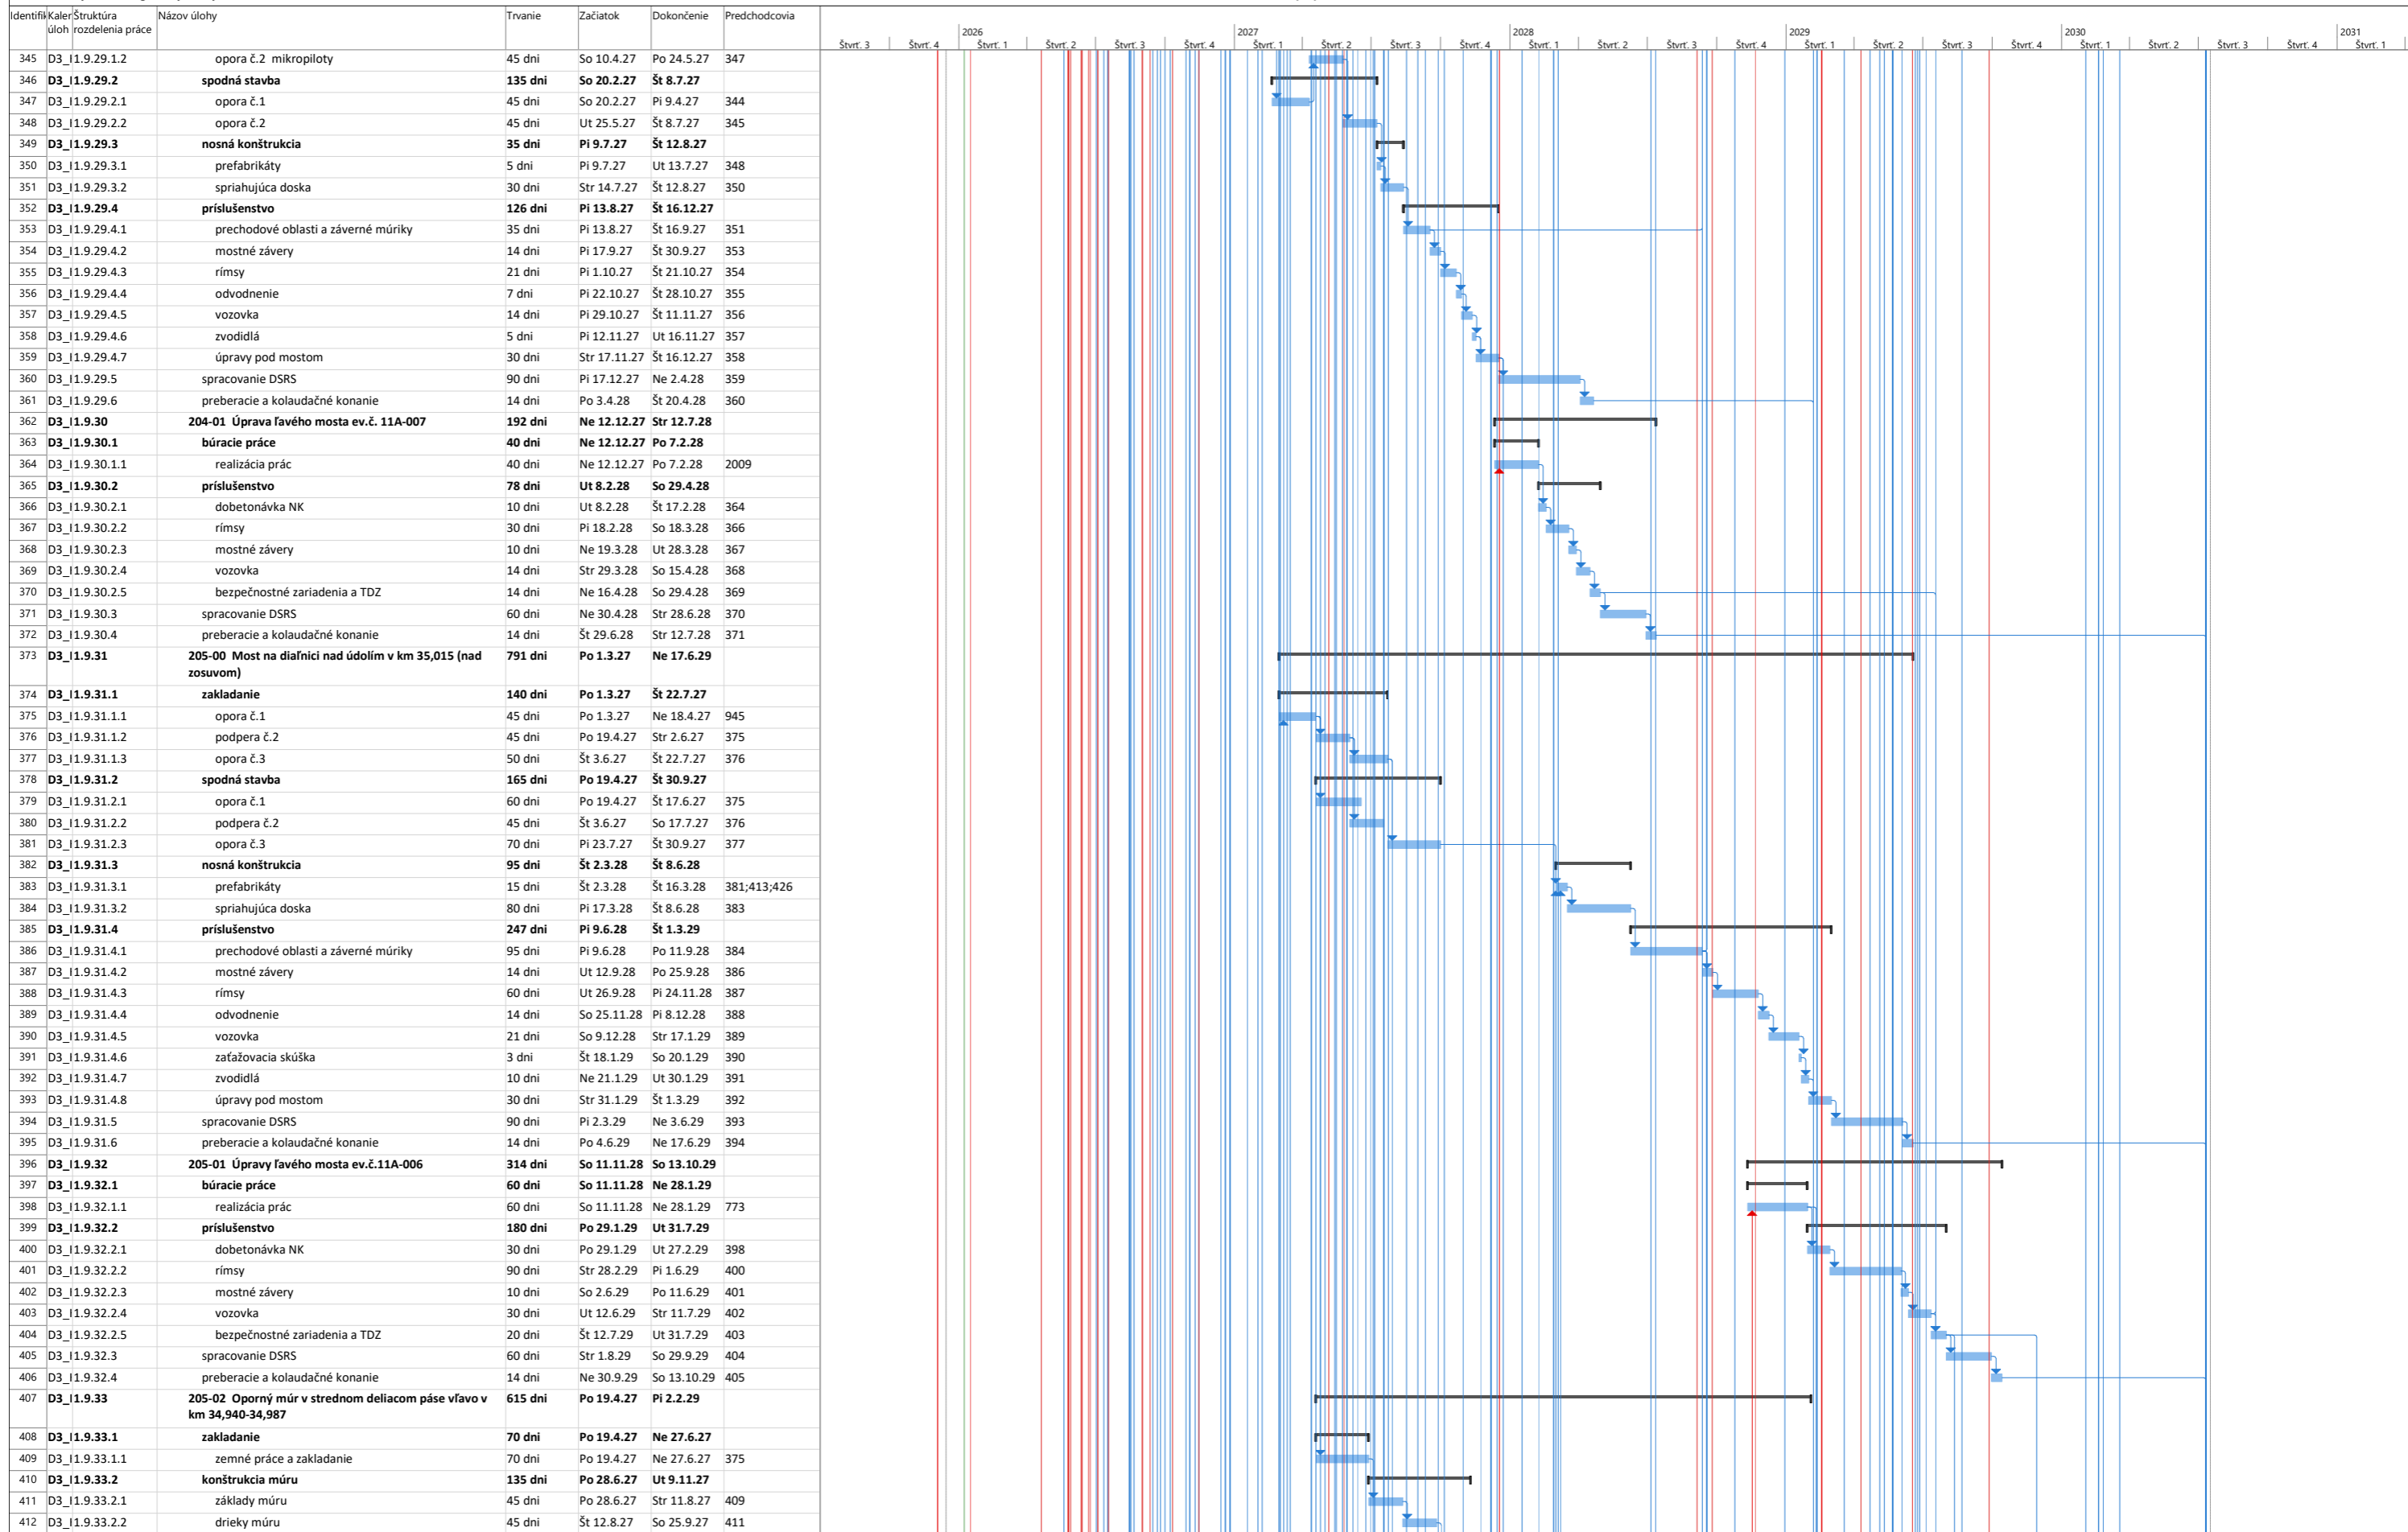


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

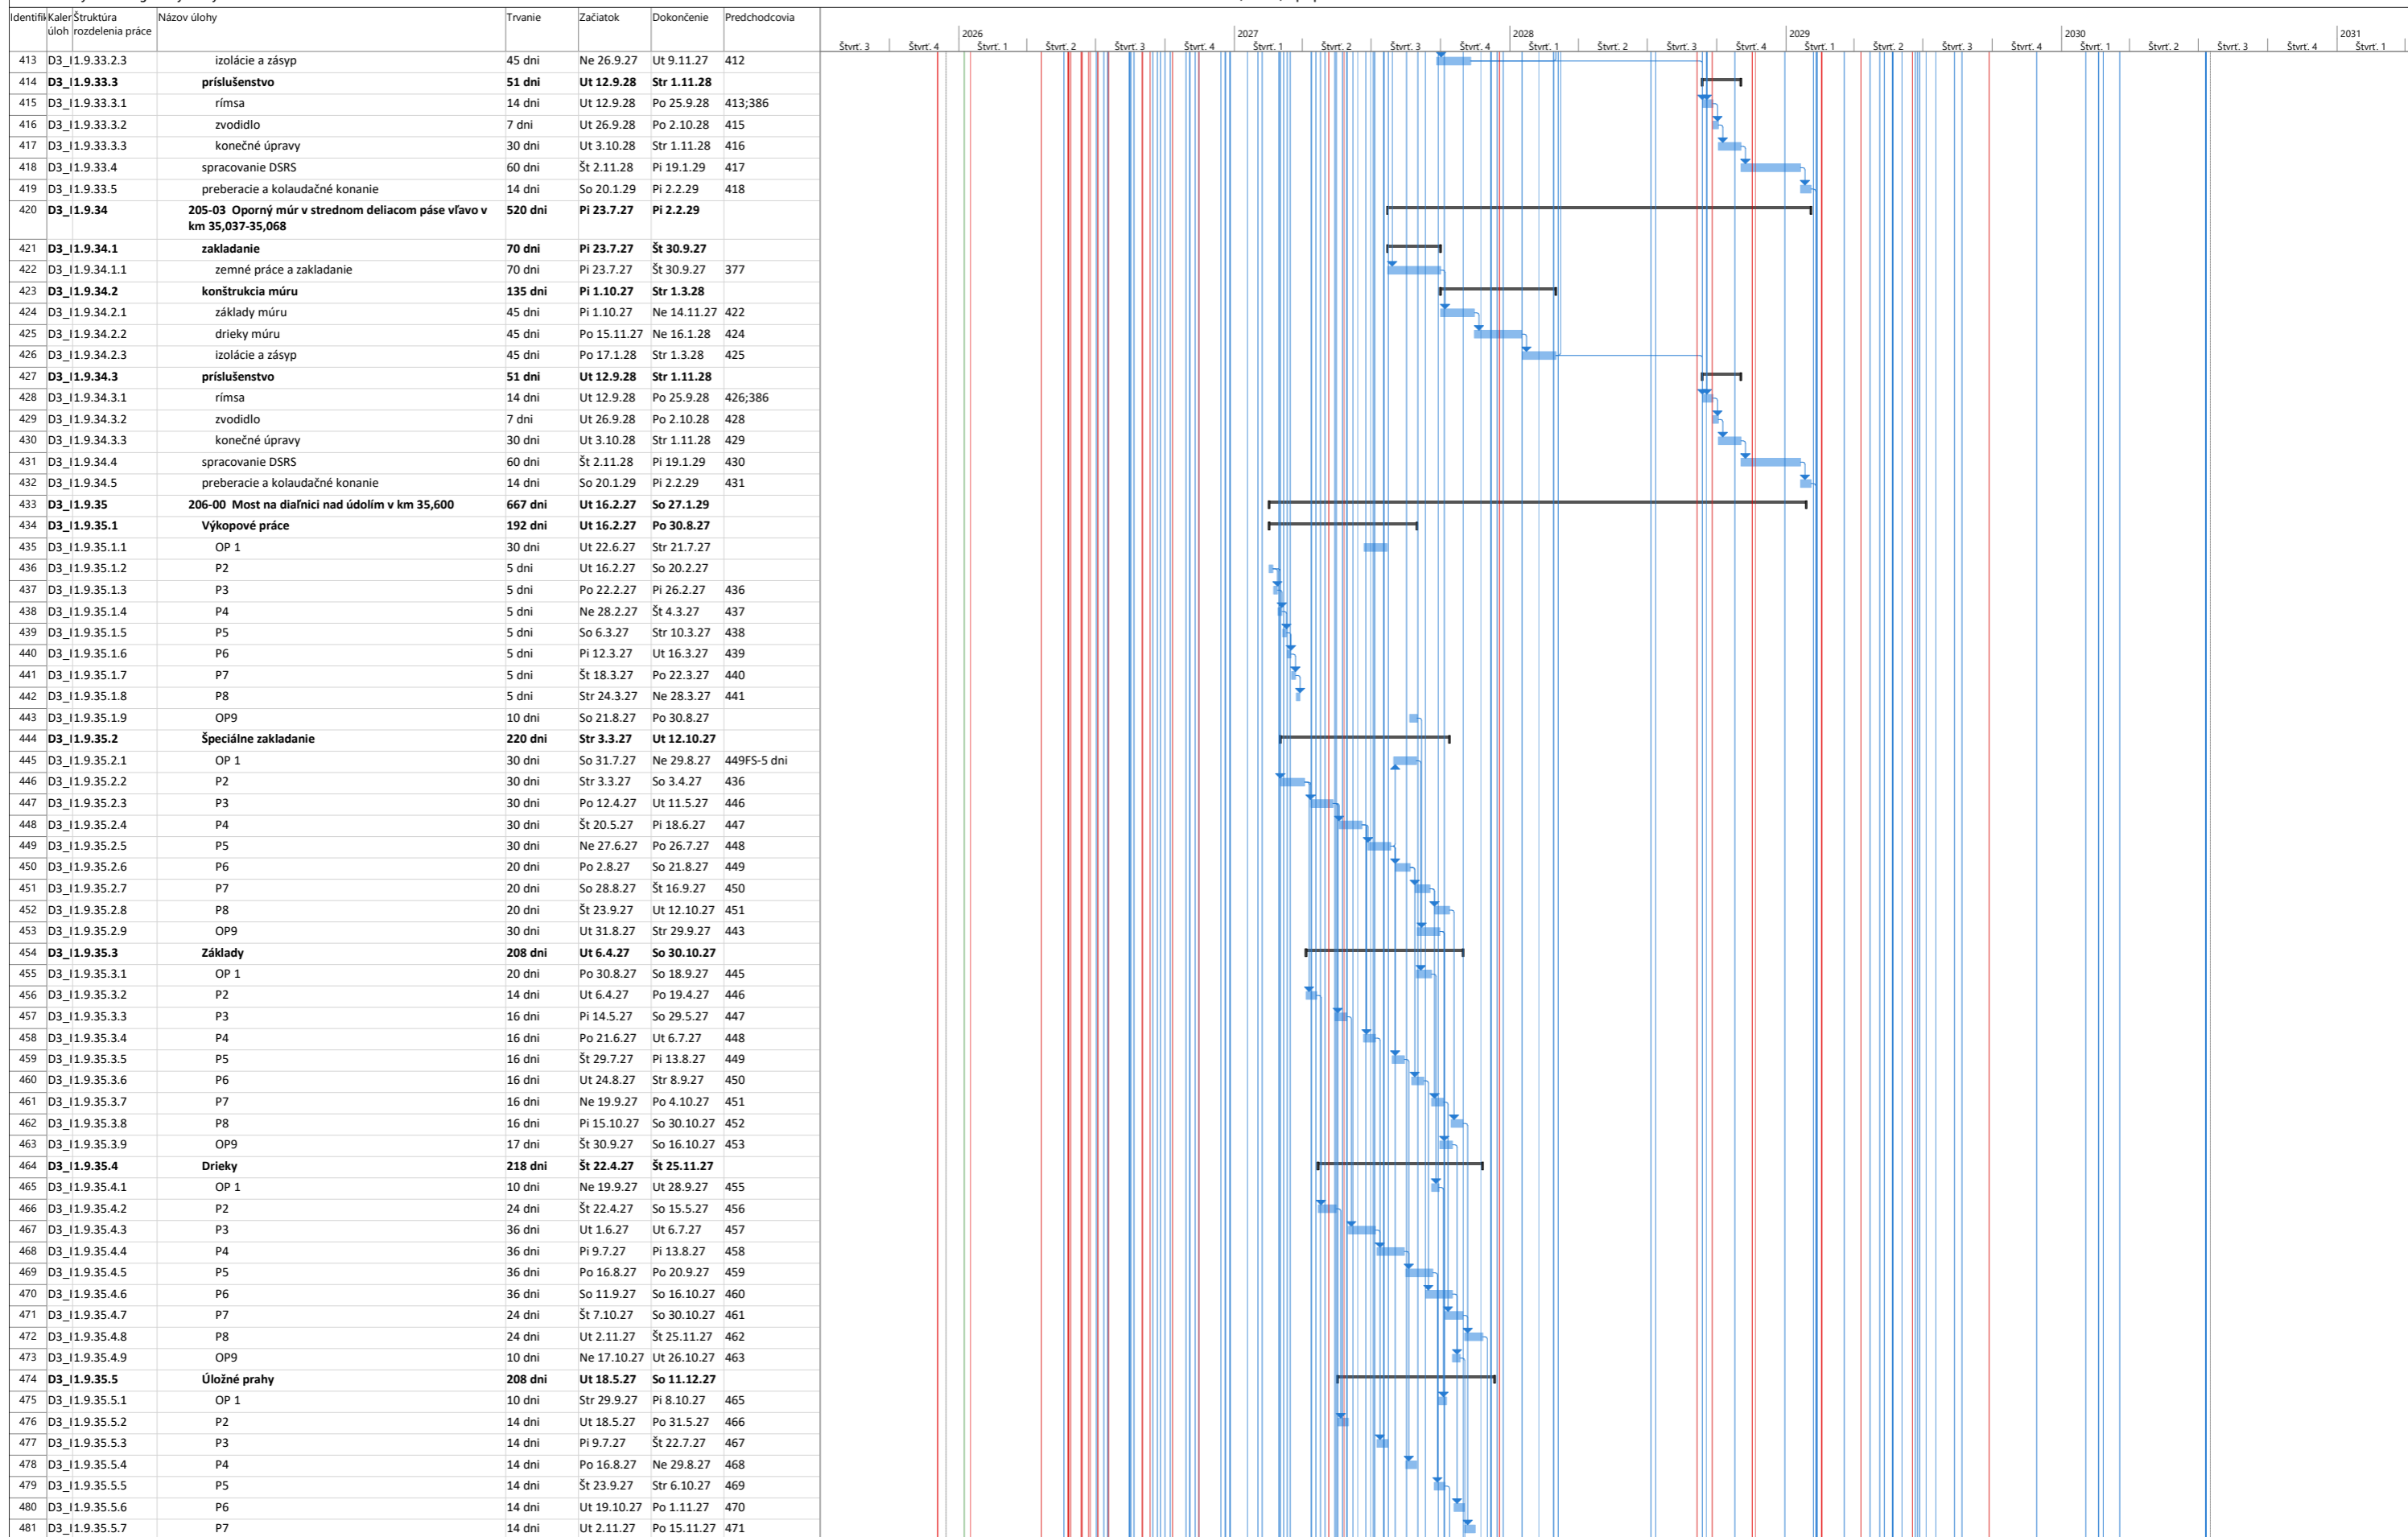

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

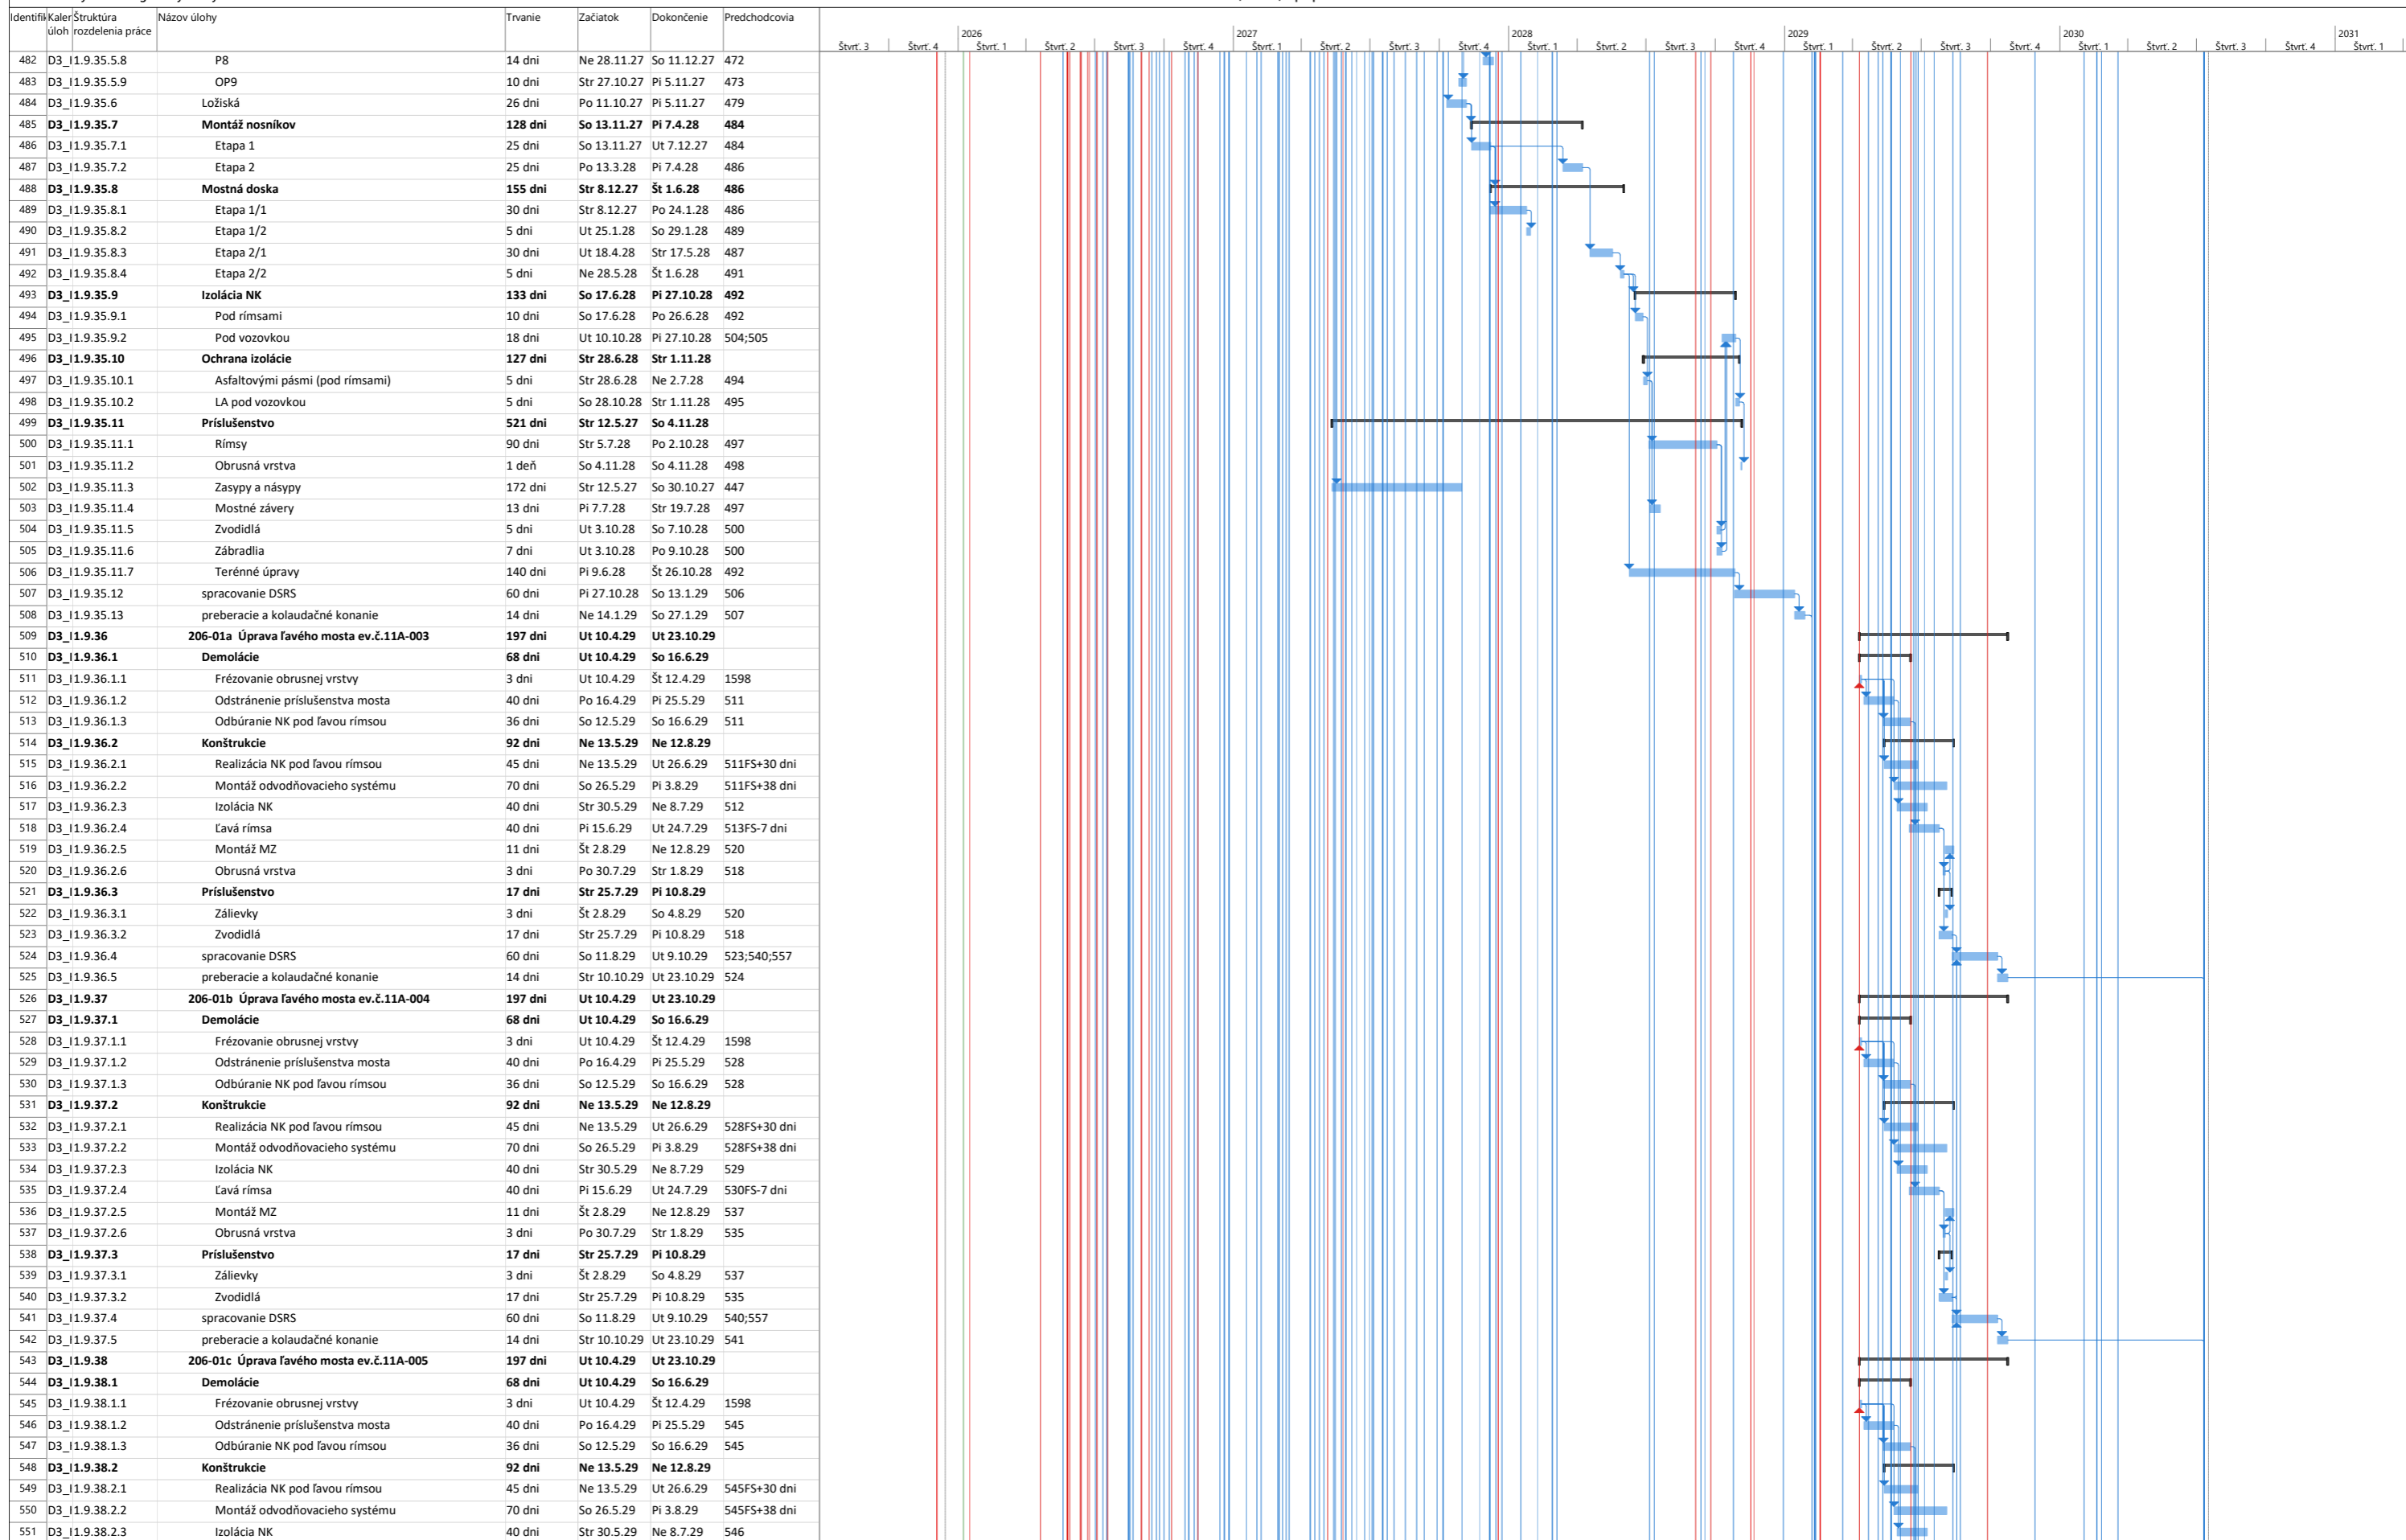


Harmonogram služieb a prác

█ Úloha ◆ Medzník ◆ Súhrn projektu ◆ Neaktívny medzník █ Manuálna úloha █ Manuálny súhrn █ Iba začiatok █ Externé úlohy █ Termín ◆ Kritické rozdelenie ◆ Manuálny priebeh █ Priebeh

⋯ Rozdeliť ⋯ Súhrn ⋯ Neaktívna úloha ⋯ Neaktívny súhrn ⋯ Iba trvanie ⋯ Manuálny súhrn ⋯ Iba dokončiť ⋯ Externý medzník ◆ Kritické █ Priebeh █ Manuálny priebeh


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

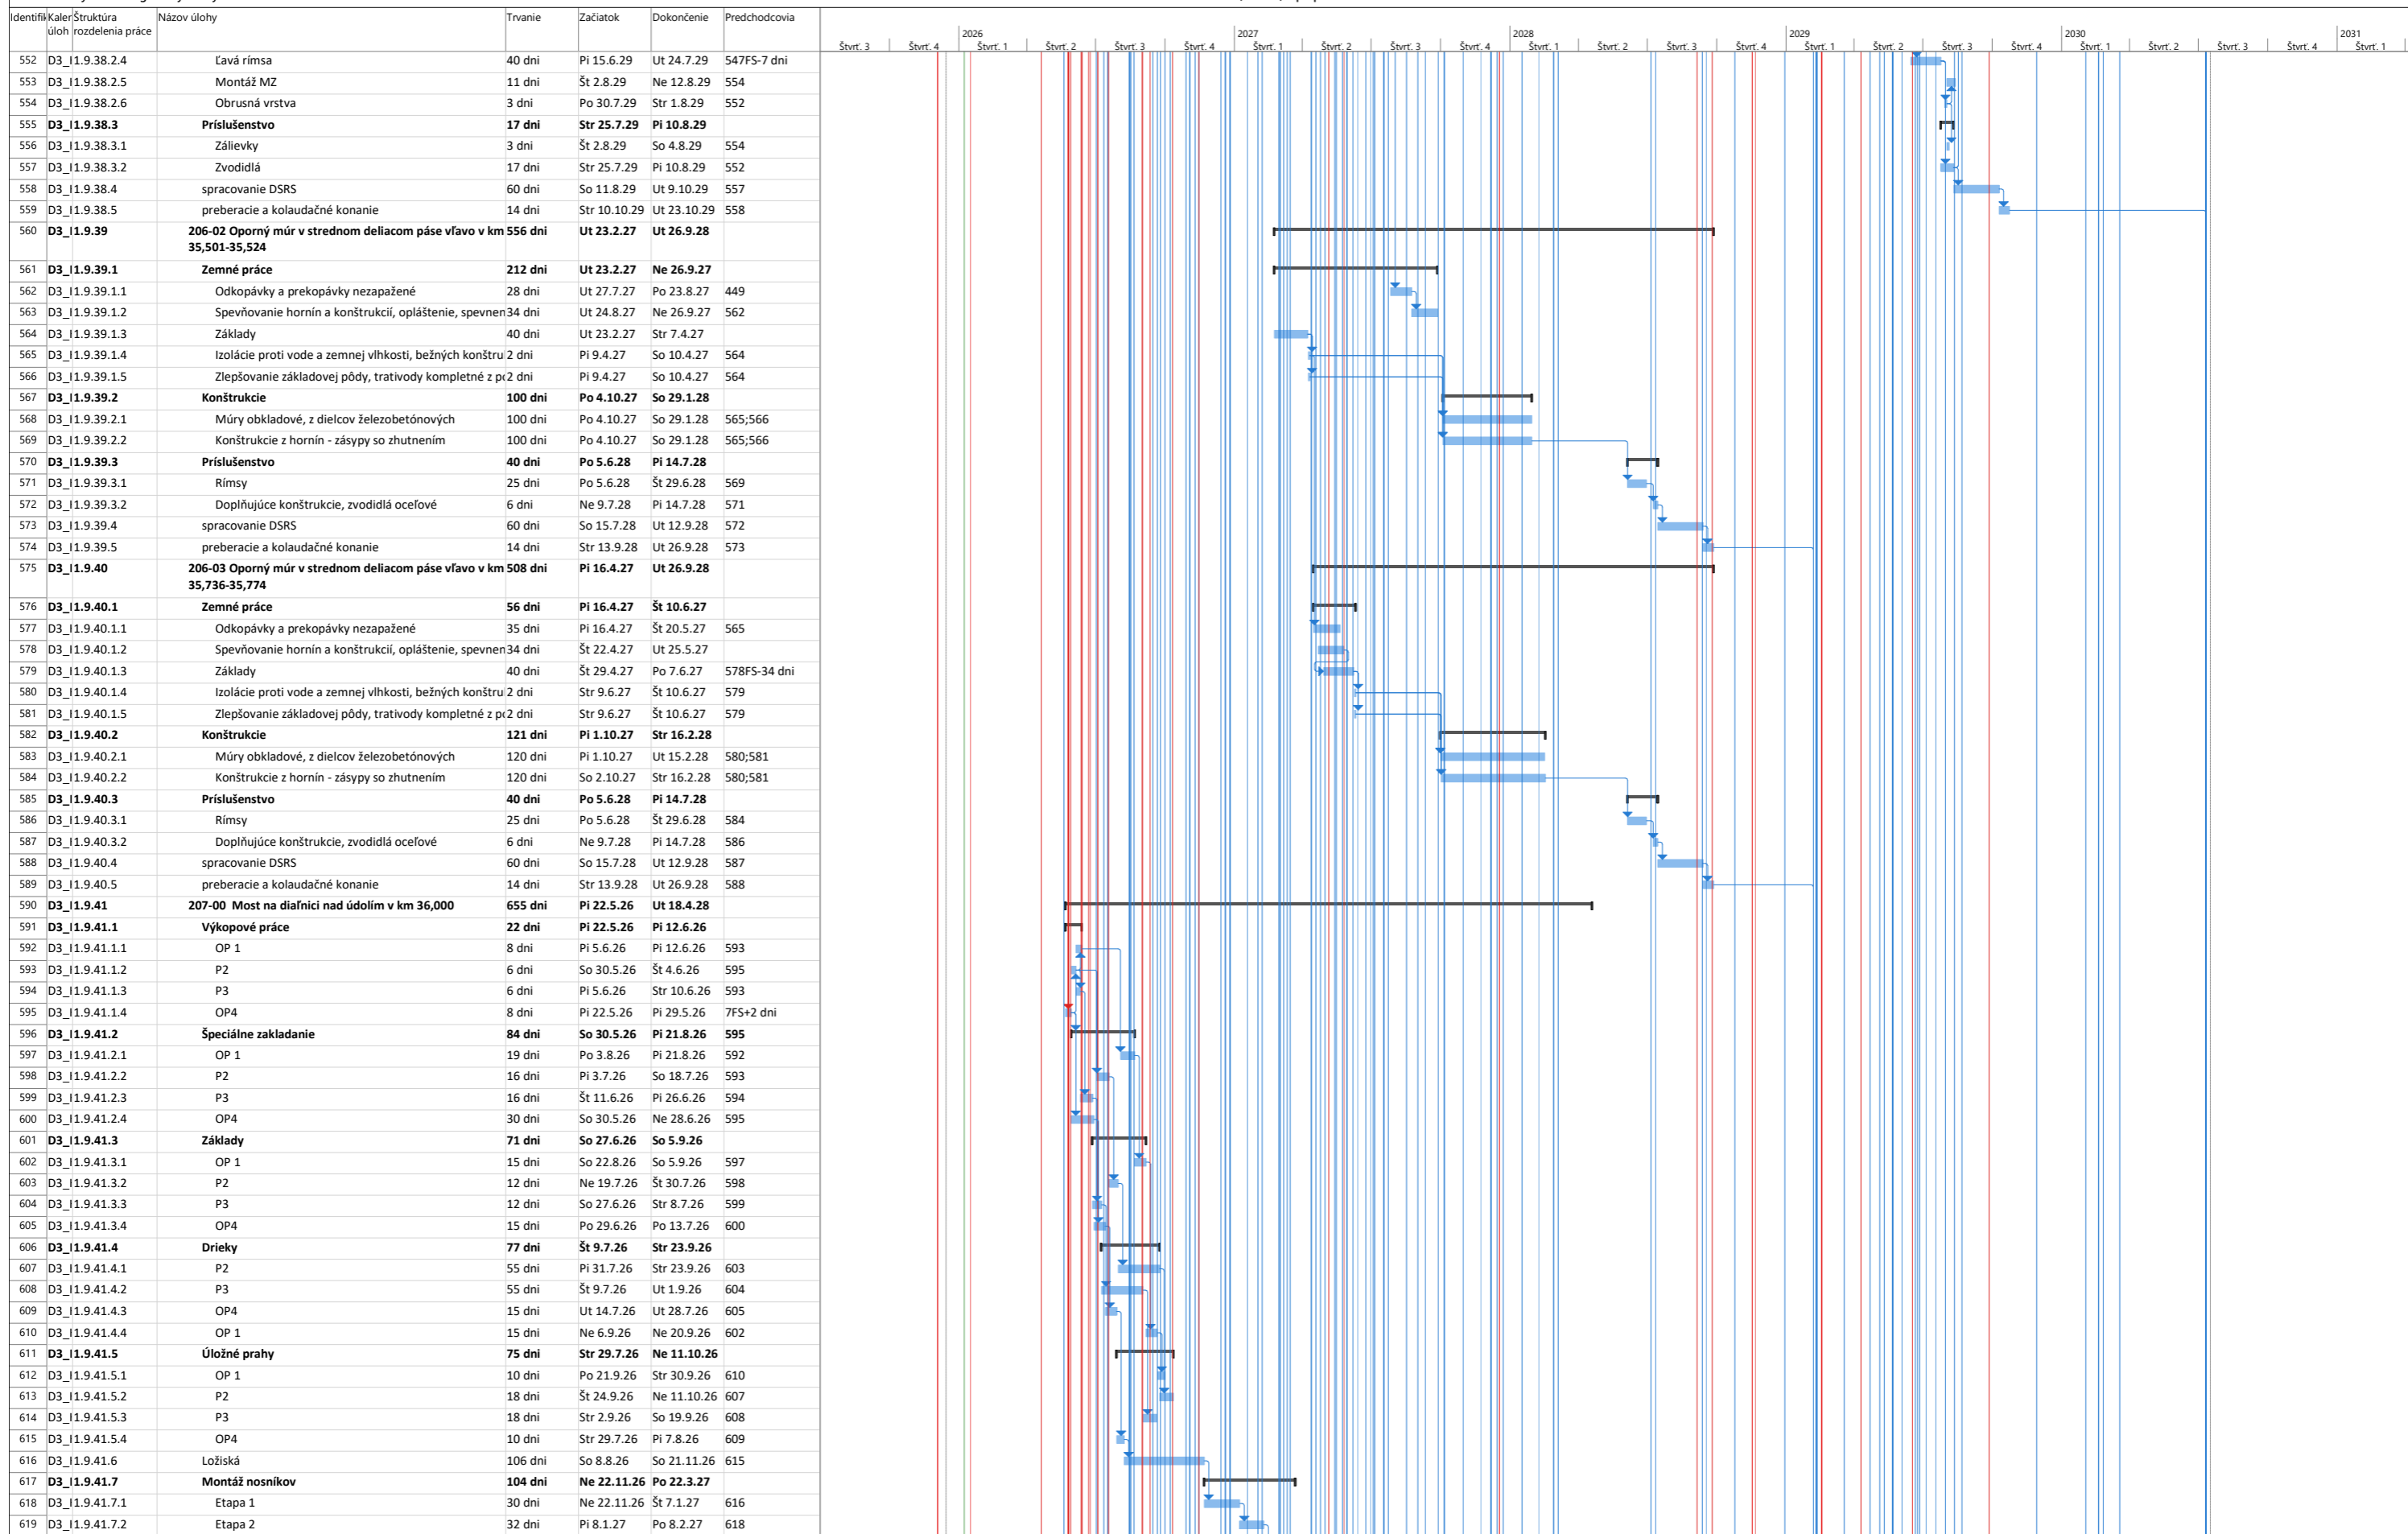



2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

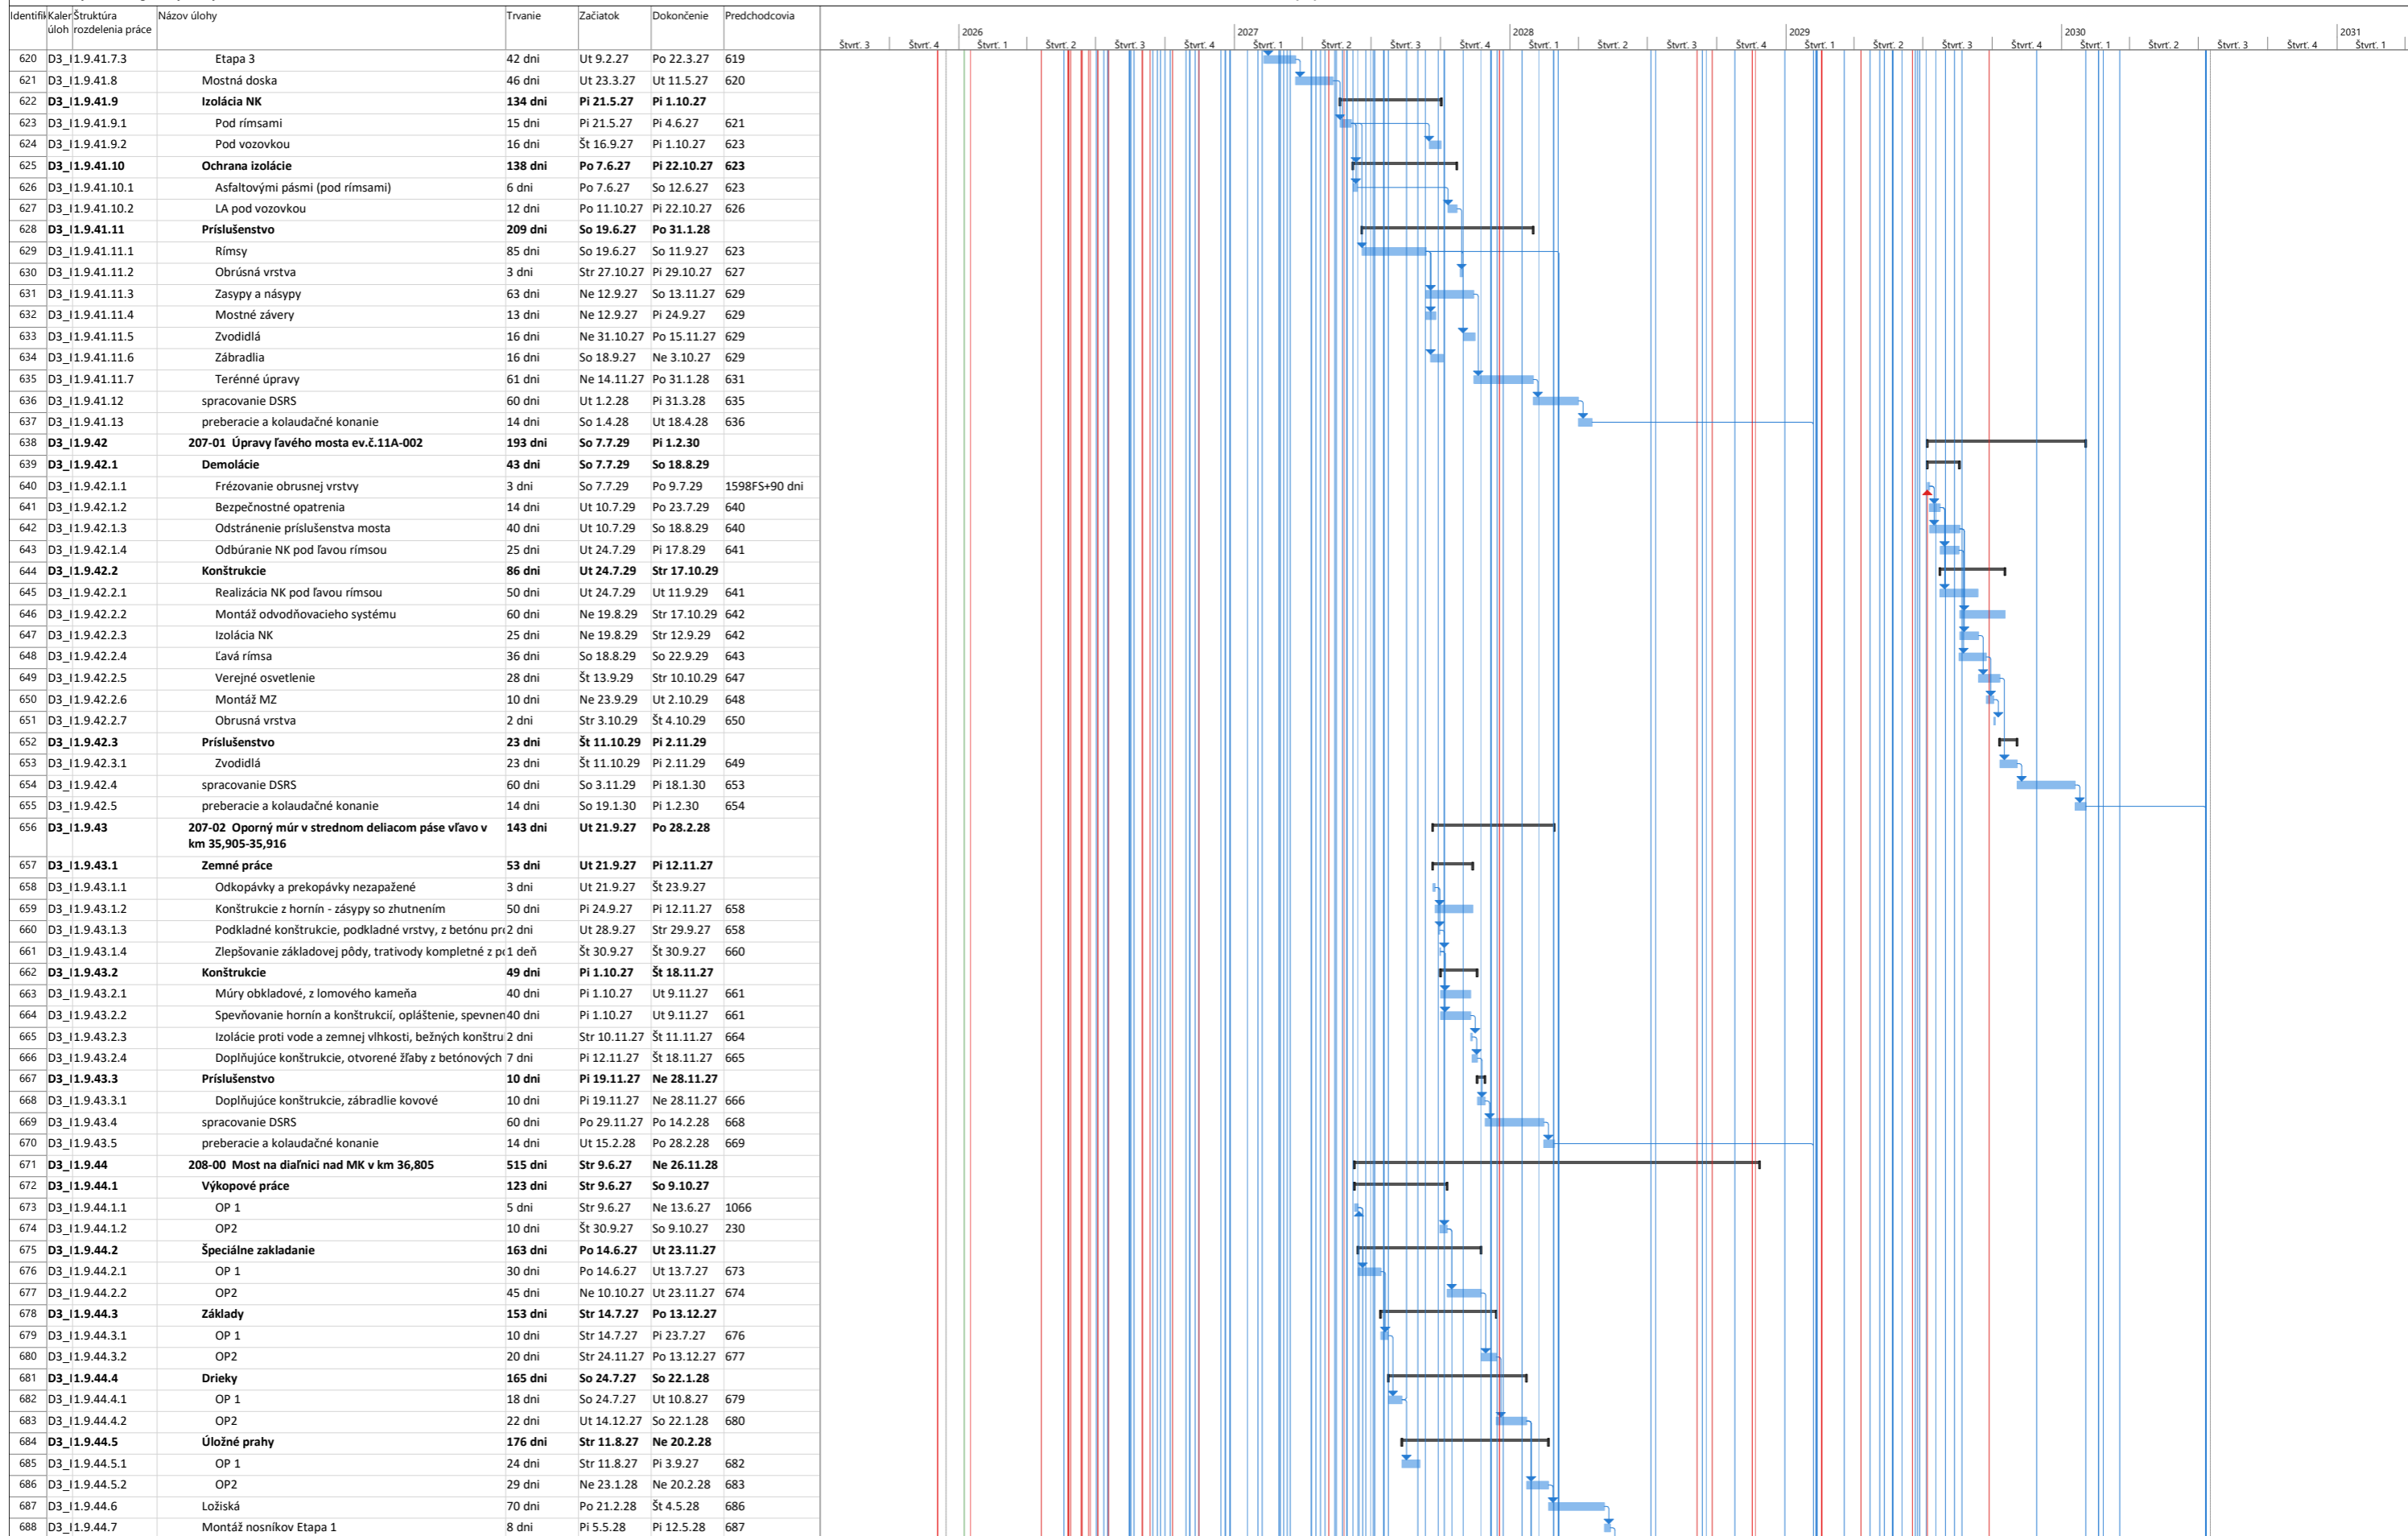


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby


Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

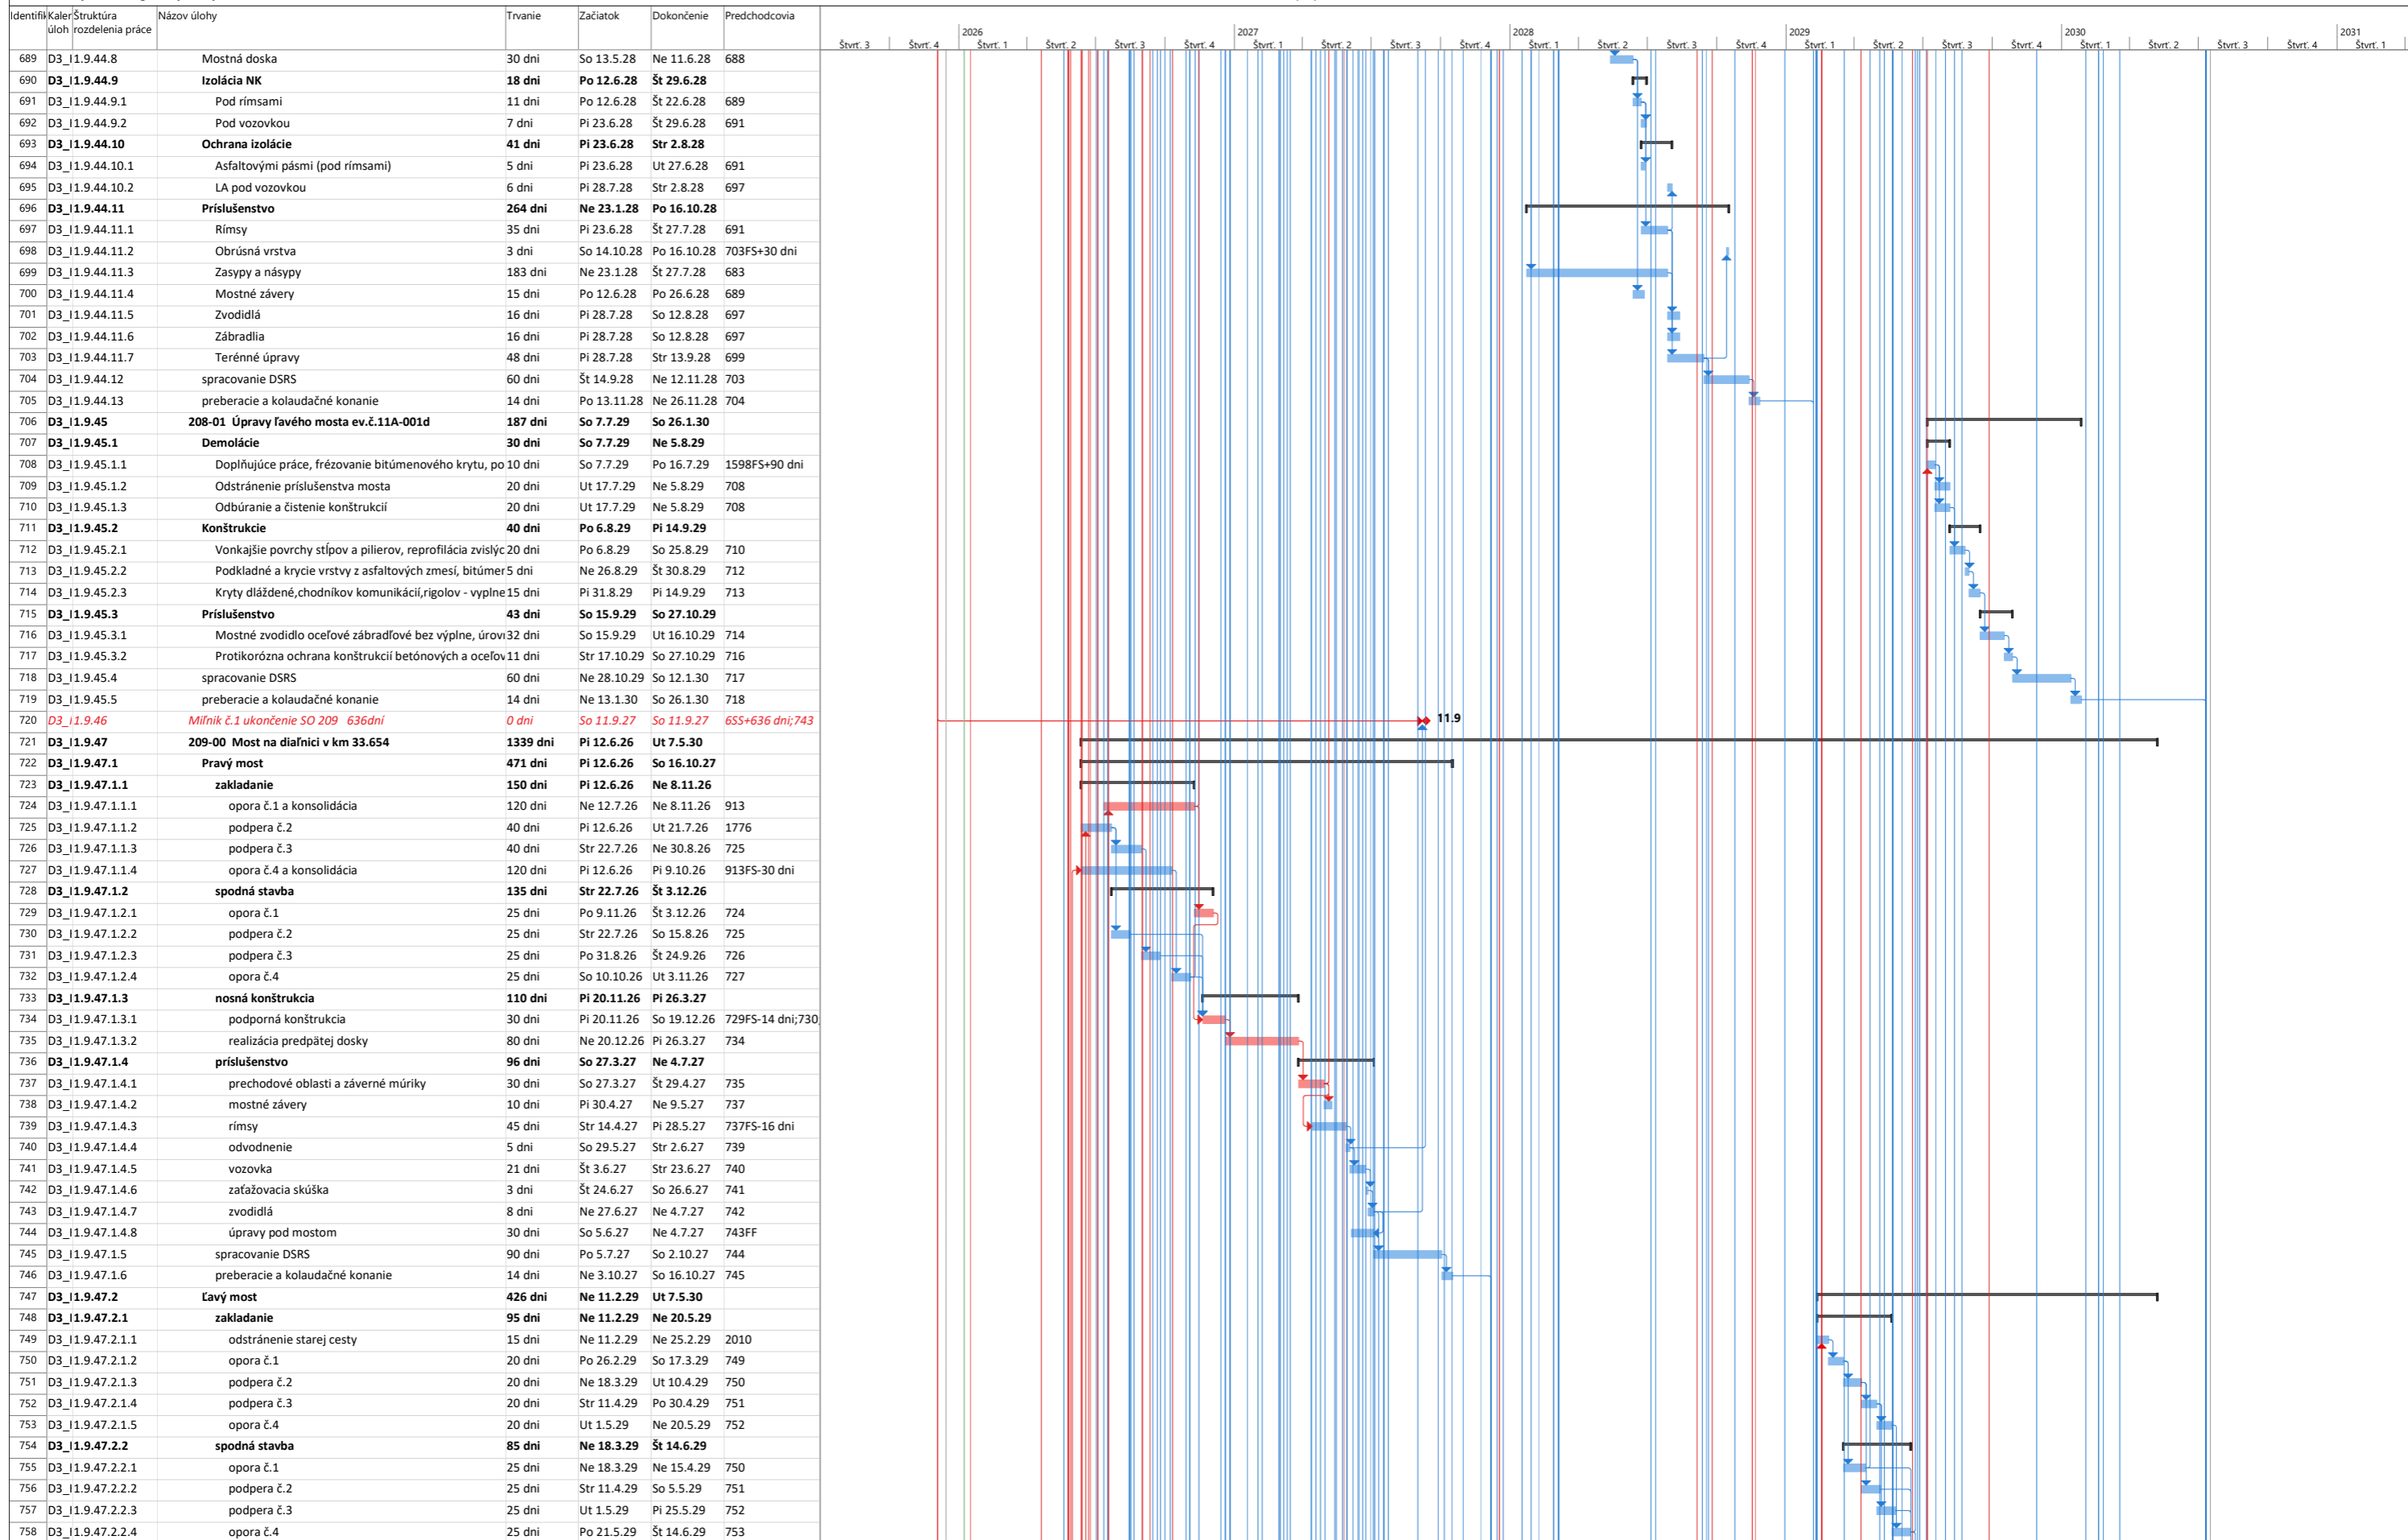

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby


Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

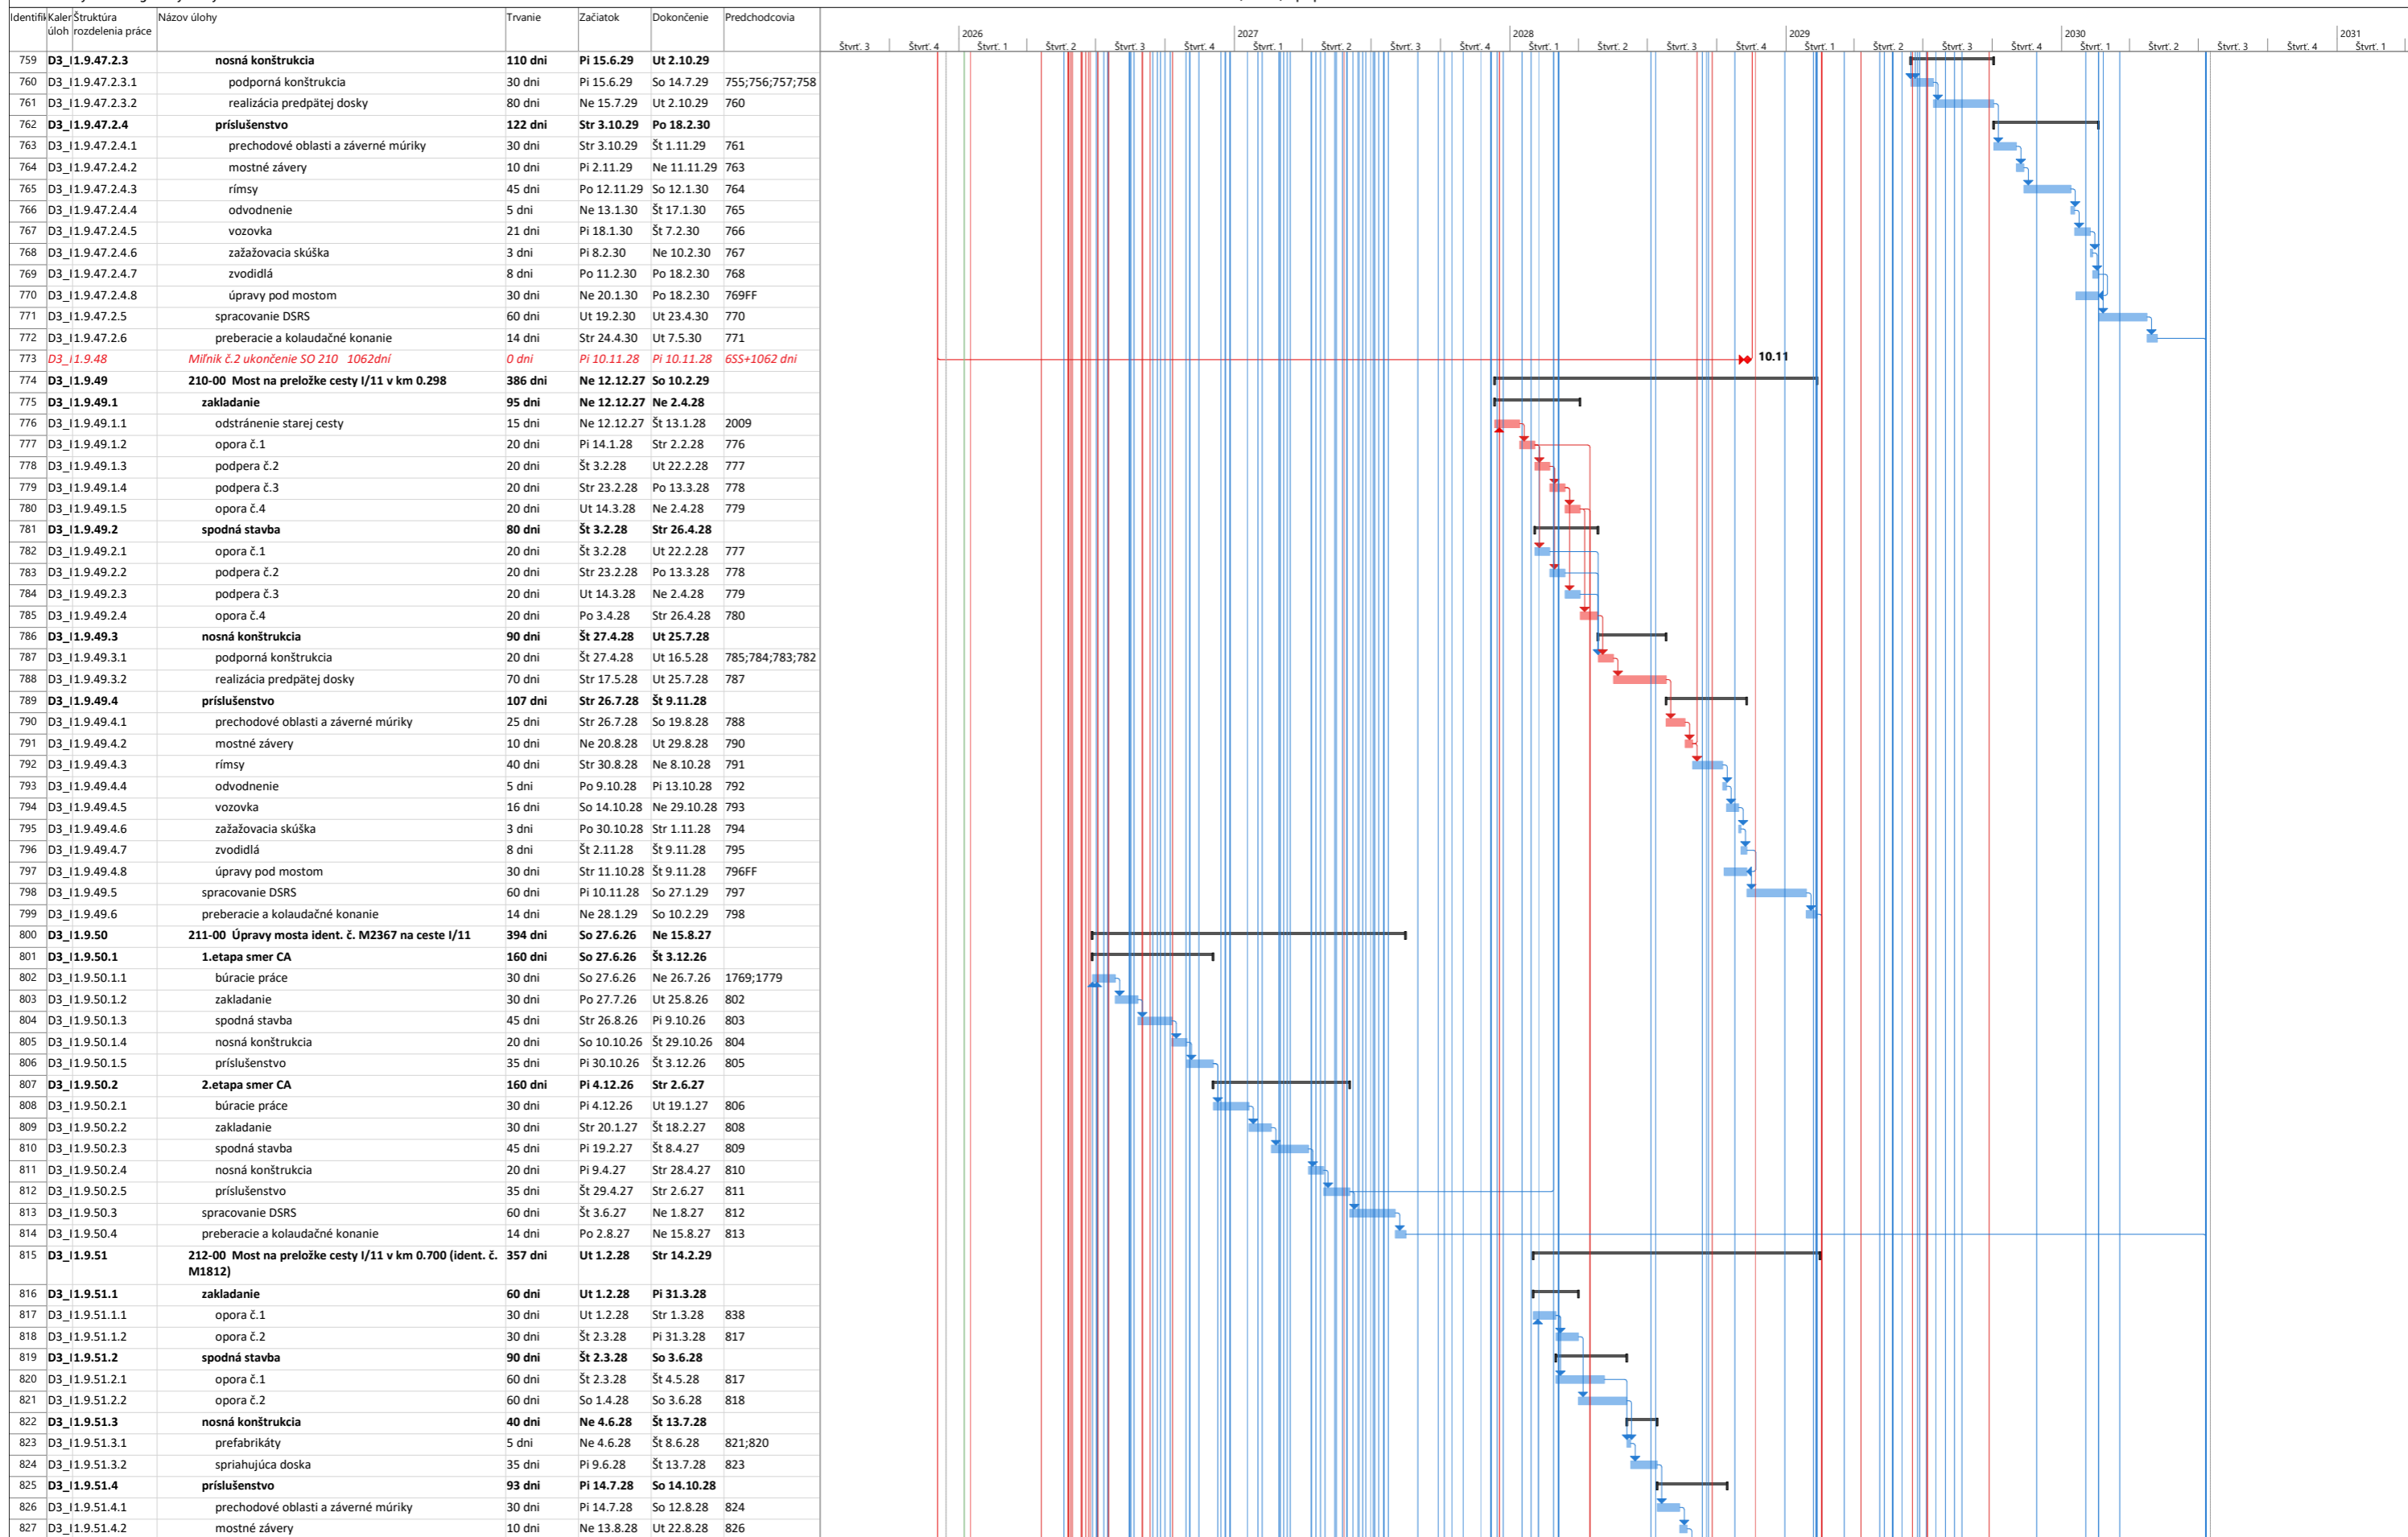

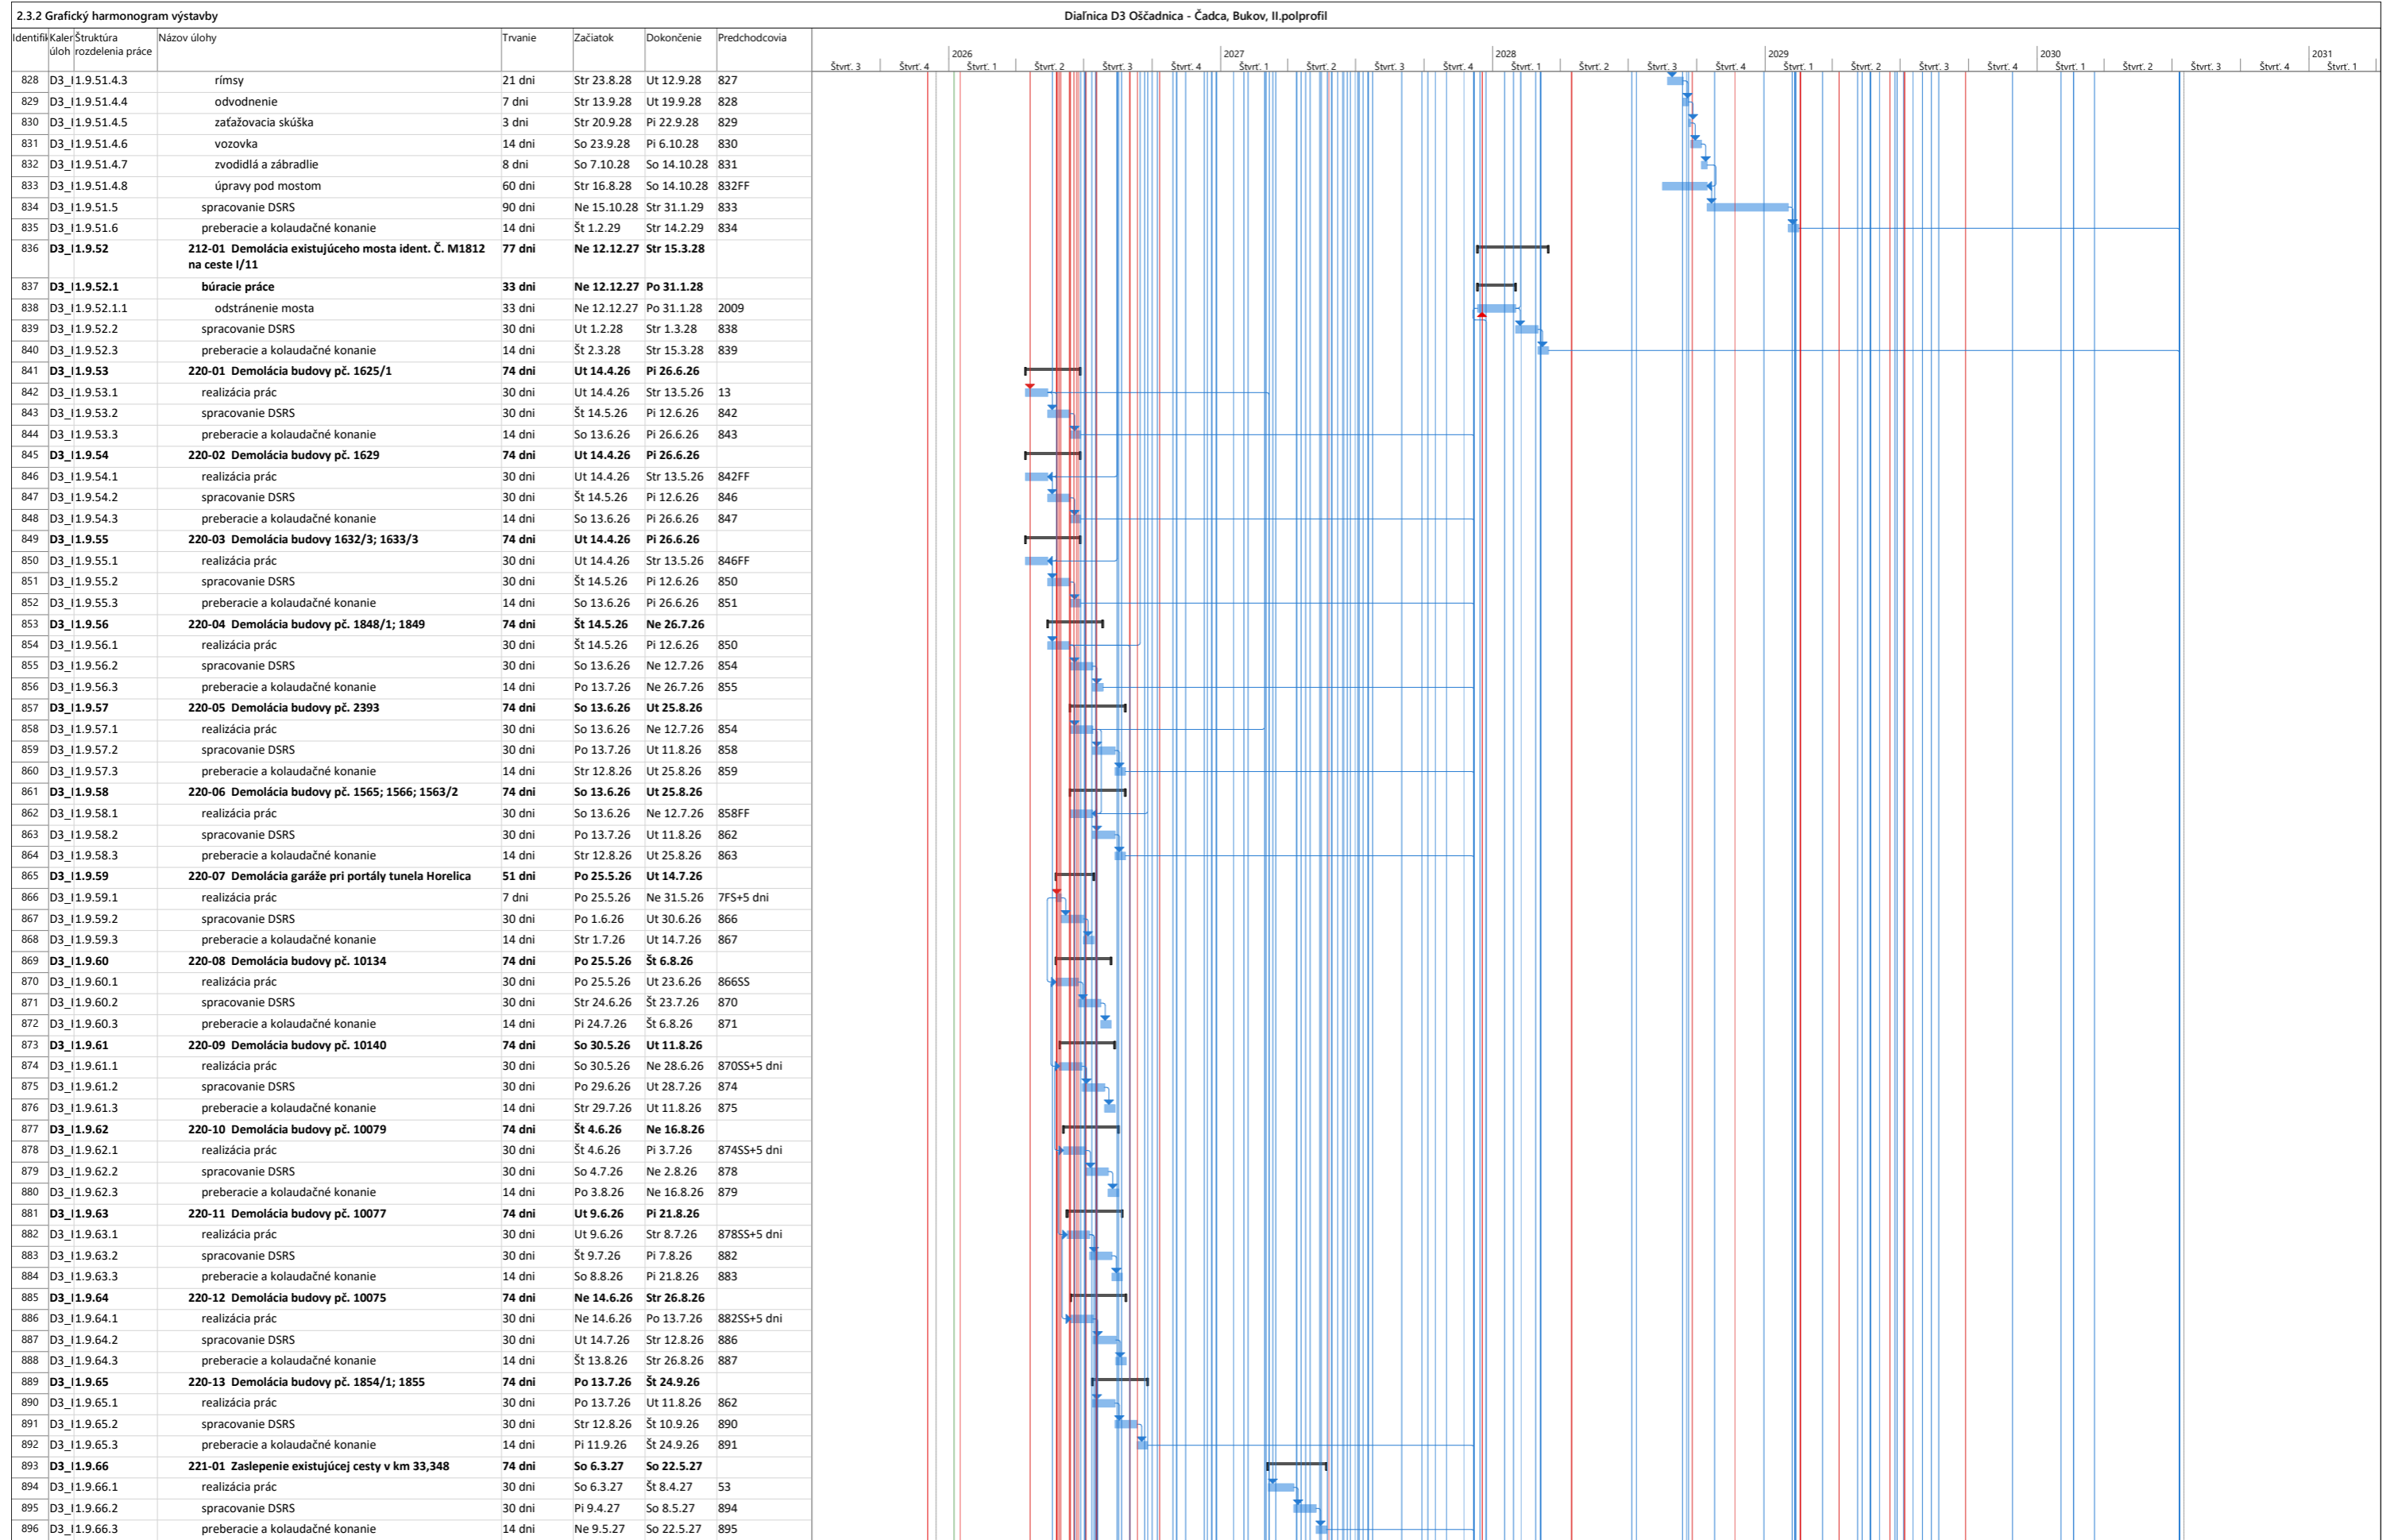


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

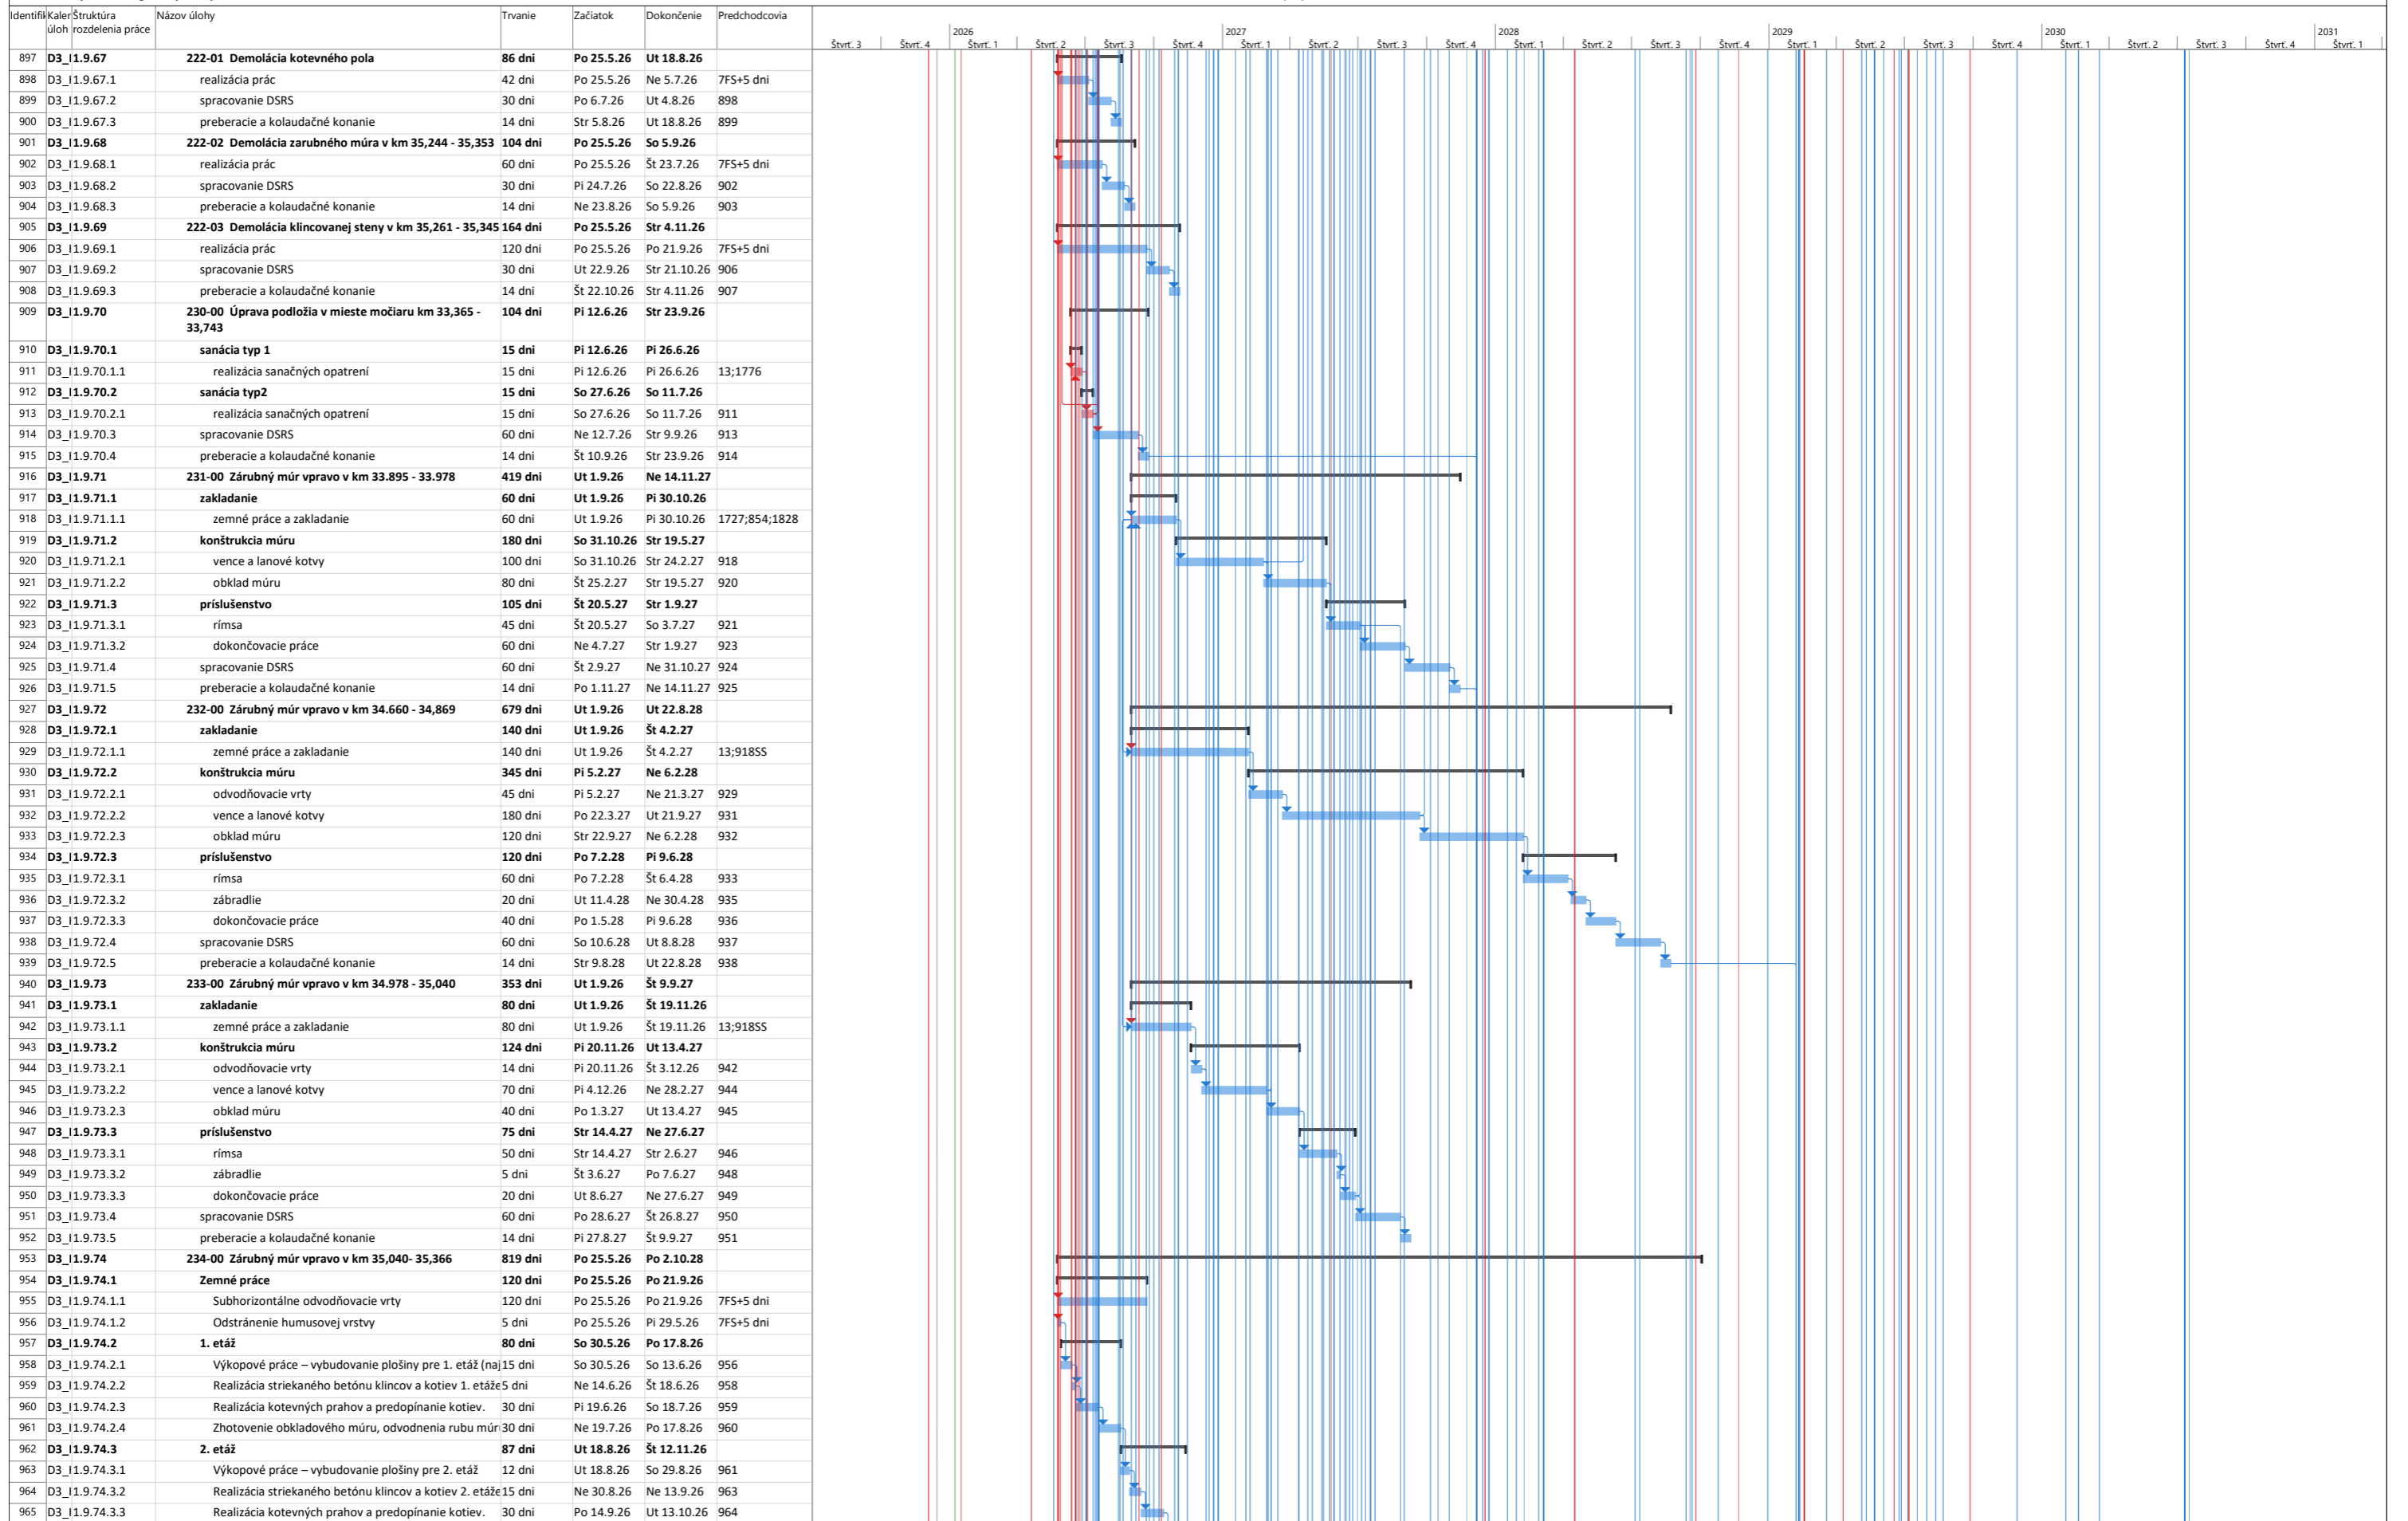

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Ošádnic - Čadca, Bukov, II.polprofil


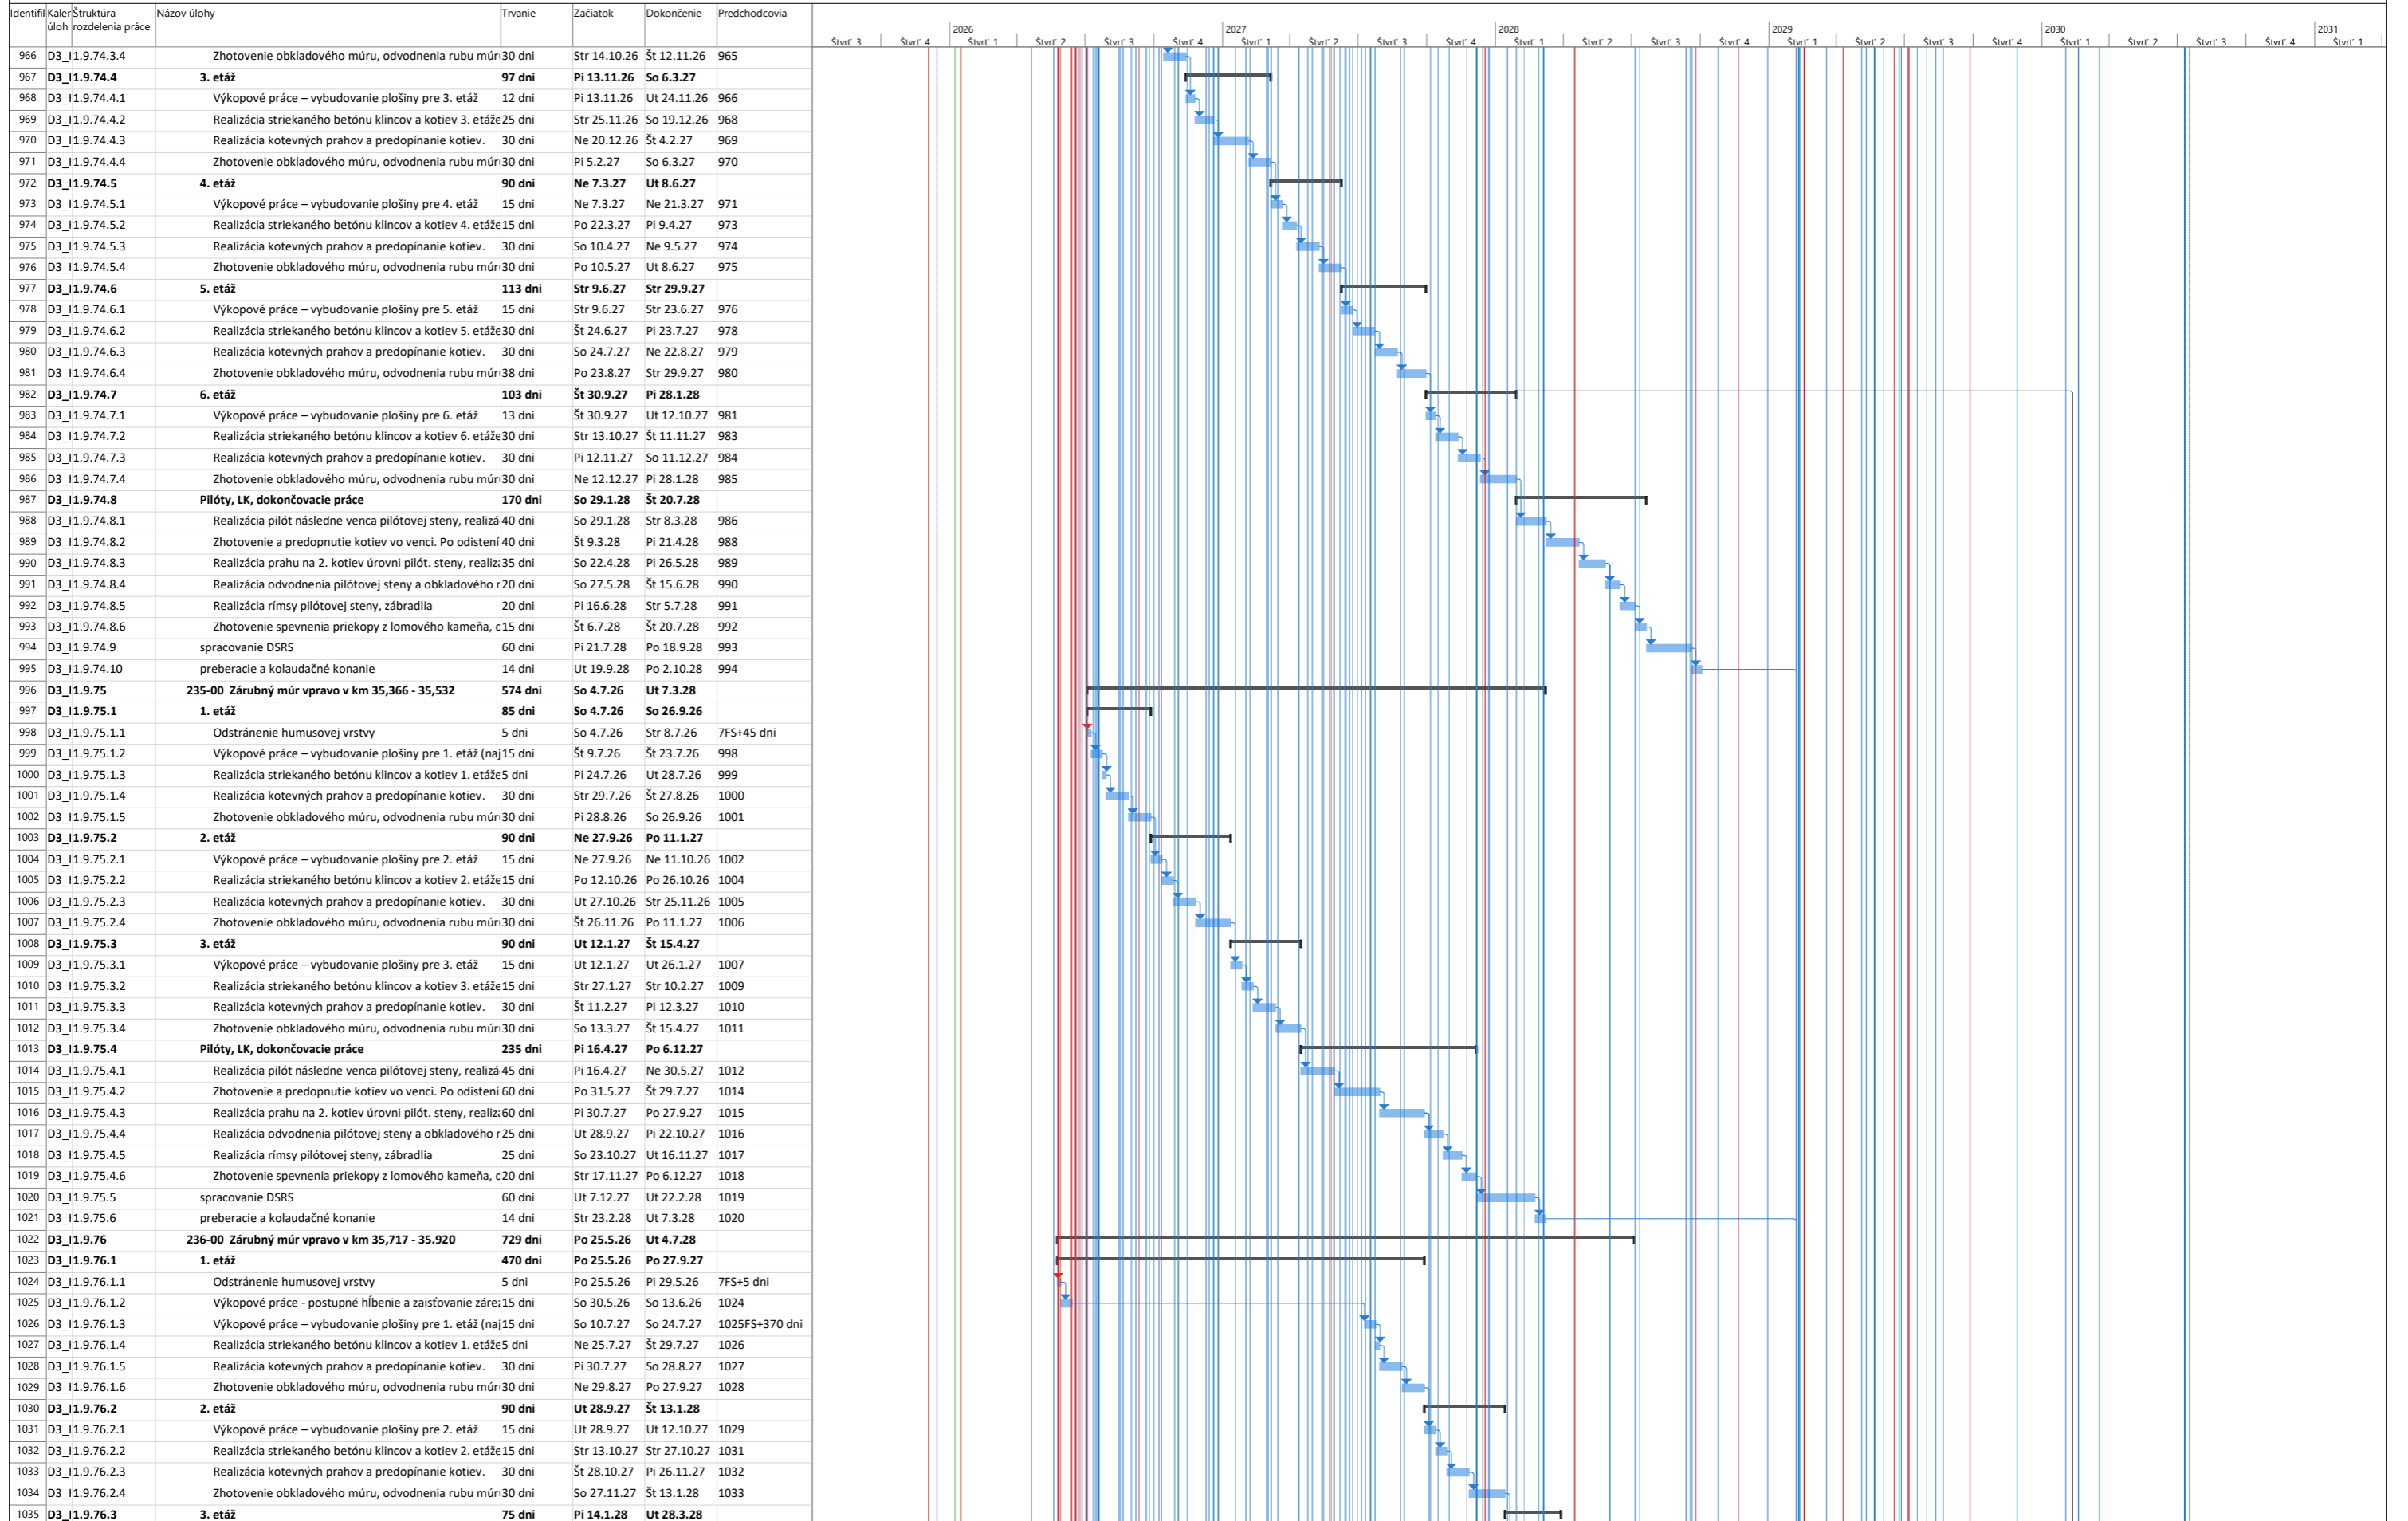


Harmonogram služieb a prác

- Úloha: █ Medzník: ◆ Súhrn projektu: Neaktívny medzník: ◆
- Rozdeliť: Súhrn: Neaktívna úloha: Neaktívny súhrn:
- Manuálna úloha: Manuálny súhrn: Iba začiatok: Externé úlohy: Termin: ◆
- Iba trvanie: Manuálny súhrn: Iba dokončiť: Externý medzník: ◆ Kritické: ◆
- Kritické rozdelenie: Manuálny priebeh: — Priebeh: —


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

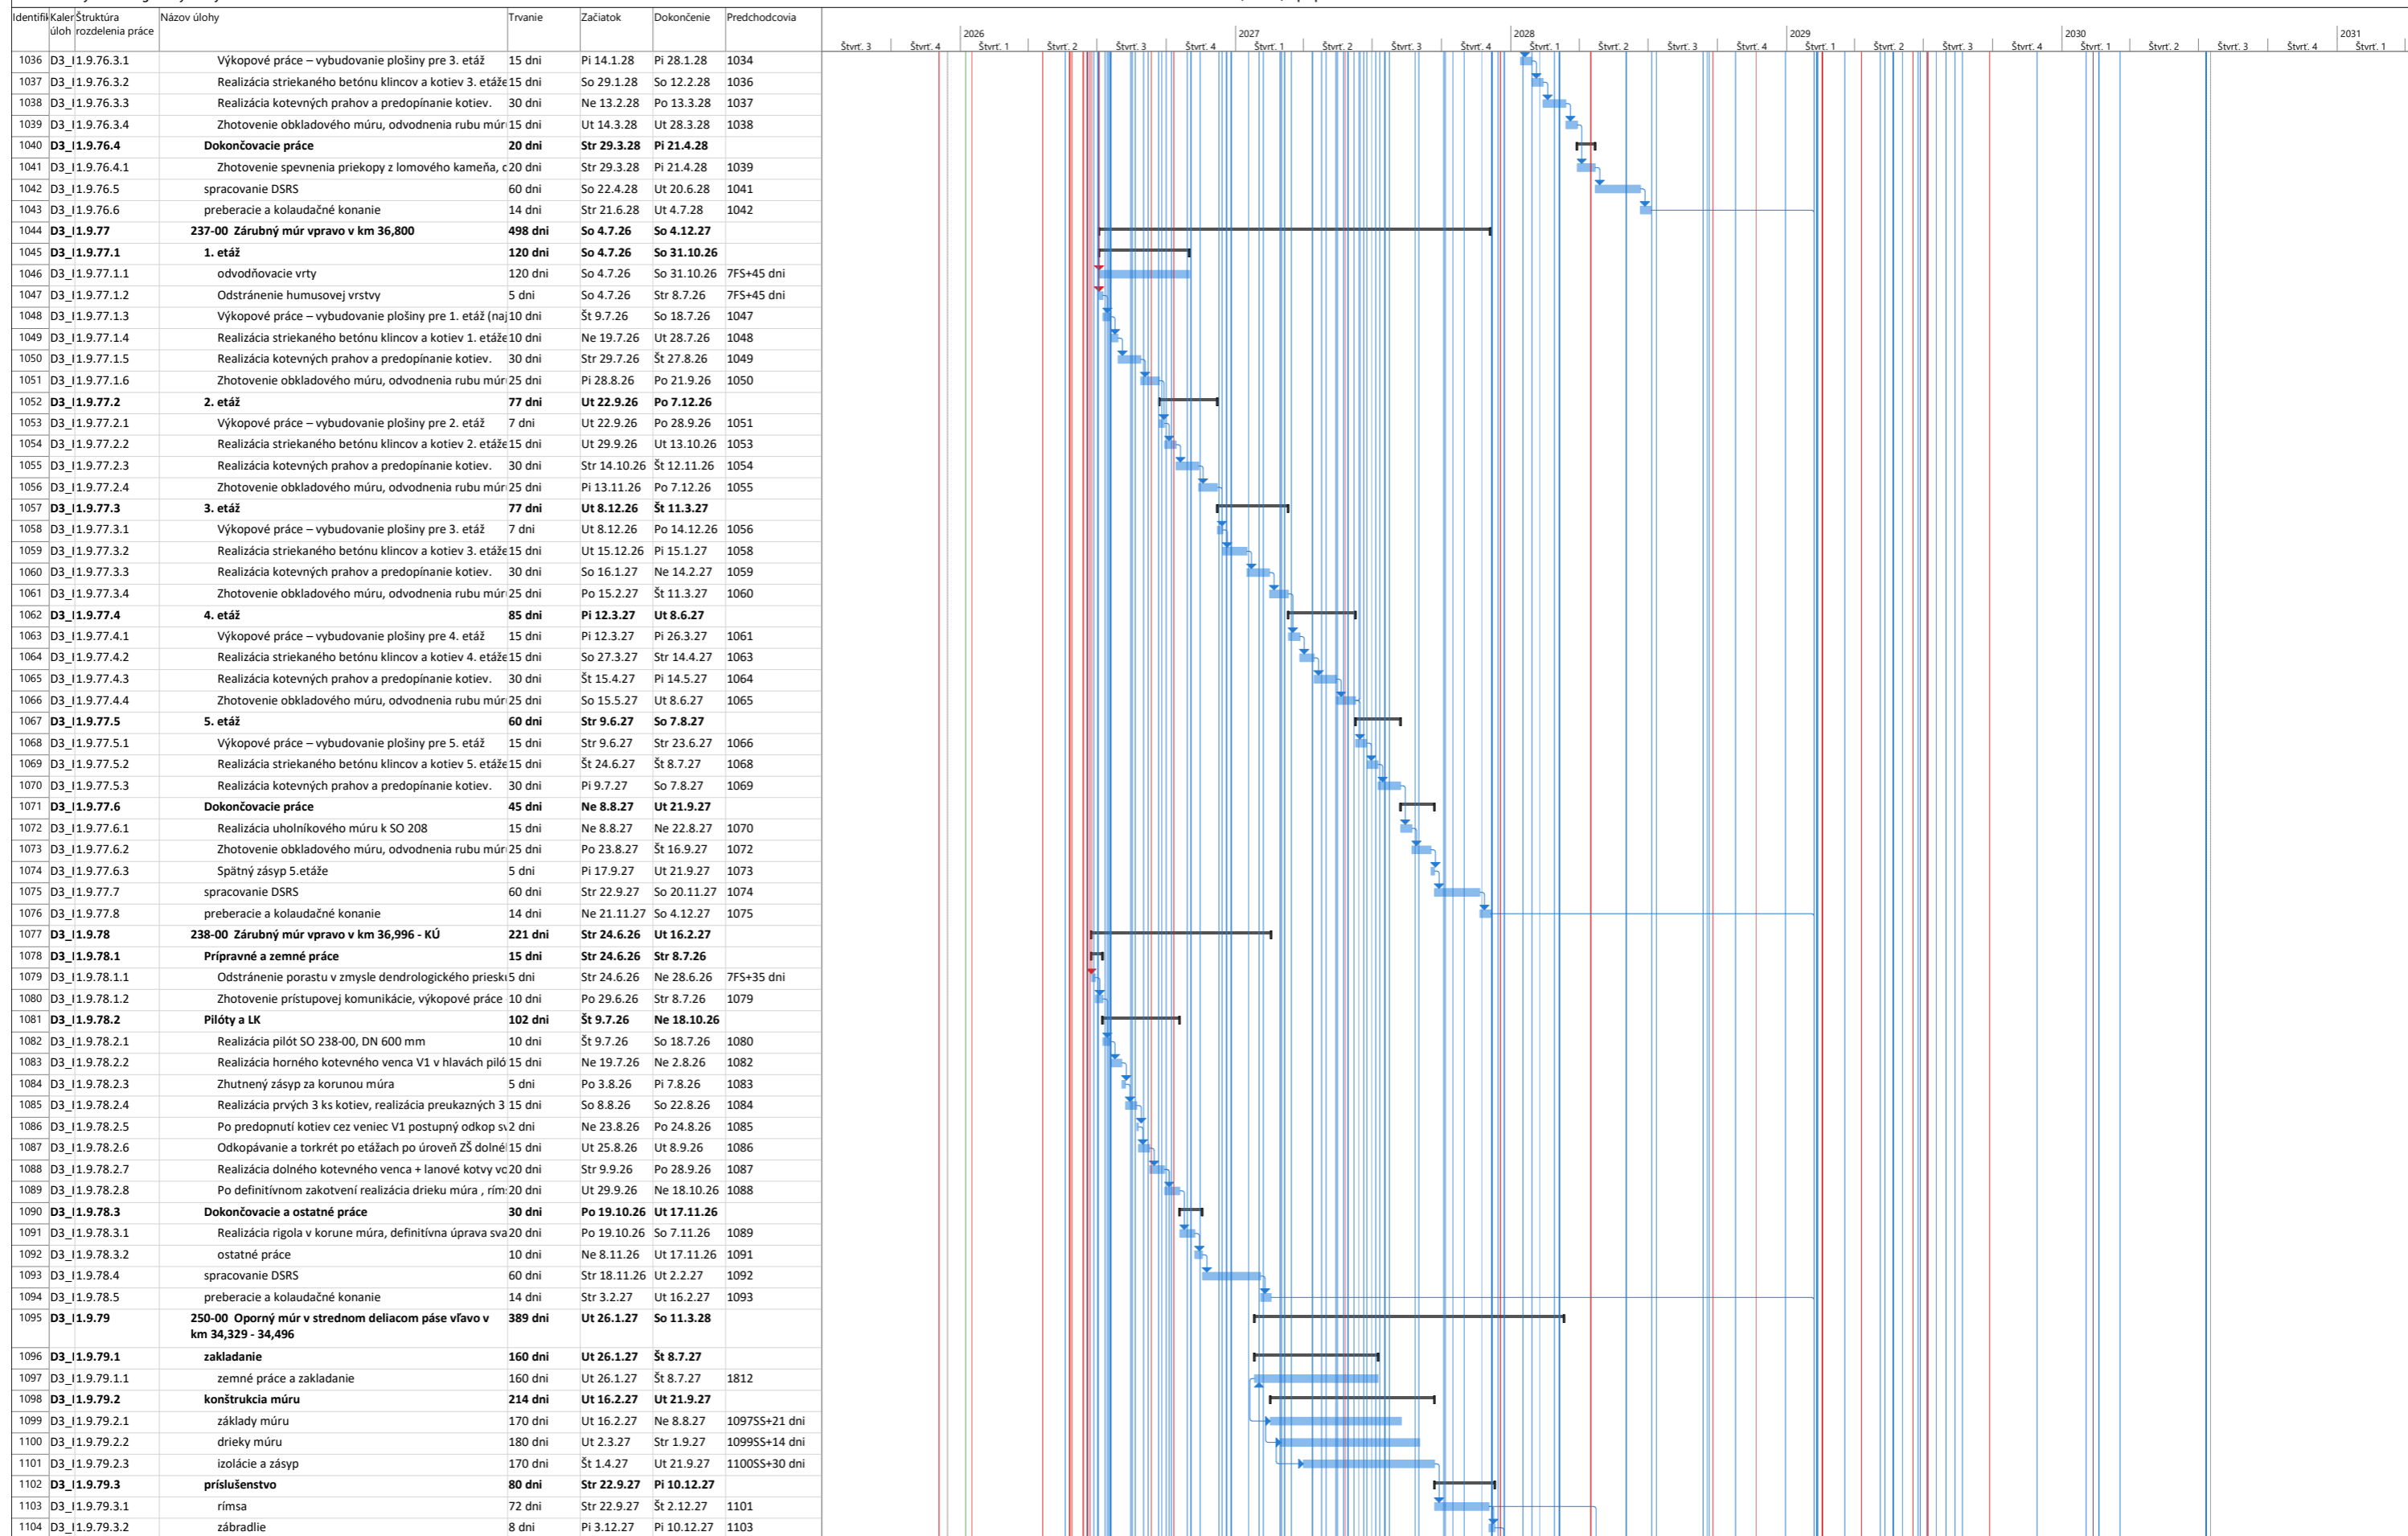

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

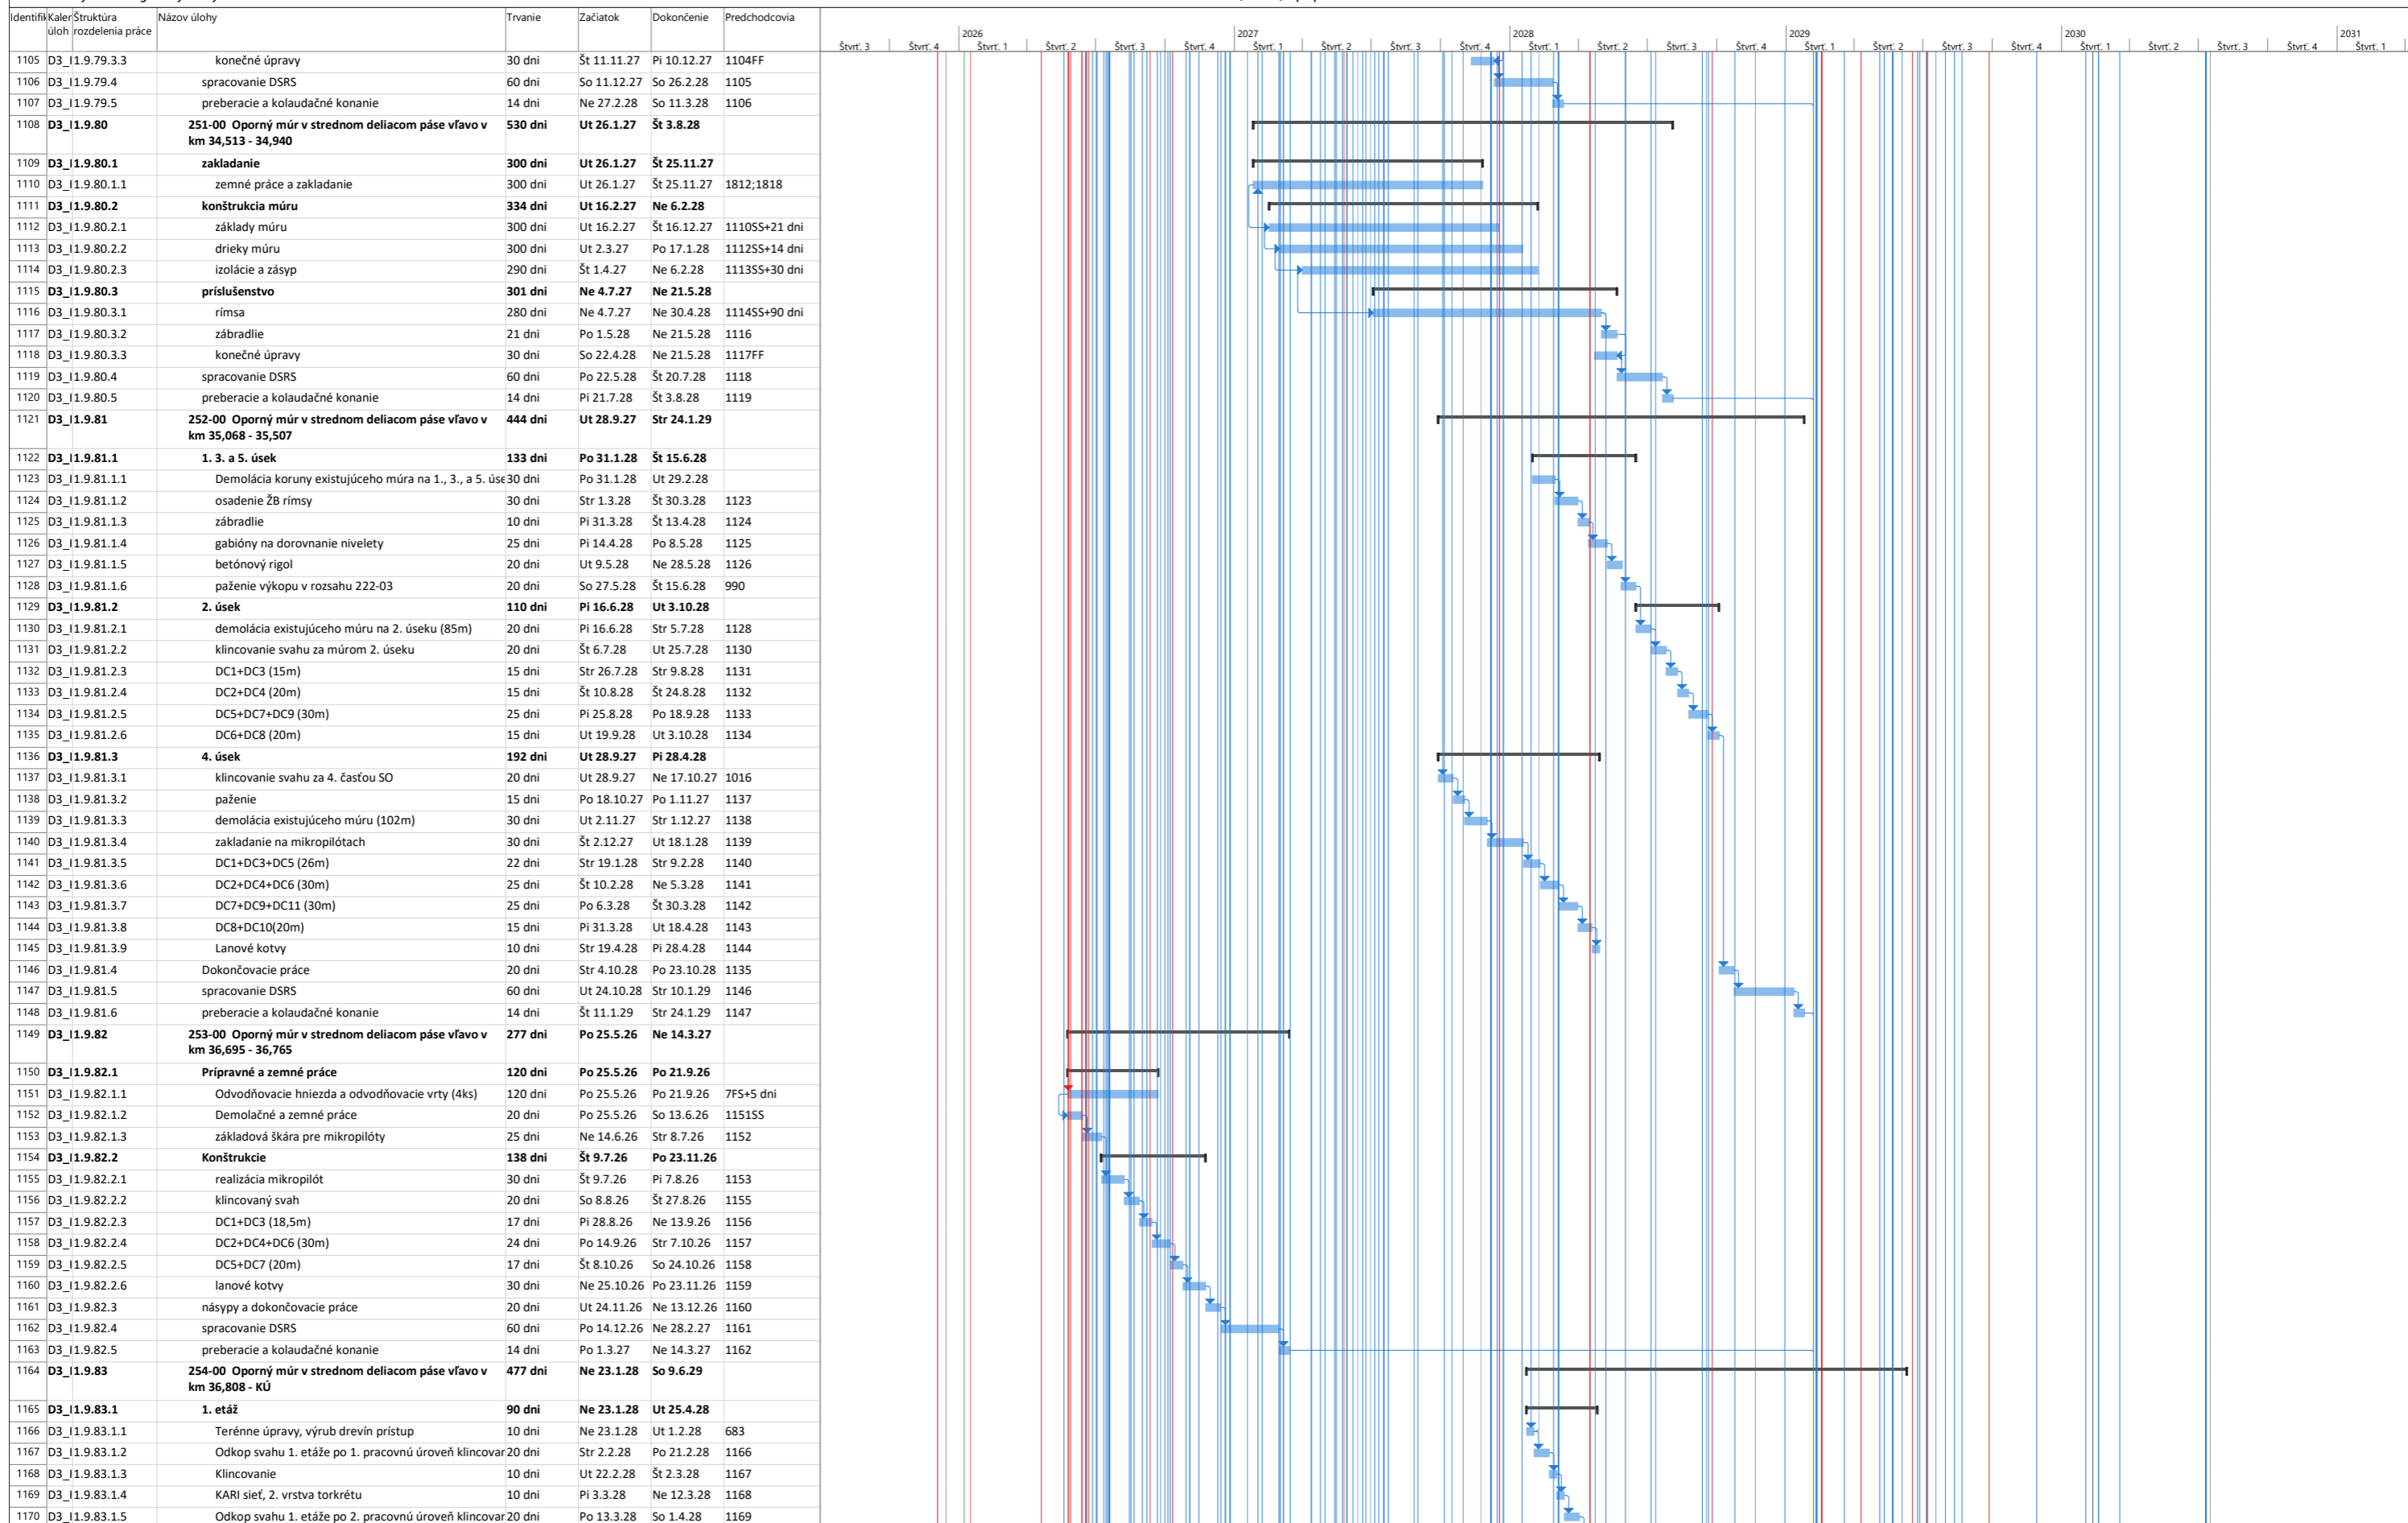


Harmonogram služieb a prác

- Úloha: Medzník (blue bar), Rozdeliť: Súhm (dotted line)
- Súhm projektu: Neaktívny medzník (grey bar), Neaktívna úloha (white bar)
- Manuálna úloha: Manuálny súhm (blue bar), Iba začiatok (blue bar), Iba dokončiť (blue bar)
- Externé úlohy: Termin (grey bar), Kritické (red bar)
- Kritické rozdelenie: Manuálny priebeh (blue bar), Priebeh (red bar)

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

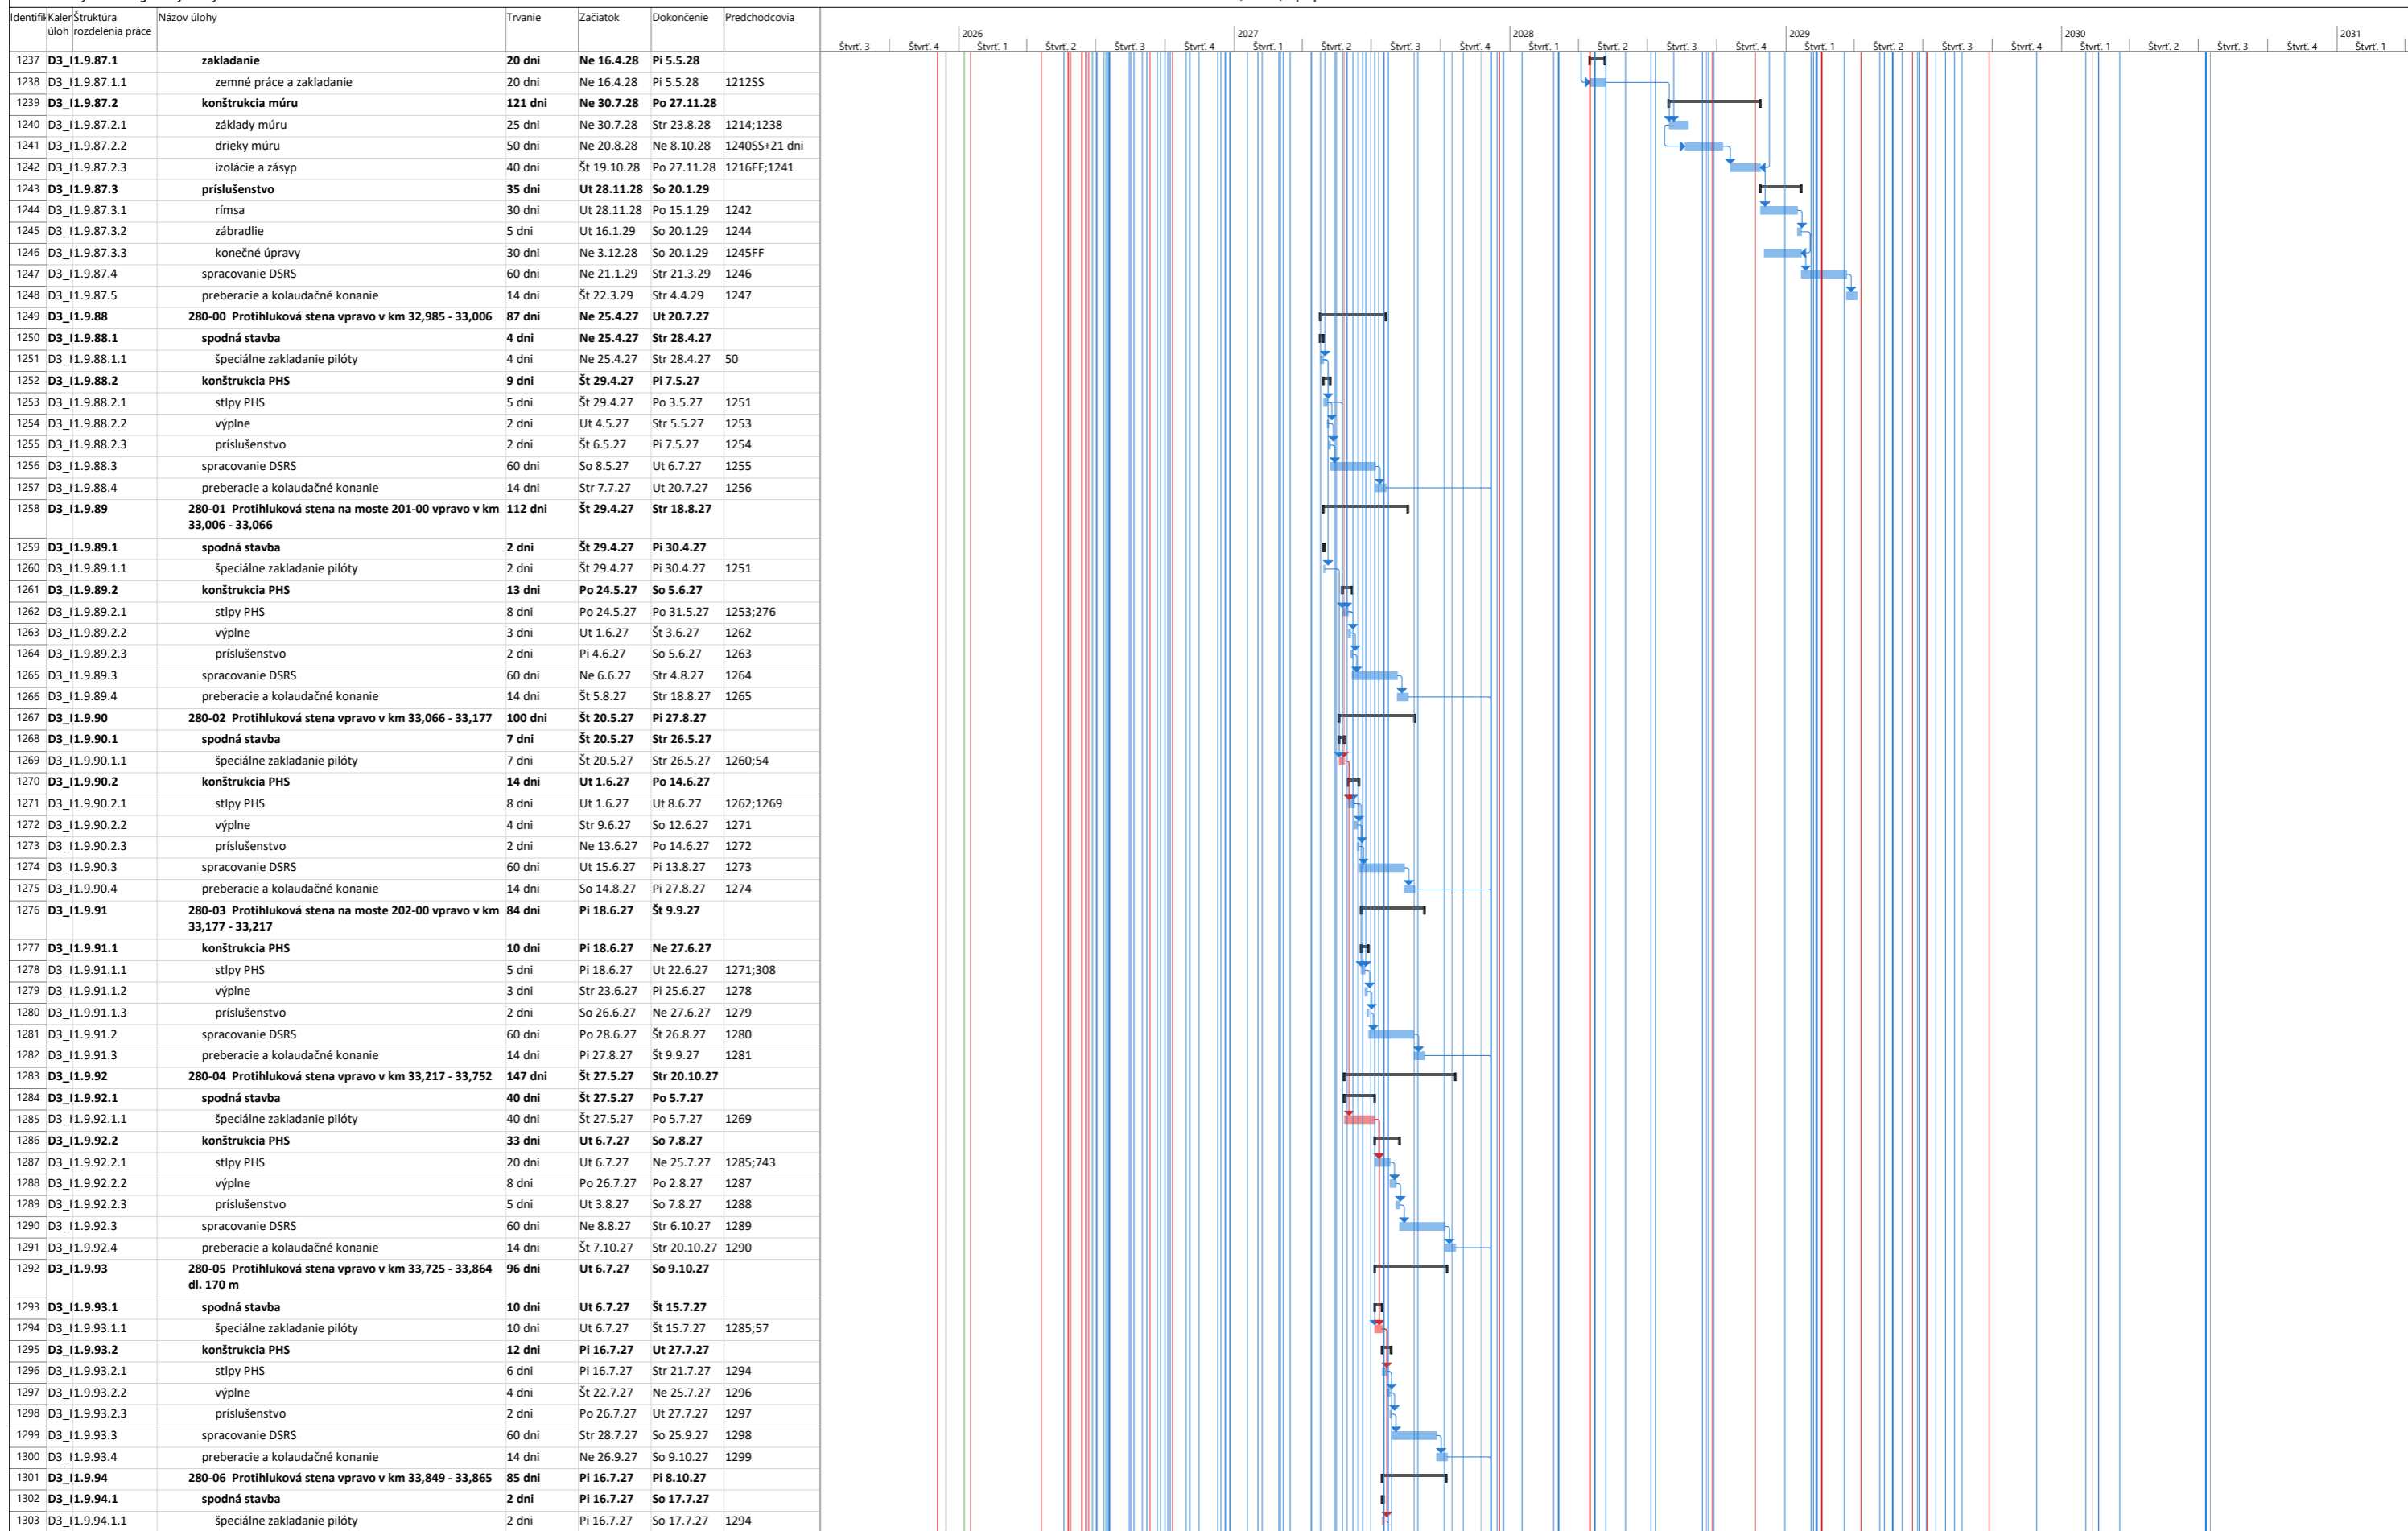

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil


Identifikačný kód	Kód úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	2026		2027		2028		2029		2030		2031	
							Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2
1304	D3_1.9.94.2	konštrukcia PHS	5 dni	Št 22.7.27	Po 26.7.27													
1305	D3_1.9.94.2.1	stĺpy PHS	2 dni	Št 22.7.27	Pi 23.7.27	1296												
1306	D3_1.9.94.2.2	výplne	2 dni	So 24.7.27	Ne 25.7.27	1305												
1307	D3_1.9.94.2.3	príslušenstvo	1 deň	Po 26.7.27	Po 26.7.27	1306												
1308	D3_1.9.94.3	spracovanie DSRS	60 dni	Ut 27.7.27	Pi 24.9.27	1307												
1309	D3_1.9.94.4	preberacie a kolaudačné konanie	14 dni	So 25.9.27	Pi 8.10.27	1308												
1310	D3_1.9.95	280-07 Protihluková stena na moste 203-00 vpravo v km 33,865 - 33,884	81 dni	So 24.7.27	Ut 12.10.27													
1311	D3_1.9.95.1	konštrukcia PHS	7 dni	So 24.7.27	Pi 30.7.27													
1312	D3_1.9.95.1.1	stĺpy PHS	3 dni	So 24.7.27	Po 26.7.27	1305;328												
1313	D3_1.9.95.1.2	výplne	2 dni	Ut 27.7.27	Str 28.7.27	1312												
1314	D3_1.9.95.1.3	príslušenstvo	2 dni	Št 29.7.27	Pi 30.7.27	1313												
1315	D3_1.9.95.2	spracovanie DSRS	60 dni	So 31.7.27	Ut 28.9.27	1314												
1316	D3_1.9.95.3	preberacie a kolaudačné konanie	14 dni	Str 29.9.27	Ut 12.10.27	1315												
1317	D3_1.9.96	280-08 Protihluková stena vpravo v km 33,893 - 34,478	147 dni	Ne 18.7.27	So 11.12.27													
1318	D3_1.9.96.1	spodná stavba	40 dni	Ne 18.7.27	Št 26.8.27													
1319	D3_1.9.96.1.1	špeciálne zakladanie pilóty	40 dni	Ne 18.7.27	Št 26.8.27	1303												
1320	D3_1.9.96.2	konštrukcia PHS	33 dni	Pi 27.8.27	Ut 28.9.27													
1321	D3_1.9.96.2.1	stĺpy PHS	20 dni	Pi 27.8.27	Str 15.9.27	1312;923;1319												
1322	D3_1.9.96.2.2	výplne	8 dni	Št 16.9.27	Št 23.9.27	1321												
1323	D3_1.9.96.2.3	príslušenstvo	5 dni	Pi 24.9.27	Ut 28.9.27	1322												
1324	D3_1.9.96.3	spracovanie DSRS	60 dni	Str 29.9.27	So 27.11.27	1323												
1325	D3_1.9.96.4	preberacie a kolaudačné konanie	14 dni	Ne 28.11.27	So 11.12.27	1324												
1326	D3_1.9.97	280-09 Protihluková stena na moste 204-00 vpravo v km 34,478 - 34,514	81 dni	Str 17.11.27	Str 23.2.28													
1327	D3_1.9.97.1	konštrukcia PHS	7 dni	Str 17.11.27	Ut 23.11.27													
1328	D3_1.9.97.1.1	stĺpy PHS	3 dni	Str 17.11.27	Pi 19.11.27	1321;358												
1329	D3_1.9.97.1.2	výplne	2 dni	So 20.11.27	Ne 21.11.27	1328												
1330	D3_1.9.97.1.3	príslušenstvo	2 dni	Po 22.11.27	Ut 23.11.27	1329												
1331	D3_1.9.97.2	spracovanie DSRS	60 dni	Str 24.11.27	Str 9.2.28	1330												
1332	D3_1.9.97.3	preberacie a kolaudačné konanie	14 dni	Št 10.2.28	Str 23.2.28	1331												
1333	D3_1.9.98	280-10 Protihluková stena vpravo v km 34,514 - 34,701	99 dni	Po 1.5.28	Po 7.8.28													
1334	D3_1.9.98.1	spodná stavba	12 dni	Po 1.5.28	Pi 12.5.28													
1335	D3_1.9.98.1.1	špeciálne zakladanie pilóty	12 dni	Po 1.5.28	Pi 12.5.28	1319;1116												
1336	D3_1.9.98.2	konštrukcia PHS	13 dni	So 13.5.28	Št 25.5.28													
1337	D3_1.9.98.2.1	stĺpy PHS	6 dni	So 13.5.28	Št 18.5.28	1328;1335												
1338	D3_1.9.98.2.2	výplne	4 dni	Pi 19.5.28	Po 22.5.28	1337												
1339	D3_1.9.98.2.3	príslušenstvo	3 dni	Ut 23.5.28	Št 25.5.28	1338												
1340	D3_1.9.98.3	spracovanie DSRS	60 dni	Pi 26.5.28	Po 24.7.28	1339												
1341	D3_1.9.98.4	preberacie a kolaudačné konanie	14 dni	Ut 25.7.28	Po 7.8.28	1340												
1342	D3_1.9.99	280-11 Protihluková stena na moste 207-00 vpravo v km 35,919 - 36,053	124 dni	Po 6.3.28	Ut 11.7.28													
1343	D3_1.9.99.1	Kotvenie	20 dni	Po 6.3.28	So 25.3.28													
1344	D3_1.9.99.1.1	vrtanie kotvenia a osádzanie kotevných prvkov	20 dni	Po 6.3.28	So 25.3.28	629												
1345	D3_1.9.99.2	Konštrukcie	30 dni	Ne 26.3.28	Pi 28.4.28													
1346	D3_1.9.99.2.1	osádzanie stĺpov	5 dni	Ne 26.3.28	Št 30.3.28	1344												
1347	D3_1.9.99.2.2	podlievanie plastmaltou	5 dni	Pi 31.3.28	Ut 4.4.28	1346												
1348	D3_1.9.99.2.3	osádzanie soklových panelov	5 dni	Str 5.4.28	Št 13.4.28	1347												
1349	D3_1.9.99.2.4	osádzanie výplní	5 dni	Pi 14.4.28	Ut 18.4.28	1348												
1350	D3_1.9.99.2.5	detaily	10 dni	Str 19.4.28	Pi 28.4.28	1349												
1351	D3_1.9.99.3	spracovanie DSRS	60 dni	So 29.4.28	Ut 27.6.28	1350												
1352	D3_1.9.99.4	preberacie a kolaudačné konanie	14 dni	Str 28.6.28	Ut 11.7.28	1351												
1353	D3_1.9.100	280-12 Protihluková stena na moste 208-00 vpravo v km 36,762 - 36,826	113 dni	Št 14.9.28	Ut 23.1.29													
1354	D3_1.9.100.1	Kotvenie	15 dni	Št 14.9.28	Št 28.9.28													
1355	D3_1.9.100.1.1	vrtanie kotvenia a osádzanie kotevných prvkov	15 dni	Št 14.9.28	Št 28.9.28	703												
1356	D3_1.9.100.2	Konštrukcie	24 dni	Pi 29.9.28	Ne 22.10.28													
1357	D3_1.9.100.2.1	osádzanie stĺpov	3 dni	Pi 29.9.28	Ne 1.10.28	1355												
1358	D3_1.9.100.2.2	podlievanie plastmaltou	5 dni	Po 2.10.28	Pi 6.10.28	1357												
1359	D3_1.9.100.2.3	osádzanie soklových panelov	3 dni	So 7.10.28	Po 9.10.28	1358												
1360	D3_1.9.100.2.4	osádzanie výplní	3 dni	Ut 10.10.28	Št 12.10.28	1359												
1361	D3_1.9.100.2.5	detaily	10 dni	Pi 13.10.28	Ne 22.10.28	1360												
1362	D3_1.9.100.3	spracovanie DSRS	60 dni	Po 23.10.28	Ut 9.1.29	1361												
1363	D3_1.9.100.4	preberacie a kolaudačné konanie	14 dni	Str 10.1.29	Ut 23.1.29	1362												
1364	D3_1.9.101	280-13 Protihluková stena vpravo v km 36,826 - 36,992	149 dni	Ne 28.1.29	Pi 29.6.29													
1365	D3_1.9.101.1	Zakladanie a kotvenie	45 dni	Ne 28.1.29	Ut 13.3.29													
1366	D3_1.9.101.1.1	vrtanie pilót a betonáž	15 dni	Ne 28.1.29	Ne 11.2.29	1190												
1367	D3_1.9.101.1.2	betónovanie hlavíc	15 dni	Po 12.2.29	Po 26.2.29	1366												
1368	D3_1.9.101.1.3	vrtanie kotvenia a osádzanie kotevných prvkov	15 dni	Ut 27.2.29	Ut 13.3.29	1367												
1369	D3_1.9.101.2	Konštrukcie	30 dni	Str 14.3.29	Po 16.4.29													

Harmonogram služieb a prác

- Úloha: █ Medzník: ◆ Súhrn projektu: Neaktívny medzník: ○
- Rozdeliť: ⋯ Súhrn: Neaktívna úloha: Neaktívny súhrn:
- Manuálna úloha: Manuálny súhrn: Iba začiatok: ┌ Externé úlohy: Termin: + Kritické rozdelenie: ⋯ Manuálny priebeh: —
- Iba trvanie: Manuálny súhrn: Iba dokončiť: └ Externý medzník: ◆ Kritické: █ Priebeh: —

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

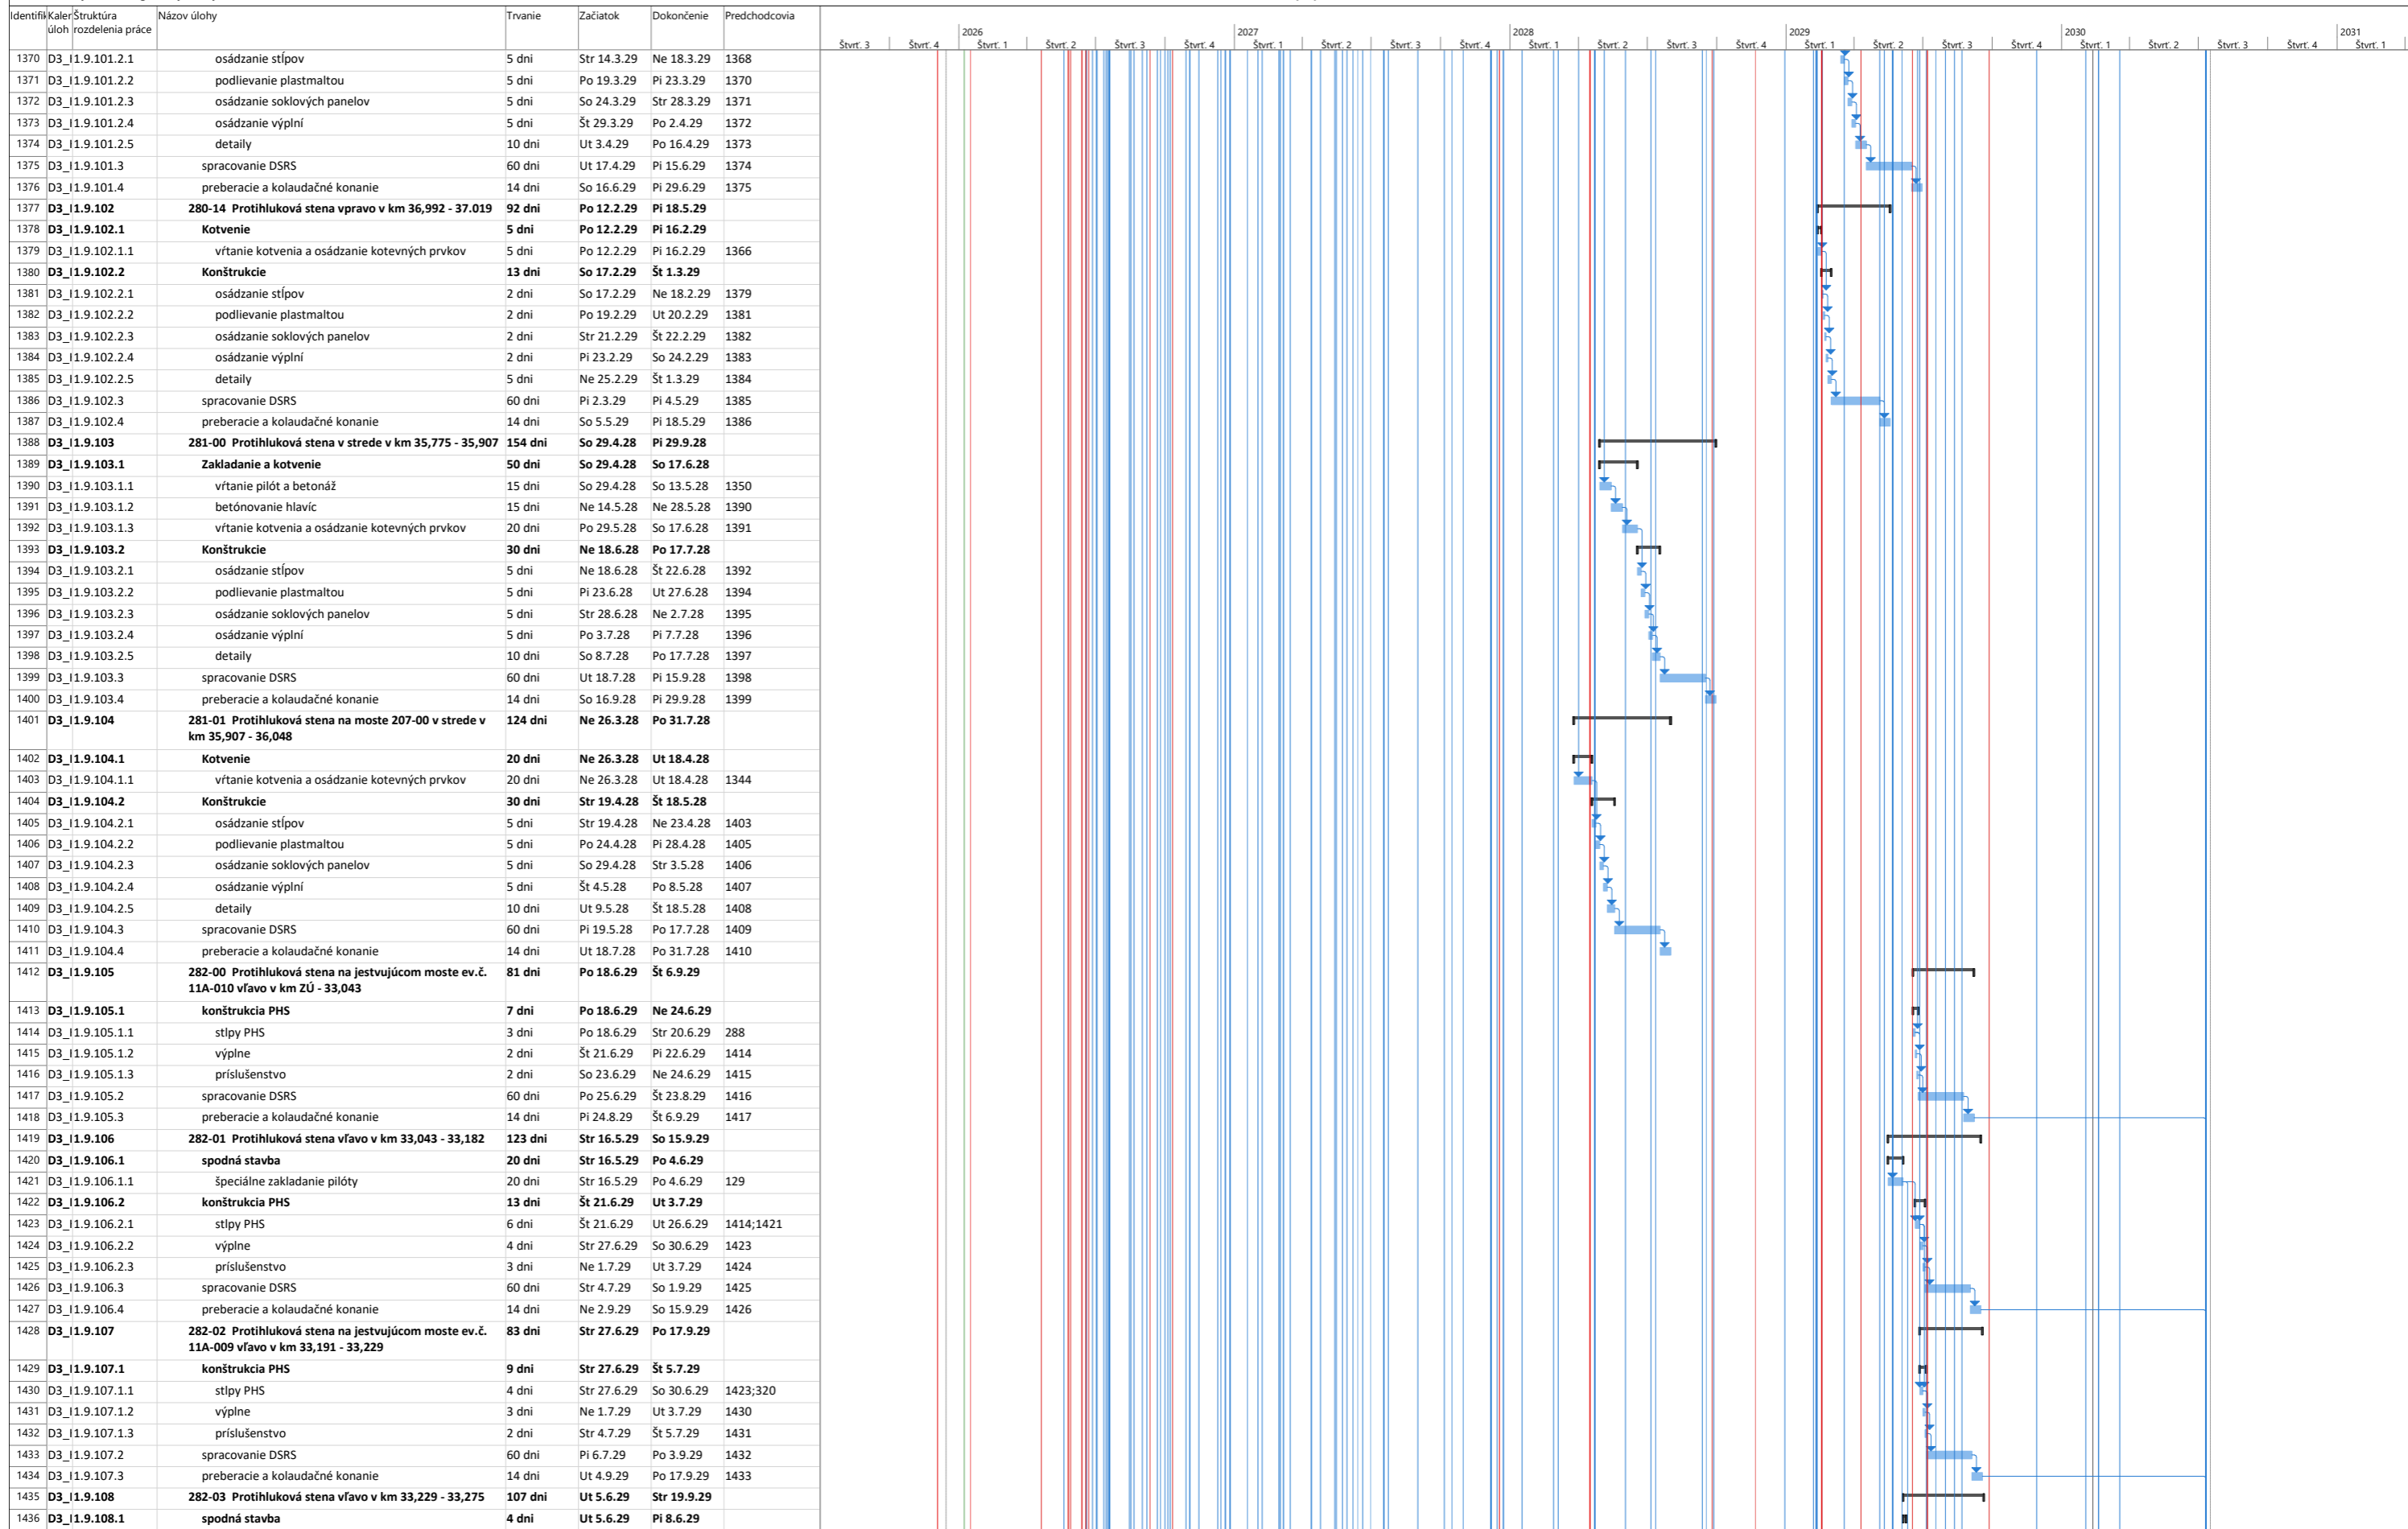


Harmonogram služieb a prác

- Úloha: Rozdeliť (modrá čiara), Súhrn (čierna bodka)
- Medzník: Medzník (červená bodka)
- Súhrn projektu: Súhrn (čierna čiara)
- Neaktívny medzník: Neaktívny medzník (šedá bodka)
- Neaktívna úloha: Neaktívna úloha (šedá čiara)
- Neaktívny súhrn: Neaktívny súhrn (šedá bodka)
- Manuálna úloha: Manuálna úloha (modrá čiara)
- Iba začiatok: Iba začiatok (modrá čiara)
- Iba dokončiť: Iba dokončiť (modrá čiara)
- Manuálny súhrn: Manuálny súhrn (modrá bodka)
- Iba trvanie: Iba trvanie (modrá čiara)
- Externé úlohy: Externé úlohy (šedá čiara)
- Externý medzník: Externý medzník (šedá bodka)
- Termín: Termín (šedá čiara)
- Kritické: Kritické (červená čiara)
- Kritické rozdelenie: Kritické rozdelenie (červená bodka)
- Priebeh: Priebeh (modrá čiara)
- Manuálny priebeh: Manuálny priebeh (modrá čiara)


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

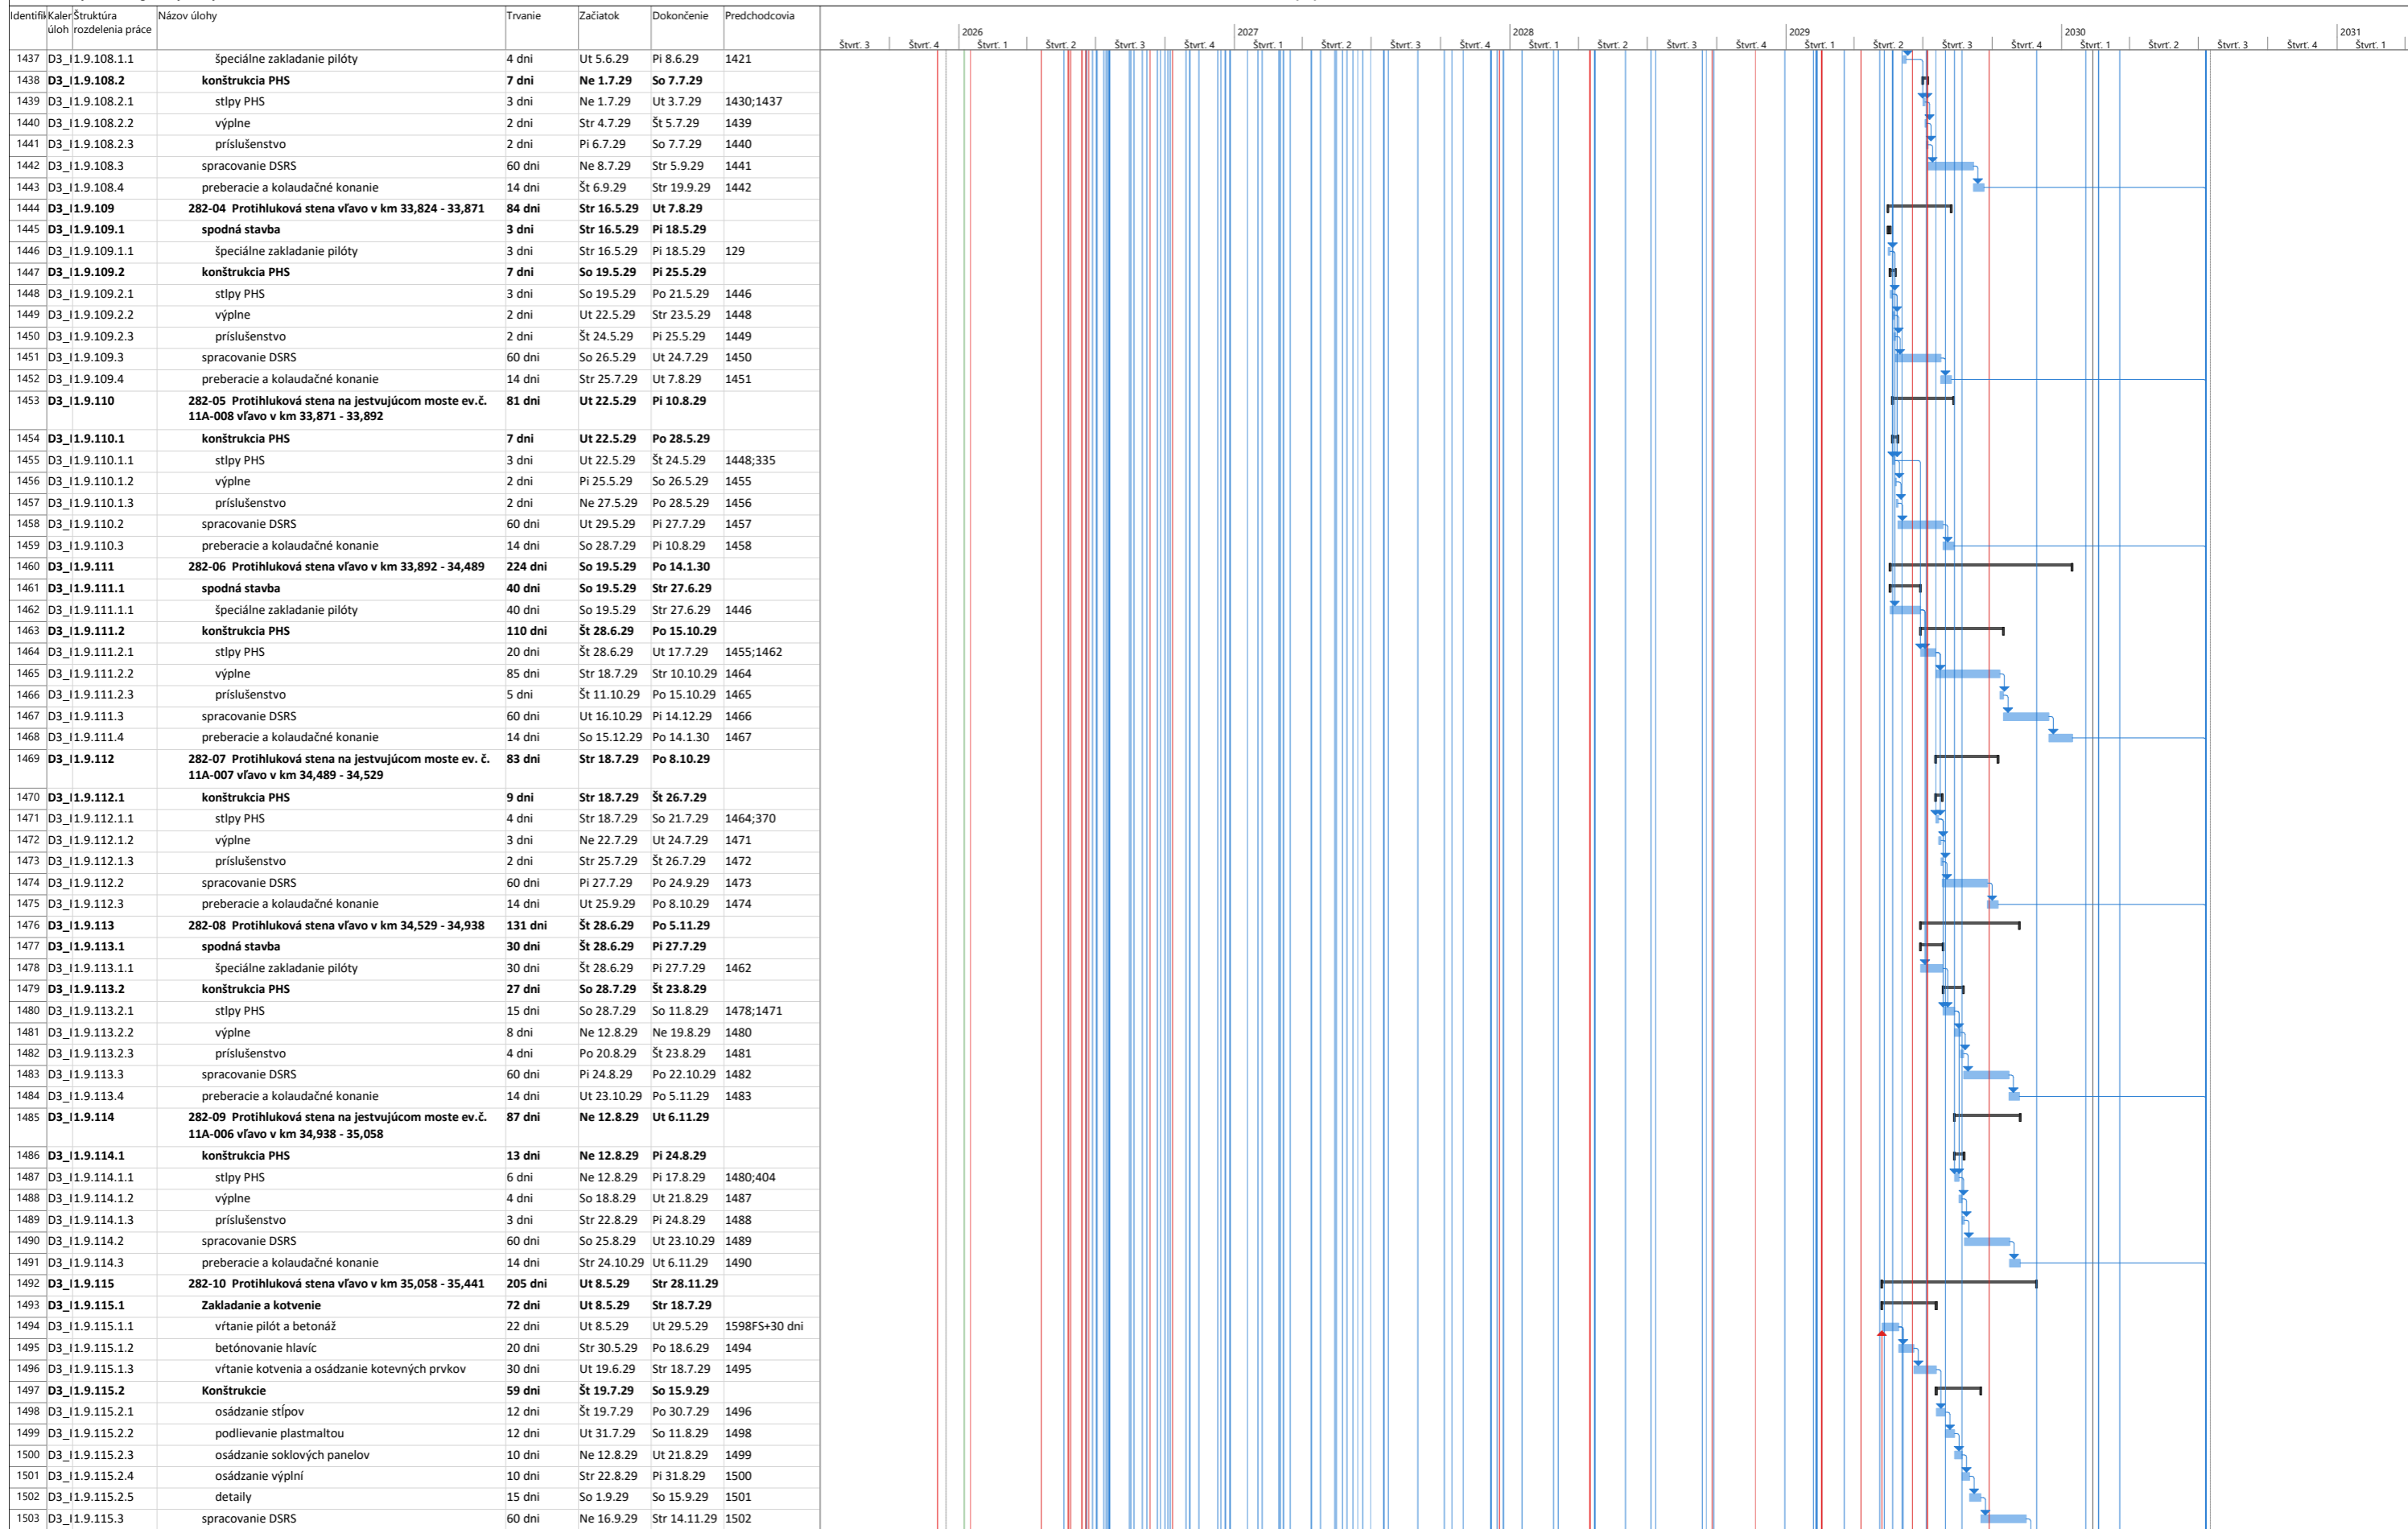


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

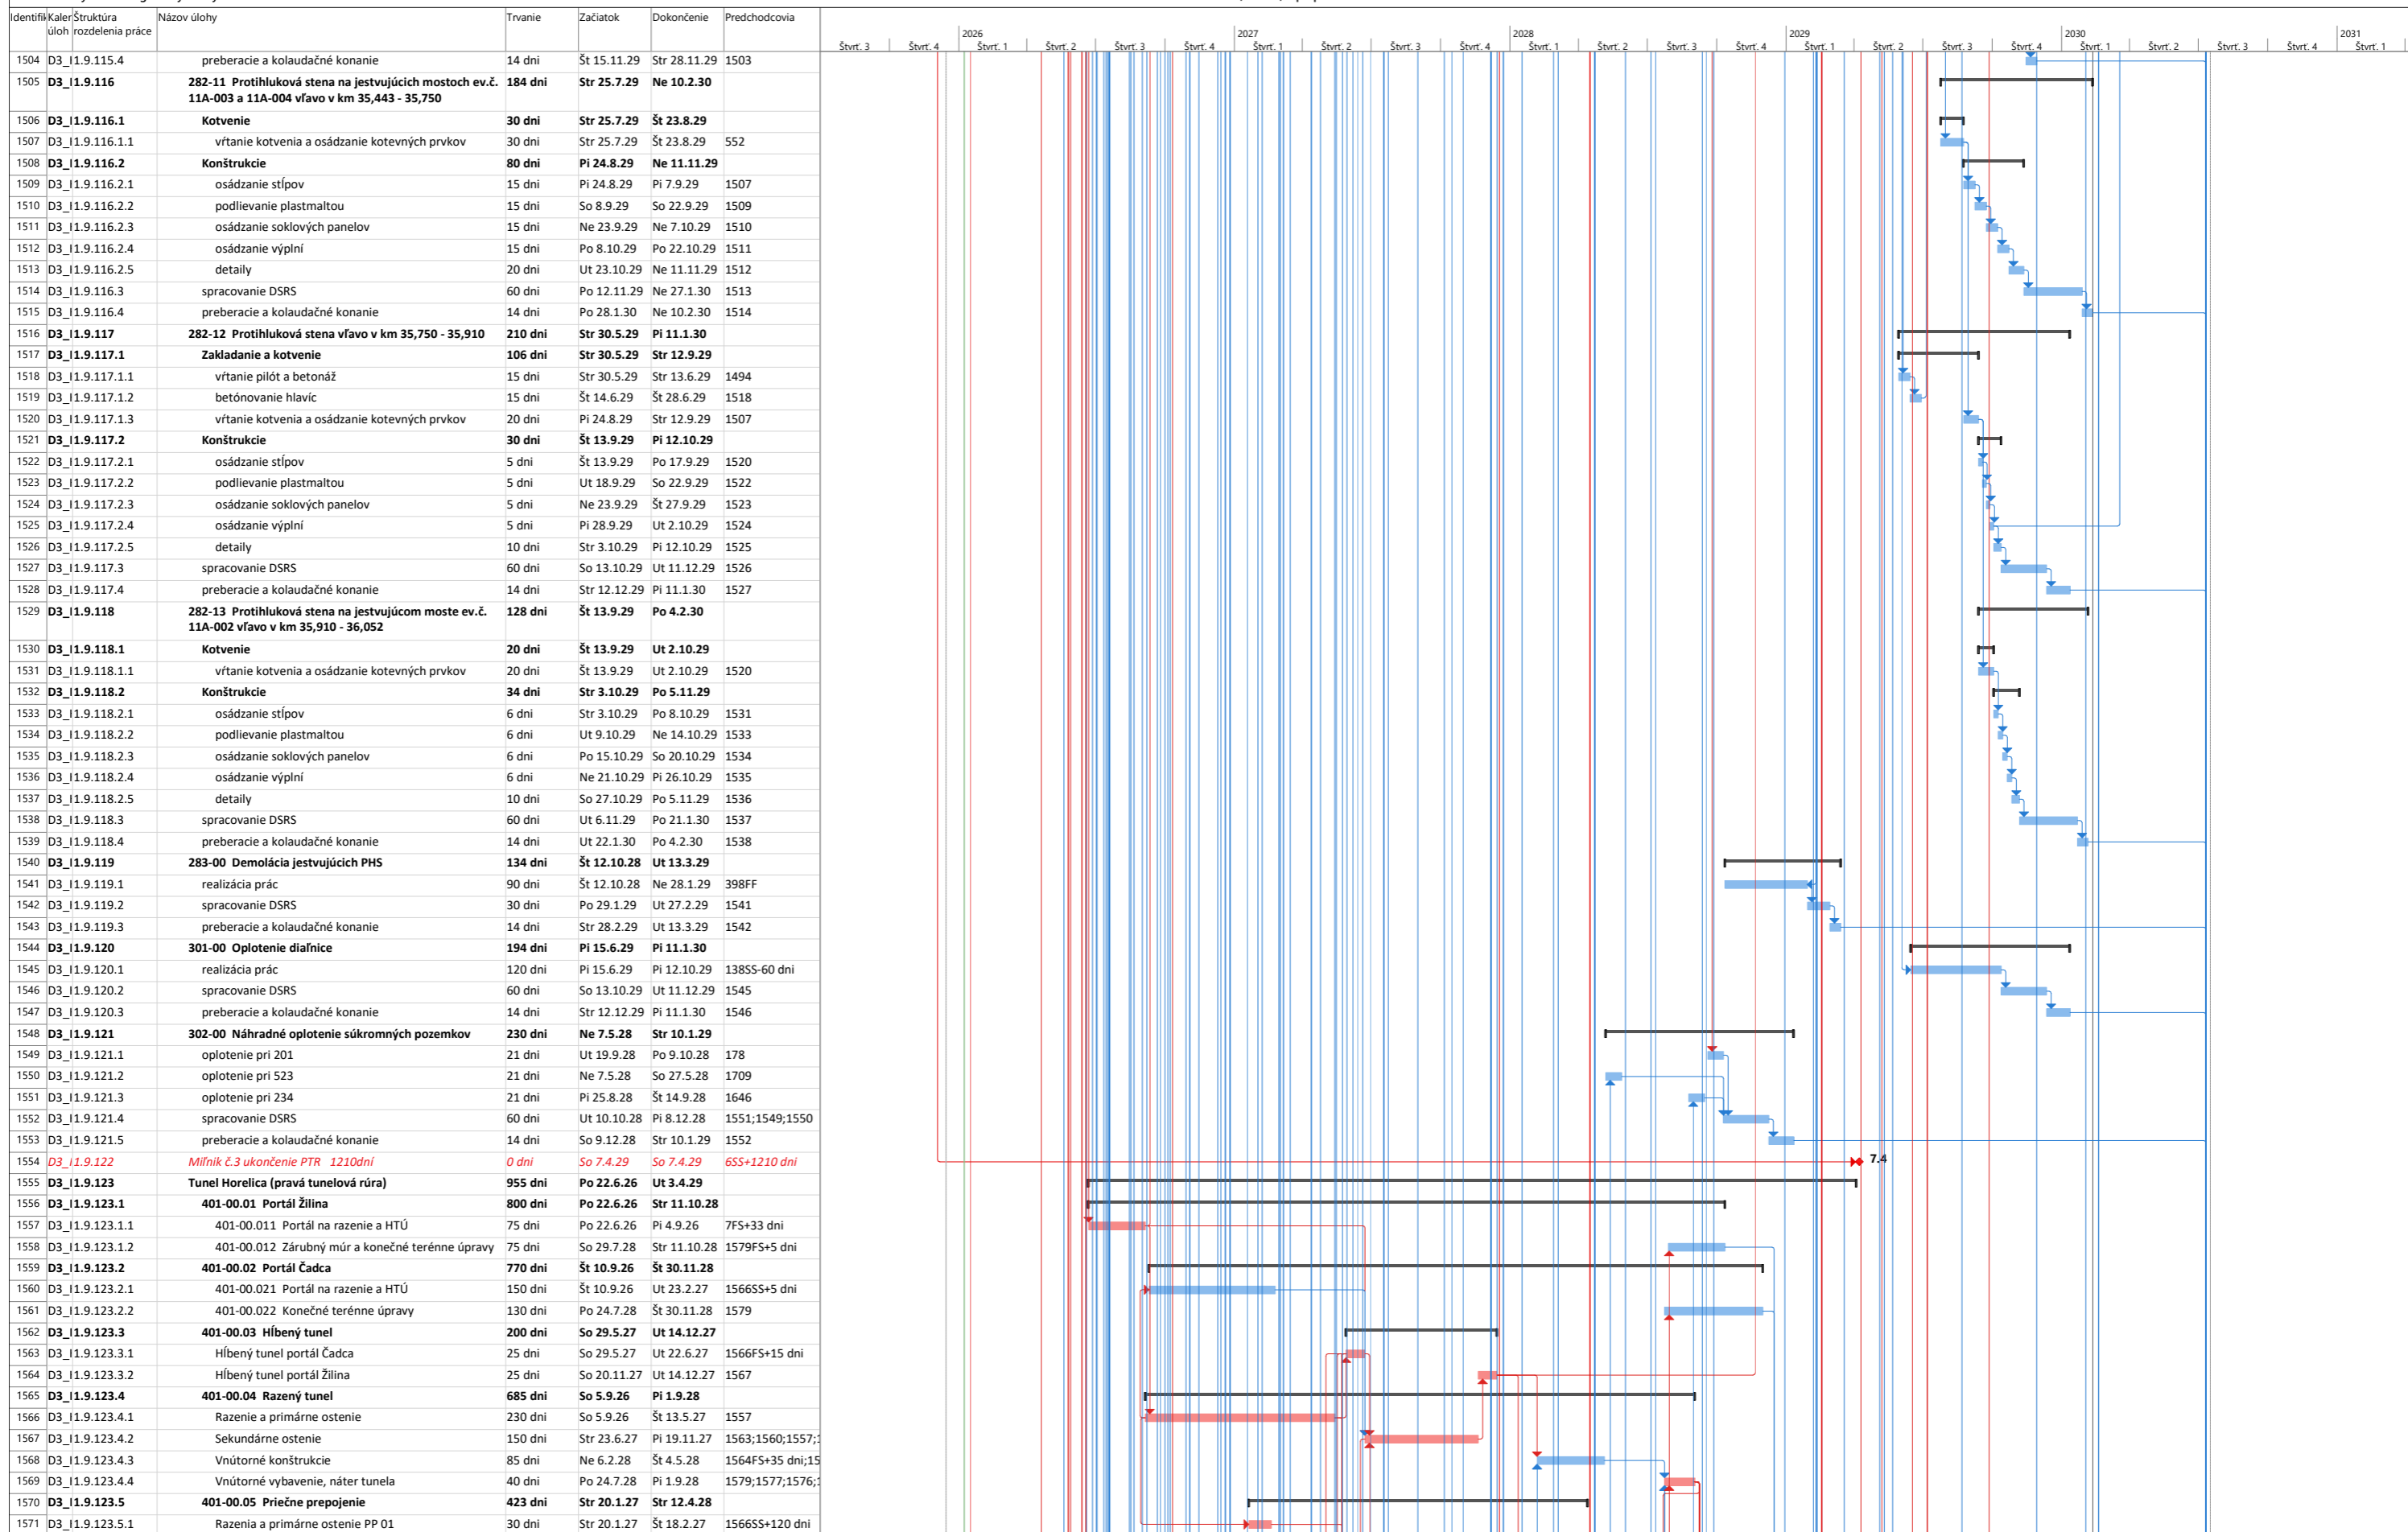


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

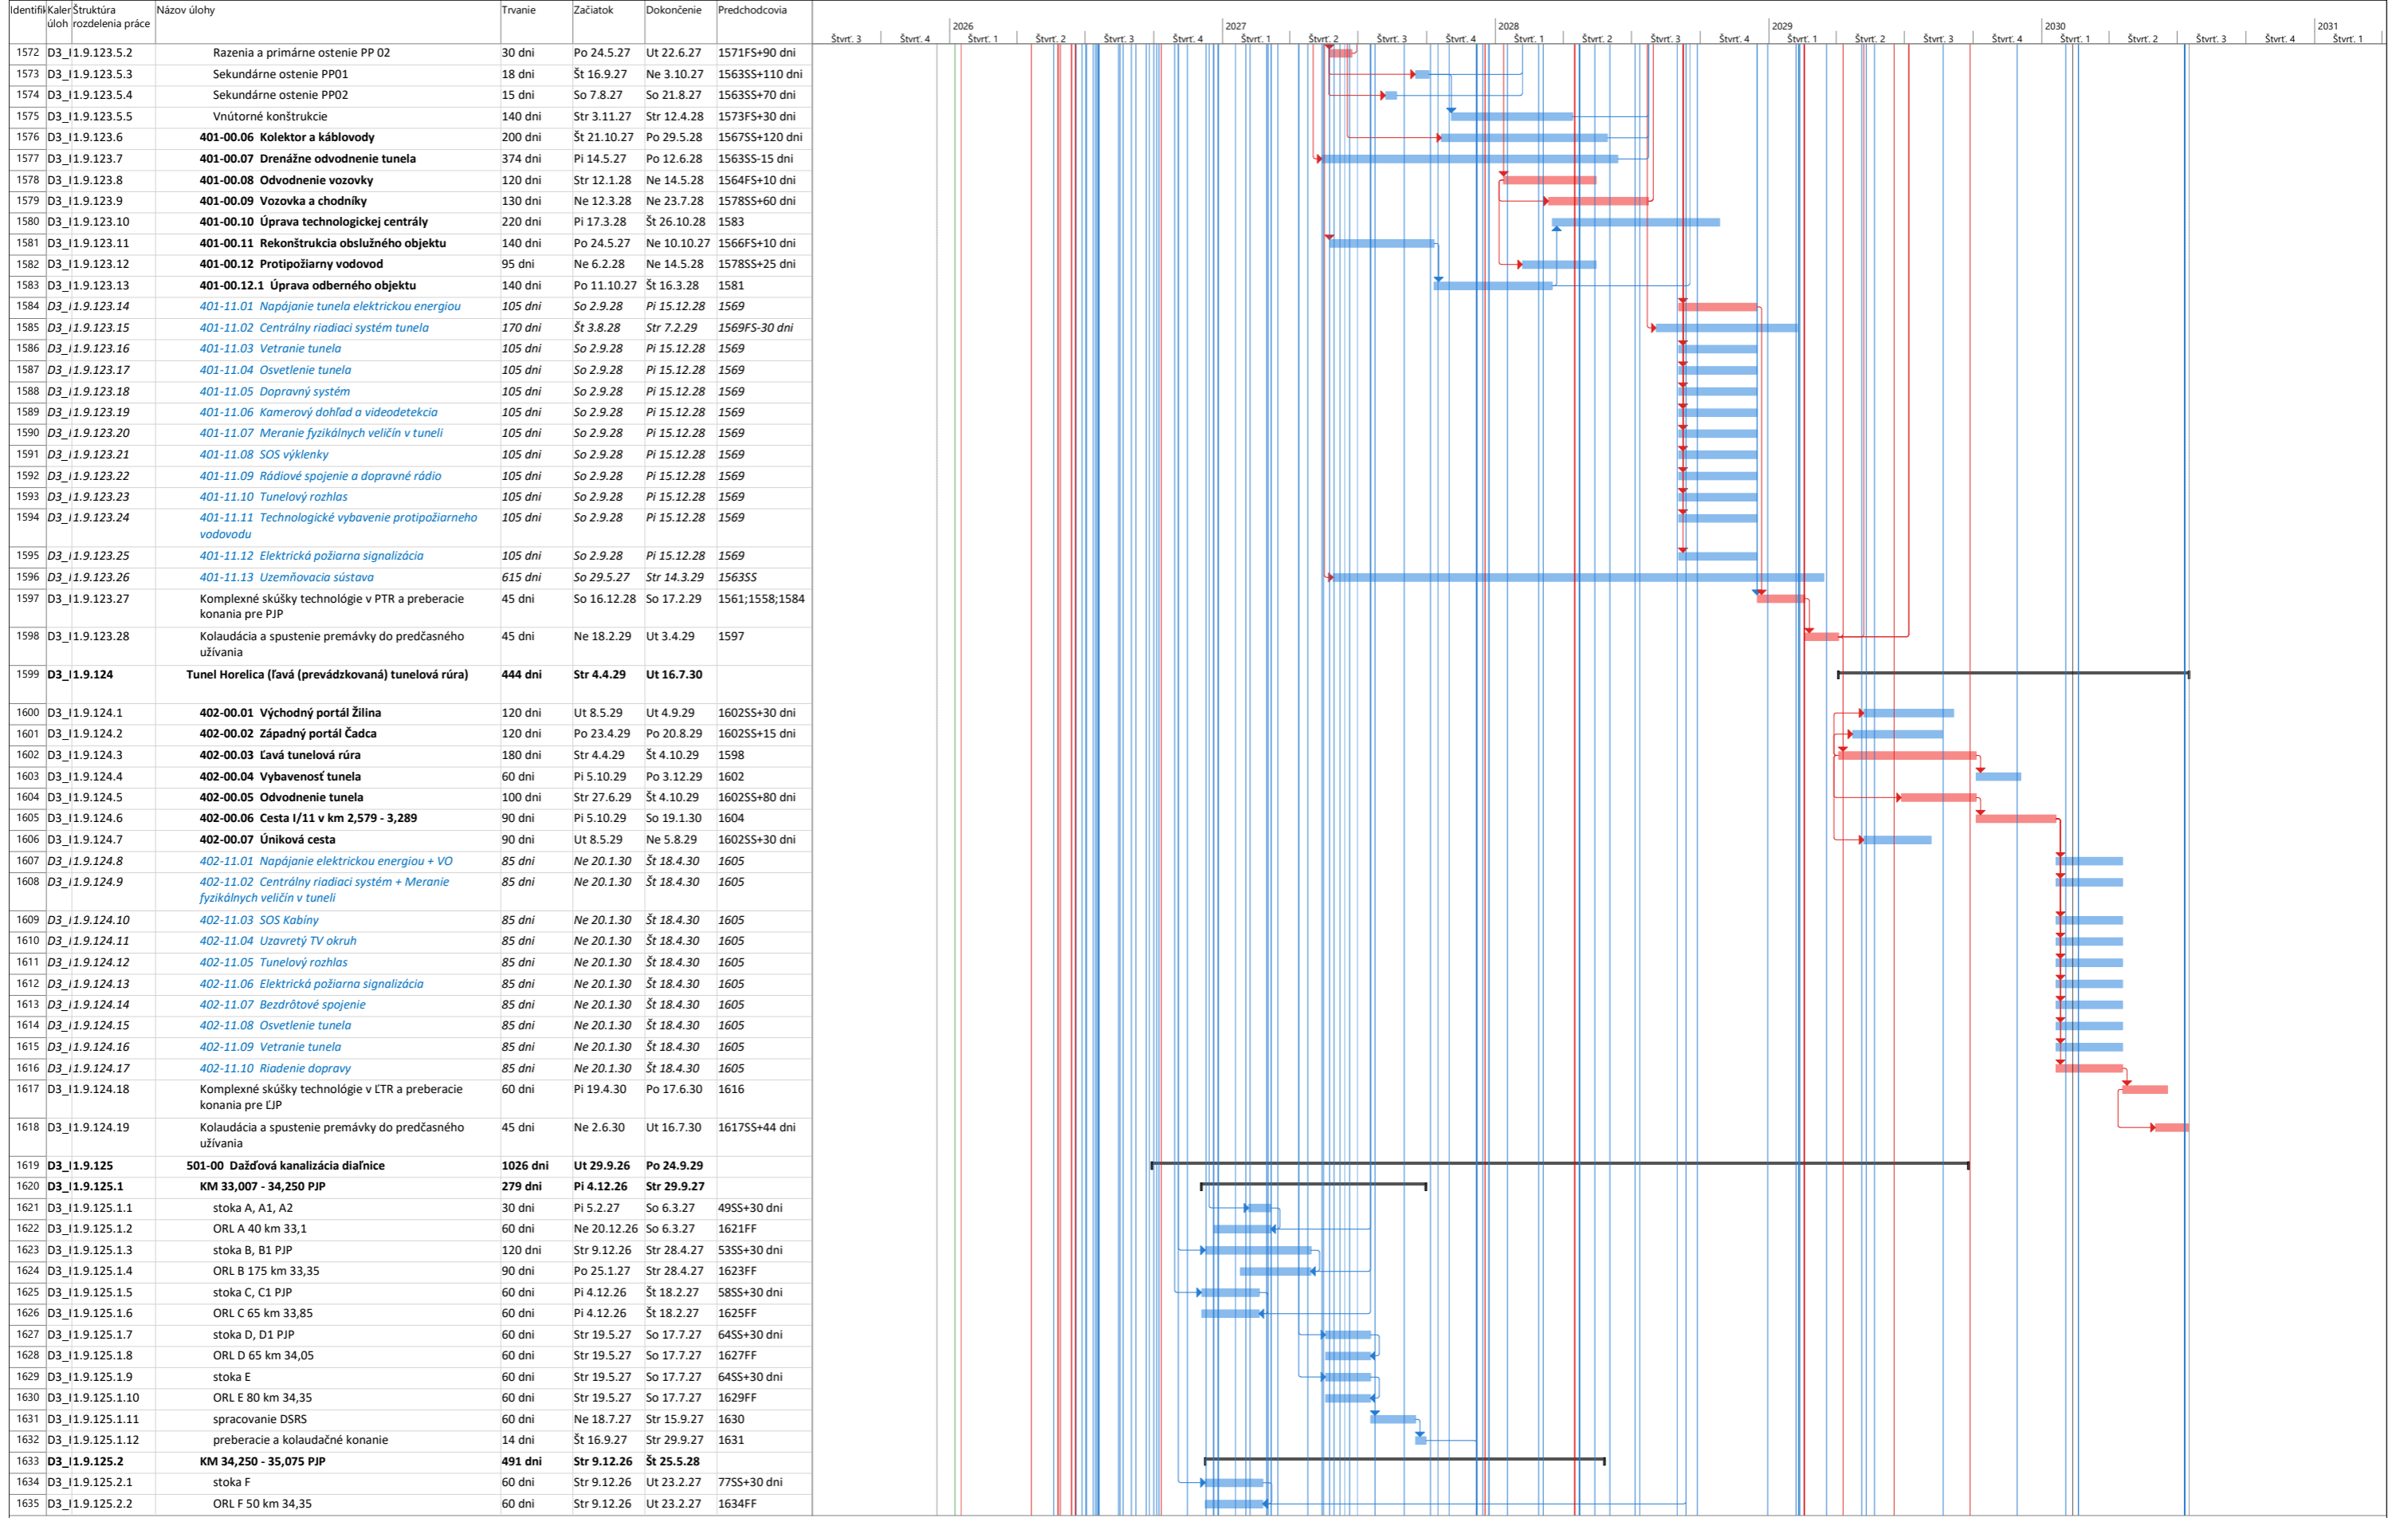



2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

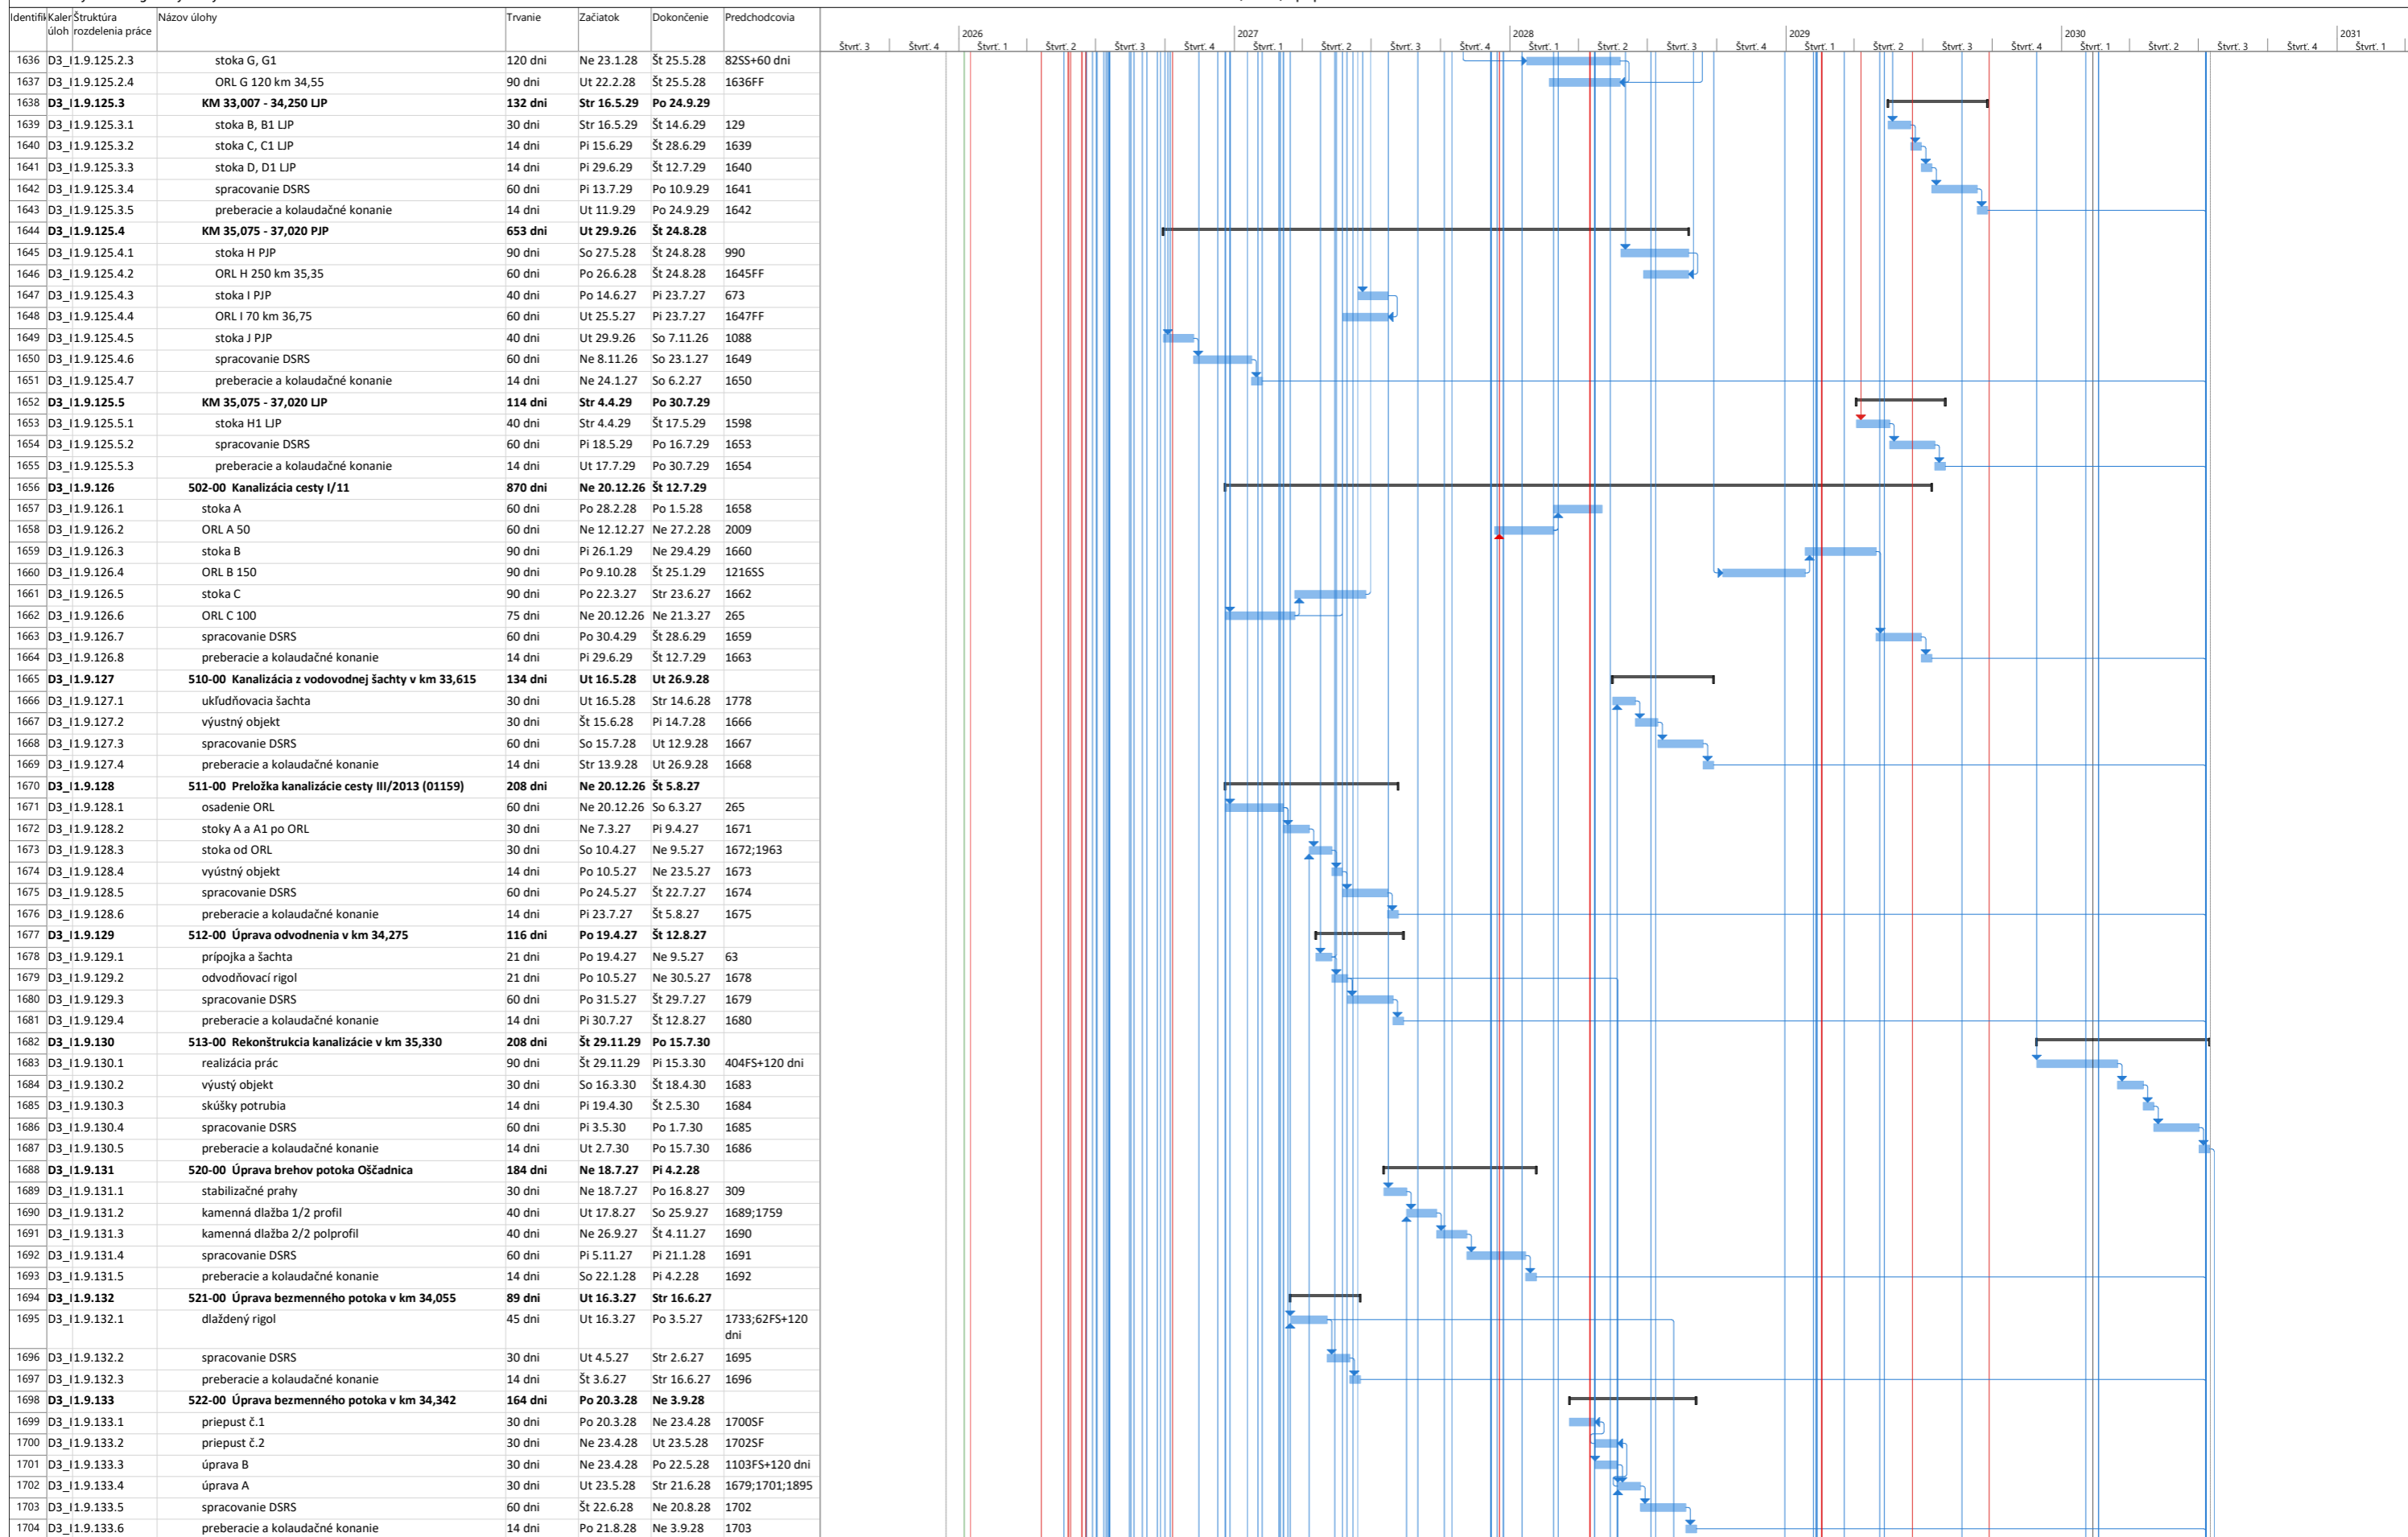


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

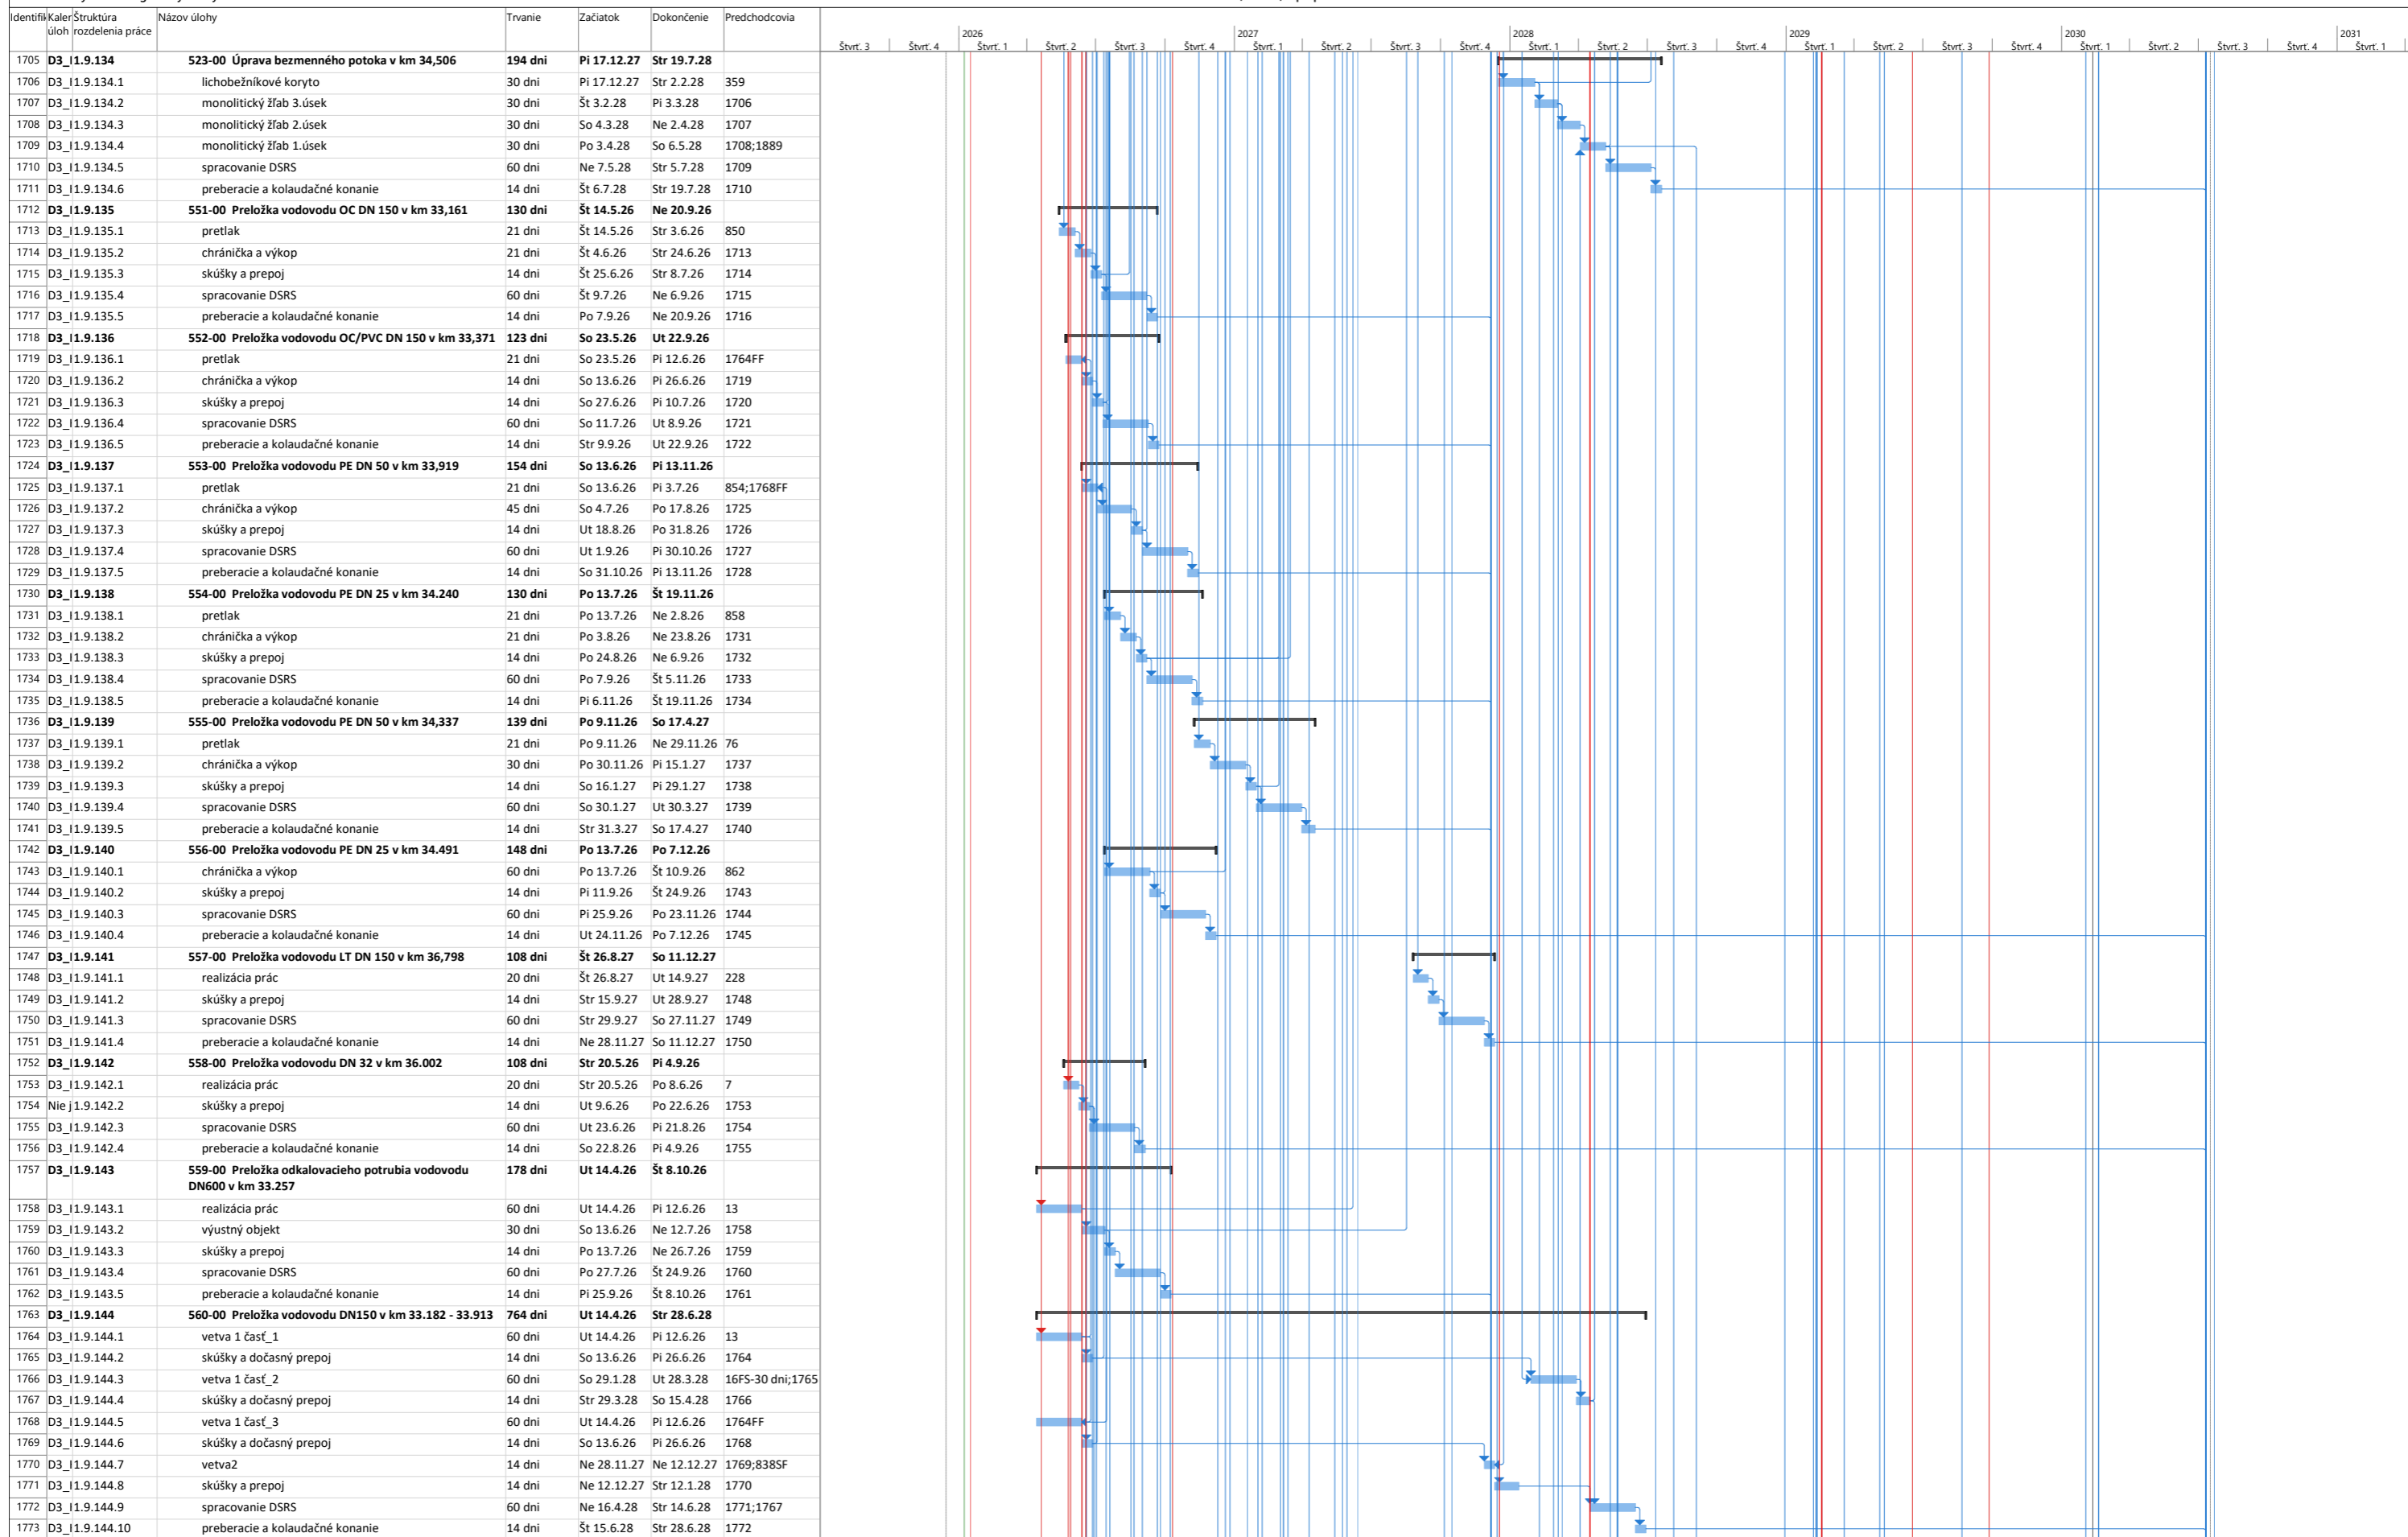

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

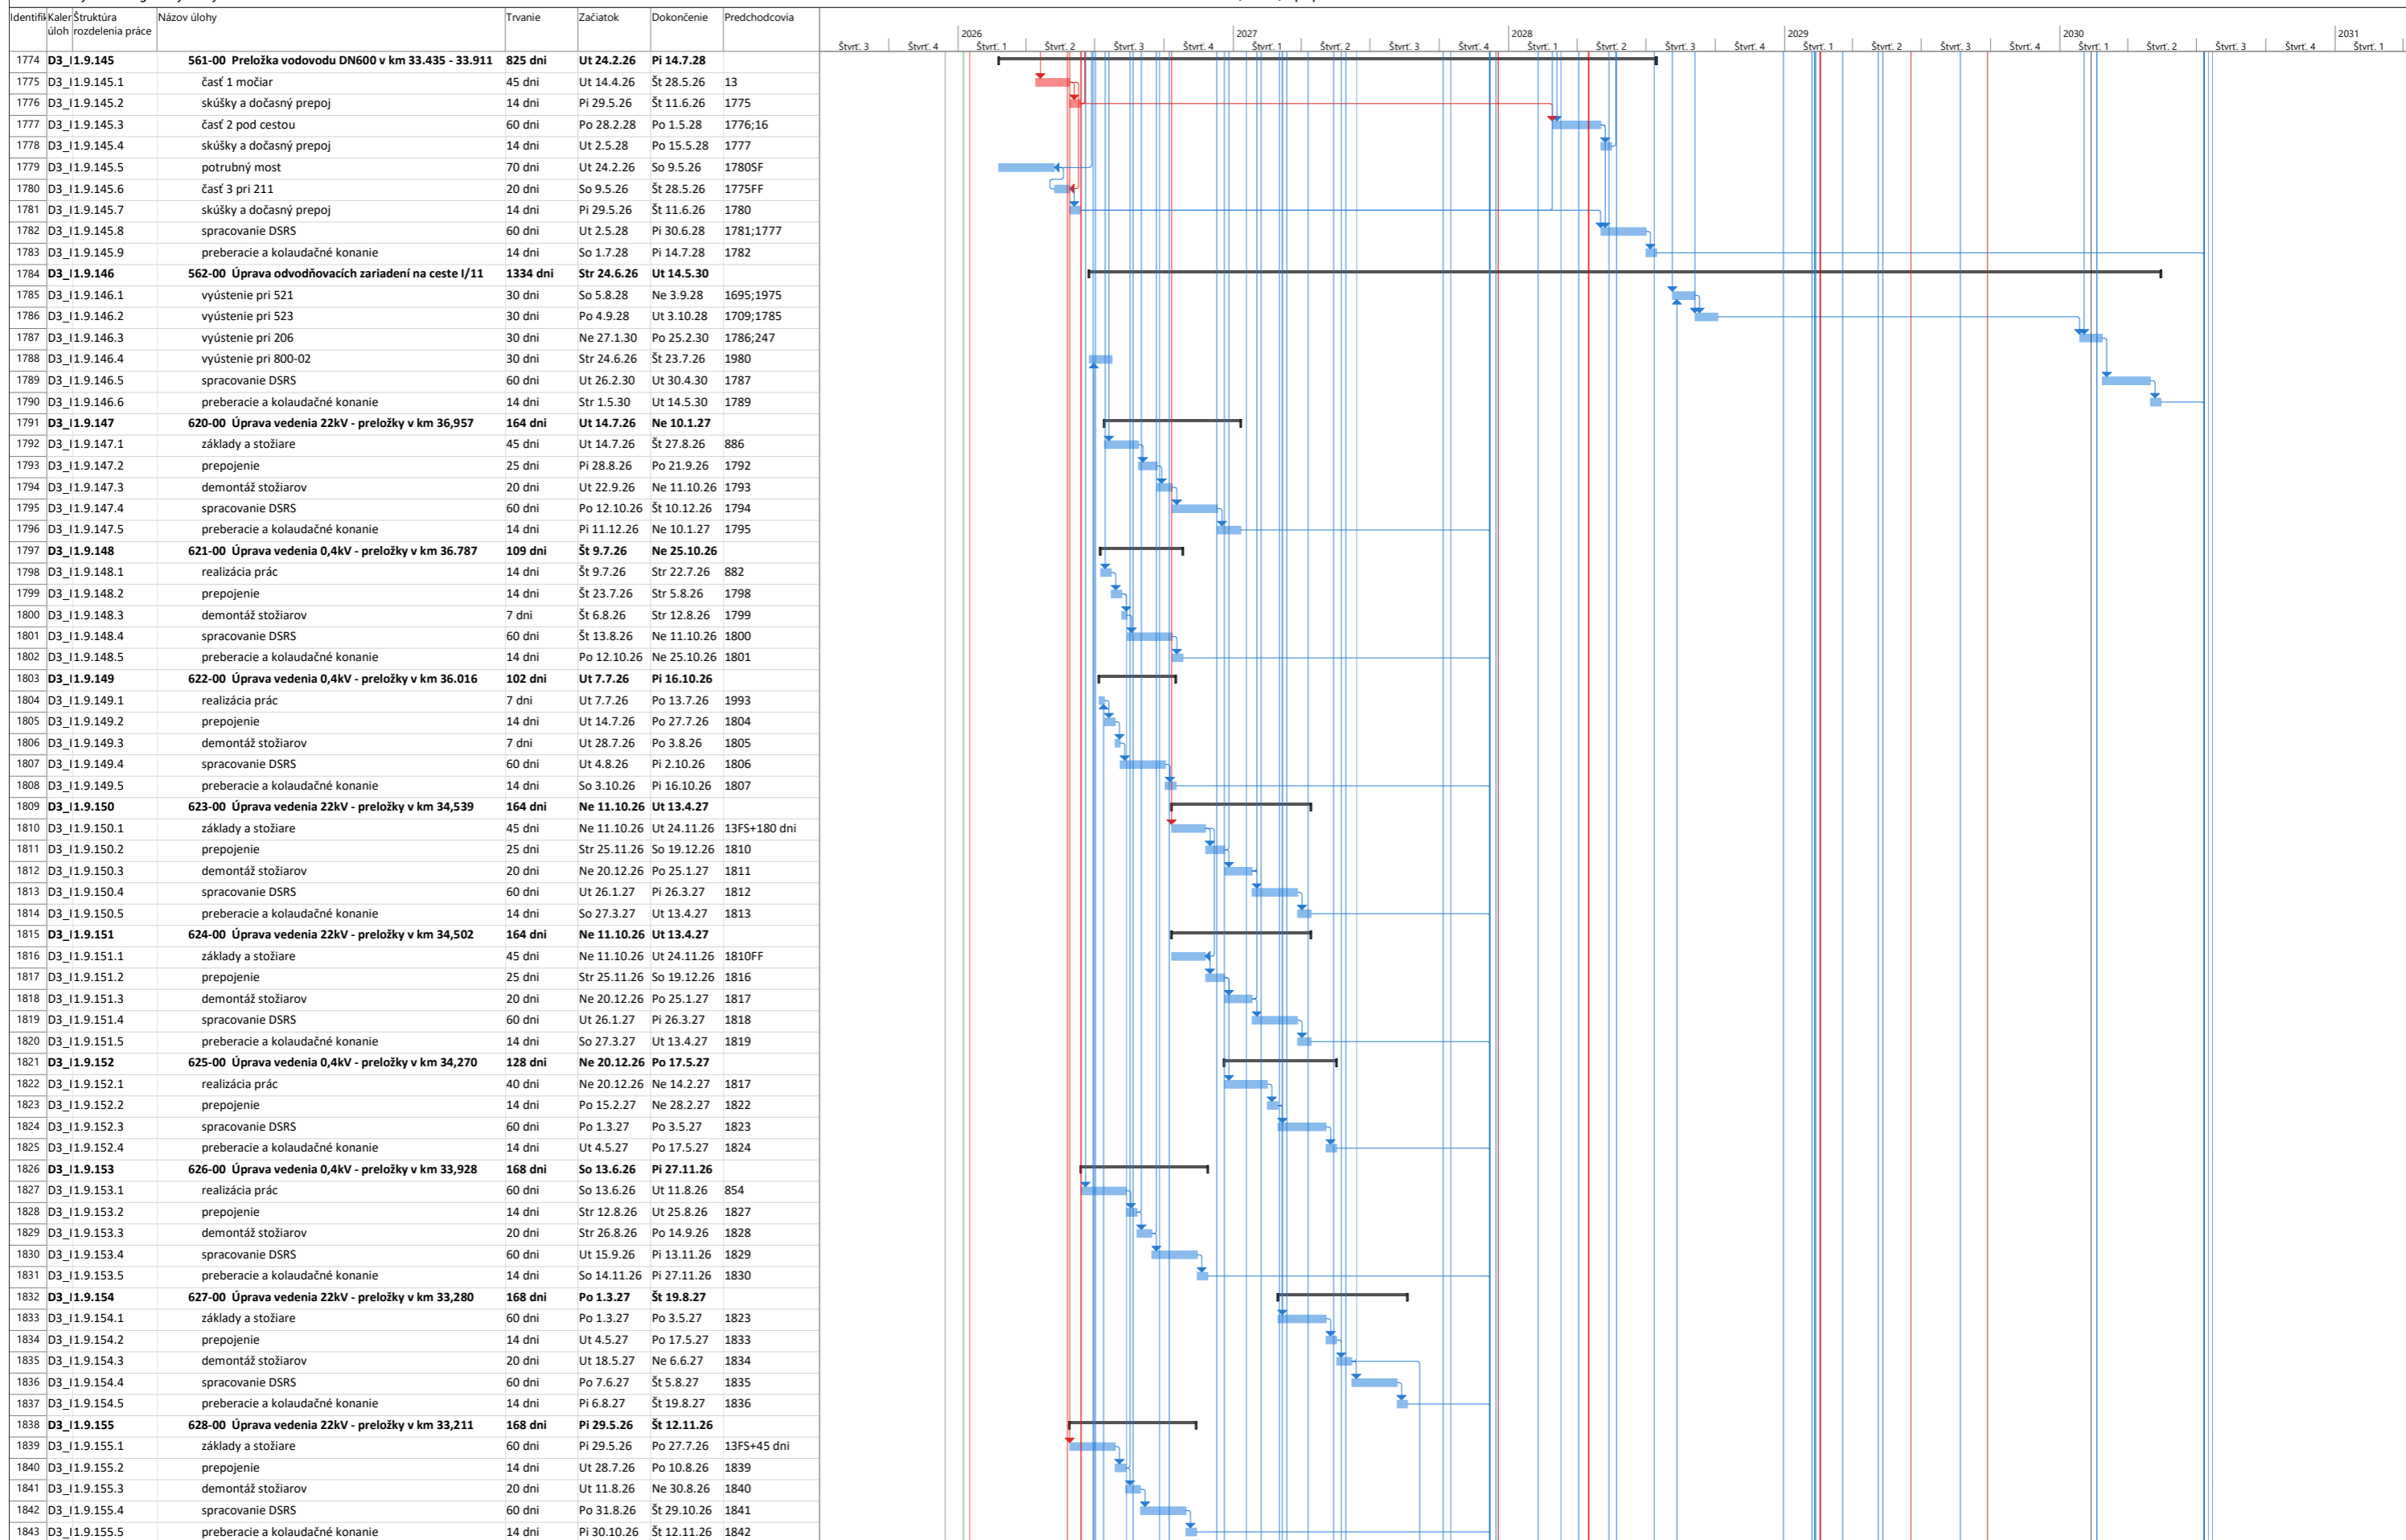


Harmonogram služieb a prác

■ Úloha ■ Medzník ◆ Súhrn projektu ■ Neaktívny medzník ■ Manuálna úloha ■ Manuálny súhrn ■ Iba začiatok ■ Externé úlohy ■ Termín ◆ Kritické rozdelenie ◆ Manuálny priebeh
◆ Rozdeliť ◆ Súhrn ◆ Neaktívna úloha ◆ Neaktívny súhrn ◆ Iba trvanie ◆ Manuálny súhrn ◆ Iba dokončiť ◆ Externý medzník ◆ Kritické ◆ Priebeh


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

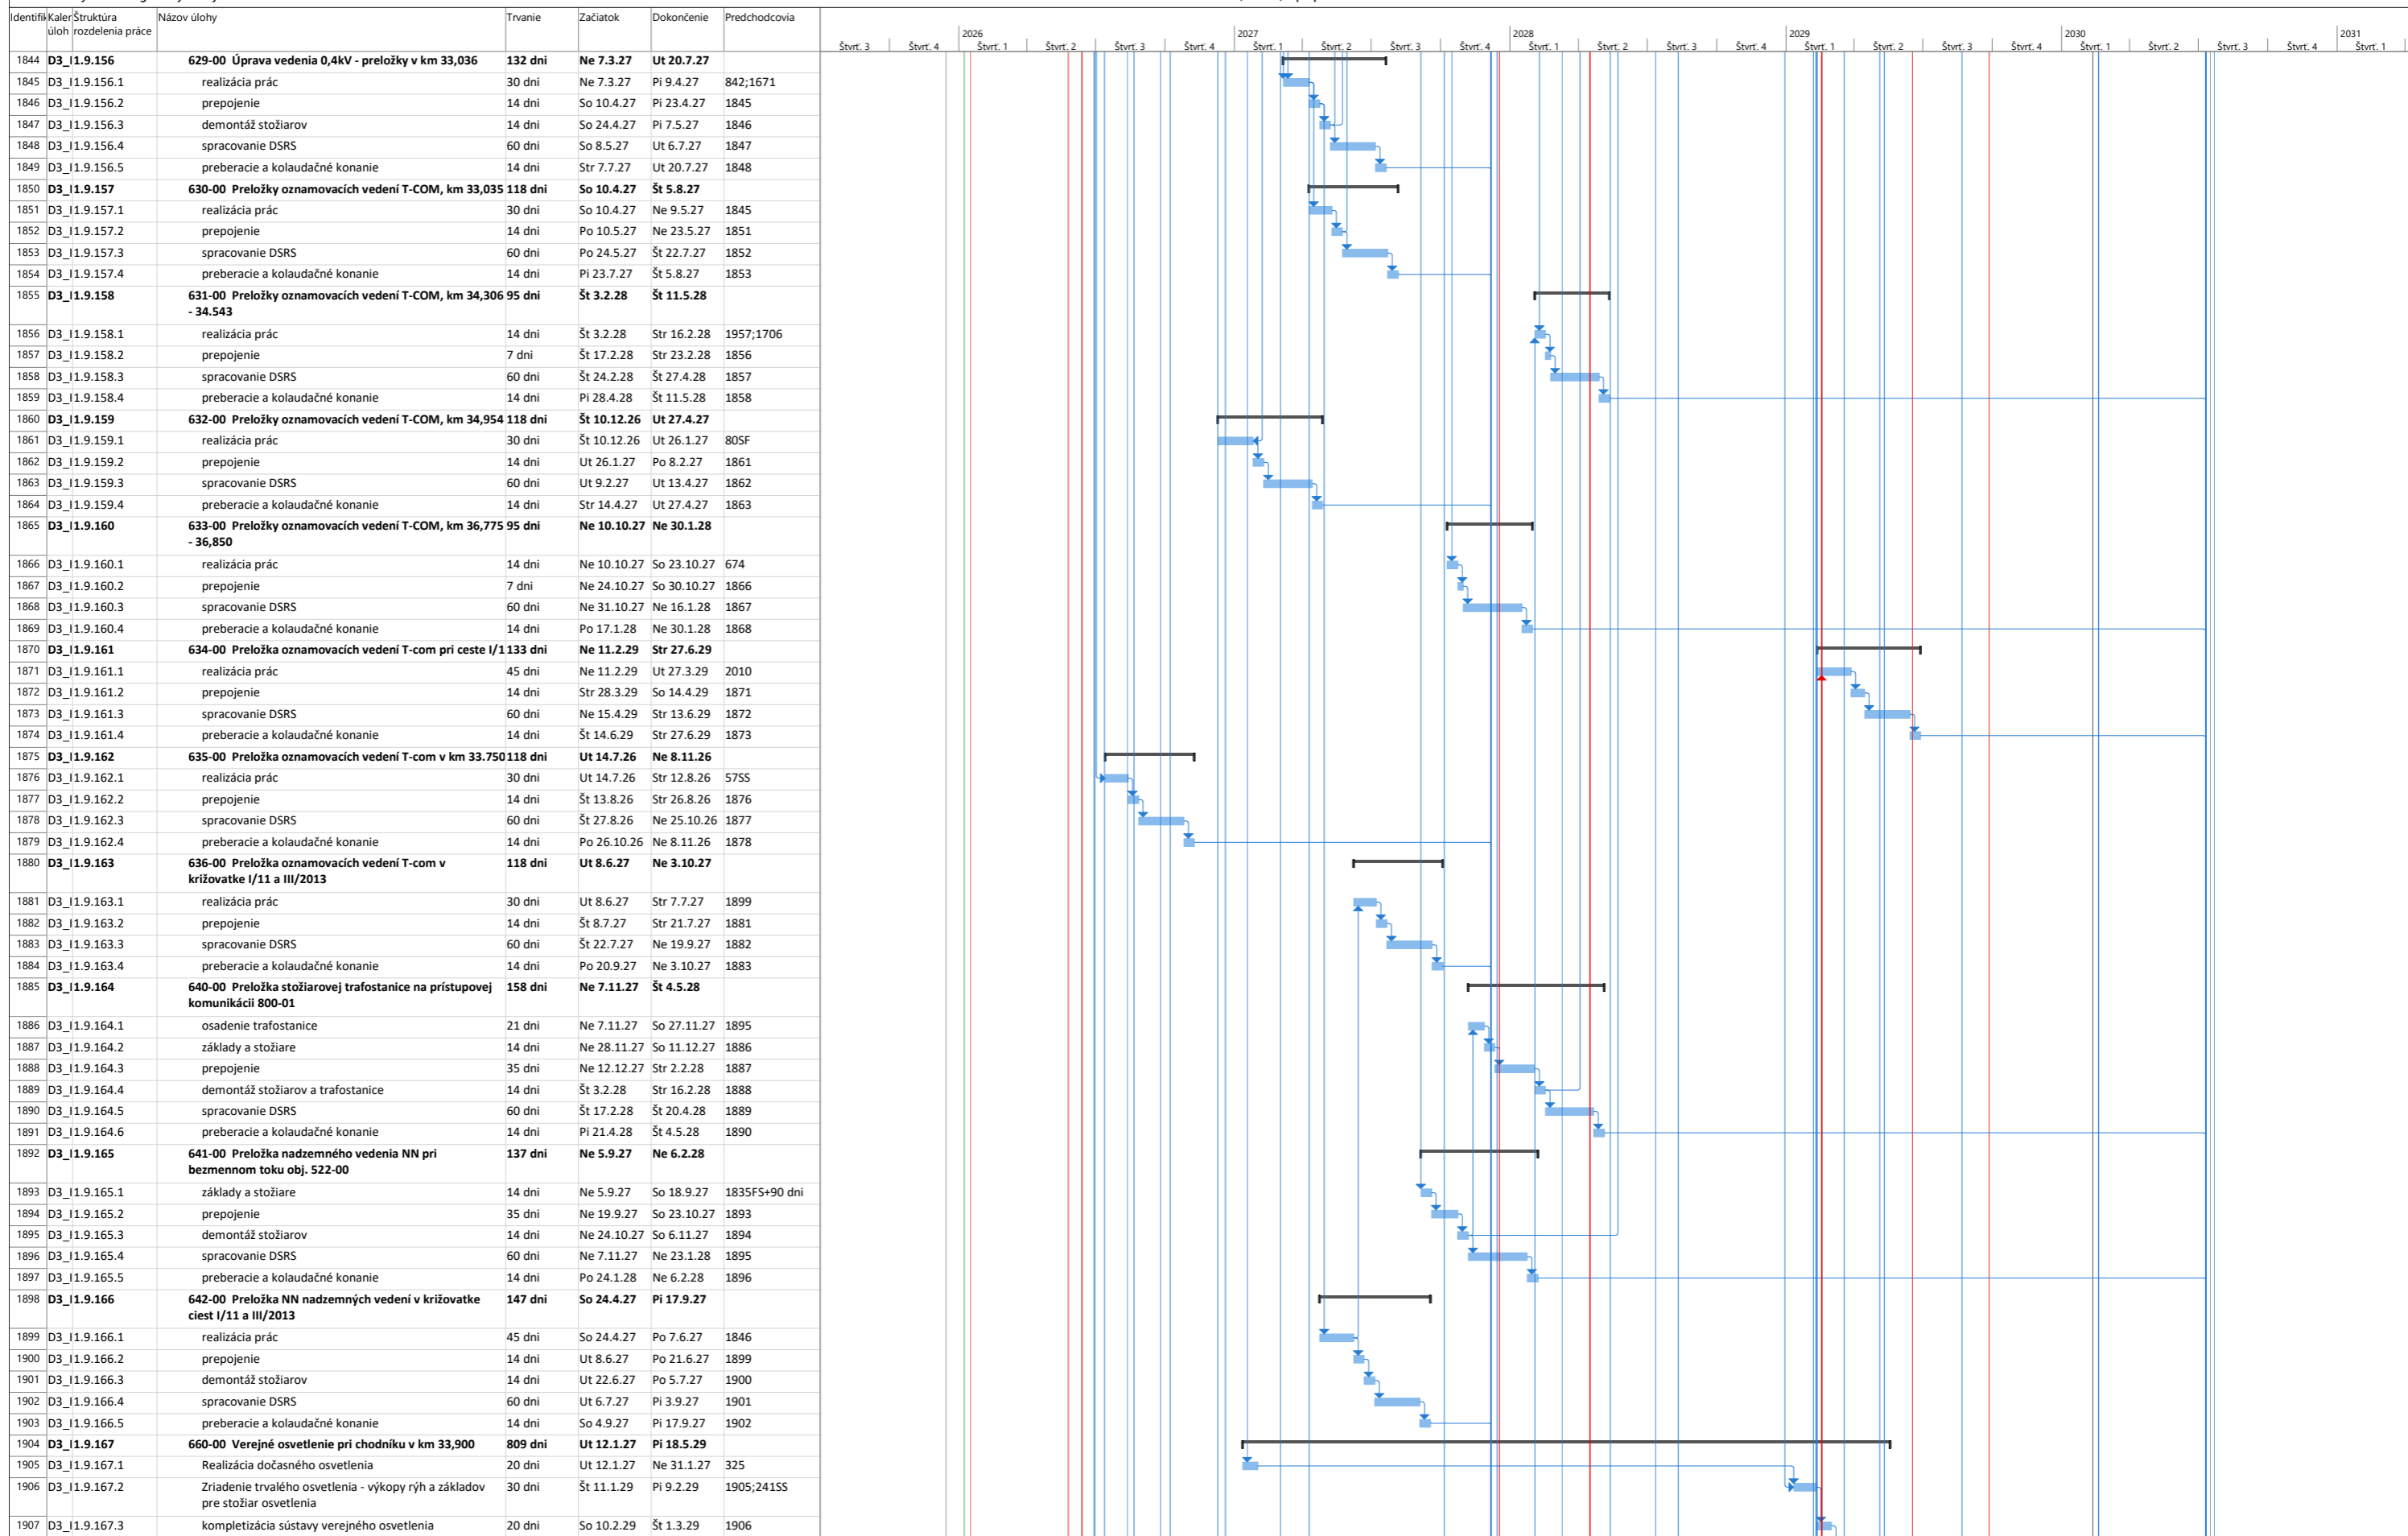

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

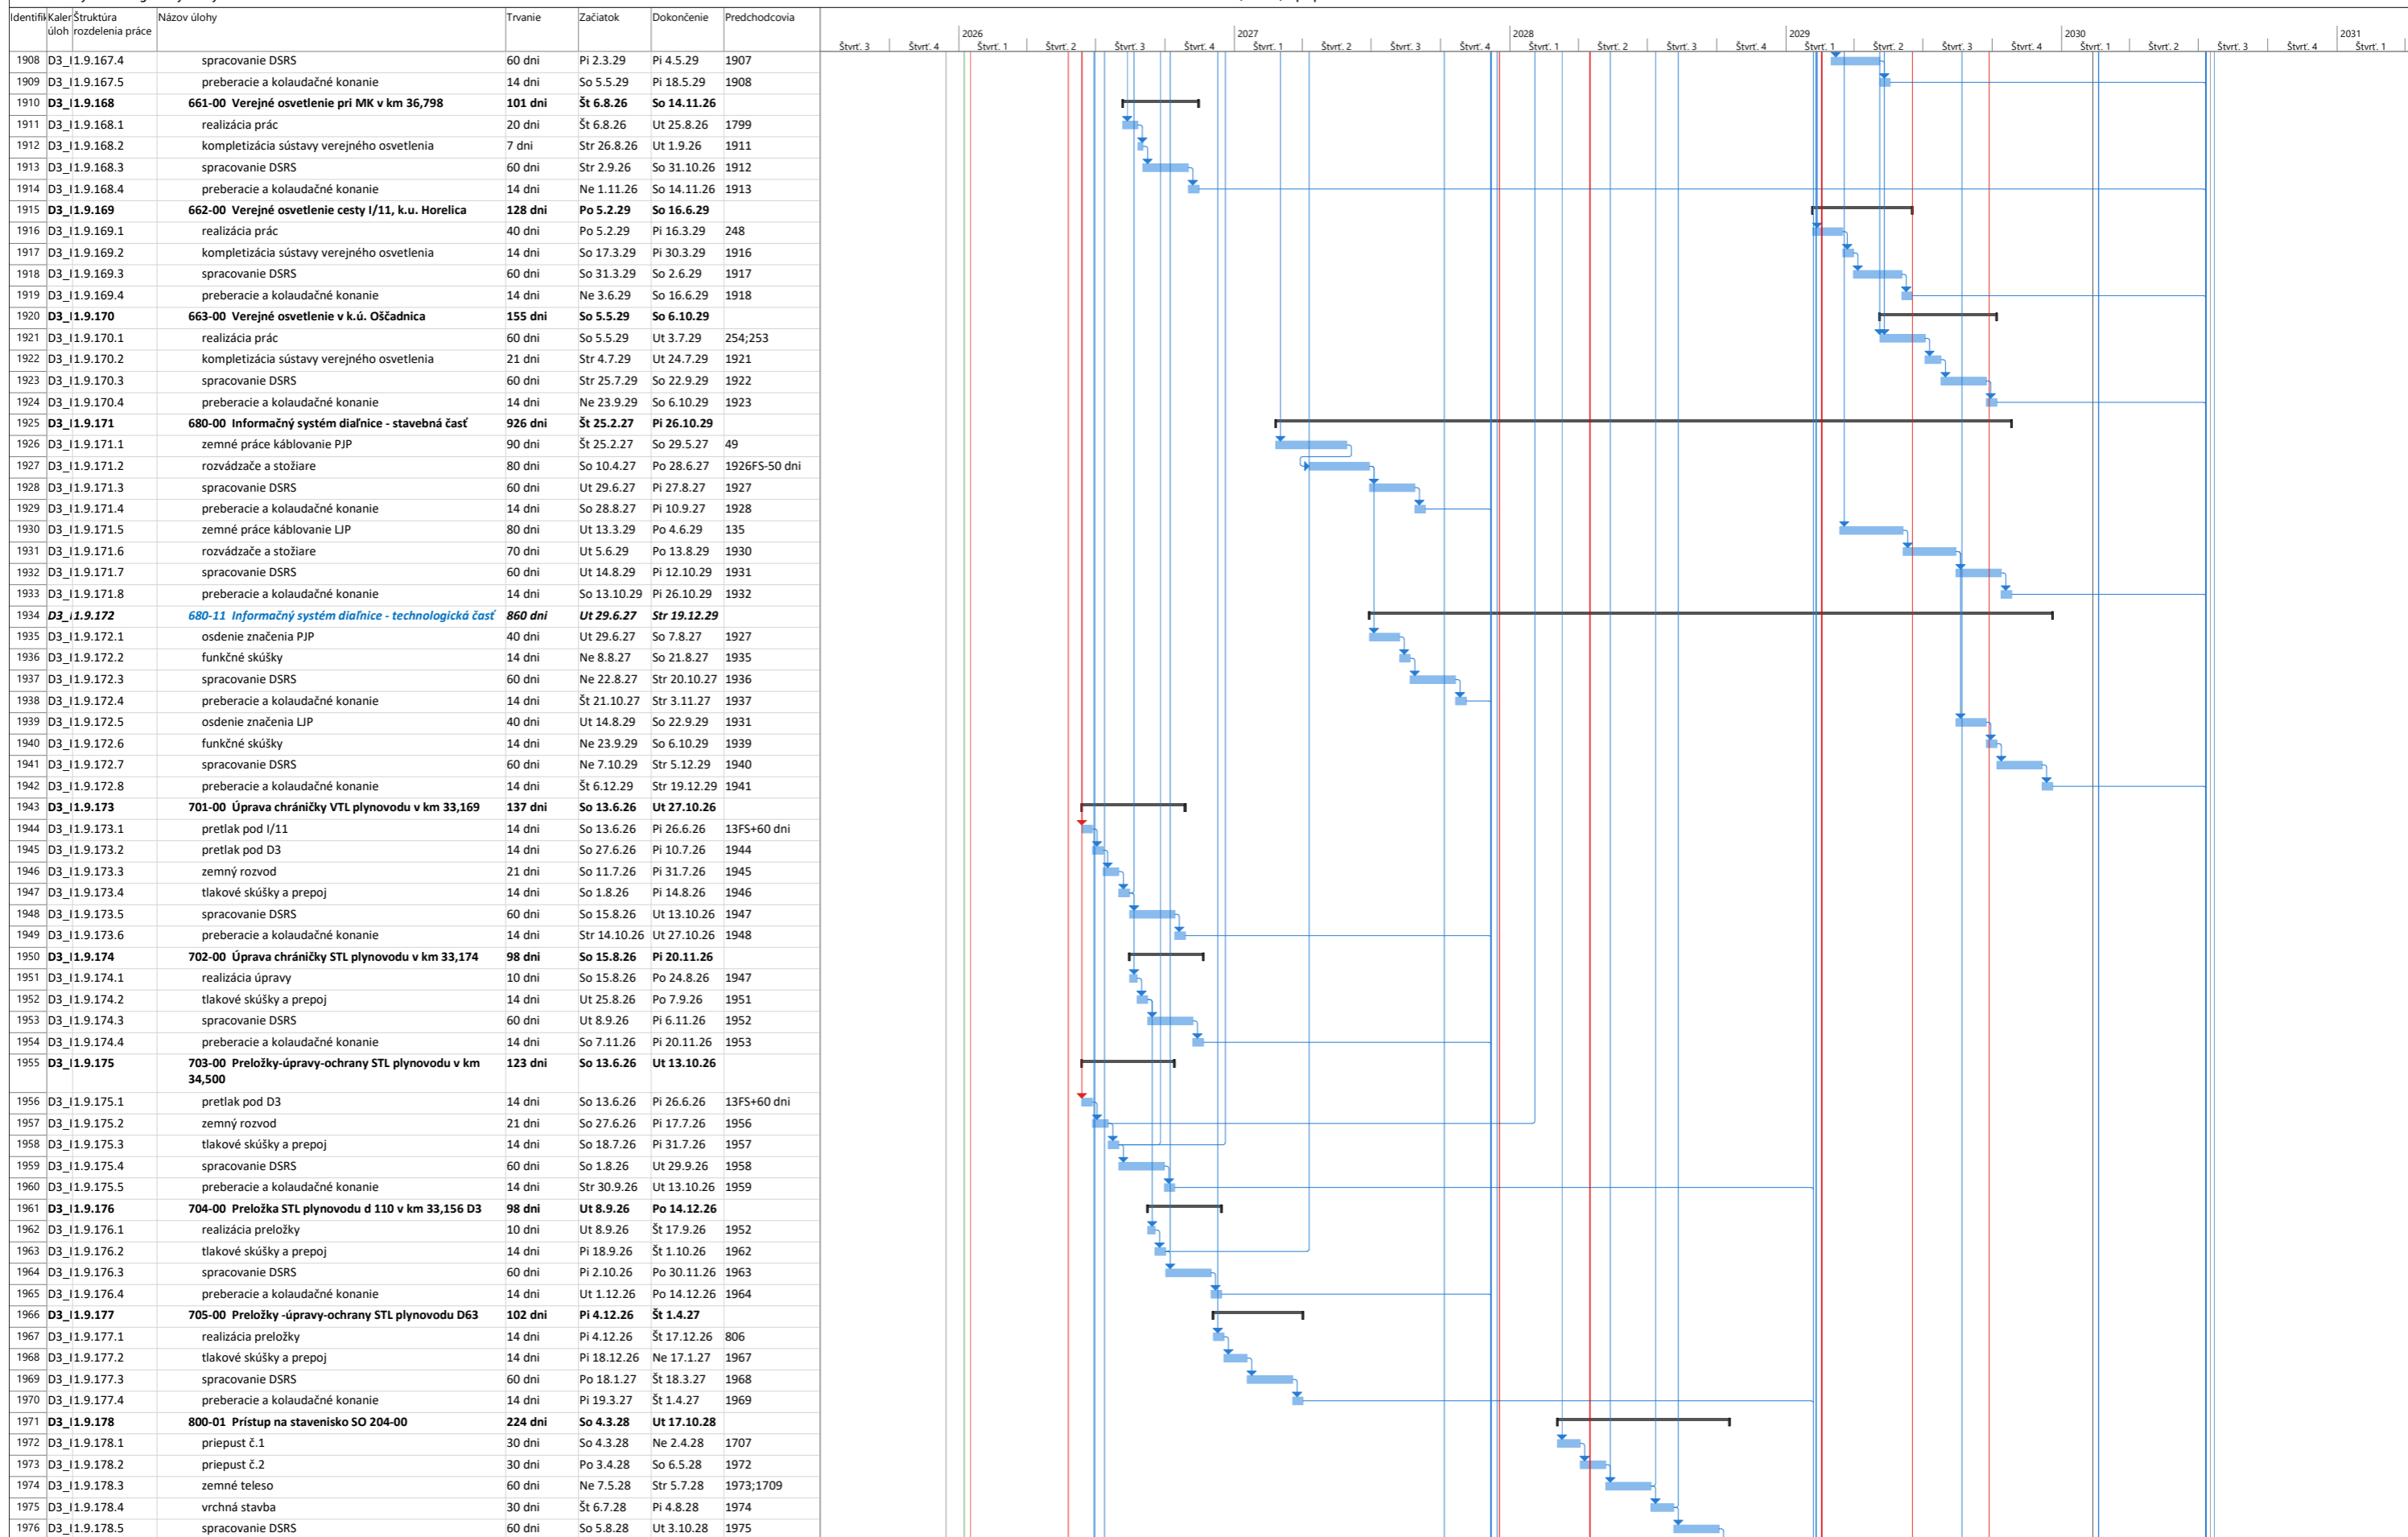


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Ošadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil




2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

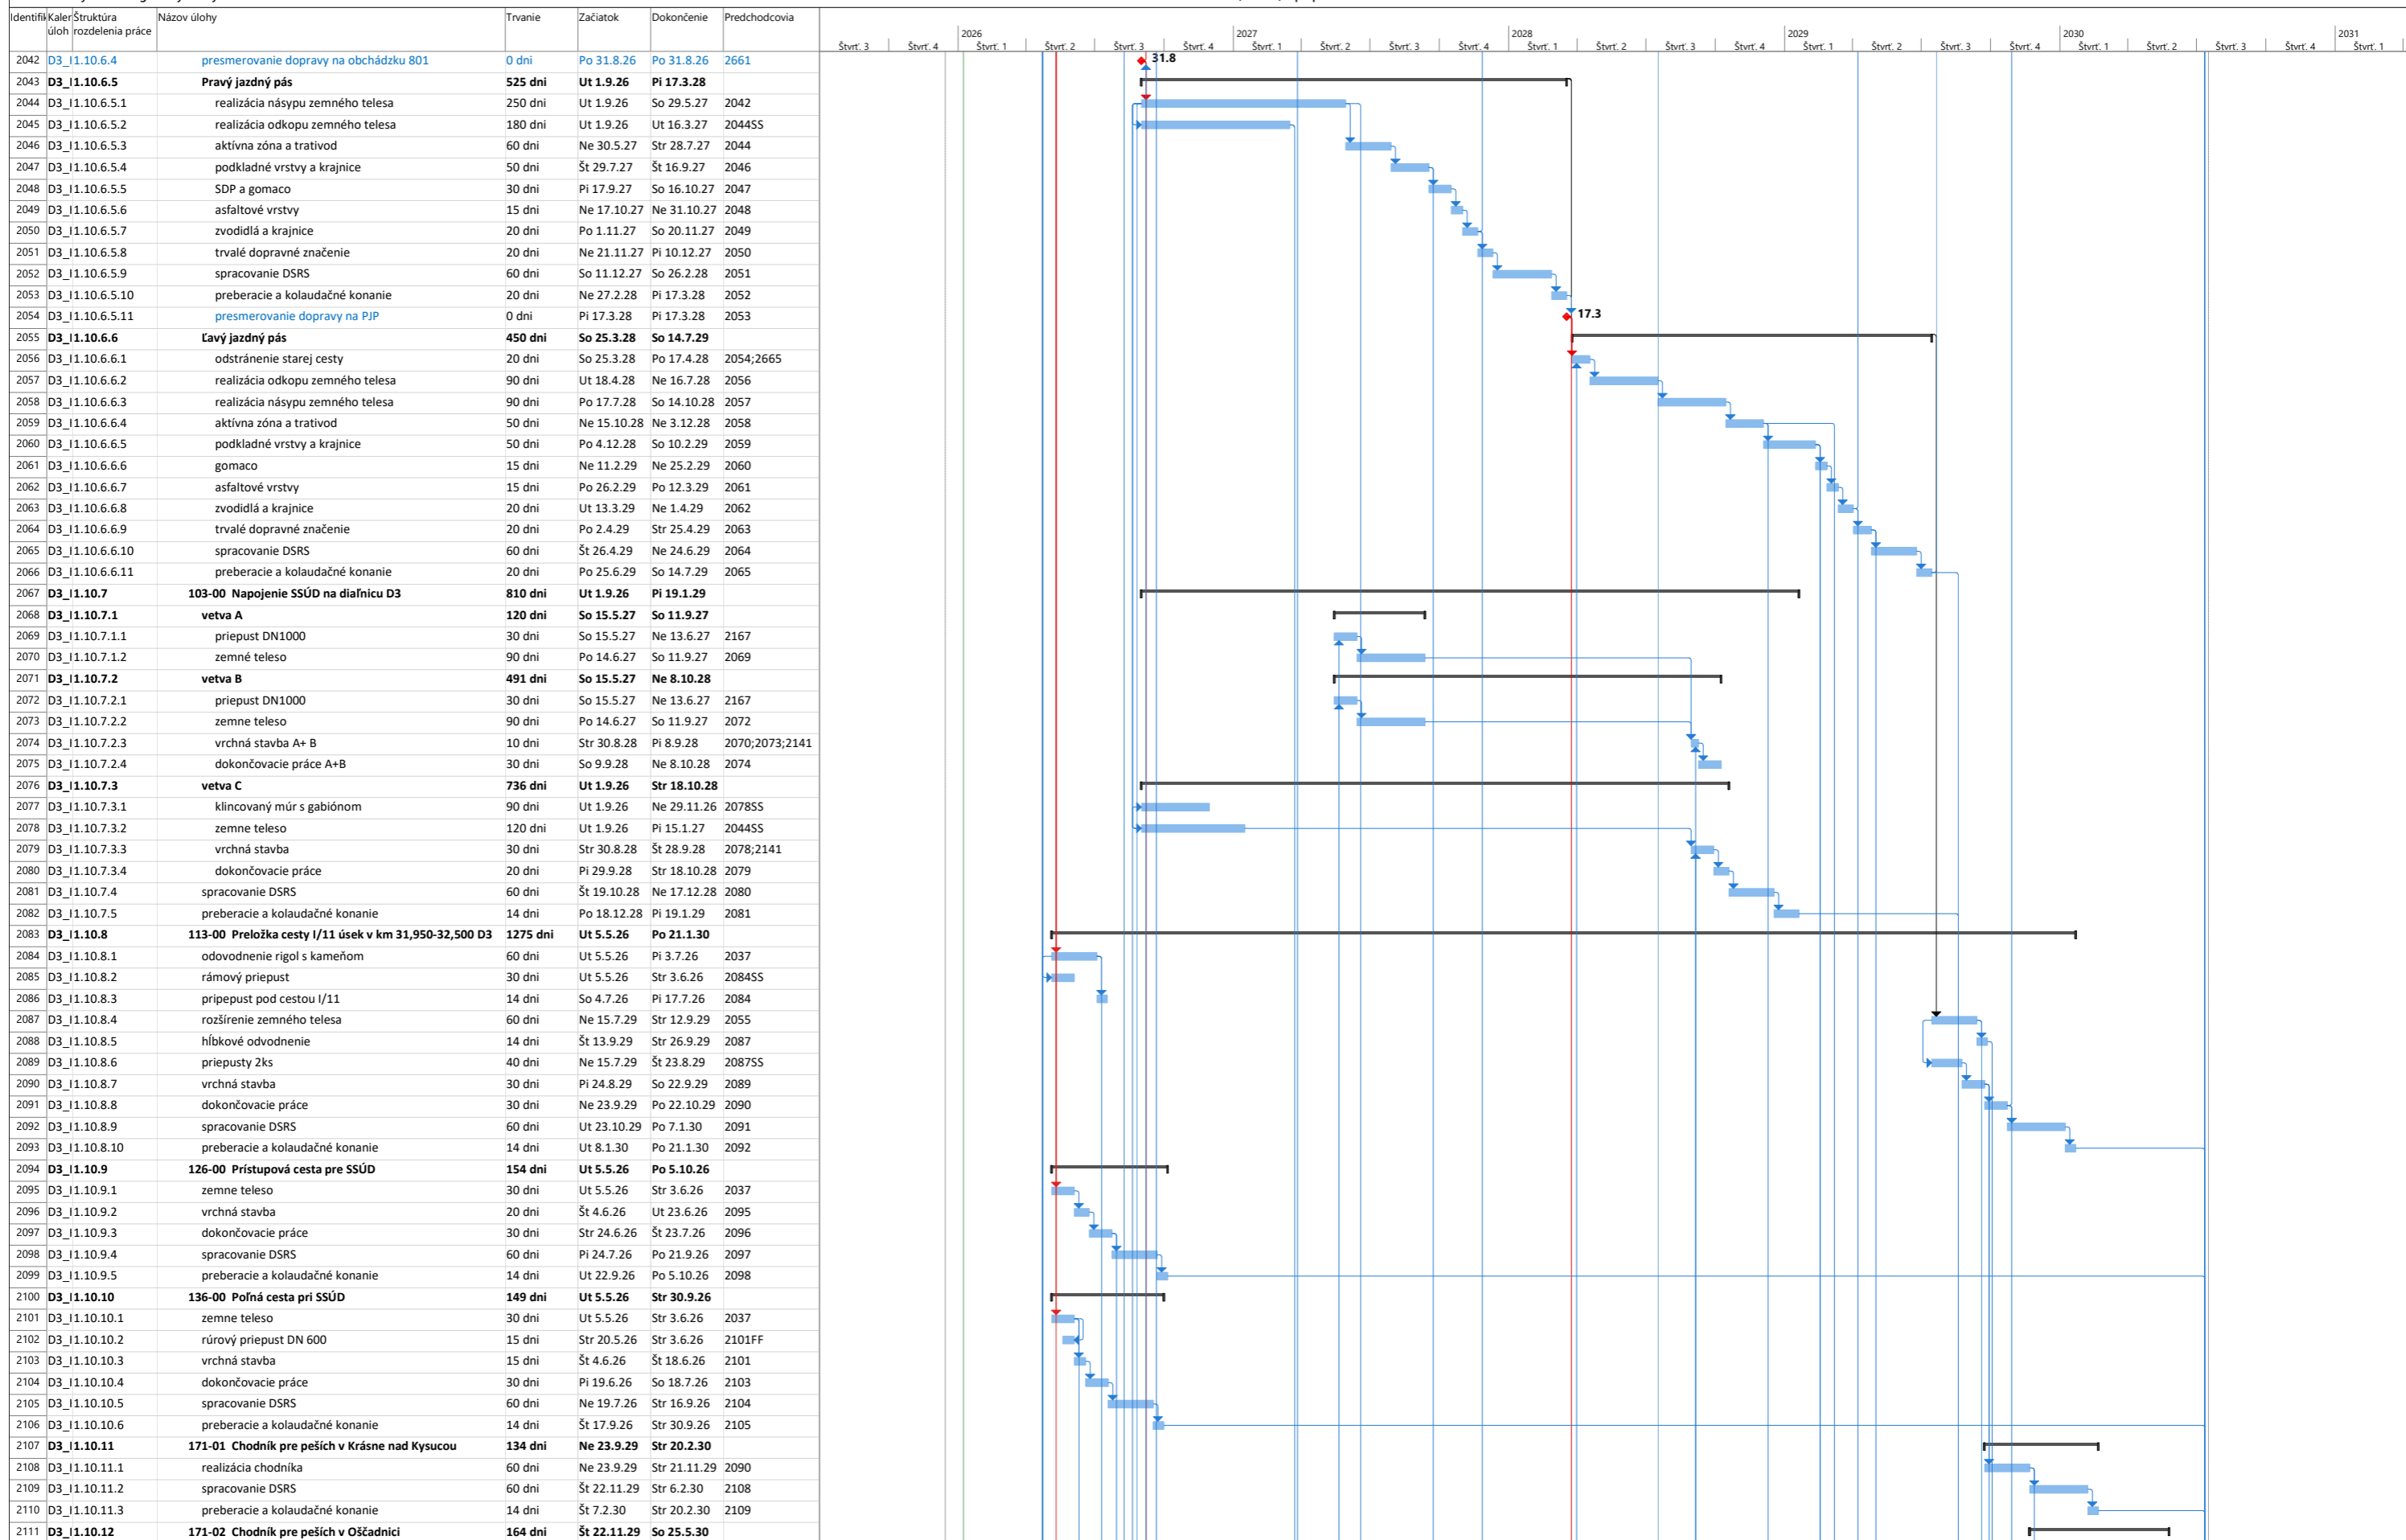


Harmonogram služieb a prác

- Úloha: █ Medzník: ◆ Súhrn projektu: Neaktívny medzník: ◆
- Rozdeliť: Súhrn: Neaktívna úloha: Neaktívny súhrn:
- Manuálna úloha: Manuálny súhrn: Iba začiatok: Externé úlohy: Termin: Kritické:
- Iba trvanie: Manuálny súhrn: Iba dokončiť: Externý medzník: Kritické: Priebeh: Manuálny priebeh:

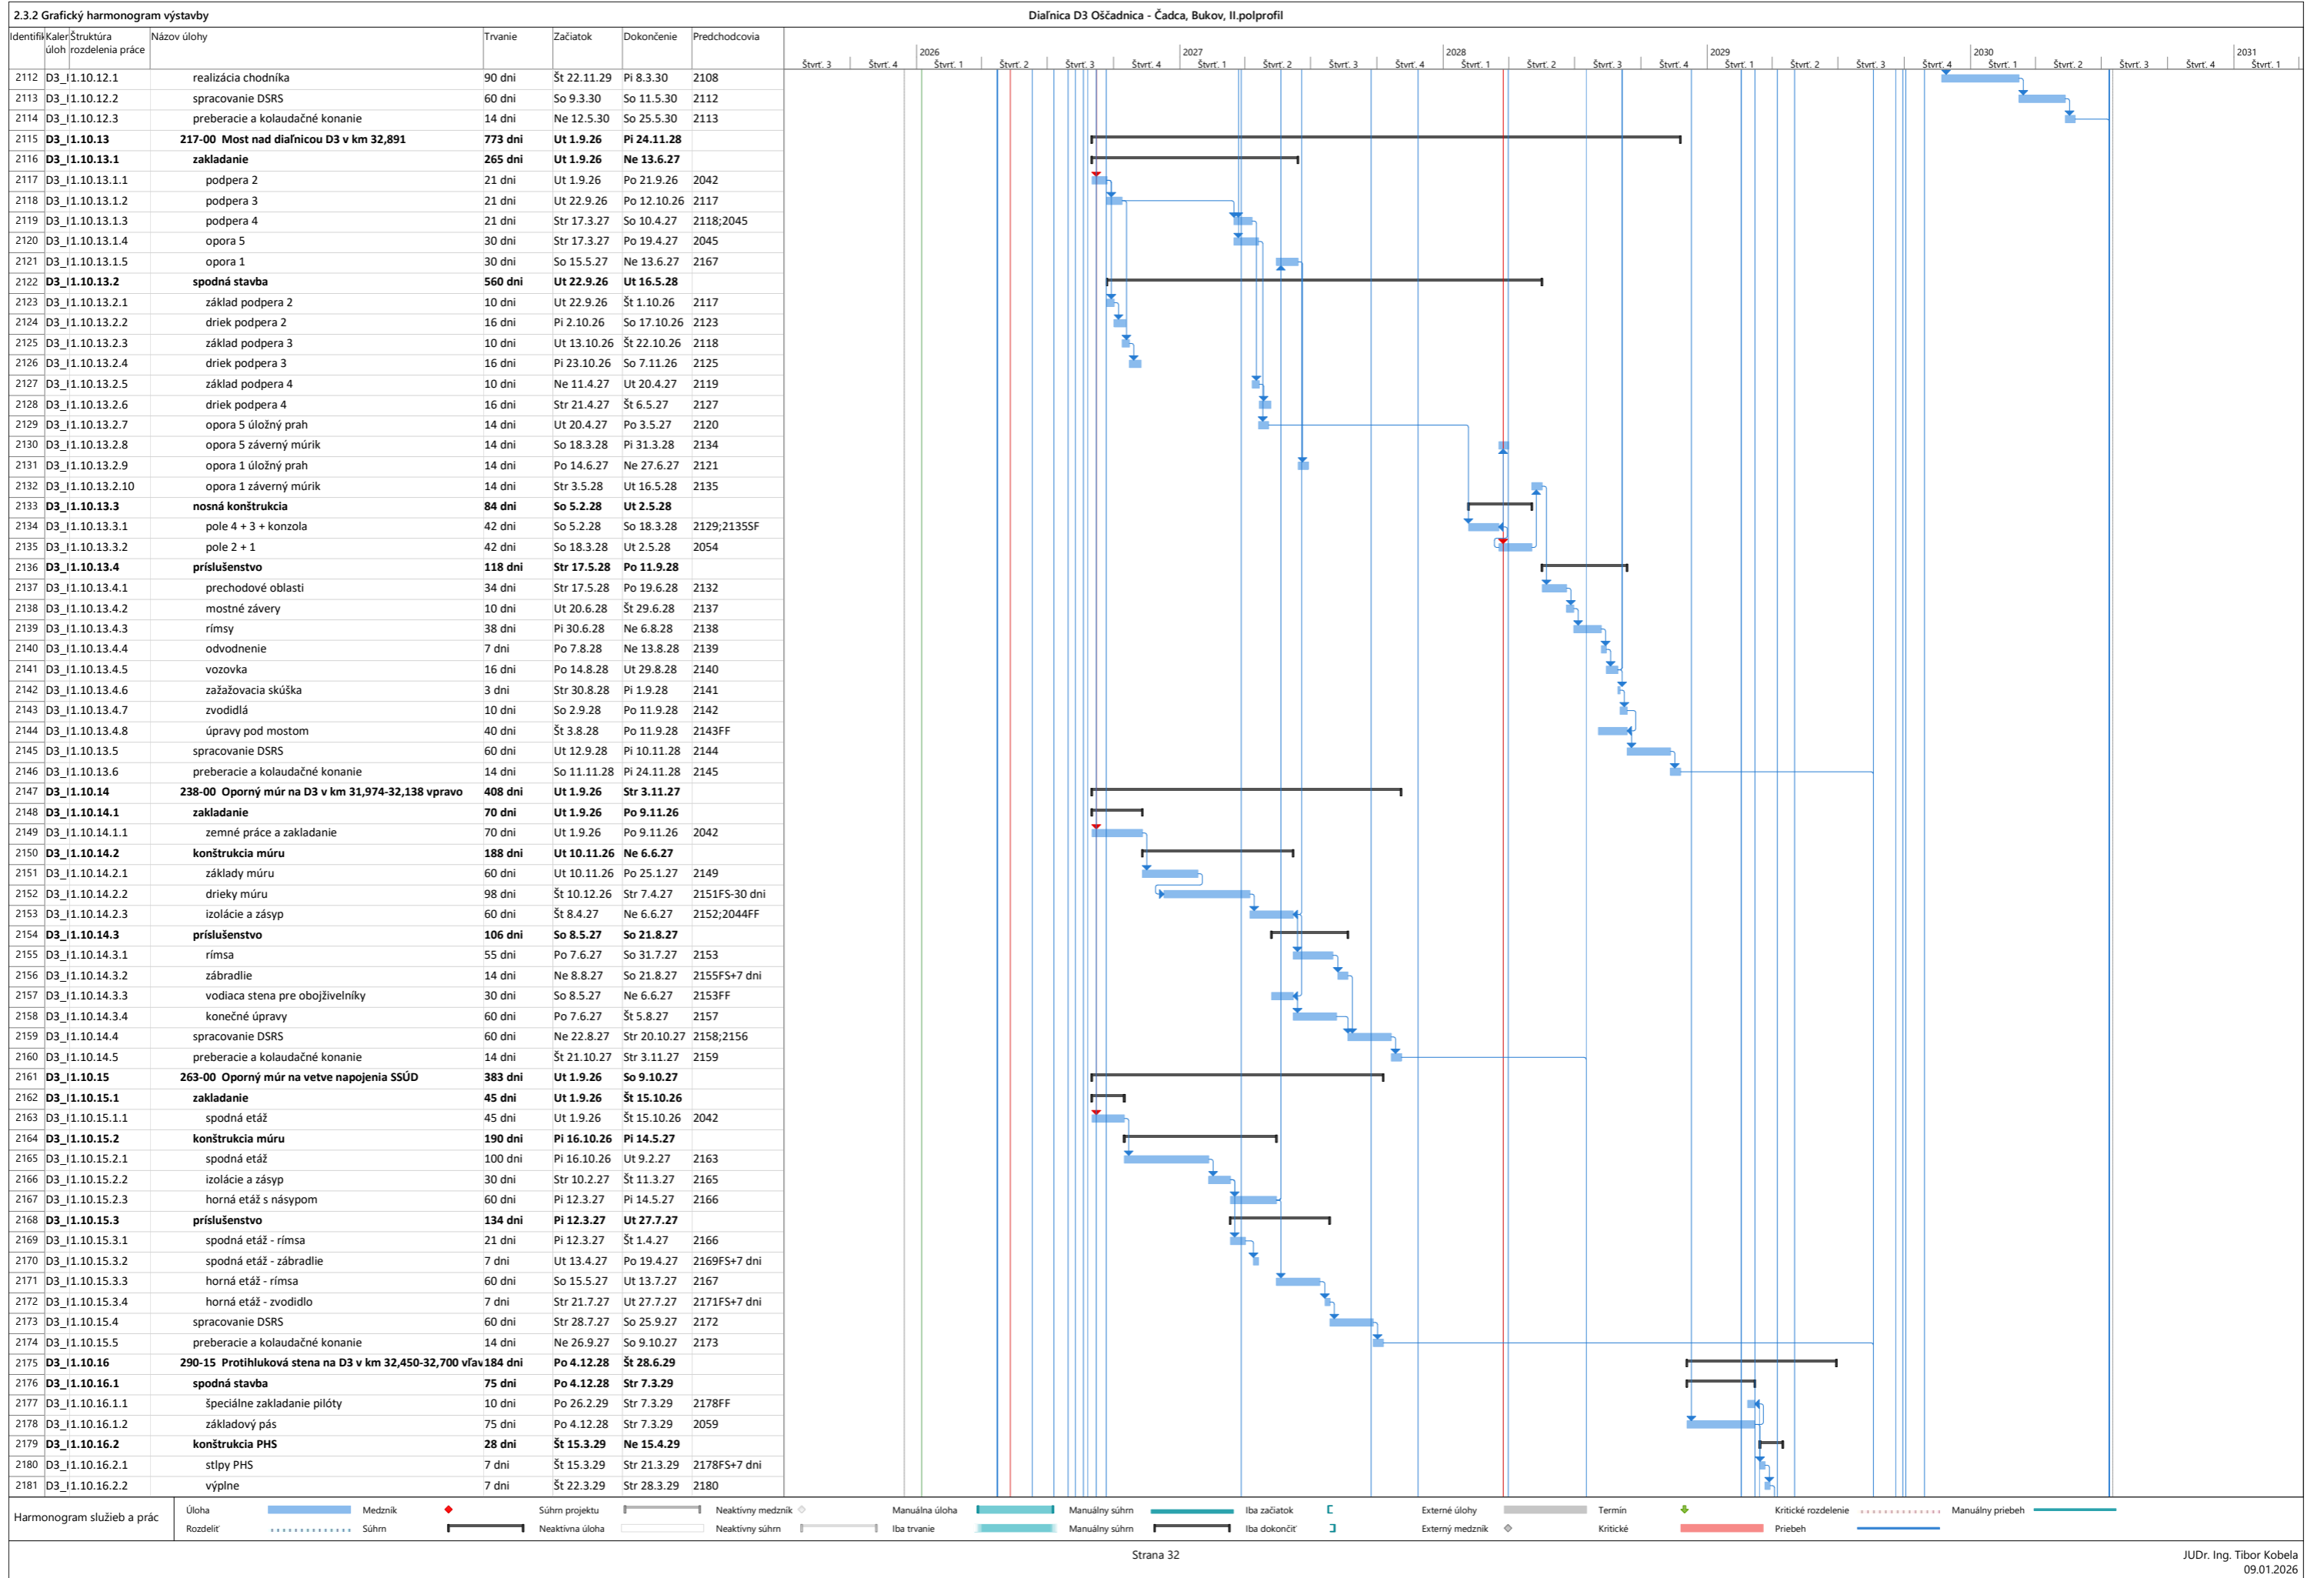

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

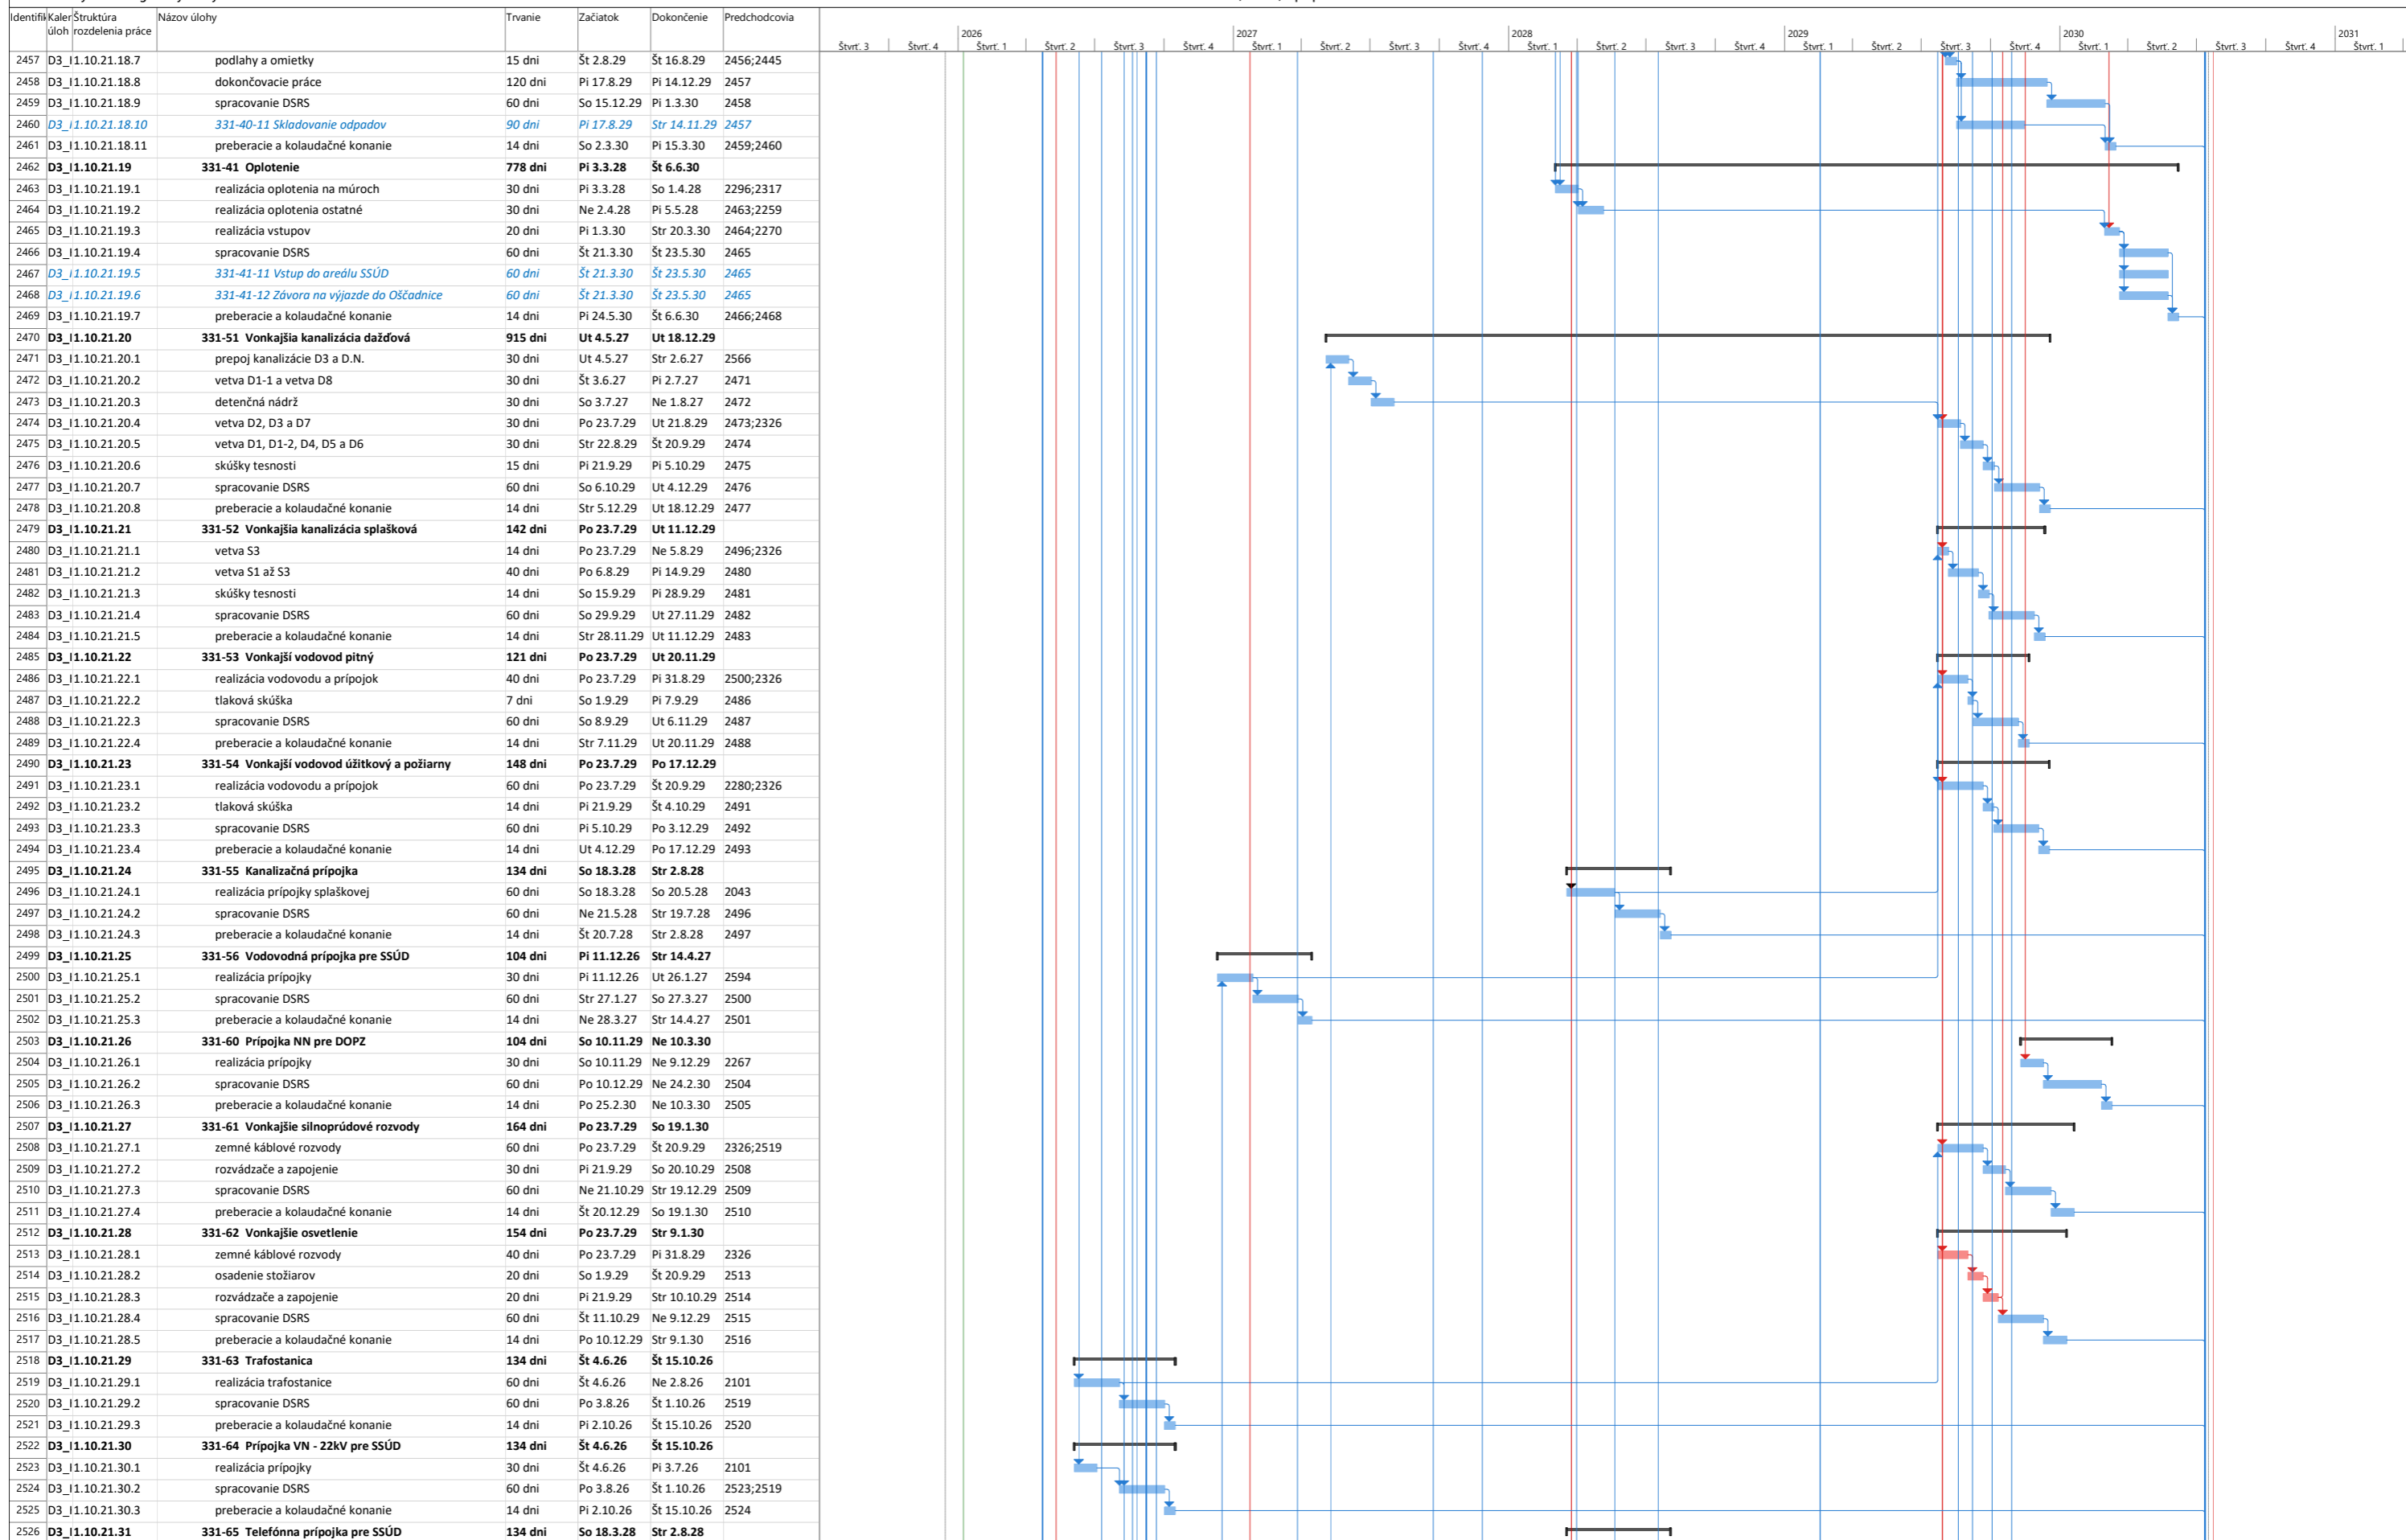


Harmonogram služieb a prác

- Úloha: █ Medzník: ♦ Súhrn projektu: Neaktívny medzník: ○ Manuálna úloha: Manuálny súhrn: Iba začiatok: Externé úlohy: Termín: Kritické rozdelenie: Manuálny priebeh:
- Rozdeliť: ● Súhrn: Neaktívna úloha: Neaktívny súhrn: Iba trvanie: Manuálny súhrn: Iba dokončiť: Externý medzník: ◇ Kritické: ■ Priebeh:


2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

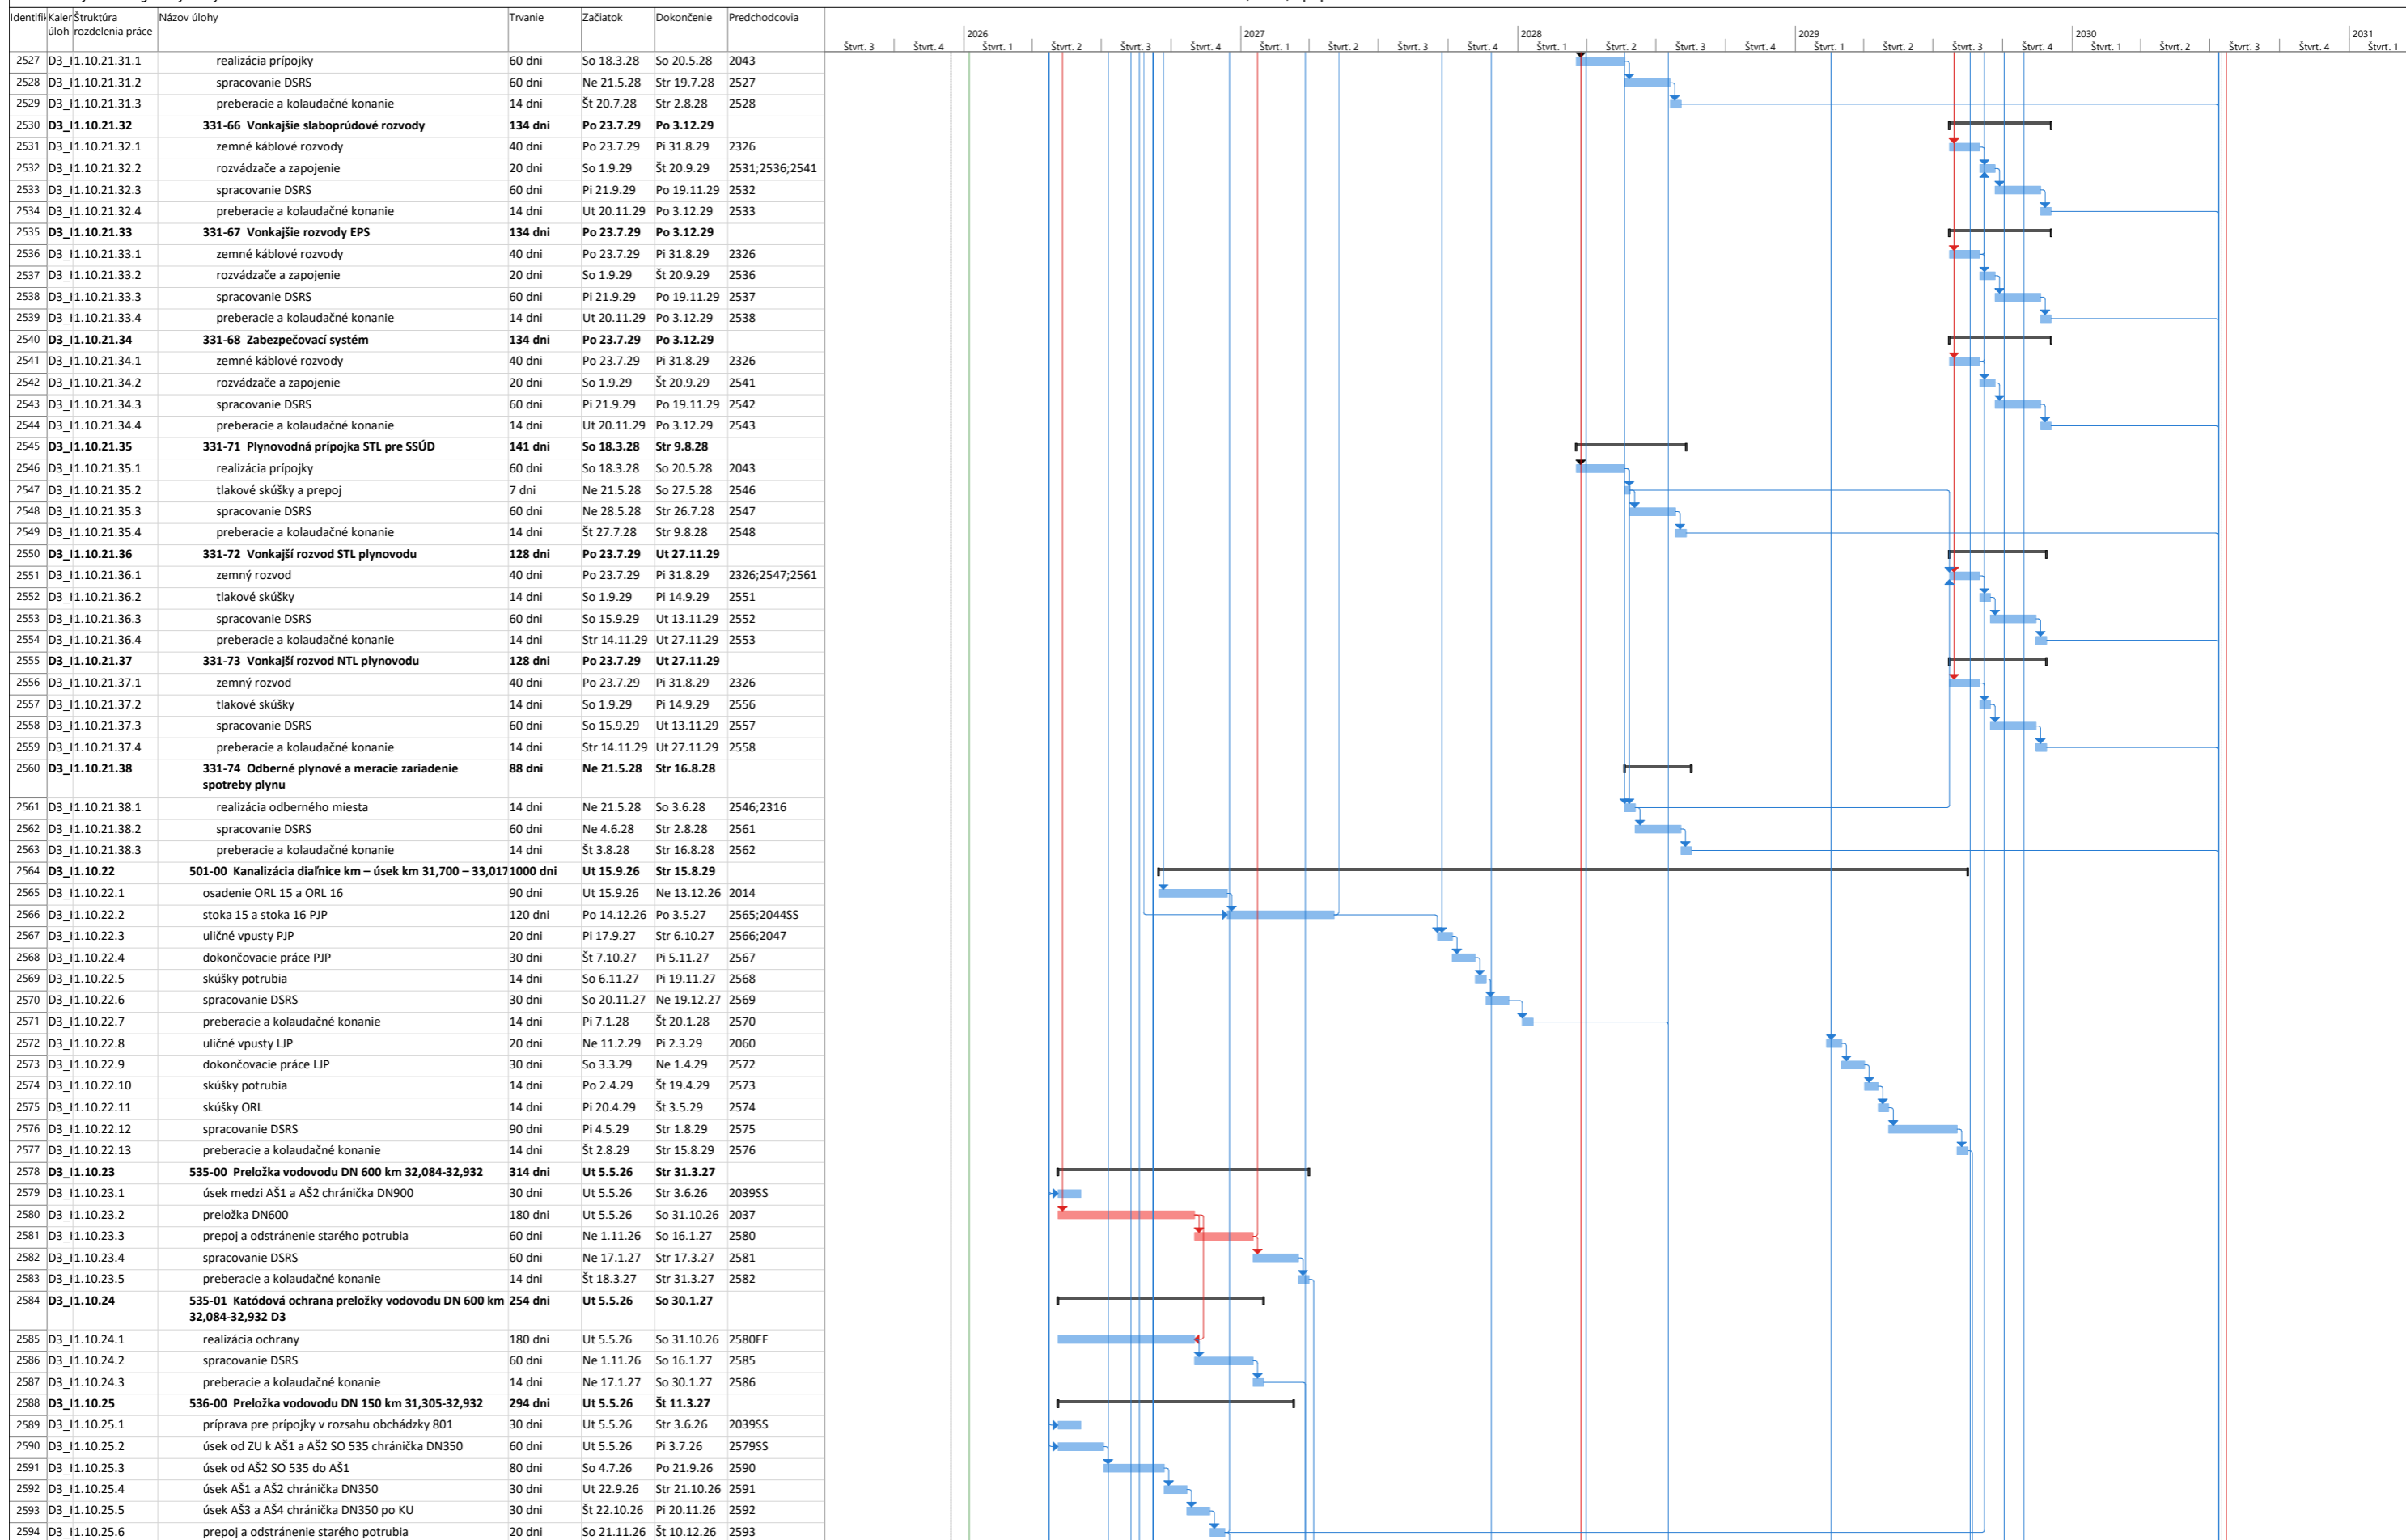

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

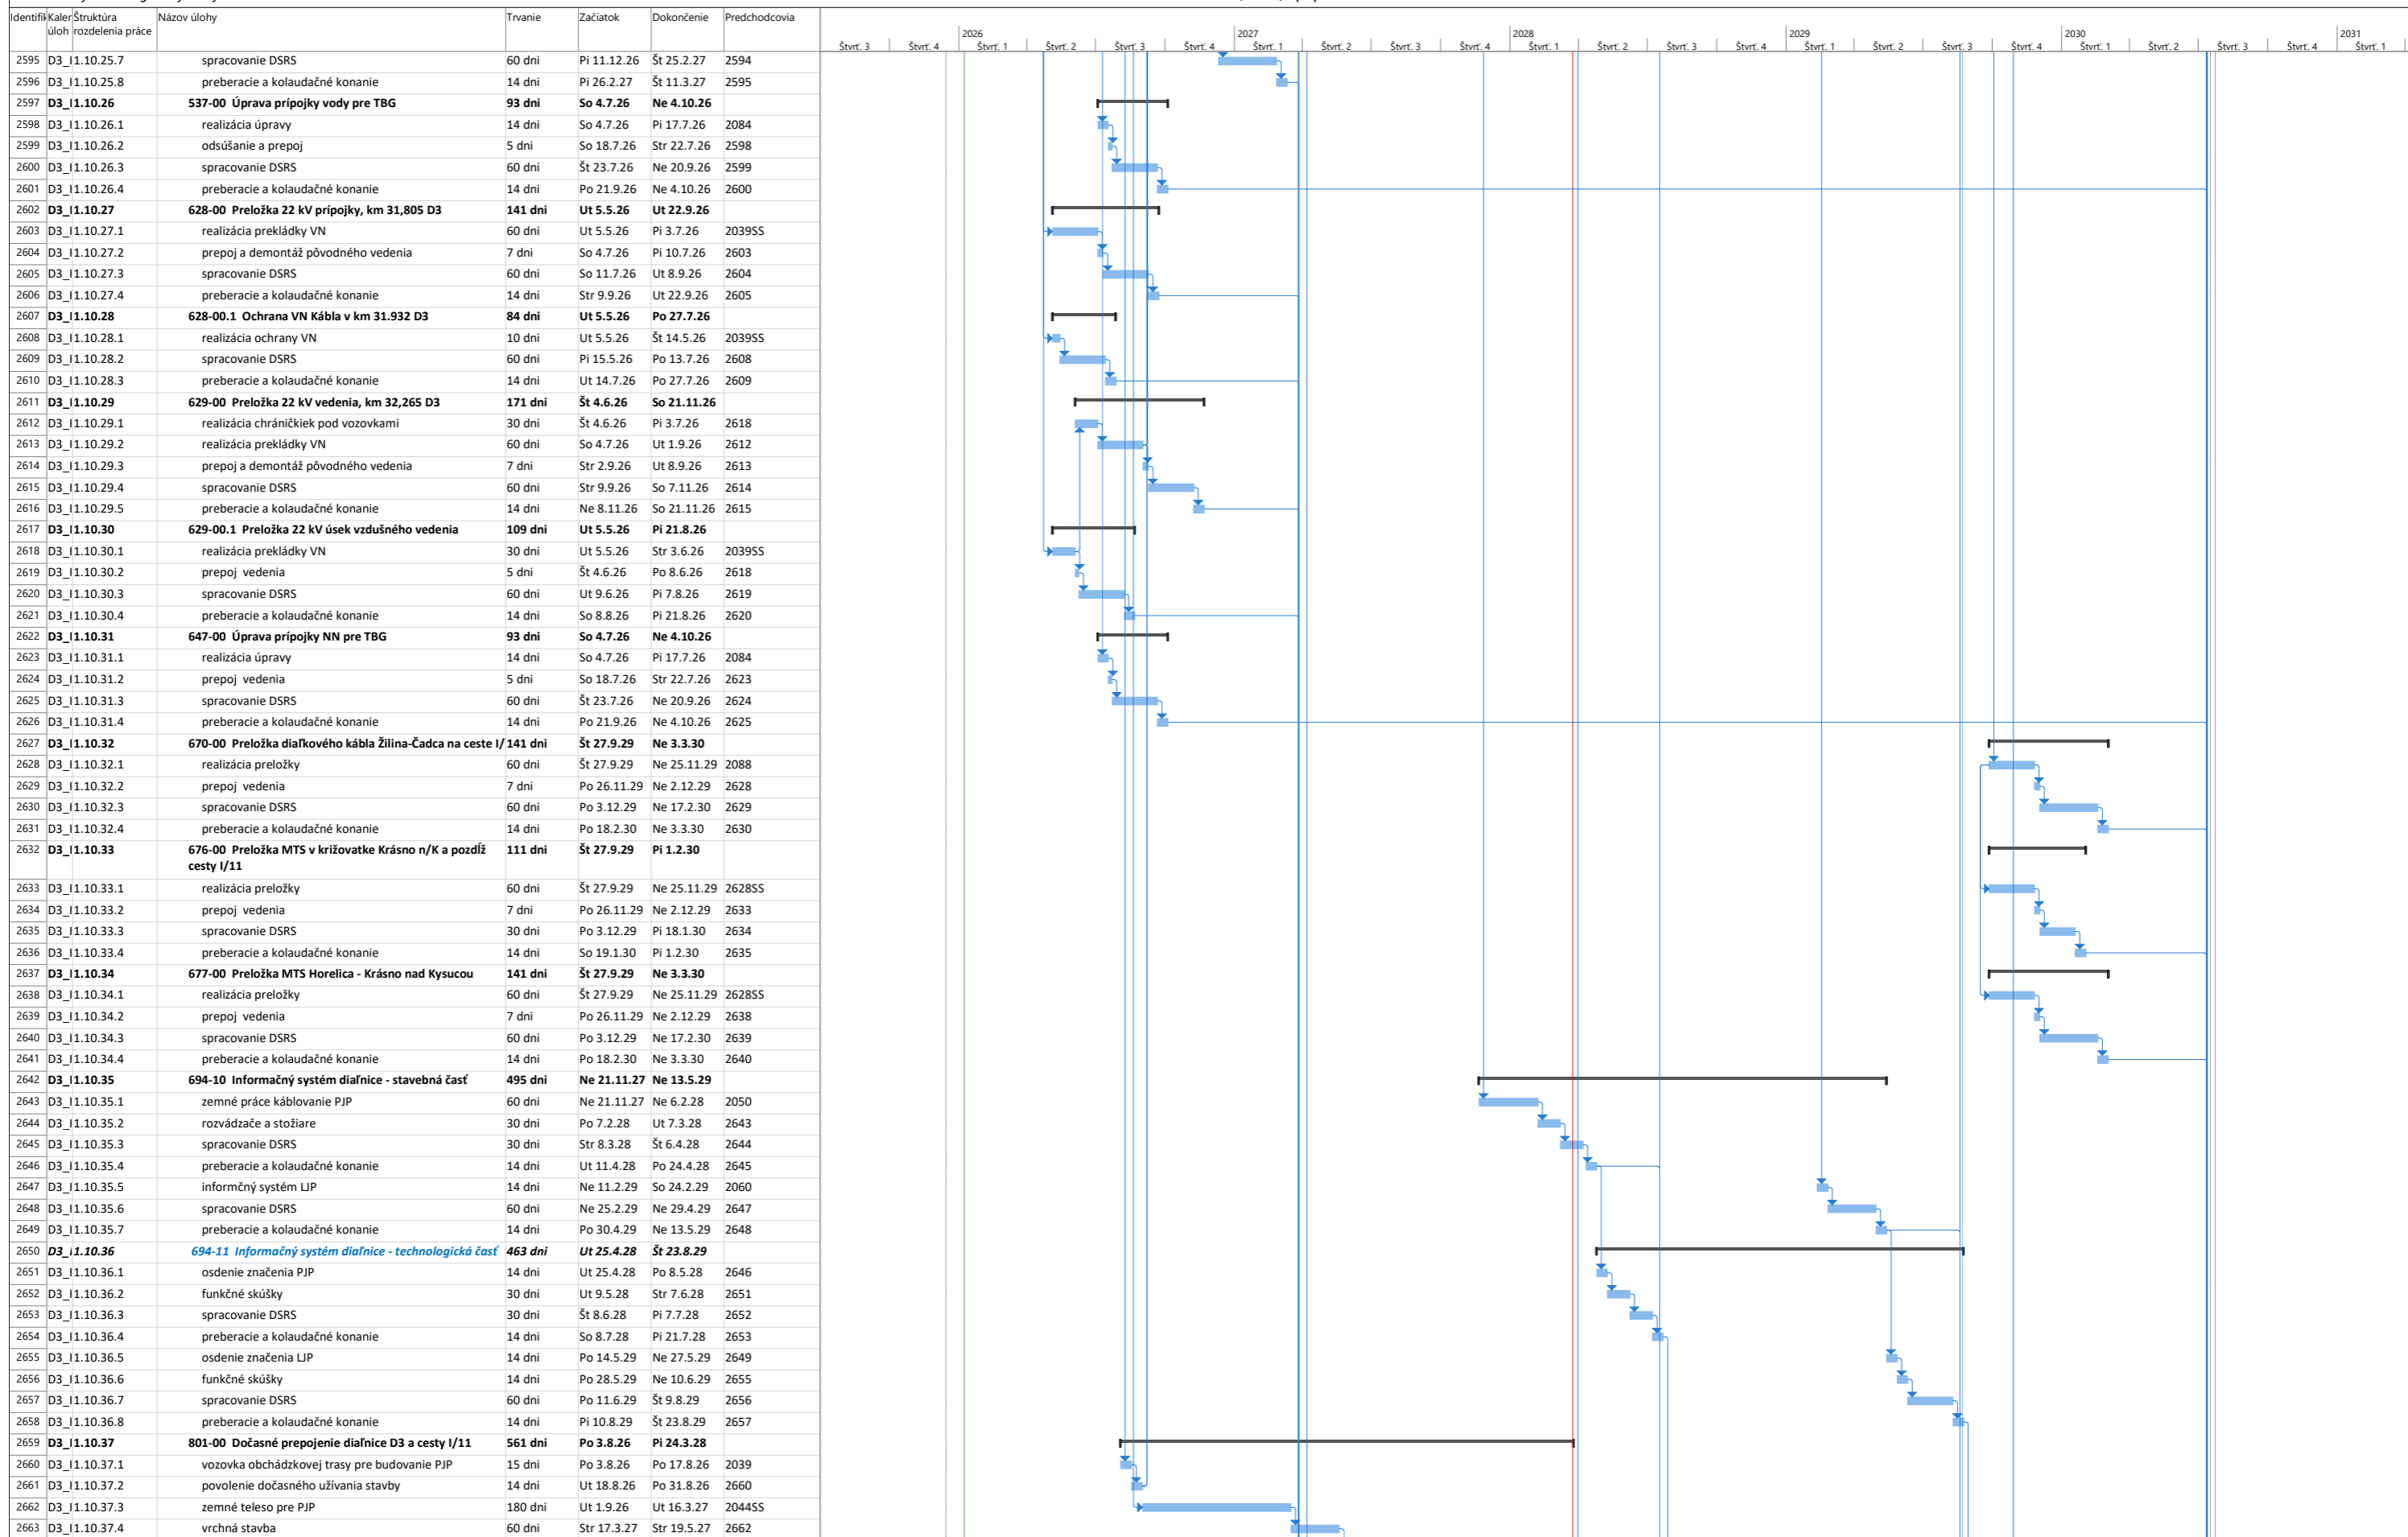

2.3.2 Grafický harmonogram výstavby

Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II.polprofil

