

## „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Zmluva o Dielo č.:** 01/2017

**Predmet zmluvy:** vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

**Dielo:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
  - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
    - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
    - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
  - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), \*bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

## Správa o postupe prác za obdobie: júl 2025

**Objednávateľ** : Železnice Slovenskej republiky  
**Zhotoviteľ** : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“  
**Lehota výstavby** : od 10.09.2020 do 31.12.2027  
**Predstaviteľ Zhotoviteľa** : Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa  
**Stavebný dozor** : Ing. Milan Zvonár

**Správu vypracovali:** Ing. Andrej Paták, Ing. Matteo Foffani

**Schválil za Zhotoviteľa**

**Vedúci technického útvaru:** Ing. Matteo Foffani, ..... , dátum 11.08.2025

**Schválil za SD :** Ing. Milan Zvonár, ..... , dátum.....

## OBSAH:

<b>1. Projektová dokumentácia:</b>	3
<b>2. Inžinierska činnosť:</b>	4
<b>3. Realizácia Diela:</b>	5
<b>4. Vyhodnotenie prác:</b>	6
<b>5. Zmluva o Dielo a dodatky:</b>	12
<b>6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :</b>	12
<b>6.1. Zoznam Zmien:</b>	12
<b>6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):</b>	12
<b>6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):</b>	12
<b>7. Systém kvality:</b>	12
<b>8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:</b>	12
<b>8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:</b>	12
<b>8.2. Personál Zhotoviteľa:</b>	12
<b>9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:</b>	13
<b>9.1. Bezpečnosť práce:</b>	13
<b>9.2. Ekologické vplyvy:</b>	16
<b>9.3. Evidencia odpadov:</b>	16
<b>10. Finančné plnenie:</b>	18
<b>11. Fotodokumentácia</b>	20

## 1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie</li> <li>Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW</li> <li>Riešenie zmien PD na základe požiadaviek Zhotoviteľa</li> <li>Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu realizácie, MPV a inžinierskej činnosti</li> <li>Účasti na miestnych šetreniach v mieste stavby</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMIING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.2.	<b>Činnosť HIP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spracovanie Správy o postupe prác</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS</li> <li>Účast' na rokovaníach v procese územných konaní</li> <li>Účast' na rokovaníach s budúcimi správcami</li> <li>Účast' na rokovaníach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností</li> <li>Účast' na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom</li> <li>Účast' na koordinačných poradách s podzhotoviteľmi Zhotoviteľa stavby</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMIING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.3.	<b>Činnosť Projektanta počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Účast' na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Zmeny PD počas realizácie</li> <li>Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov</li> <li>Príprava rozpočtov A.1.4</li> <li>Vyjadrenie k zmenovej dokumentácii počas realizácie</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMIING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO



## 2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<b>IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS</li> <li>Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS</li> <li>Sledovanie priebehu územného konania na UČS 03 a stavebných konaní pre stavbu A.1.1 (UČS 01), stavbu A.1.2 (UČS 02) a stavby B</li> <li>Dopĺňanie návrhov na vydanie územného rozhodnutia UČS 03 a stavebných povolení podľa požiadaviek úradov</li> <li>Činnosti súvisiace s konaním na stavbu UČS 03</li> <li>Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01), stavbu A.1.2 (UČS 02) a stavby B</li> <li>Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), stavby B za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV</li> <li>Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV UČS 01 a stavby B</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.2.	<b>Prieskumy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V mesiaci júl 2025 boli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom</li> </ul>	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.3.	<b>IČ počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie</li> <li>Účasť na riadiacom výbore</li> <li>Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD



### 3. Realizácia Diela:

#### V zmysle ROV č. 410

- Zahájenie výluk podľa ROV 410 v nepárnej skupine koľají žst. Zohor bolo dňa 24.03.2025  
Trvanie do 13.10.2025

#### V zmysle ROV č.440

- Zahájenie výluky 2. TK v úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR dňa 31.03.2025 o 16:00 hod.  
Trvanie do 09.12.2025

#### V zmysle ROV č.460

- Dňa 24.06.2025 - zahájenie nepretržitej výluky 2. TK v úseku DNV - Zohor podľa schváleného mesačného plánu výluk ŽSR  
Trvanie do 02.12.2025

#### Na stavbe evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti:

- odo dňa 20.03.2025 evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v koľaji č.1 úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR v km 68,090 - 74,466, pre rýchlosť 50 km/h.  
Predpokladané ukončenie dňa 09.12.2025
- odo dňa 24.03.2025 v staničnej koľaji č.2 žst. Zohor v km 12,100 - 13,200, pre rýchlosť 50 km/h.  
Predpokladané ukončenie dňa 13.10.2025
- 50 km/h okolo pracovného miesta v 1.TK úseku žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor v km 1,405 - 11,750 v denných hodinách, od 07:00 do 21:00 hod. od 02.06.2025, v trvaní do 02.12..2025
- 50 km/h v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od km 3,780 (začiatok/koniec nástupiska na zást. D. Jazero) do km 4,300 v 1.TK, počnúc dňom 24.05.2025 o 08:00 hod. nepretržite, do ukončenia výstavby novej lávky pre peších v zást. D. Jazero (predpoklad koniec roka 2025), z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pohybu cestujúcej verejnosti a pracovných miest v oblasti

### **Vyhodnotenie prác:**

#### **UČS 01 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)**

PS 01-21-04 Devínska Nová Ves - Zohor, zabezpečenie stavebných postupov

- demontáž vonkajších prvkov UAB
- ochrana káblov

SO 01-32-02 Devínska Nová ves-Zohor, žel. spodok

- odkop železničného spodku
- realizácia záporového paženia, vodorovné vzpery
- dodanie a vykládka žľabov
- stabilizácia zemnej pláne
- statické zaťažovacie skúšky
- polozenie geotextílie , návoz vrstvy železničného spodku
- úprava prístupovej cesty Devínske jazero

SO 01-32-08 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- paženie, zarážanie štetovnic
- osadenie vodorovných vzpier
- búranie betónov existujúceho priepustu, odvoz sute
- výmena podlažia, úprava pláne, dynamická skúška
- podkladový betón
- viazanie výstuže a betonáž 1.etapa
- polozenie rúry
- betonáž druhá etapa

SO 01-32-09 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- paženie, zarážanie štetovnic
- tiahla priepustu
- realizácia zadných uchytení tiahiel

SO 01-32-15 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- tiahla priepustu
- realizácia zadných uchytení tiahiel

SO 01-32-16 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- tiahla priepustu
- realizácia zadných uchytení tiahiel

SO 01-32-21 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- paženie, zarážanie štetovnic, baranenie HEB
- uloženie, pripevnenie tiaha

SO 01-32-22 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- paženie, zarážanie štetovnic, baranenie HEB
- uloženie, pripevnenie tiaha

SO 01-32-23 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- paženie, zarážanie štetovnic, baranenie HEB
- uloženie, pripevnenie tiahla

SO 01-32-24 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- paženie, zarážanie štetovnic
- osadenie vodorovných vzpier
- búranie betónov existujúceho priepustu, odvoz sute
- výmena podložia, úprava pláne, dynamická skúška
- podkladový betón
- viazanie výstuže a betonáž 1.etapa
- polozenie rúry
- betonáž druhá etapa

SO 01-33-05 Devínska Nová ves-Zohor, zástavka Devínske jazero, lávka pre cestujúcich

- realizácia výstuže a debnenia základov a výťahovej šachty
- betonáž základov
- penetračný náter základov lávky
- výstuž, debnenie a betonáž výťahových šacht-fáza 2
- armovanie výťahových šacht-fáza 3

SO 01-33-12 Devínska Nová ves-Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 7,834

- inštalácia Larsen

SO 01-33-14 Devínska Nová ves-Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 9,834

- inštalácia Larsen

SO 01-33-15 Devínska Nová ves-Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 9,973

- inštalácia Larsen

SO 01-34-02 Devínska Nová ves-Zohor, PHS

- vrtanie pilót

SO 01-35-01 Devínska Nová Ves - Zohor, trakčné vedenie

- betonáž základov trakčného vedenia pre 2.TK
- montáž trakčných podpíer

SO 01-36-01.2 Devínska Nová Ves - Zohor, preložka MK ŽSR

- prekládka MK ŽSR, v úsekoch podľa PD



### UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)

PS 02-21-01 ŽST Zohor, staničné zabezpečovacie zariadenie

- pokládka chráničiek pre kabelizáciu

PS 02-21-02 ŽST Zohor, zabezpečenie stavebných postupov

- montáž reléového stojana
- odkopanie a odsun kabelizácie zab. zar. v kolízii s PHS

SO 02-32-02 ŽST Zohor, žel. spodok

- búranie betónov, odvoz sute
- odstraňovanie nefunkčných káblových vedení, obnaženie a ochrana funkčných káblových vedení
- zemné práce, výkop sond
- odťazenie žel. spodku v km 12,800 - 13,400
- dodanie a vykládka geotextílie
- obetónovanie funkčných križujúcich káblov
- statické zaťažovacie skúšky k.č.1, 3, odbočka Záhorská Ves
- stabilizácia zemnej pláne k.č.1
- polozenie geotextílie, návoz vrstvy železničného spodku

SO 02-32-06 ŽST Zohor, nástupištia

- zemné práce
- úprava podkladu + dynamická skúška
- debnenie + betonáž základu

SO 02-33-01 ŽST Zohor, podchod pre cestujúcich a verejnosť v nžkm 12,571

- realizácia horného rozperného rámu
- realizácia mikropilót
- výkopy po úroveň spodného rozperného rámu
- inštalácia a zváranie spodného rozperného rámu
- výkopy
- podkladná vrstva pod podkladový betón-podchod a výtahová šachta-etapa 1
- betonáž-podkladný betón podchod a výtahová šachta-etapa 1

SO 02-33-02 Žst Zohor, nový cestný nadjazd na obchvate obce Zohor v nžkm 12,880

- realizácia pilot
- realizácia plošiny pre pilotáž pre oporu č.3

SO 02-34-02 ŽST Zohor, zariadenia pre kabelové trasy

- zemné práce, výkop pre šachty
- zemné práce, príprava pre prepojenie medzi šachtami
- osádzanie šachiet
- prepojenie šachiet
- prekop na páru skupinu
- výkop a osadenie šachty 25a

SO 02-34-03 ŽST Zohor, zastrešenie nástupíšť

- zemné práce, výkop pre pätky
- úprava základovej škáry, hutnenie vankúšov
- viazanie výstuže, betonáž pätiiek

SO 02-35-06 ŽST Zohor, vonkajšie osvetlenie

- demontáž osvetľovacích stožiarov, betonáž základov pre nové stožiare, výkop káblovej ryhy
- montáž osvetľovacích stožiarov

SO 02-35-09 ŽST Zohor, EO V

- výkop káblových rýh

SO 02-35-11 ŽST Zohor, úprava NN rozvodov

- výkop káblovej ryhy pre preložku káblov
- osadenie novej KS8 a preložka káblov

SO 02-35-15 ŽST Zohor, rozvod 6kV

- montáž koncoviek a uvedenie do prevádzky úseku MS Zohor- TS 601

SO-02-37-01 ŽST Zohor, odvedenie dažďových vôd

- geologická sonda – vsakovanie
- pokládka vsaku

**UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)**

SO 10-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- odkop zeminy po ZP a odvoz na skládku
- realizácia SZS na PŽS
- rozprestretie geotextílie a štrkodrvy fr.0/63mm a zriadenie PŽS
- odkop ryhy a zriadenie otvorenej spevnenej priekopy
- rušenie záporového paženia HEB a štetovnic

SO 10-32-05 Kúty - št.hranica SR/ČR , Priepust

- viazanie výstuže a debnenie stropnej dosky
- betonáž dosky
- betónová rímsa
- zriadenie izolácie

SO 10-32-06 Kúty - št.hranica SR/ČR , Priepust

- betonáž rúr +obsyp štrkodrvou
- montáž betónových rúr + penetračný náter

SO-10-34-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, budova napájacej stanice

- zemné práce
- viazanie výstuže
- betonáž základové dosky

SO-10-34-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 27 kV (stavebná časť)

- montáž strešného plášt'a
- montáž soklu
- montáž KZS

SO-10-34-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, stanovište transformátorov

- montáž 2. poschodia prefa panelu
- montáž 3. a 4. poschodia prefa panelu

SO 10-35-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, 2. časť

- betonáž základov trakčného vedenia
- montáž trakčných podpíer

SO-10-35-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, Úprava TV v ŽST Veľké Leváre, pripojenie SpS na TV

- viazanie výstuže
- betonáž základovej dosky

### **UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)**

SO 11-32 01 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok

- rušenie záporového paženia HEB

SO 11-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- rozprestretie štrkodrvy fr.0/63mm a zriadenie PŽS
- odkop ryhy a zriadenie otvorenej spevnenej priekopy

SO 11-32-04 Kúty-št.hranica SR/ČR, zastávka Brodské - nástupište

- zriadenie vankúša pod základový pás zo štrkodrvy
- montáž debnenia pre základový pás + betonáž
- spätný zásyp základového pásu
- rozvoz a montáž nástupištých hrán

SO 11-33-01 Kúty - št.hr. SR/ČR, podchod pre cestujúcich na zast. Brodské v nžkm 71,722

- armovanie, debnenie a betonáž výťahovej šachty
- odstránenie debnenia výťahovej šachty-časť 2
- izolácia výťahovej šachty-časť 2
- čiastočné zásypy výťahovej šachty
- podkladný betón podchodu
- penetrácia a izolácia - podkladný betón



SO 11-33-04 Kúty - št.hranica SR/Čr, nový cestný most v nžkm 72,138

- armovanie, debnenie, betonáž mostovky

SO 11-33-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, oporné múry pri MK v nžkm 72,138

- napínanie kotiev

SO 11-33-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, tesniaca vaňa pod MK v nžkm 72,138

- výkopy
- inštalácia kari sieti - DC1, DC2
- podkladný betón podchodu - DC1, DC2
- výkopy - DC3
- armovanie-kari siete, betonáž podkladný betón - DC3, DC4

### **UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)**

SO 12-33-01 Kúty - št.hr. SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,232

- výstuž, debnenia a betonáž základov
- odstránenie debnenia základov
- penetrácia, izolácia základov
- výstuž betonáž a debnenie opôr
- zásyp základov
- oddebnenie opôr, armovanie a betonáž záverné múriky a krídla opôr

SO 12-33-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,489

- betonáž základu opory a piliera
- izolácie základov
- armovanie, debnenie a betonáž dříeku piliera
- armovanie, debnenie a betonáž opory a krídel
- debnenie a betonáž podložiskové bloky
- prípravné práce pre montáž oceľových nosníkov

SO 12-33-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410

- konečné úpravy, česká strana
- kladenie ochranných kameňov na rieke Morava, česká strana

#### **4. Zmluva o Dielo a dodatky:**

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

#### **5. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**

##### **5.1.Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

##### **5.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):**

Uvedené v prílohe č.2

##### **5.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):**

Uvedené v prílohe č.3

#### **6. Systém kvality:**

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

#### **7. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:**

##### **7.1.Zariadenie Zhotoviteľ'a:**

Uvedené v prílohe č.4

##### **7.2.Personál Zhotoviteľ'a:**

Uvedené v prílohe č.4

## **8. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:**

### **8.1. Bezpečnosť práce:**

#### **A. Popis činnosti BOZP:**

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

#### **B. Plnenie Plánu BOZP stavby**

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci február boli spracované 4 Správy z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:



- a) Pracovisko bez zabezpečenia hliadkou, strojník mechanickej ruky bez platného vstupného preukazu a práca bez prilieb pod zaveseným bremenom.




- b) Pracovisko bez hliadky a výkop bez zabezpečenia.





c) Výkopy bez zabezpečenia.

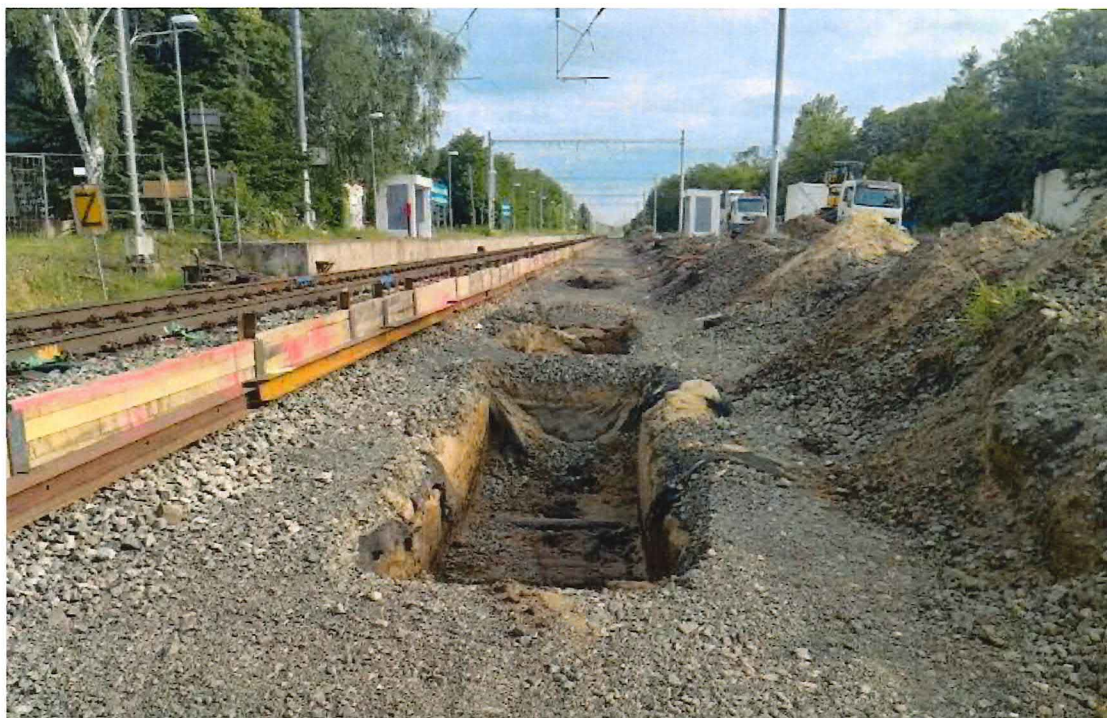

### **Práce s osobitným nebezpečenstvom**

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

### **C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP**

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP . Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

### **D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie**

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti vo vzťahu k BOZP na stavenisku

### **E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác**

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľ'mi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľ'om. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

## **8.2. Ekologické vplyvy:**

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – vid' príloha č. 5.

## **8.3. Evidencia odpadov:**

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"



Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "25A, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Mesiac:

07/2025

P.č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu	Názov P5/50	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1	01.07.2025	Zahor	17 05 04	0		1309,96	SO 02 34 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
2	01.07.2025	Broďské	17 05 04	0		2139,88	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
3	01.07.2025	Broďské	17 05 04	0		238,92	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
4	02.07.2025	Zahor	17 05 04	0		988,42	SO 02 34 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
5	02.07.2025	Broďské	17 05 04	0		2304,20	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
6	02.07.2025	Broďské	17 05 04	0		245,27	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
7	03.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		102,19	SO 01 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
8	03.07.2025	Zahor	17 05 04	0		462,68	SO 02 32 06	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
9	03.07.2025	Zahor	17 05 04	0		1073,32	SO 02 34 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
10	03.07.2025	Broďské	17 05 04	0		2116,53	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
11	03.07.2025	Broďské	17 05 04	0		513,61	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
12	04.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		842,98	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
13	04.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		102,06	SO 01 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
14	04.07.2025	Zahor	17 05 04	0		329,46	SO 02 32 06	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
15	04.07.2025	Broďské	17 05 04	0		2372,85	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
16	04.07.2025	Broďské	17 05 08	0		312,00	SO 11 32 03	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
17	04.07.2025	Broďské	17 05 04	0		215,07	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
18	07.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		514,84	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
19	07.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		25,78	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
20	07.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		280,76	SO 10 32 05	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
21	07.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		203,50	SO 10 32 07	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
22	07.07.2025	Broďské	17 05 04	0		1567,58	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
23	07.07.2025	Broďské	17 01 07	0		307,92	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
24	08.07.2025	Zahor	17 05 04	0		228,12	SO 02 33 01	AFR GROUP, s.r.o. Ján Ondruša 19/C, Stupava	R5
25	08.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		2309,83	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
26	08.07.2025	Broďské	17 01 07	0		524,44	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
27	09.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		668,92	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
28	09.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		101,76	SO 01 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
29	09.07.2025	Zahor	17 05 04	0		173,84	SO 02 33 01	AFR GROUP, s.r.o. Ján Ondruša 19/C, Stupava	R5
30	09.07.2025	Broďské	17 01 07	0		690,38	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
31	10.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		1796,66	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
32	10.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		102,23	SO 01 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
33	10.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		641,39	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
34	10.07.2025	Kúty-Broďské	17 01 01	0		102,72	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
35	10.07.2025	Kúty-Broďské	17 01 01	0		76,20	SO 10 32 05	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
36	10.07.2025	Broďské	17 01 01	0		155,70	SO 11 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
37	10.07.2025	Broďské	17 01 07	0		233,76	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
38	11.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		46,16	SO 01 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
39	11.07.2025	Zahor	17 05 04	0		252,48	SO 02 33 01	AFR GROUP, s.r.o. Ján Ondruša 19/C, Stupava	R5
40	11.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		611,65	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
41	11.07.2025	Kúty-Broďské	17 01 01	0		75,64	SO 10 32 07	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
42	11.07.2025	Broďské	17 01 01	0		25,40	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
43	11.07.2025	Broďské	17 01 01	0		229,98	SO 11 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
44	14.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		1470,72	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
45	14.07.2025	Zahor	17 05 04	0		266,16	SO 02 33 01	AFR GROUP, s.r.o. Ján Ondruša 19/C, Stupava	R5
46	15.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		3102,56	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
47	15.07.2025	Zahor	17 01 01	0		35,54	SO 02 32 06	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
48	15.07.2025	Zahor	17 05 04	0		173,46	SO 02 33 01	AFR GROUP, s.r.o. Ján Ondruša 19/C, Stupava	R5
49	15.07.2025	Zahor	17 01 01	0		22,22	SO 02 33 01	AFR GROUP, s.r.o. Ján Ondruša 19/C, Stupava	R5
50	15.07.2025	Broďské	17 01 07	0		656,51	SO 12 33 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
51	15.07.2025	Broďské	17 01 07	0		189,98	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
52	16.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		3543,26	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
53	16.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		352,34	SO 01 32 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
54	16.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		52,34	SO 01 32 08	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
55	16.07.2025	Zahor	17 01 01	0		178,40	SO 02 32 06	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
56	16.07.2025	Broďské	17 05 04	0		619,17	SO 12 32 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
57	16.07.2025	Broďské	17 01 07	0		25,59	SO 12 33 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
58	16.07.2025	Broďské	17 01 07	0		326,13	SO 12 33 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
59	17.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		1778,56	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
60	17.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		467,34	SO 01 32 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
61	17.07.2025	Zahor	17 05 04	0		2169,96	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
62	17.07.2025	Broďské	17 05 04	0		404,12	SO 12 32 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
63	17.07.2025	Broďské	17 01 07	0		26,51	SO 12 33 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
64	17.07.2025	Broďské	17 01 07	0		26,29	SO 12 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
65	18.07.2025	Zahor	17 05 04	0		4865,72	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
66	21.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		63,64	SO 01 32 24	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
67	21.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		274,18	SO 01 35 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
68	21.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		3220,75	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
69	21.07.2025	Broďské	17 05 04	0		258,59	SO 12 32 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
70	21.07.2025	Broďské	17 01 07	0		365,07	SO 12 33 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
71	22.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		159,04	SO 01 35 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
72	22.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		3019,84	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
73	22.07.2025	Broďské	17 05 04	0		626,50	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
74	23.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		296,32	SO 01 32 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
75	23.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		3304,75	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
76	23.07.2025	Broďské	17 05 04	0		881,34	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
77	24.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		289,60	SO 01 32 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
78	24.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		3171,07	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
79	24.07.2025	Broďské	17 05 04	0		540,85	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
80	25.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		184,66	SO 01 32 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
81	25.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		2526,12	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
82	25.07.2025	Broďské	17 05 04	0		793,30	SO 11 33 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
83	28.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		552,82	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
84	28.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		83,92	SO 01 32 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
85	28.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		123,76	SO 01 32 08	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
86	28.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		127,38	SO 01 32 23	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
87	28.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		101,68	SO 01 32 24	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
88	28.07.2025	Zahor	17 05 04	0		147,22	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
89	28.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		1811,32	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
90	29.07.2025	DNV - Zahor	17 05 04	0		1004,08	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Kolice	R5
91	29.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		1129,50	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
92	30.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		68,25	SO 01 35 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
93	30.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		1300,64	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
94	31.07.2025	DNV - Zahor	17 01 01	0		58,48	SO 01 35 01	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
95	31.07.2025	Kúty-Broďské	17 05 04	0		483,32	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
96	31.07.2025	Broďské	17 05 04	0		868,02	SO 11 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5

Spracoval na:

Subdodávateľov:

Ing. Lukáš Hučko

Podpis:

Tlač dokumentu, s.r.o.  
 Bratislava 11  
 IČO: 40834000  
 DIČ: SK2023000000  
 E-mail: info@tlač.sk  
 Tel.: 02 68 88 88 88



## 9. Finančné plnenie:

### Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 667 718,54	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025
16/2024-A	11/2024	1 856 011,65	16.2.2025
1/2025-A	12/2024	11 113 697,95	30.3.2025
2/2025-A-CZ1	12/2024	36 082,96	18.4.2025
3/2025-A	02/2025	7 298 303,76	13.6.2025
5/2025-A	03/2025	5 106 862,27	15.7.2025
6/2025-A	04/2025	6 166 398,14	4.8.2025
7/2025-A	05/2025	4 990 540,24	14.9.2025

**Stavba B - fakturácia**

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024
17/2024-A	12/2024	892 751,19	29.3.2025
8/2025-B	05/2025	2 483 529,77	15.9.2025

K 31.07.2025 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 76 812 396,53 € bez DPH.
- stavby B vo výške 4 306 383,40 € bez DPH.



## 10. Fotodokumentácia



UČS 12, Armovanie, debnenie a betónáž základu



UČS 12, Armovanie a debnenie drieku mosta





UČS 12, Armovanie, debnenie a betonáž opôr



UČS 12, Betonáž záverných múrikov a krídel



UČS 12, Osádzanie ložísk



UČS 12, Přípravné práce na realizáciu mostovky








UČS 12, Kladenie ochranných kameňov na rieke Morava



UČS 11, Armovanie výťahovej šachty, podchod

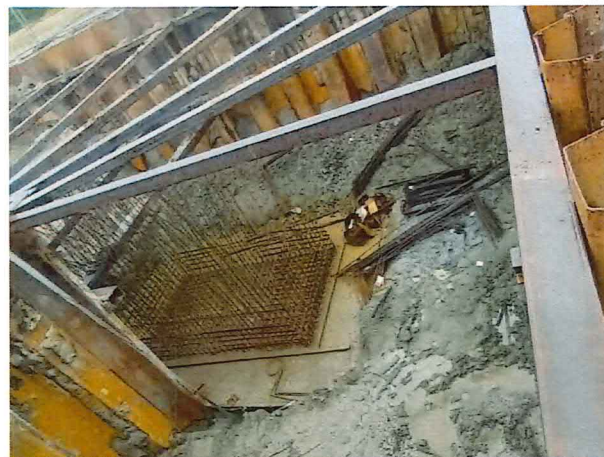


UČS 11, Armovanie základovej dosky, výťahová šachta, podchod





UČS 11, Oddebnenie a izolácia výťahovej šachty, podchod

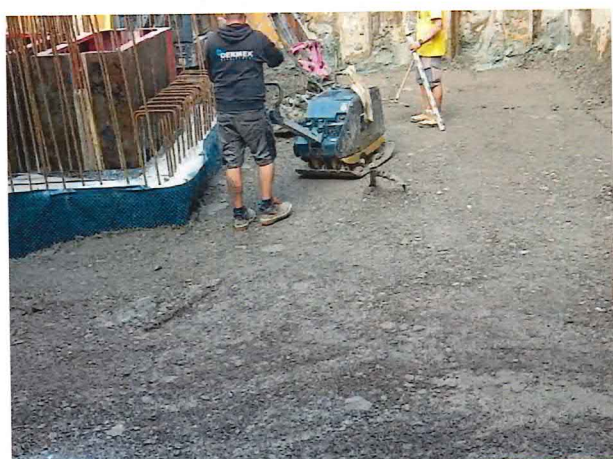

UČS 11, Zásyp a armovanie podkladnej dosky, podchod




UČS 11, Penetračný náter a izolácia, podchod






UČS 11, Armovanie a debnenie dna tubusu, podchod

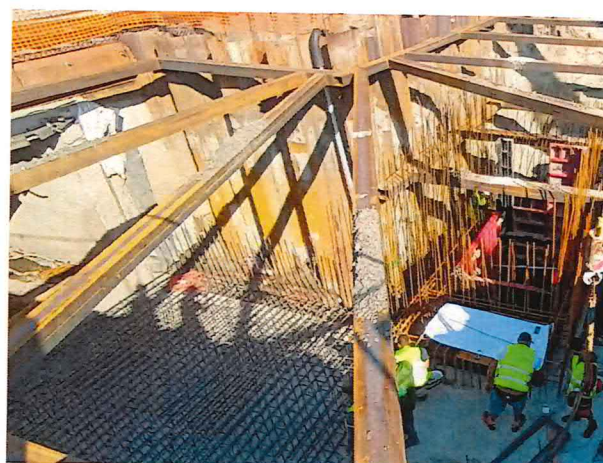

UČS 11, Betonáž dna tubusu, podchod

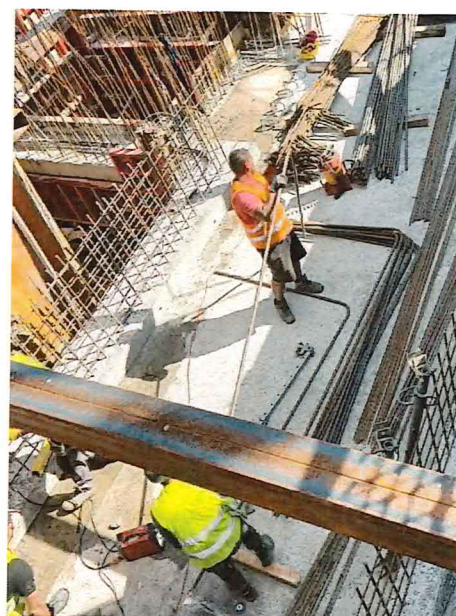


UČS 11, Betonáž mostovky, podjazd



UČS 11, Výkopy podjazd



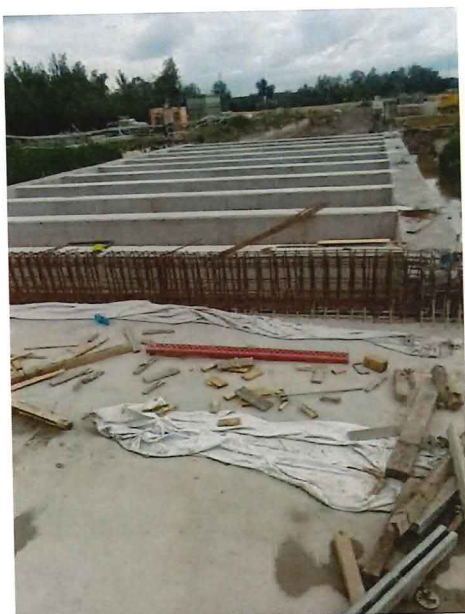

UČS 11, Podjazd



UČS 11, Armovanie a betonáž podkladnej dosky, podjazd



UČS 11, Výkopy, podjazd





UČS 11, Montáž nástupištných hrán



UČS 10, Montáž prefa, TNS transformátorovňa







UČS 10, 11, Odkopy rýh a realizácia spevnených priekop





UČS 10, Zriadenie PŽS a statické zaťažovacie skúšky




UČS 10, Rozprestretie geotextílie a štrkodrvy, zriadenie PŽS





UČS 10, Betónová rímša a izolácie, priepust

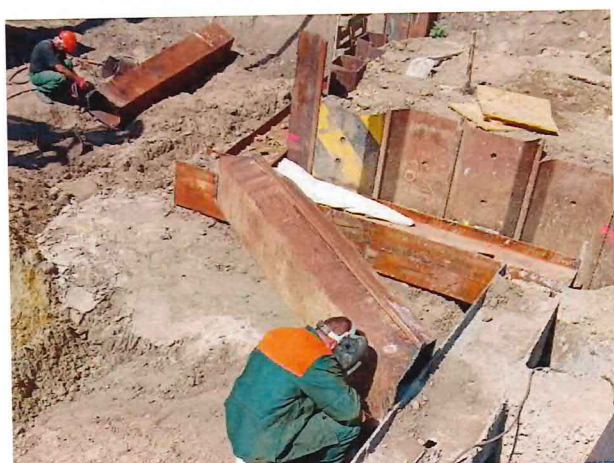

UČS 02, Realizácia štetovnic a horný rozperný rám, podchod





UČS 02, Výkopy, podchod



UČS 02, Zváranie spodného rozperného rámu




UČS 02, Odkopy, podchod








UČS 02, Podkladná vrstva pod podkladový betón, podchod

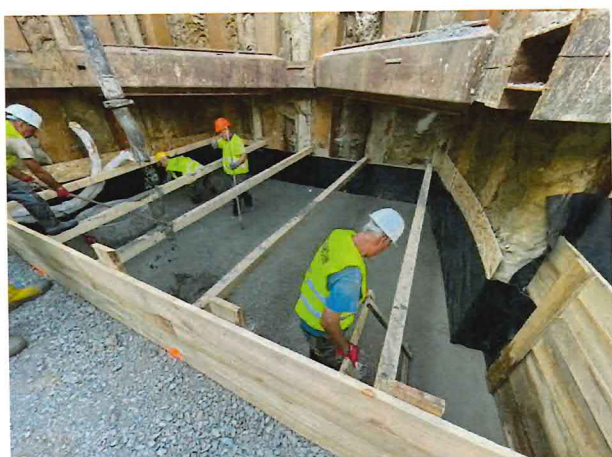

UČS 02, Podkladný betón, podchod

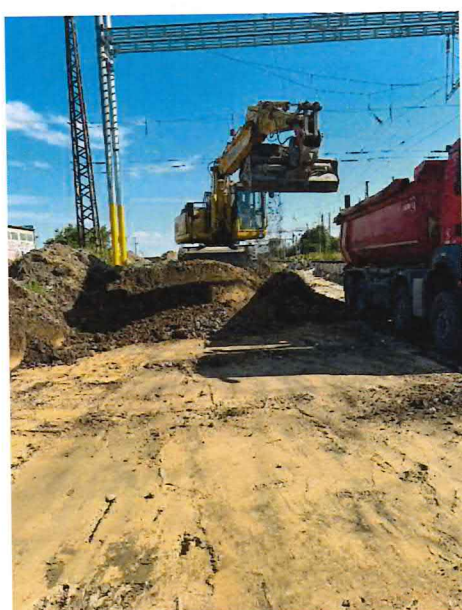

UČS 02, Odťazenie železničného spodku





UČS 02, Odkopávanie starých kábelových trás





UČS 02, Odsun jestvujúcich kábelových trás



UČS 02, Ochrana jestvujúcich kábelových trás suchým betónom





UČS 02, Realizácia kábelovodov





UČS 02, Betonáž základového pásu, nástupisko



UČS 02, Armovanie a debnenie základov pre prístrešky





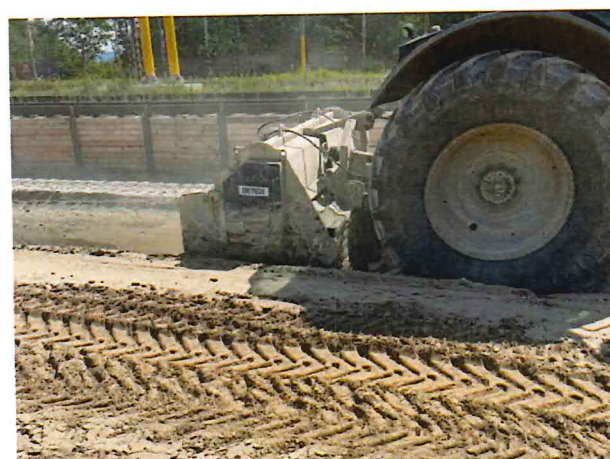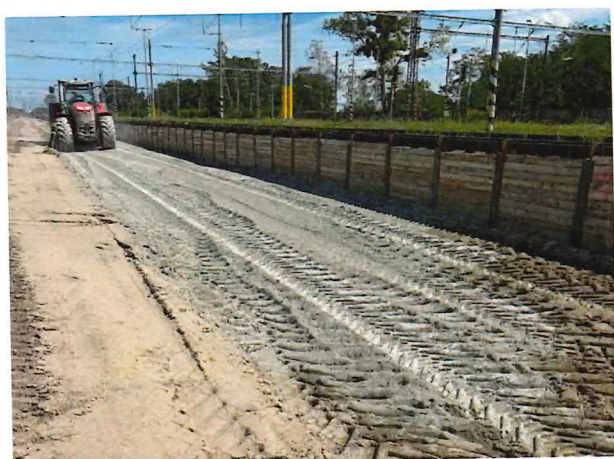


UČS 02, Príprava a stabilizácia zemnej pláne





UČS 01, Realizácia záporového paženia a odkop železničného spodku

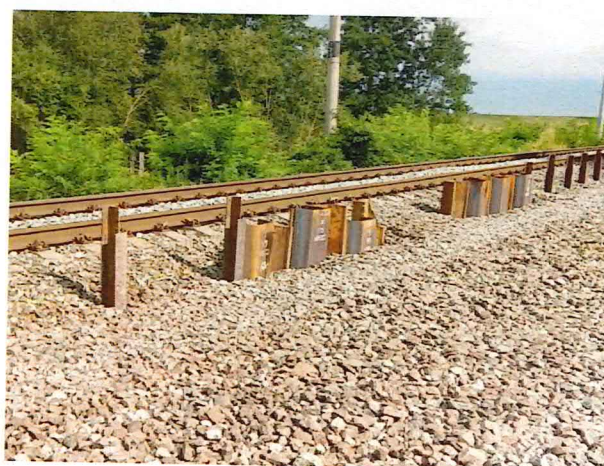

UČS 01, Realizácia záporového paženia, priepusty a mosty





UČS 01, Realizácia záporového paženia



UČS 01, Búranie betónov, úprava podložia a podkladový betón, priepust





UČS 01, Realizácia priepustu



UČS 01, Realizácia pilót PHS







UČS 01, Odkopy po zemnú pláň



UČS 01, Rozprestretie štrkodrvy a geotextílie



UČS 01, Dodávka žľabov



UČS 01, Armovanie a debnenie základov, lávka pre cestujúcich







UČS 01, Oddebňovanie základov, lávka pre cestujúcich



UČS 01, Armovanie a debnenie výťahových šácht a druhý stupeň základov, lávka pre cestujúcich



UČS 01, Armovanie, debnenie a betonáž výťahových šácht, lávka pre cestujúcich







## Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.07.2025-31.07.2025

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu





[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



## Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.07.2025-31.07.2025

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu



**Príloha č.3**

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.07.2025-31.07.2025

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa pod- článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	31.7.2025	JVICM-VHS/25/0287



#### Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

#### Zariadenie Zhotoviteľa

Popis, druh	Množstvo
<b>STROJE</b>	
Rýpadlo	18
Búracie kladivo	7
Traktor CAT, JCB	9
Žeriav	5
Elektrocentrála	15
Čerpadlo na vodu	12
Ponorný vibrátor	10
Vibračná doska	2
Mikropilótová vrtná súprava	2
Pilotovacia súprava	2
<b>DOPRAVA</b>	
Autožeriav	8
Domiešavač	7
Mann s mech. Rukou	0
Nákladné auto TATRA 815	23
LOKO	3
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	16
Pracovný vlak TV-betonárka	2
DESEC	0
Manitou	2

#### Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
<b>VLASTNÍ: Predstavitel' zhotoviteľa:</b>	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Pripravár, kalkulant	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5
<b>CUDZÍ - subdodávateľa</b>	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	18
- Geodet	12
- Stavebný robotník - strojník, vodič	87
- Stavebný robotník	102
