























Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	14 dec '20														21 dec '20			
							N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š						
1		 2020_027 - Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske	325 dni	Pi 1.1.21	Št 31.3.22																			
2		 Protokolárne prevzatie staveniska	6 dni	Pi 1.1.21	Pi 8.1.21																			
3		 SO 101 - PRIJÍMACIA HALA	111 dni	Ut 1.6.21	Ut 2.11.21																			
4		 Zemné práce	5 dni	Ut 1.6.21	Po 7.6.21																			
5		 Zakladanie	10 dni	Ut 8.6.21	Po 21.6.21	4																		
6		 Zvislé a kompletné konštrukcie	20 dni	Ut 22.6.21	Po 19.7.21	5																		
7		 Komunikácie	10 dni	Ut 22.6.21	Po 5.7.21	5																		
8		 Konštrukcie klampiarske	10 dni	Str 20.10.21	Ut 2.11.21	9																		
9		 Konštrukcie doplnkové kovové	20 dni	Ut 28.9.21	Po 25.10.21	10																		
10		 Nátery	15 dni	Ut 7.9.21	Po 27.9.21	12																		
11		 Elektromontáže	27 dni	Ut 8.6.21	Str 20.10.21	4																		
12		 Montáž oceľových konštrukcií	35 dni	Ut 20.7.21	Po 6.9.21	6																		
13		 SO 102 - KOMPOSTOVACIE BOXY	150 dni	Po 14.6.21	Pi 7.1.22																			
14		 Zemné práce	10 dni	Po 14.6.21	Pi 25.6.21																			
15		 Zakladanie	55 dni	Po 28.6.21	Pi 8.10.21	14																		
16		 Zvislé a kompletné konštrukcie	32 dni	Po 19.7.21	Ut 31.8.21																			
17		 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 dni	Po 27.12.21	Pi 7.1.22																			
18		 Izolácie proti vode a vlhkosti	15 dni	Po 4.10.21	Pi 22.10.21																			
19		 Konštrukcie klampiarske	15 dni	Po 11.10.21	Pi 29.10.21																			
20		 Konštrukcie doplnkové kovové	25 dni	Po 13.9.21	Pi 15.10.21																			
21		 Montáže vzduchotechnických zariadení	30 dni	Po 4.10.21	Pi 12.11.21																			
22		 Nátery	15 dni	Po 13.12.21	Pi 31.12.21																			
23		 Elektromontáže	40 dni	Po 28.6.21	Pi 10.12.21	14																		
24		 Montáž a dodávka technológie	50 dni	Po 13.9.21	Pi 10.12.21																			
25		 SO 103 - BIOFILTER	75 dni	Po 14.6.21	Pi 24.9.21																			
26		 Zemné práce	10 dni	Po 14.6.21	Pi 25.6.21																			
27		 Zakladanie	10 dni	Po 28.6.21	Pi 9.7.21	26																		
28		 Zvislé a kompletné konštrukcie	15 dni	Po 12.7.21	Pi 30.7.21	27																		
29		 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 dni	Po 23.8.21	Pi 3.9.21	28																		
30		 Izolácie proti vode a vlhkosti	5 dni	Po 6.9.21	Pi 10.9.21	28																		
31		 Konštrukcie tesárske	5 dni	Po 13.9.21	Pi 17.9.21	28																		
32		 Konštrukcie doplnkové kovové	15 dni	Po 6.9.21	Pi 24.9.21	28																		
33		 Nátery	5 dni	Po 23.8.21	Pi 27.8.21	32																		
34		 Elektromontáže	15 dni	Št 1.7.21	Po 30.8.21																			
35		 Montáž a dodávka technológie	10 dni	Ut 31.8.21	Po 13.9.21	34																		
36		 SO 104 - KOMPOSTOVACIA PLOCHA	233 dni	Pi 8.1.21	Ut 30.11.21																			
37		 Zemné práce	45 dni	Po 11.1.21	Pi 12.3.21	2																		
38		 Zakladanie	25 dni	Po 15.3.21	Pi 16.4.21	37																		
39		 Zvislé a kompletné konštrukcie	20 dni	Po 19.4.21	Pi 14.5.21	38																		
40		 Komunikácie	60 dni	Str 1.9.21	Ut 23.11.21																			
41		 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 dni	Str 1.9.21	Ut 21.9.21																			
42		 Konštrukcie doplnkové kovové	32 dni	Po 11.10.21	Ut 23.11.21	43																		
43		 Montáž a dodávka technológie	110 dni	Po 17.5.21	Pi 15.10.21	39																		
44		 SO 105 - OPLOTENIE	135 dni	Po 17.5.21	Pi 19.11.21	39																		
45		 Zemné práce	25 dni	Po 17.5.21	Pi 18.6.21	39																		
46		 Zakladanie	20 dni	Po 21.6.21	Pi 16.7.21	45																		
47		 Zvislé a kompletné konštrukcie	20 dni	Po 21.6.21	Pi 16.7.21	45																		
48		 Konštrukcie doplnkové kovové	5 dni	Po 15.11.21	Pi 19.11.21																			
49		 SO 106 - PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER	75 dni	Po 15.11.21	Pi 25.2.22																			
50		 Zakladanie	5 dni	Po 15.11.21	Pi 19.11.21																			
51		 Zvislé a kompletné konštrukcie	5 dni	Po 14.2.22	Pi 18.2.22																			
52		 Konštrukcie doplnkové kovové	5 dni	Po 14.2.22	Pi 18.2.22																			
53		 Elektromontáže	10 dni	Po 14.2.22	Pi 25.2.22																			
54		 SO 107 - CESTNÁ VÁHA	25 dni	Po 15.11.21	Pi 17.12.21																			
55		 Zemné práce	5 dni	Po 15.11.21	Pi 19.11.21																			
56		 Zakladanie	5 dni	Po 22.11.21	Pi 26.11.21	55																		
57		 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5 dni	Po 22.11.21	Pi 26.11.21	55																		
58		 Elektromontáže	20 dni	Po 22.11.21	Pi 17.12.21	55																		
59		 Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	10 dni	Po 29.11.21	Pi 10.12.21	56																		
60		 SPEVNENÉ PLOCHY	93 dni	Po 15.11.21	Str 23.3.22																			
61		 Zemné práce	50 dni	Po 15.11.21	Pi 21.1.22																			
62		 Zakladanie	25 dni	Po 22.11.21	Pi 24.12.21	55																		
63		 Zvislé a kompletné konštrukcie	20 dni	Po 27.12.21	Pi 21.1.22	62																		

Identifik		Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	14 dec '20														21 dec '20			
								N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š						
64			Komunikácie	43 dni	Po 24.1.22	Str 23.3.22	63																		
65			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40 dni	Po 10.1.22	Pi 4.3.22																			
66			SO 301 - AREÁLOVÝ ROZVOD A POŽIRNA NÁDRŽ	70 dni	Po 15.3.21	Pi 18.6.21																			
67			Potrubné rozvody	60 dni	Po 15.3.21	Pi 4.6.21	37																		
68			Objekty na vodovode	55 dni	Po 22.3.21	Pi 4.6.21																			
69			Zdravotechnika - vnútorný vodovod	70 dni	Po 15.3.21	Pi 18.6.21	37																		
70			SO 401 - KANALIZÁCIA	70 dni	Po 17.5.21	Pi 20.8.21																			
71			Potrubné rozvody	65 dni	Po 17.5.21	Pi 13.8.21	39																		
72			Objekty na areálovej kanalizácii	65 dni	Po 17.5.21	Pi 13.8.21	39																		
73			Ostatné	80 dni	Po 3.5.21	Pi 20.8.21																			
74			AREÁLOVÝ ROZVOD NN	28 dni	Po 14.2.22	Str 23.3.22																			
75			Elektromontáže	28 dni	Po 14.2.22	Str 23.3.22																			
76			SO 602 - AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE	223 dni	Po 17.5.21	Str 23.3.22																			
77			Elektromontáže	96 dni	Po 17.5.21	Str 23.3.22																			
78			PS 01 - PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU	65 dni	Po 17.5.21	Pi 13.8.21																			
79			46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	65 dni	Po 17.5.21	Pi 13.8.21																			
80			PS 02 - MERANIE A REGULÁCIA	220 dni	Po 17.5.21	Pi 18.3.22																			
81			3. Špecifikácia zariadení MaR:	55 dni	Po 3.1.22	Pi 18.3.22																			
82			A. Dodávka	50 dni	Po 3.1.22	Pi 11.3.22																			
83			46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	65 dni	Po 17.5.21	Pi 13.8.21																			
84			Protokolárne odovzdávanie staveniska	5 dni	Št 24.3.22	Str 30.3.22	76																		



Projekt: Harmonogram stavby\_  
Dátum: Ut 15.12.20

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy


Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh


Strana 2

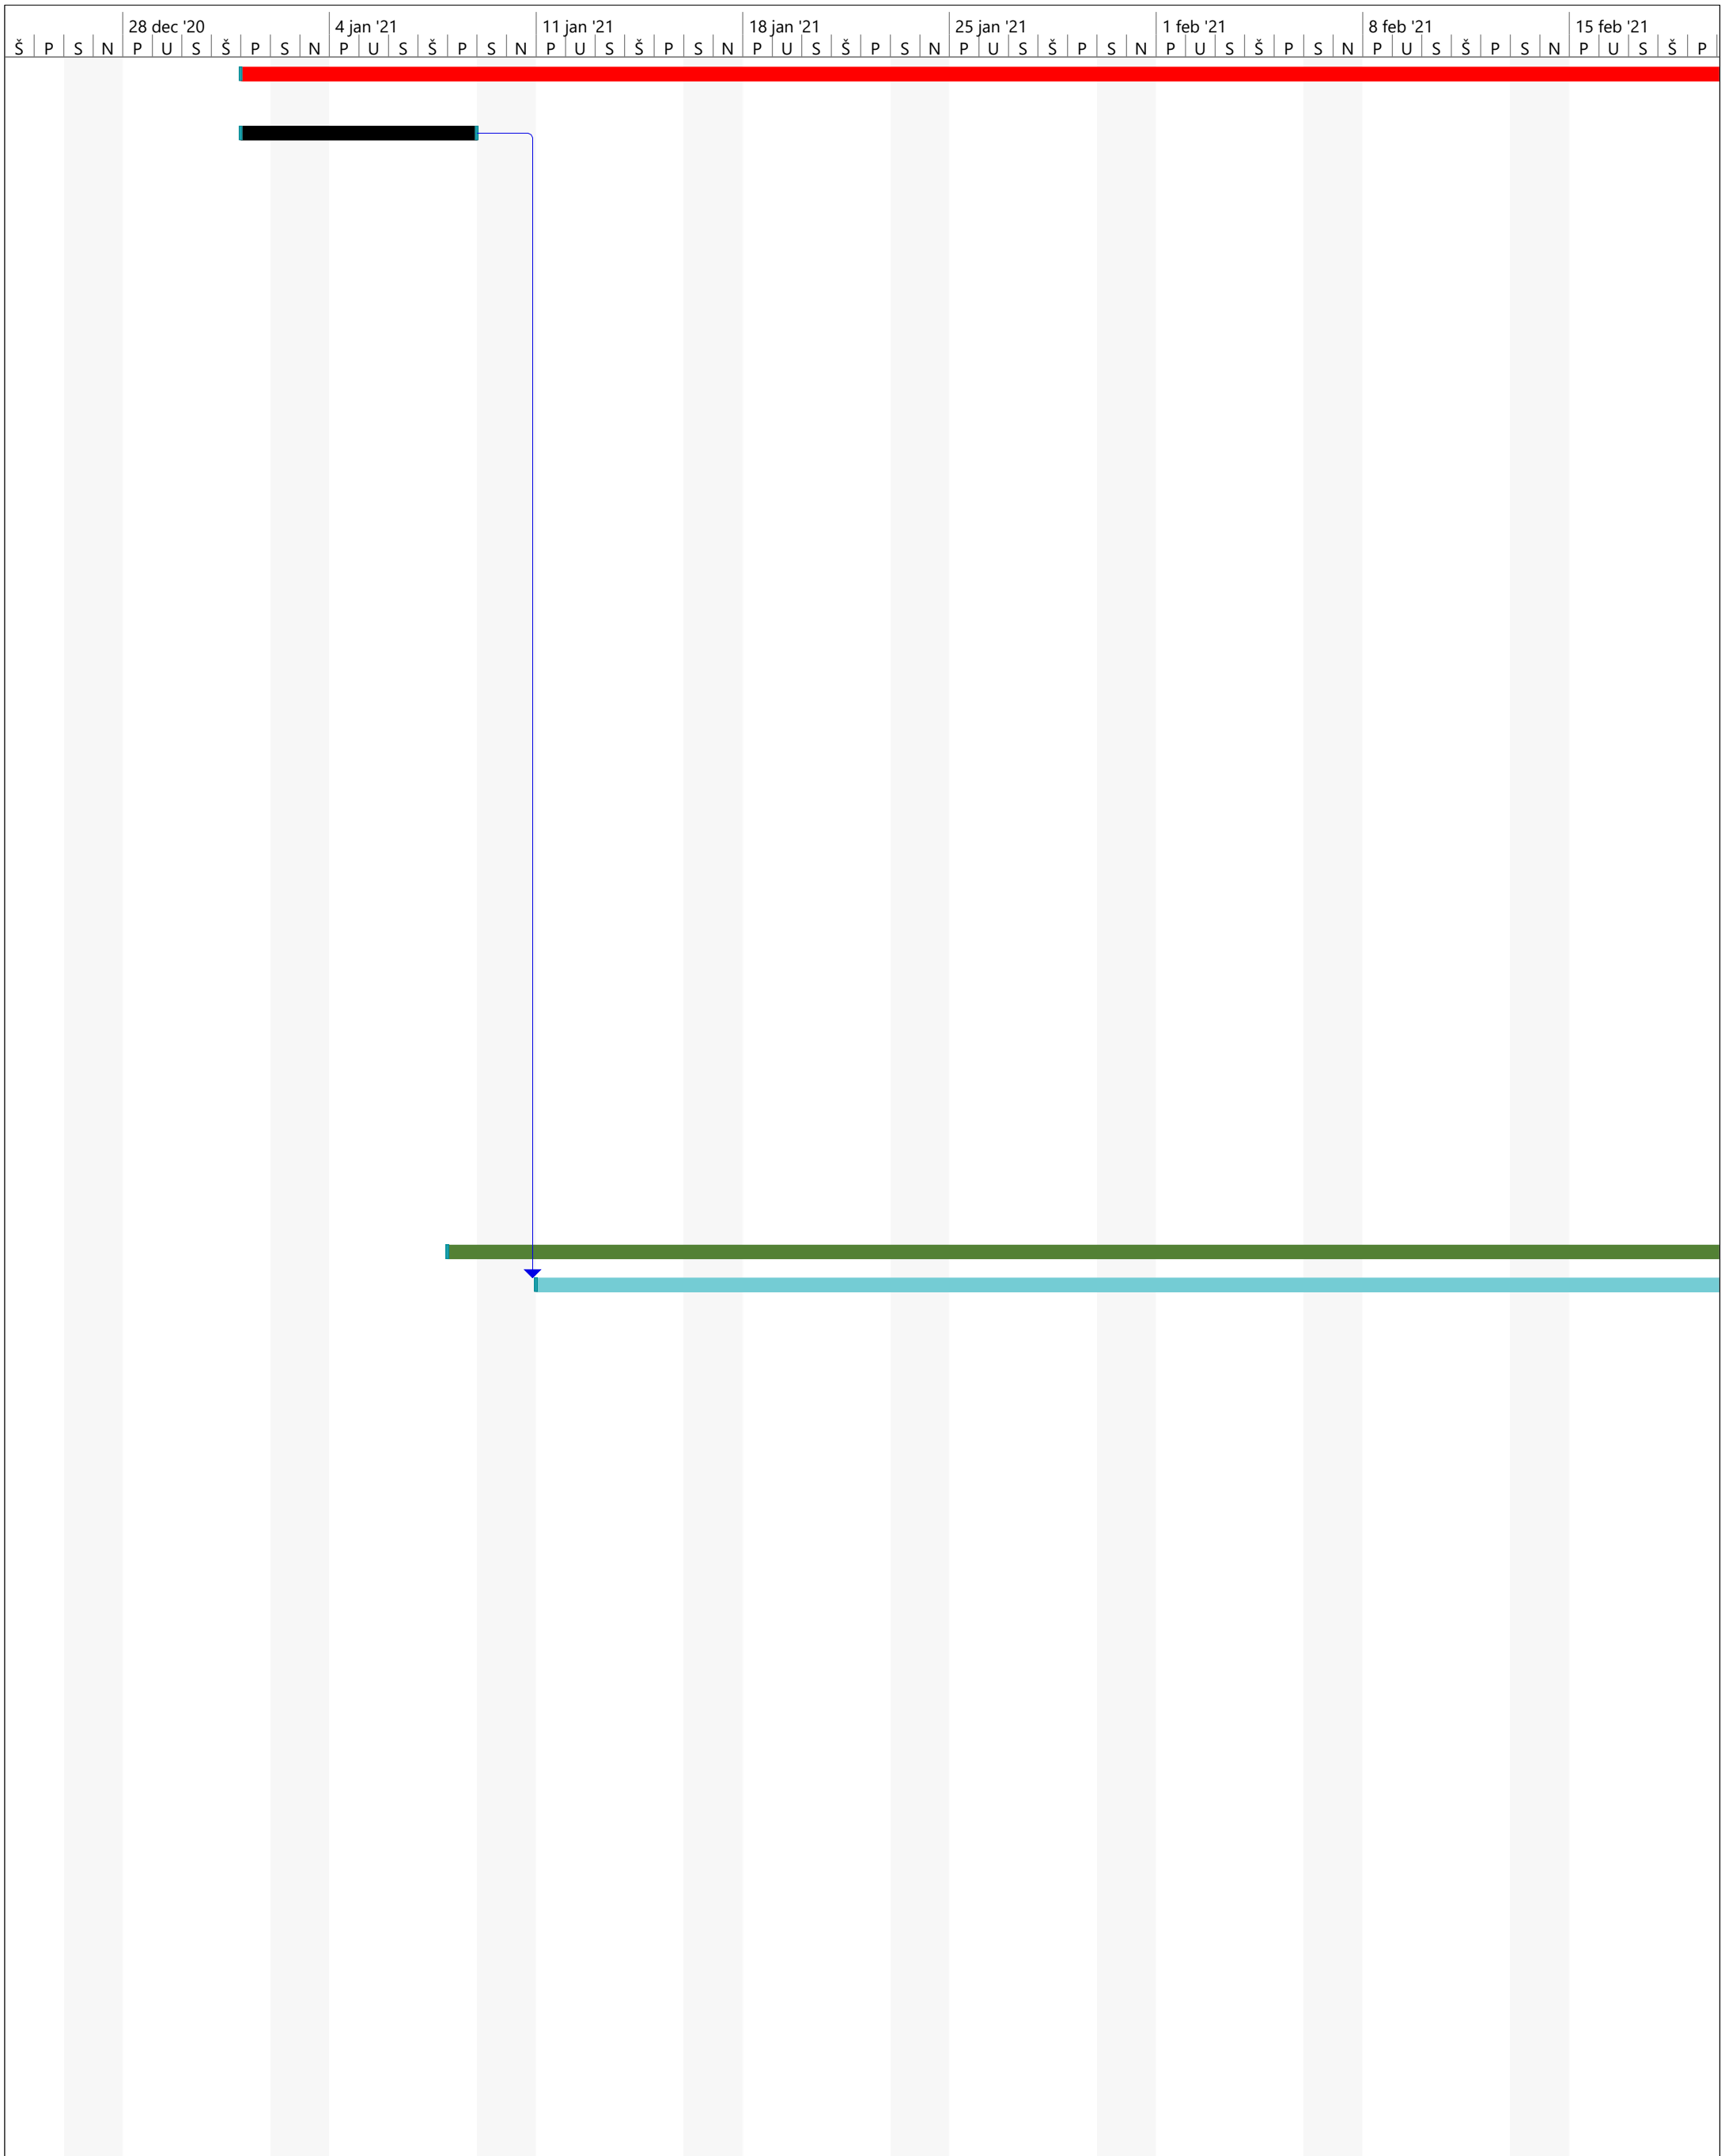

Projekt: Harmonogram stavby\_  
Dátum: Ut 15.12.20

Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			

Strana 3




Projekt: Harmonogram stavby_ Dátum: Ut 15.12.20	Úloha	<div></div>	Neaktívna úloha	<div></div>	Manuálny súhrn	<div></div>	Externý medzník	<div></div>
	Rozdeliť	<div></div>	Neaktívny medzník	<div></div>	Manuálny súhrn	<div></div>	Termín	<div></div>
	Medzník	<div></div>	Neaktívny súhrn	<div></div>	Iba začiatok	<div></div>	Priebeh	<div></div>
	Súhrn	<div></div>	Manuálna úloha	<div></div>	Iba dokončiť	<div></div>	Manuálny priebeh	<div></div>
	Súhrn projektu	<div></div>	Iba trvanie	<div></div>	Externé úlohy	<div></div>		







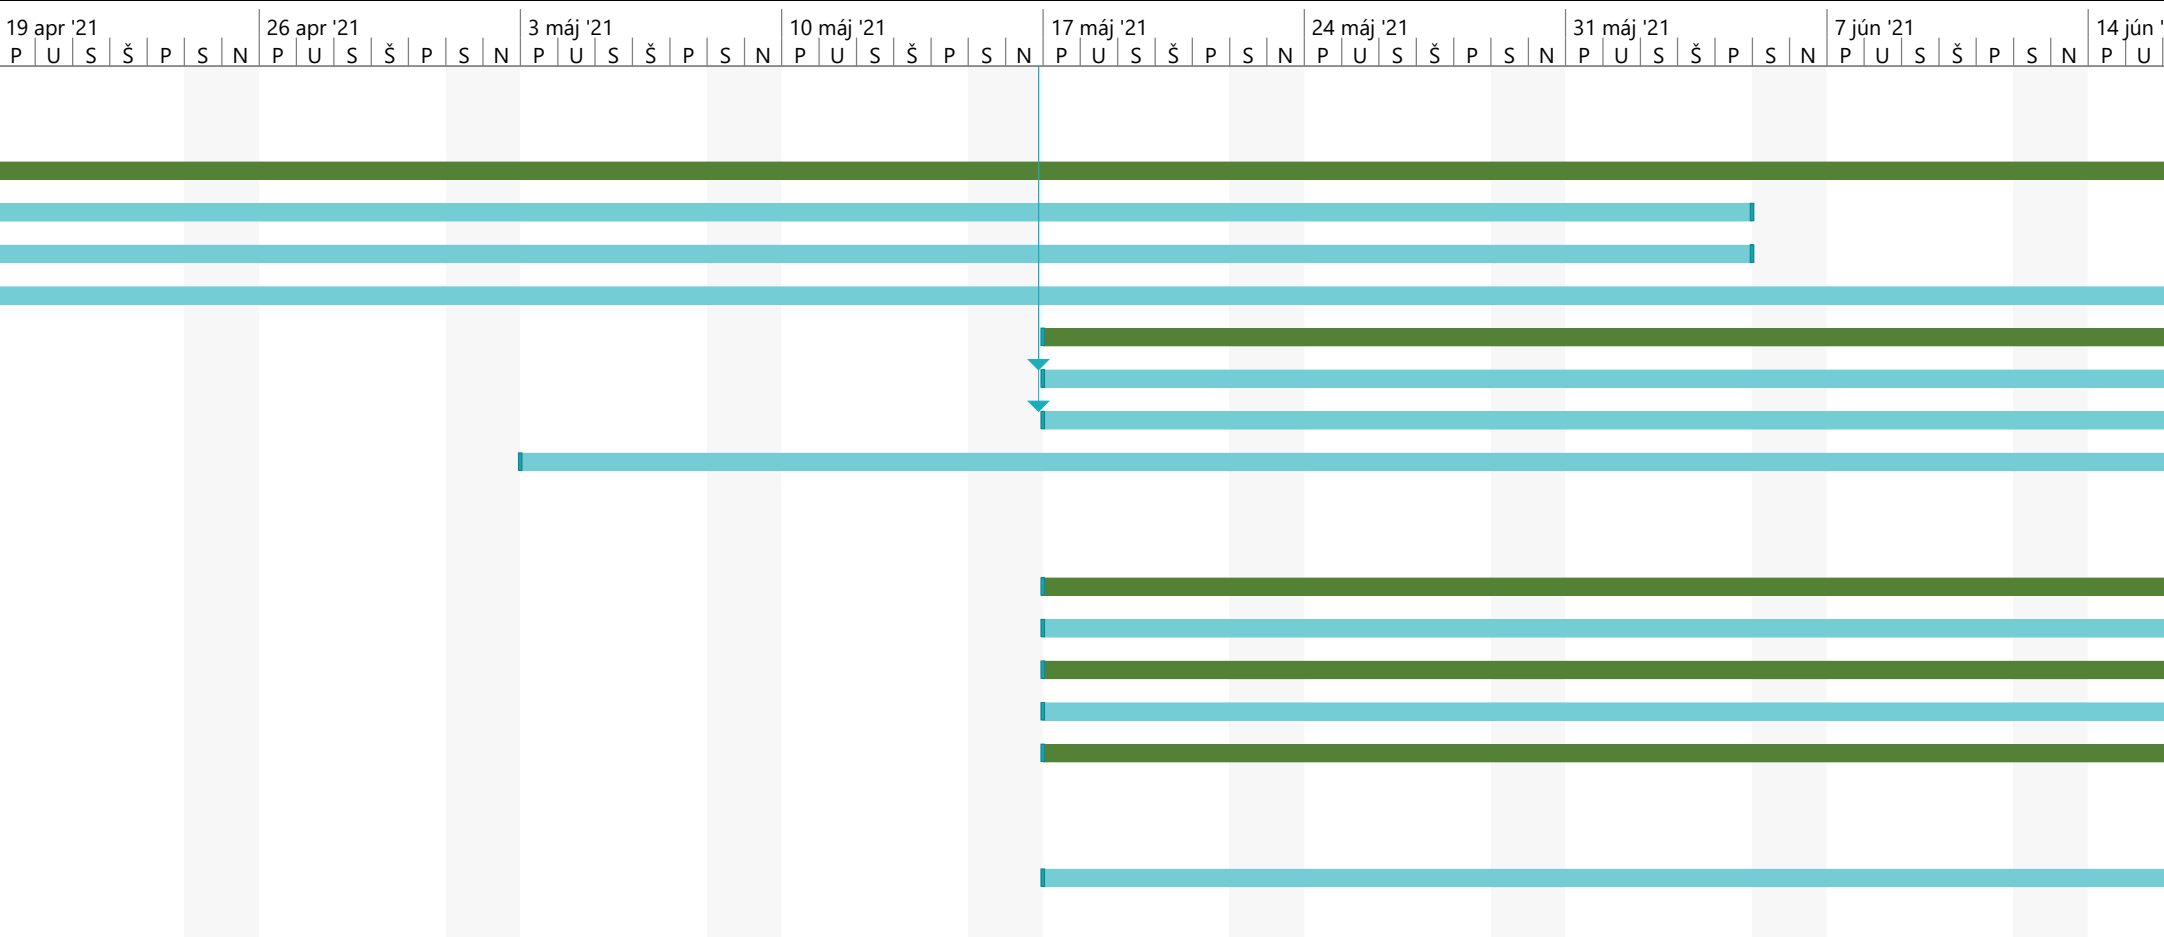


Projekt: Harmonogram stavby_ Dátum: Ut 15.12.20	Úloha	<div></div>	Neaktívna úloha	<div></div>	Manuálny súhrn	<div></div>	Externý medzník	<div></div>
	Rozdeliť	<div></div>	Neaktívny medzník	<div></div>	Manuálny súhrn	<div></div>	Termín	<div></div>
	Medzník	<div></div>	Neaktívny súhrn	<div></div>	Iba začiatok	<div></div>	Priebeh	<div></div>
	Súhrn	<div></div>	Manuálna úloha	<div></div>	Iba dokončiť	<div></div>	Manuálny priebeh	<div></div>
	Súhrn projektu	<div></div>	Iba trvanie	<div></div>	Externé úlohy	<div></div>		



Projekt: Harmonogram stavby_ Dátum: Ut 15.12.20	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			
Strana 9								



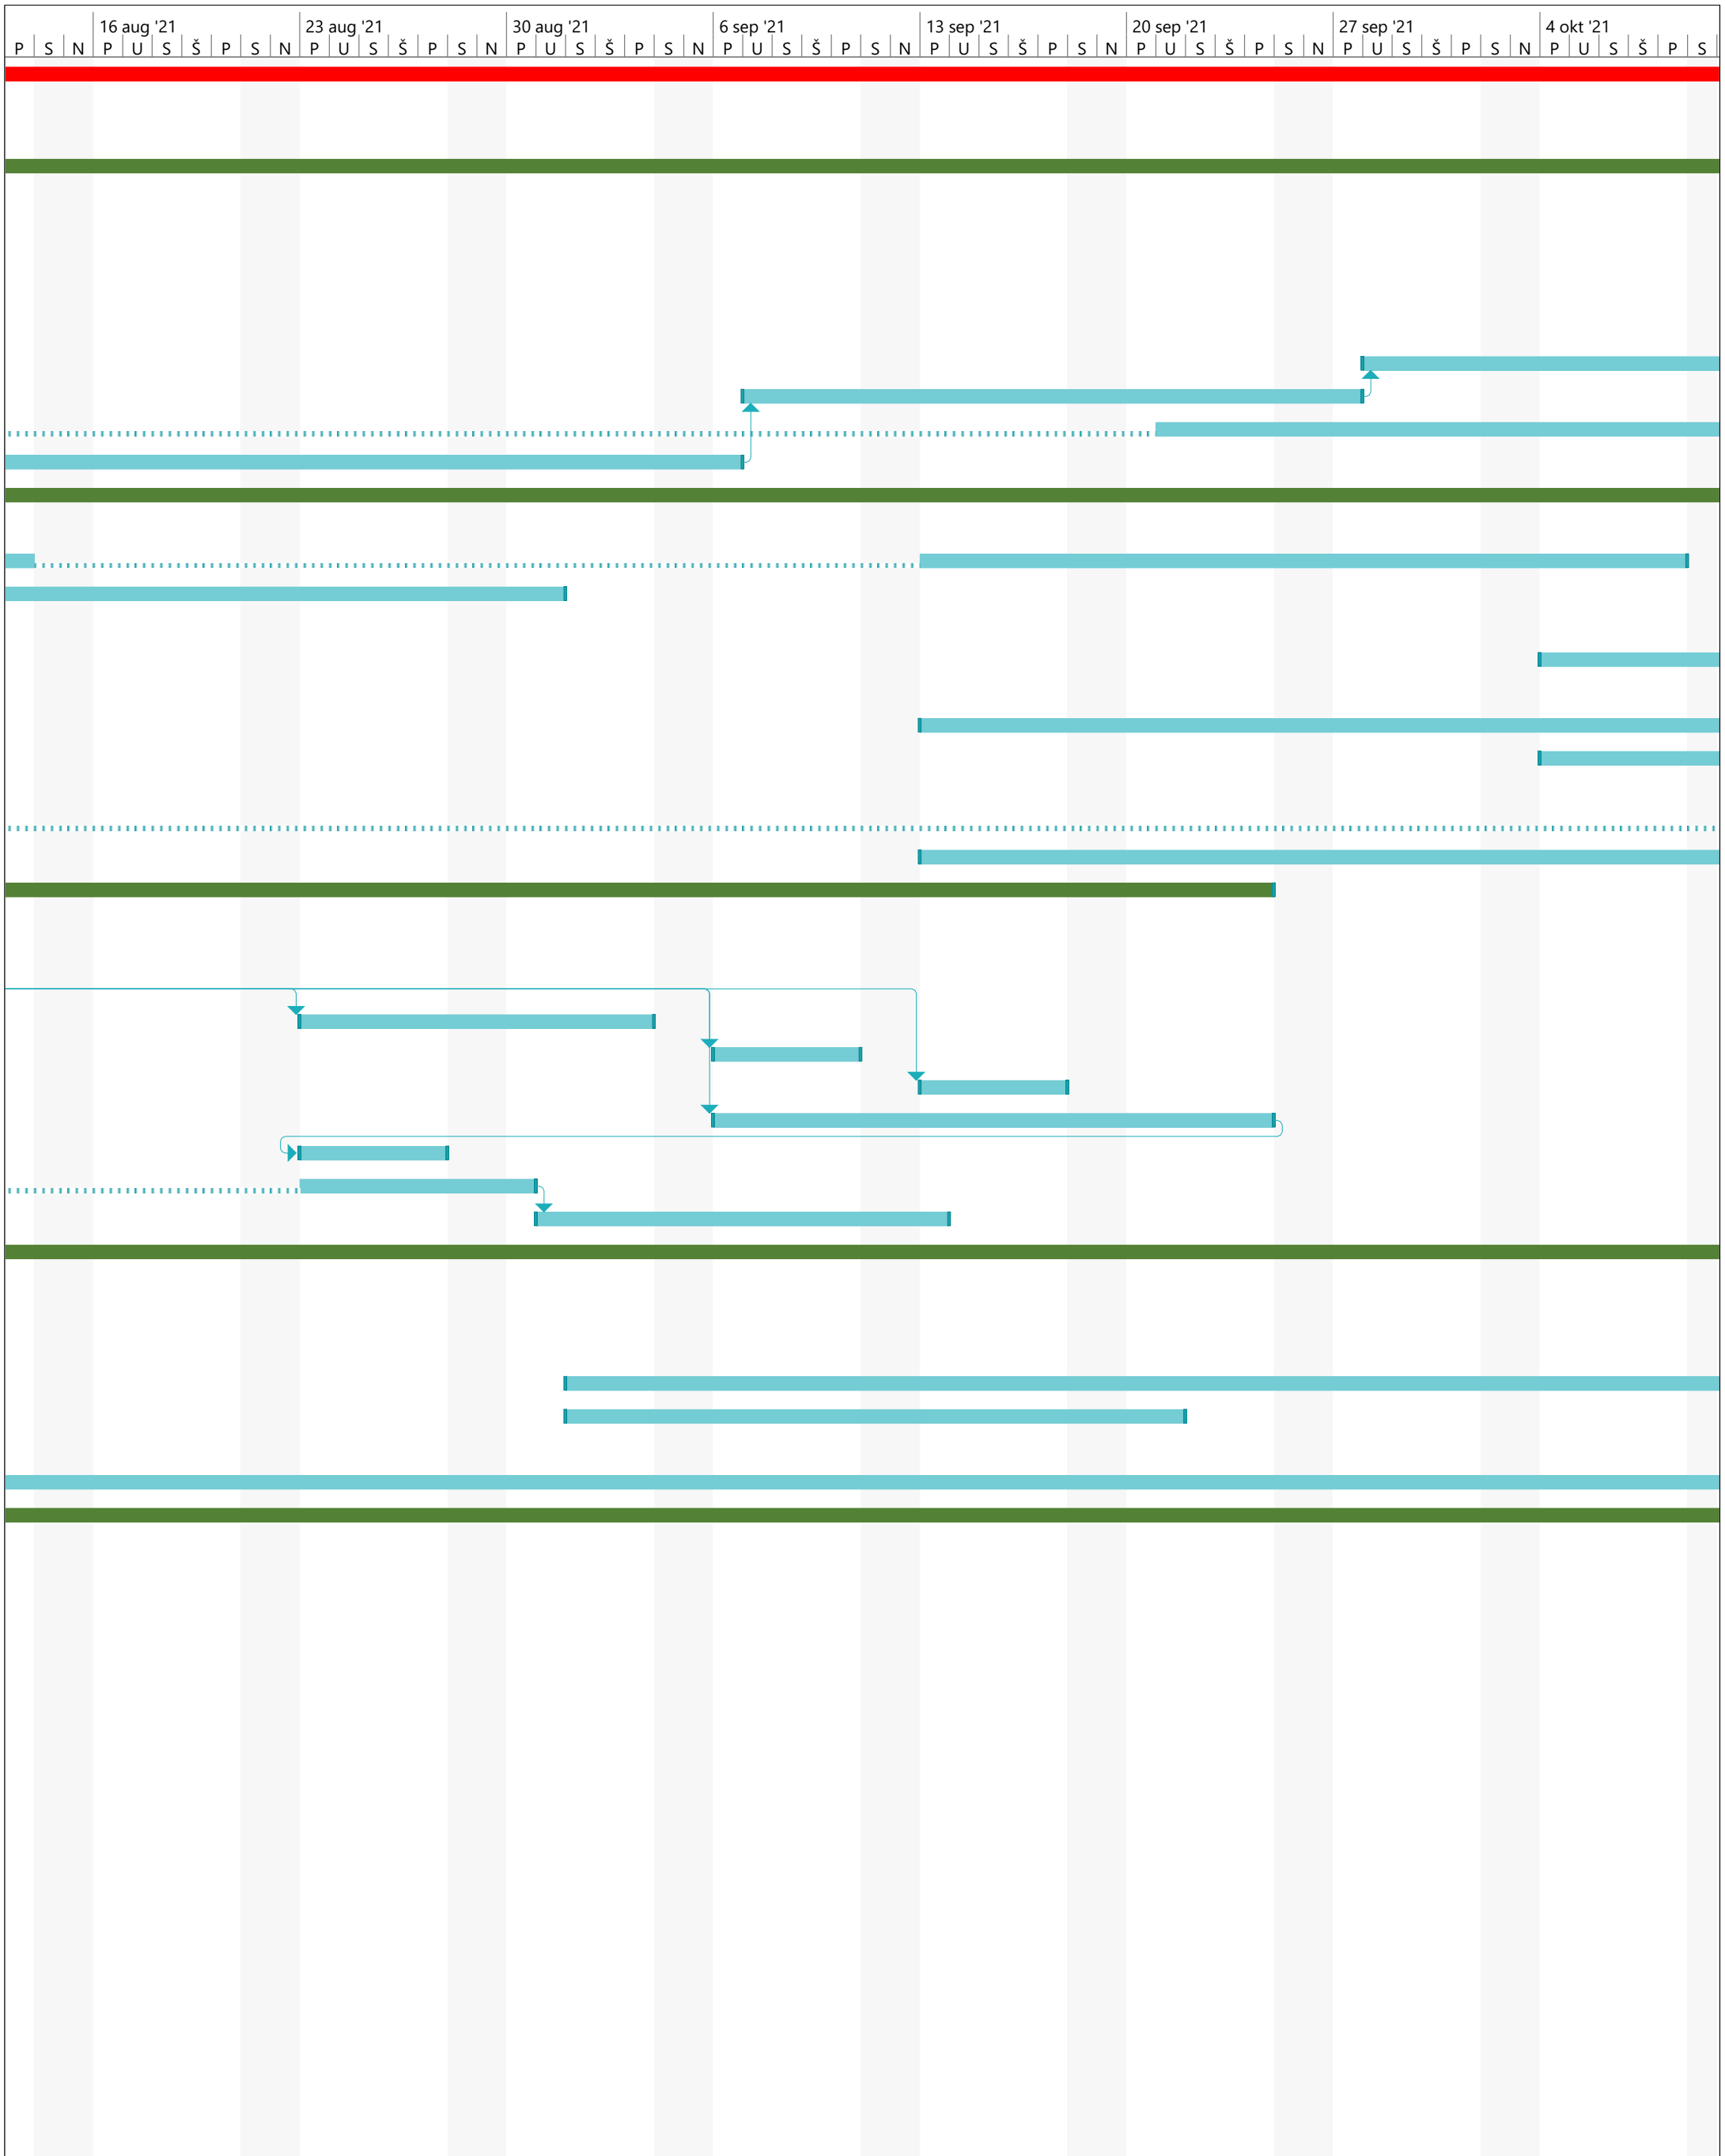

Projekt: Harmonogram stavby\_  
Dátum: Ut 15.12.20

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník


Termín

Priebeh

Manuálny priebeh

Strana 11



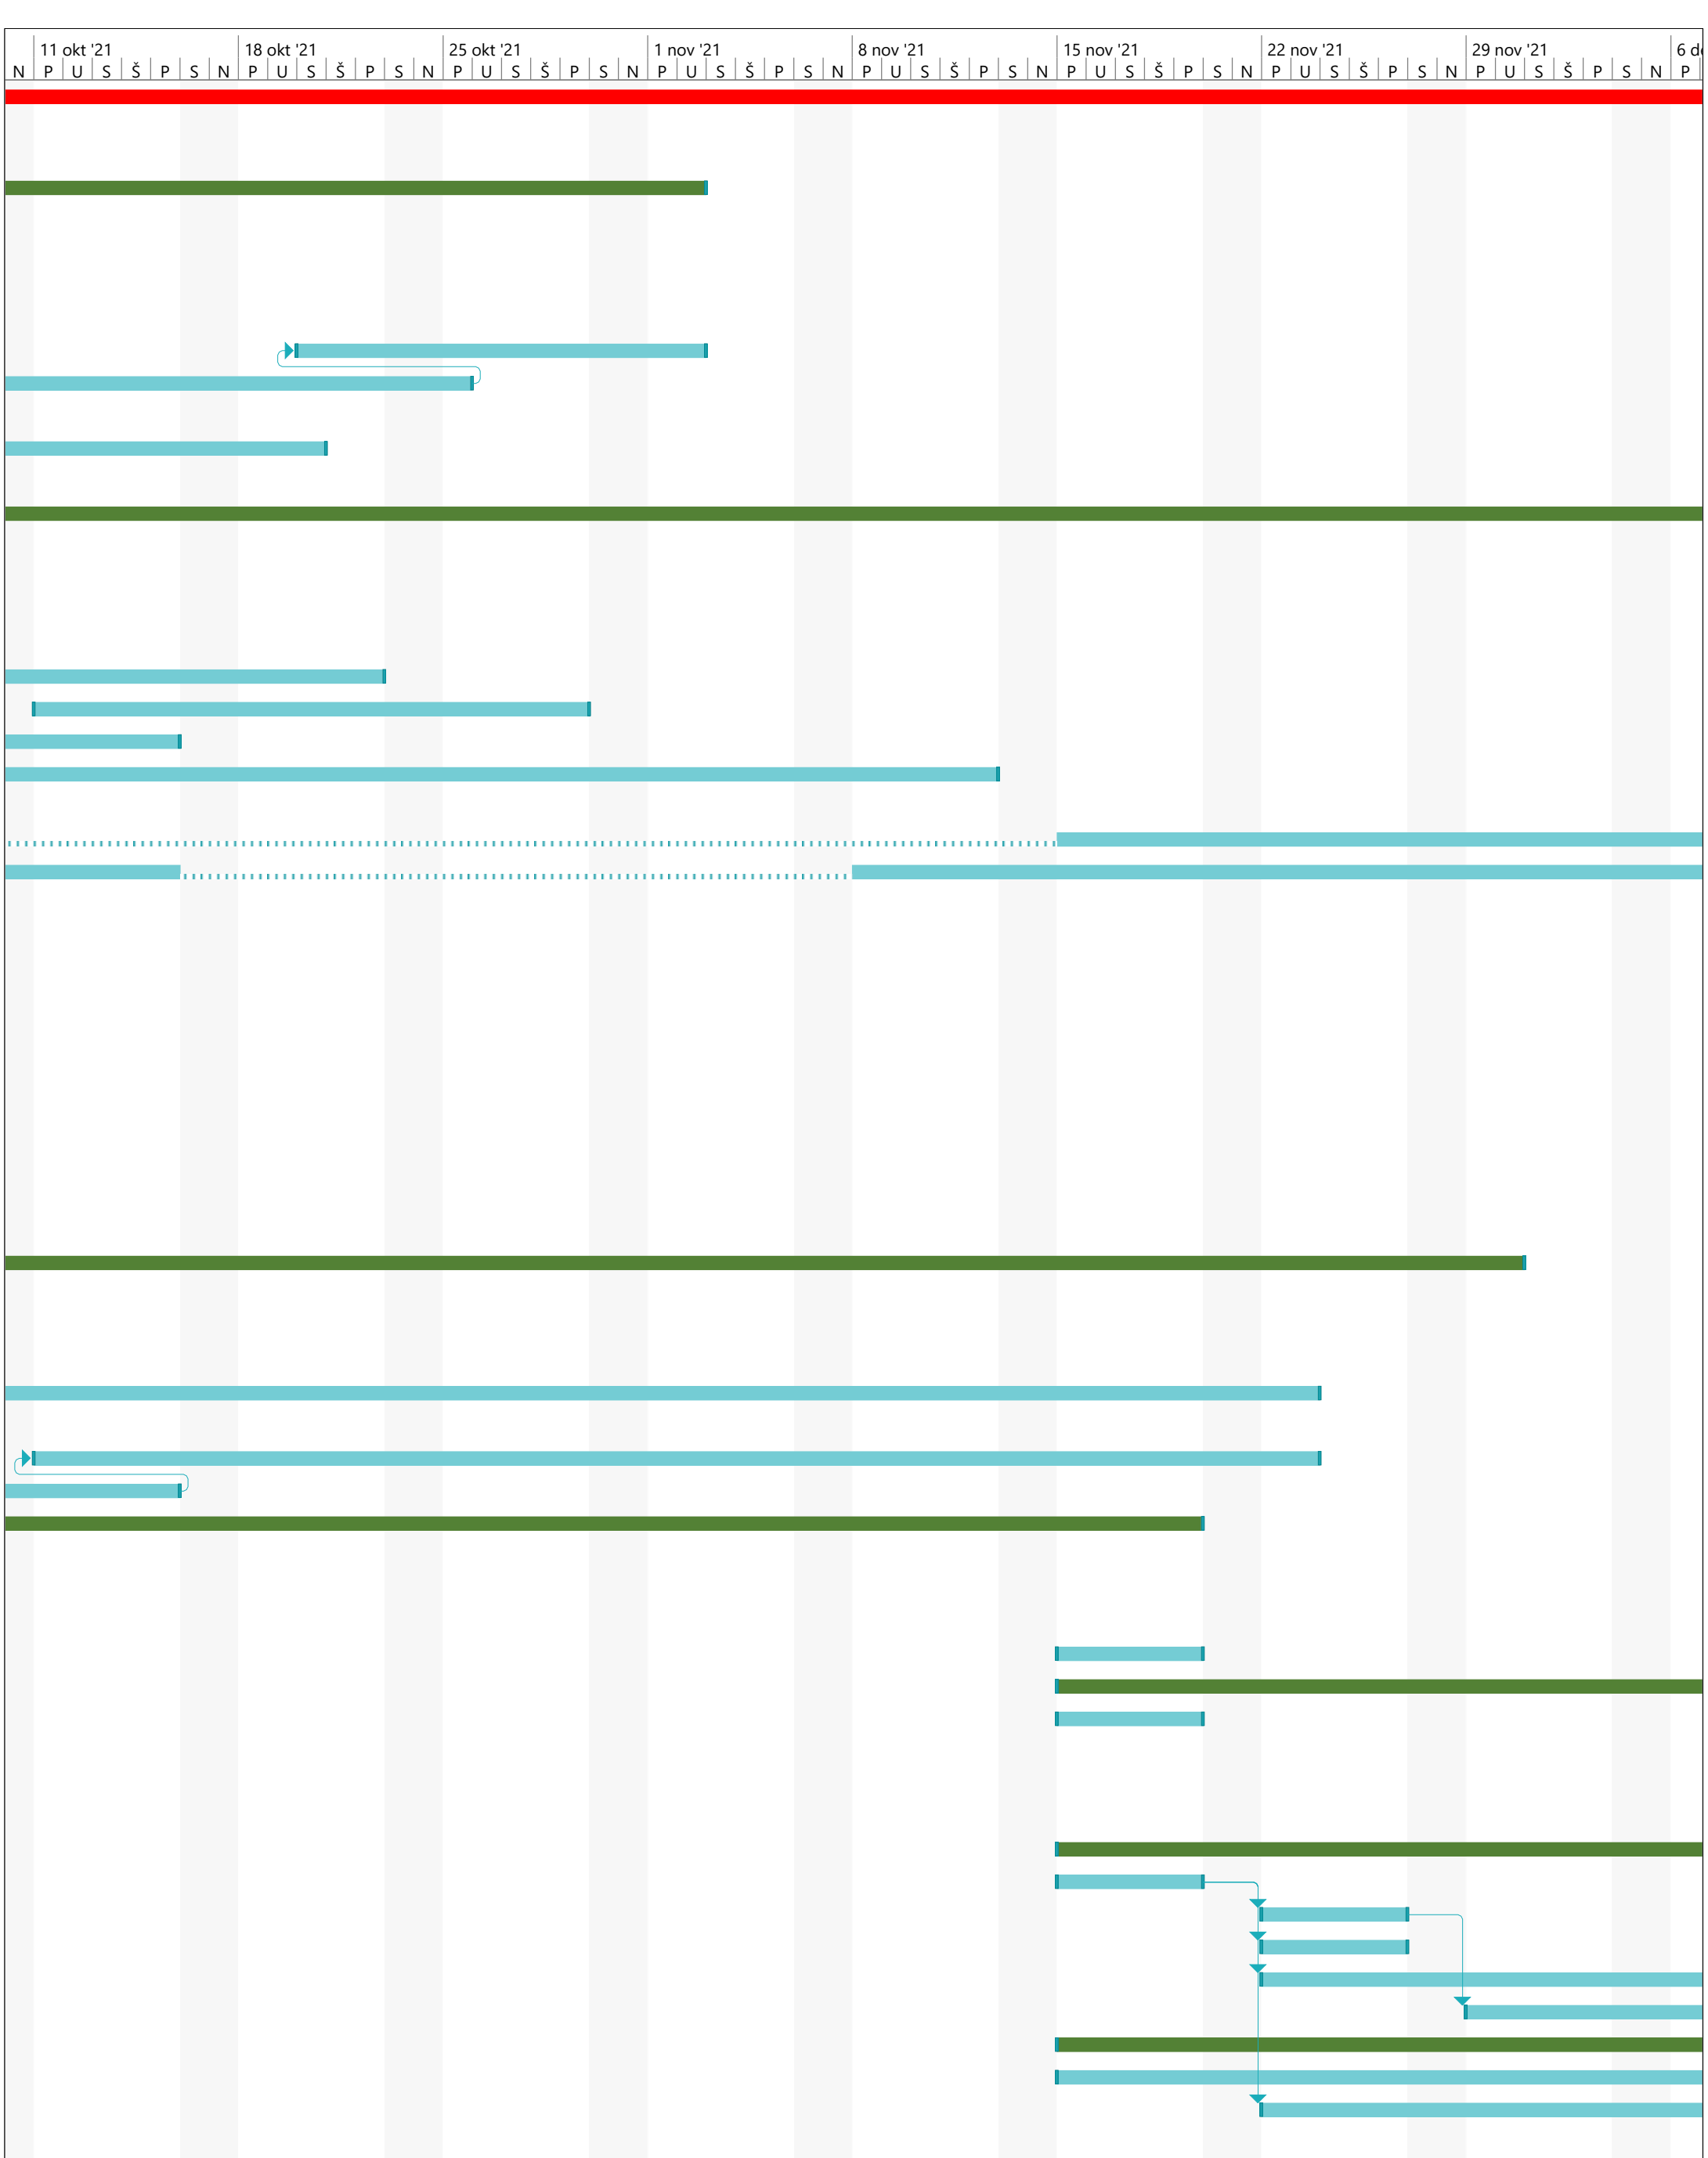


Projekt: Harmonogram stavby_ Dátum: Ut 15.12.20	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			










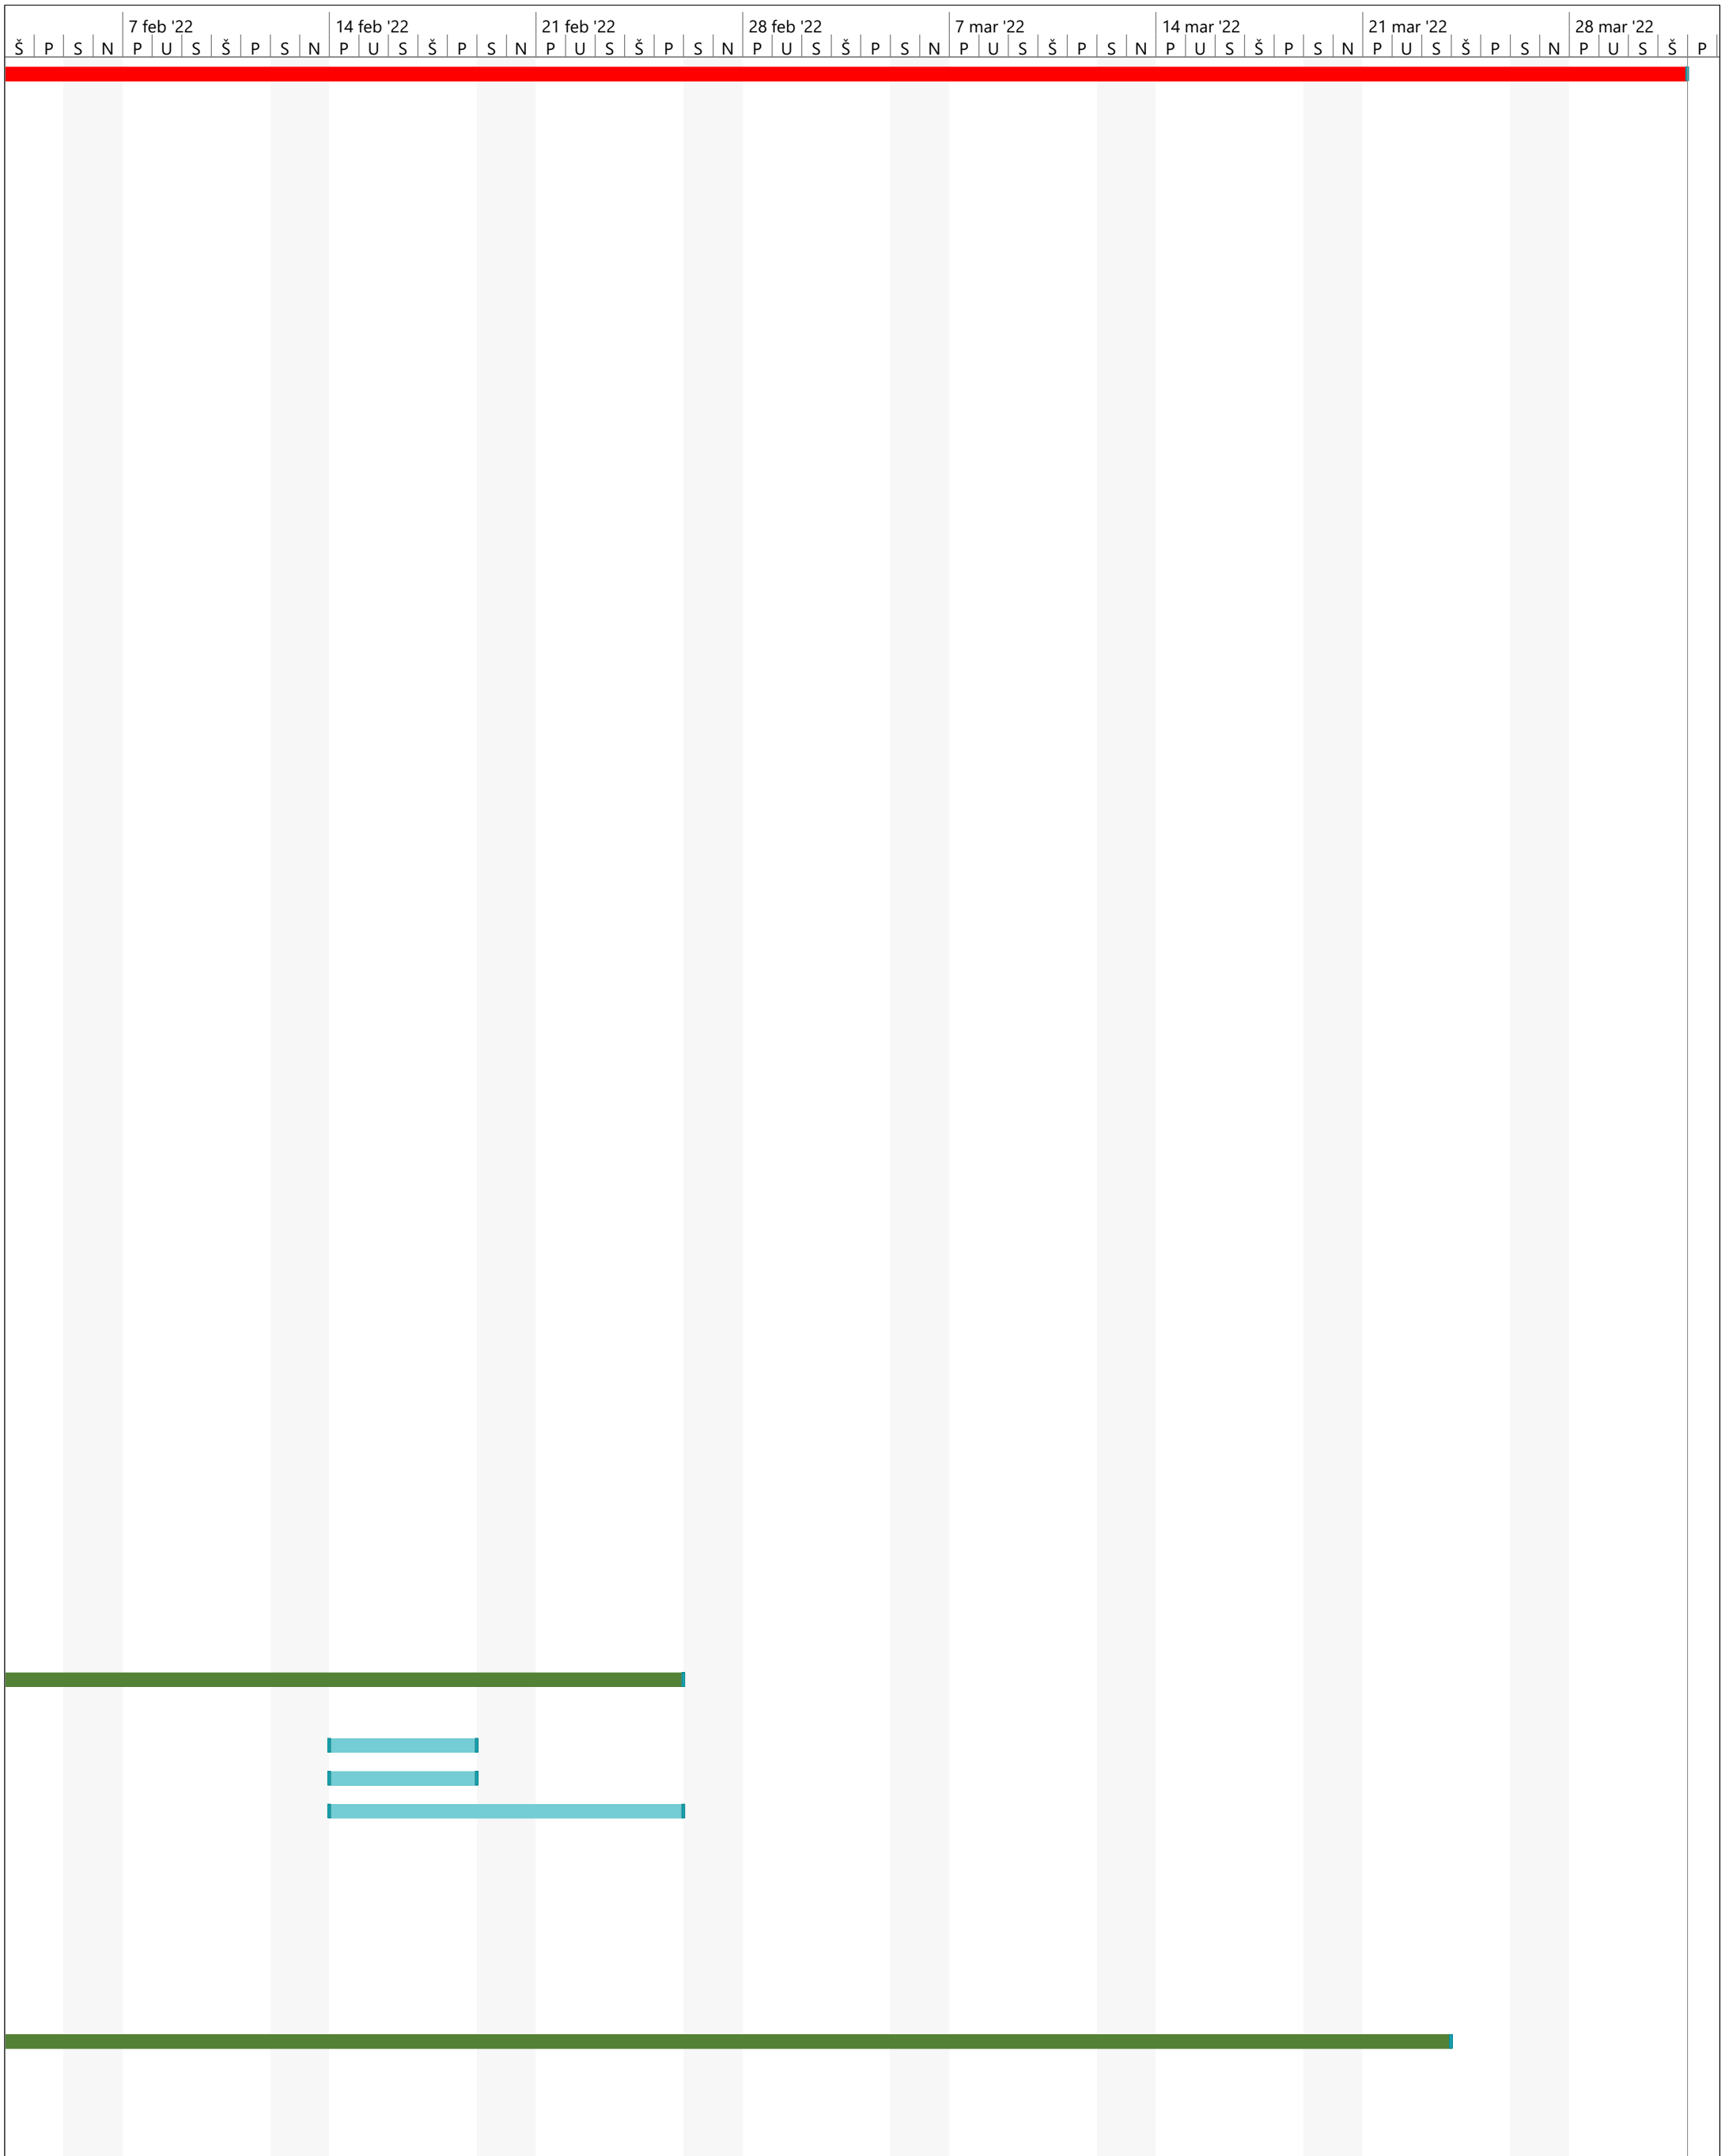

Projekt: Harmonogram stavby_ Dátum: Ut 15.12.20	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			

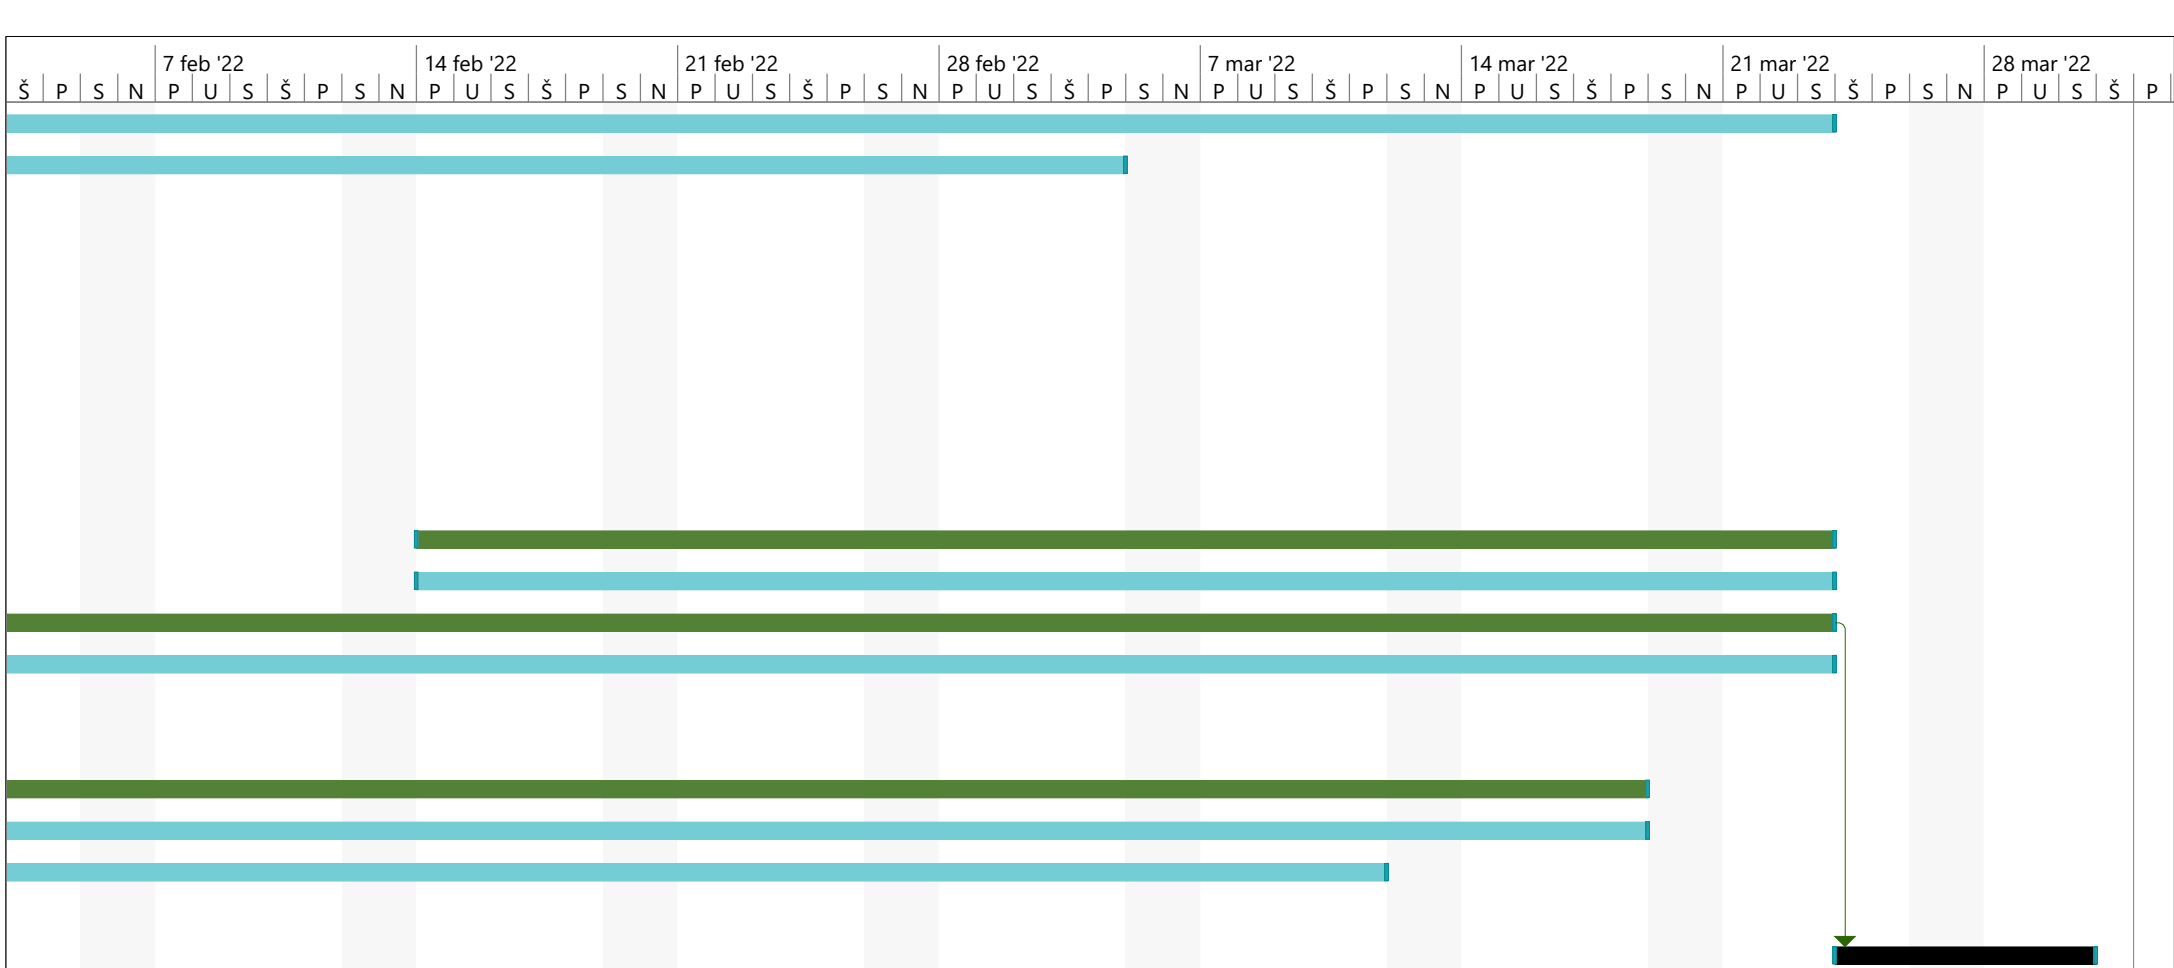

Projekt: Harmonogram stavby_ Dátum: Ut 15.12.20	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			
