Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Activity % Complete
Kompostáreň na biolog. rozložiteľný kom. odpad v meste Partizánske		456	
SO 101 - Prijímacia hala		431	
A1000	Zemné práce a zakladanie	45	0%
A1140	Výstavba železobet. stien	35	0%
A1150	Montáž zvislej oc. konštr. a oceľovej konštrukcie strechy	22	0%
A1160	Montáž sendvičových panelov a priepustnej membránovej plachty	15	0%
A1170	Realizácia elektroinštalácie, podkladných vrstiev podlahy, bleskozvodu a klampiarskych výrobkov	40	0%
A1180	Asfaltovanie podlahy a náter žb stien	4	0%
A1350	Prevzatie staveniska	0	0%
SO 102 - Kompostovacie boxy		114	
A1010	Zemné práce a zakladanie + prevzdušňovacie potrubie a hydroizolácie	45	0%
A1190	Výstavba železobetónových stien	35	0%
A1200	Montáž prestrešenia boxov	20	0%
A1210	Realizácia podlahy, epoxydový náter stien, klampiarske výrobky	14	0%
SO 103 - Biofilter		155	
A1020	Zemné práce a zakladanie vrátane hydroizolácie a bet. dosky	45	0%
A1230	Výstavba železobetónových stien	35	0%
A1360	Výstavba zdvojenej podlahy a technológie	45	0%
SO 104 - Kompostovacia plocha		241	
A1030	Zemné práce a podkladné vrstvy vrátane osadenia prevzdušňovacích rúr + výstavba múrika	140	0%
A1240	Asfaltovanie	7	0%
A1250	Montáž technológie	40	0%
SO 105 - Oplotenie		259	
A1040	Výstavba oplotenia	259	0%
SO 106 - Prevádzkovo-sociálny kontajner		35	
A1050	Realizácia plochy pod kontajner a osadenie kontajnera + elektroinštalácia	35	0%
SO 107 - Cestná váha		37	
A1060	Realizácia stavebnej prípravy pre váhu	30	0%
A1260	Osadenie a zapojenie cestnej váhy	7	0%
SO 201 - Spevnené plochy		216	
A1070	Realizácia štrkovej plochy	15	0%
A1270	Realizácia plôch pre drevenný odpad (350 m2) a hotový kompost (315 m2) bez asf.	70	0%
A1280	Real. príjazd. pl. (121+35 m2), manip. plochy (300 m2), plochy pre zel. odpad (225 m2) a hot. kompost (439 m2	100	0%
A1290	Asfaltovanie plôch	10	0%
SO 301 - Areálový rozvod a požiarna nádrž		75	
A1080	Realizácia vodomernej šachty a vodovodnej prípojky	30	0%
A1300	Výstavba požiarnej nádrže	45	0%
SO 401 - Kanalizácia		397	
A1090	Realizácia kanalizačnej prípojky	30	0%
A1310	Výstavba odvodnenia spevnených plôch + osadenie ORL	240	0%
A1320	Výstavba technologickej kanalizácie a zbernej nádrže 170 m3 k objektu SO 104 a prečerp. šácht	60	0%
A1330	Výstavba kanalizácie k objektu SO 102 a 103, filtračnej nádrže 20 m3 a revízno filtračn. šachty	70	0%
SO 601 - Areálový rozvod NN		60	
A1100	Realizácia rozvodov NN	60	0%
SO 602 - Areálové vonkajšie osvetlenie		224	
A1110	Realizácia podzemných vedení a základov pre stožiare	180	0%
A1340	Osadenie stožiarov a svietidiel	44	0%
PS 01 - Prevádzkové rozvody silnoprúdu		80	
A1120	Montáž silnoprúdových rozvodov	80	0%
PS 02 - Meranie a regulácia		35	
A1130	Montáž MaR	35	0%

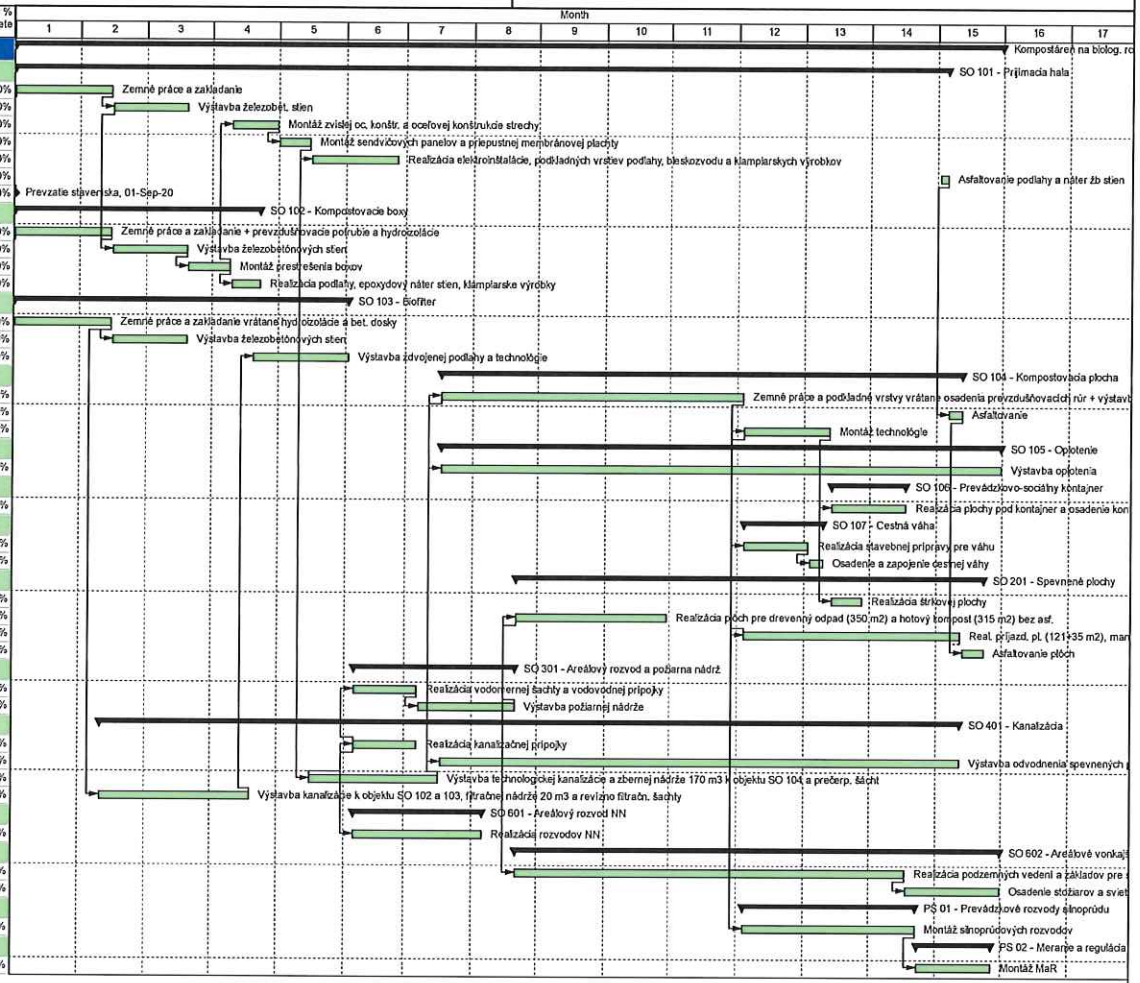

ViOn, a. s.
Továrenská 64
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 526 185

Actual Level of Effort
Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation
