HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	**1**	**Harmonogram - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica**	**1510 dni**	**13.5.2025**	**30.6.2029**
2	**1.1**	**Zmluvné termíny a nevyhnutná súčinnosť Objednávateľa**	**1510 dni**	**13.5.2025**	**30.6.2029**
3	1.1.1	Vydanie Stavebného povolenia - začiatok zapracovávania/plnenia podmienok zo Stavebného povolenia	0 dni	13.8.2025	13.8.2025
4	1.1.2	Vydanie ZS EIA - začiatok zapracovávania/plnenia podmienok zo ZS EIA	0 dni	13.5.2025	13.5.2025
5	1.1.3	Zbavenie práv tretích osôb k pozemkom v celom rozsahu Staveniska/Diela Objednávateľom v zmysle Zmluvy	0 dni	29.12.2025	29.12.2025
6	1.1.4	Odovzdanie Zhotoviteľovi všetkej súvisiacej dokumentácie k Stavenisku/Stavebným objektom/Dokumentácie Objednávateľa v súlade so Zmluvou	0 dni	29.12.2025	29.12.2025
7	1.1.5	Odovzdanie vytyčovacej siete stavby a ostatnej Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom na nosiči Objednávateľom Zhotoviteľovi a jeho fyzické prekontrolovanie	0 dni	29.12.2025	29.12.2025
8	1.1.6	Odovzdanie všetkej dokumentácie Majetkoprávneho vysporiadania k pozemkom k SP/Z-SP (v celom rozsahu Staveniska/Diela) Objednávateľom Zhotoviteľovi.	0 dni	29.12.2025	29.12.2025
9	1.1.7	Zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania vyplývajúceho zo zapracovania podmienok Stavebného povolenia a ZS EIA k pozemkom pred začiatkom realizácie dotknutých stavebných objektov v zmysle tohto Harmonogramu.	0 dni	29.12.2025	29.12.2025
10	1.1.8	Zabezpečenie výkonu Stavebnotechnického dozora Objednávateľom (od Dátumu začatia prác počas celej Lehoty výstavby Diela)	1280 dni	29.12.2025	30.6.2029
11	1.1.9	Poskytnutie Plnej moci na výkon Inžinierskej činnosti, Majetko - právneho vysporiadania a pre konania podľa zákona o odpadoch Objednávateľom Zhotoviteľovi	0 dni	29.12.2025	29.12.2025
12	**1.2**	**Ďalšie vybrané predpoklady plnenia Míľníka č.1, Míľníka č.2, Míľníka č.3 a Lehoty výstavby**	**707 dni**	**24.7.2027**	**30.6.2029**
13	1.2.1	Dosiahnutie Míľnika č.1 je podmienené kolaudáciou stavebných objektov v termínoch podľa Harmonogramu (601-02, 618-00, 652-00, 656-00, 663-00, 672-00)	0 dni	24.7.2027	24.7.2027
14	1.2.2	a následným začatím prác na stavebných objektoch (111-00, 209-10, 260-00, 290-07), ktoré sú týmito prekládkami podmienené.	0 dni	24.7.2027	24.7.2027
15	1.2.3	Dosiahnutie Míľnika č.2 je podmienené kolaudáciou stavebných objektov v termínoch podľa Harmonogramu (601-03, 620-00, 634-00, 639-00, 653-00, 664-00, 665-00, 673-00, 712-00)	0 dni	19.2.2028	19.2.2028
16	1.2.4	a následným začatím prác na stavebných objektoch (112-00, 210-10, 211-00, 261-00), ktoré sú týmito prekládkami podmienené.	0 dni	19.2.2028	19.2.2028
17	1.2.5	Dosiahnutie Míľnika č.3 je podmienené kolaudáciou stavebných objektov v termínoch podľa Harmonogramu (636-00, 637-00, 654-00, 655-00, 675-00, 676-00, 682-00)	0 dni	1.2.2029	1.2.2029
18	1.2.6	a následným začatím prác na stavebných objektoch (213-00, 801-00), ktoré sú týmito prekládkami podmienené.	0 dni	1.2.2029	1.2.2029
19	1.2.7	Ukončenie Diela v Lehote výstavby je podmienené dodržaním začiatku a trvania realizácie stavebných objektov na Kritickej ceste podľa Harmonogramu.	0 dni	30.6.2029	30.6.2029
20	1.2.8	Okrem väzieb uvedených pri Míľníku č,1, Míľníku č.2 a Míľníku č.3 sú to tieto ďalšie prekládky 311-65, 311-71, 507-00, 526-00, 527-00, 527-01, 532-00, 536-00, 621-00, 622-00,	0 dni	30.6.2029	30.6.2029
21	1.2.9	623-00, 623-01, 624-00, 627-00, 635-00, 638-00, 640-00, 649-00, 713-00, 714-00, 716-00, 717-00, ktorých ukončenie podmieňuje realizáciu nadväzujúcich stavebných prác na stavebných objektoch 101-00, 102-00, 113-00, 124-00, 214-00, 215-00	0 dni	30.6.2029	30.6.2029
22	**1.3**	**Kolaudácia**	**0 dni**	**29.12.2025**	**29.12.2025**
23	1.3.1	Najskorší možný termín kolaudácie pre jednotlivé stavebné objektym alebo ich časti, je 30 dní od Preberacieho konania.	0 dni	29.12.2025	29.12.2025
24	**2**	**Vecný harmonogram - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica**	**1280 dni**	**29.12.2025**	**30.6.2029**
25	2.1	Prevzatie staveniska	0 dni	29.12.2025	29.12.2025
26	2.2	Mobilizácia, prípravné práce a prieskumy	152 dni	29.12.2025	31.5.2026
27	2.3	Odovzdanie diela	0 dni	30.6.2029	30.6.2029
28	2.4	Všeobecné položky	1280 dni	29.12.2025	30.6.2029
29	**2.5**	**Demolácie**	**771 dni**	**30.3.2026**	**16.6.2028**
30	**2.5.1**	**020-00 Demolácia mosta v km 23,4**	**66 dni**	**12.4.2028**	**16.6.2028**
31	2.5.1.1	020-00 Demolácia mosta v km 23,4	45 dni	12.4.2028	26.5.2028
35	2.5.1.5	020-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	2.6.2028	2.6.2028
36	2.5.1.6	020-00 Preberacie konanie	0 dni	16.6.2028	16.6.2028
38	**2.5.2**	**021-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou**	**51 dni**	**30.3.2026**	**19.5.2026**
39	2.5.2.1	021-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou	30 dni	30.3.2026	28.4.2026
43	2.5.2.5	021-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.5.2026	5.5.2026
44	2.5.2.6	021-00 Preberacie konanie	0 dni	19.5.2026	19.5.2026
46	**2.5.3**	**022-00 Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3**	**51 dni**	**8.3.2028**	**27.4.2028**
47	2.5.3.1	022-00 Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3	30 dni	8.3.2028	6.4.2028
51	2.5.3.5	022-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.4.2028	13.4.2028
52	2.5.3.6	022-00 Preberacie konanie	0 dni	27.4.2028	27.4.2028
54	**2.5.4**	**023-00 Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno nad Kysucou**	**28 dni**	**21.9.2026**	**18.10.2026**
55	2.5.4.1	023-00 Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno nad Kysucou	7 dni	21.9.2026	27.9.2026
59	2.5.4.5	023-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	4.10.2026	4.10.2026
60	2.5.4.6	023-00 Preberacie konanie	0 dni	18.10.2026	18.10.2026
62	**2.5.5**	**025-00 Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou**	**35 dni**	**13.12.2027**	**4.2.2028**
63	2.5.5.1	025-00 Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou	14 dni	13.12.2027	14.1.2028
67	2.5.5.5	025-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	21.1.2028	21.1.2028
68	2.5.5.6	025-00 Preberacie konanie	0 dni	4.2.2028	4.2.2028
70	**2.5.6**	**026-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou**	**51 dni**	**9.12.2027**	**16.2.2028**
71	2.5.6.1	026-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou	30 dni	9.12.2027	26.1.2028
75	2.5.6.5	026-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	2.2.2028	2.2.2028
76	2.5.6.6	026-00 Preberacie konanie	0 dni	16.2.2028	16.2.2028
78	**2.5.7**	**027-00 Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou**	**35 dni**	**15.5.2026**	**18.6.2026**
79	2.5.7.1	027-00 Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou	14 dni	15.5.2026	28.5.2026
83	2.5.7.5	027-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	4.6.2026	4.6.2026
84	2.5.7.6	027-00 Preberacie konanie	0 dni	18.6.2026	18.6.2026
86	**2.5.8**	**028-00 Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou**	**51 dni**	**30.3.2026**	**19.5.2026**
87	2.5.8.1	028-00 Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou	30 dni	30.3.2026	28.4.2026
91	2.5.8.5	028-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.5.2026	5.5.2026
92	2.5.8.6	028-00 Preberacie konanie	0 dni	19.5.2026	19.5.2026
94	**2.5.9**	**029-01 Demolácia mosta v km 31,690**	**51 dni**	**18.1.2028**	**8.3.2028**
95	2.5.9.1	029-01 Demolácia mosta v km 31,690	30 dni	18.1.2028	16.2.2028
99	2.5.9.5	029-01 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.2.2028	23.2.2028
100	2.5.9.6	029-01 Preberacie konanie	0 dni	8.3.2028	8.3.2028
102	**2.6**	**Vegetačné úpravy**	**657 dni**	**21.7.2027**	**7.5.2029**
103	**2.6.1**	**031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D3**	**621 dni**	**21.7.2027**	**7.5.2029**
104	2.6.1.1	031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D3	600 dni	21.7.2027	16.4.2029

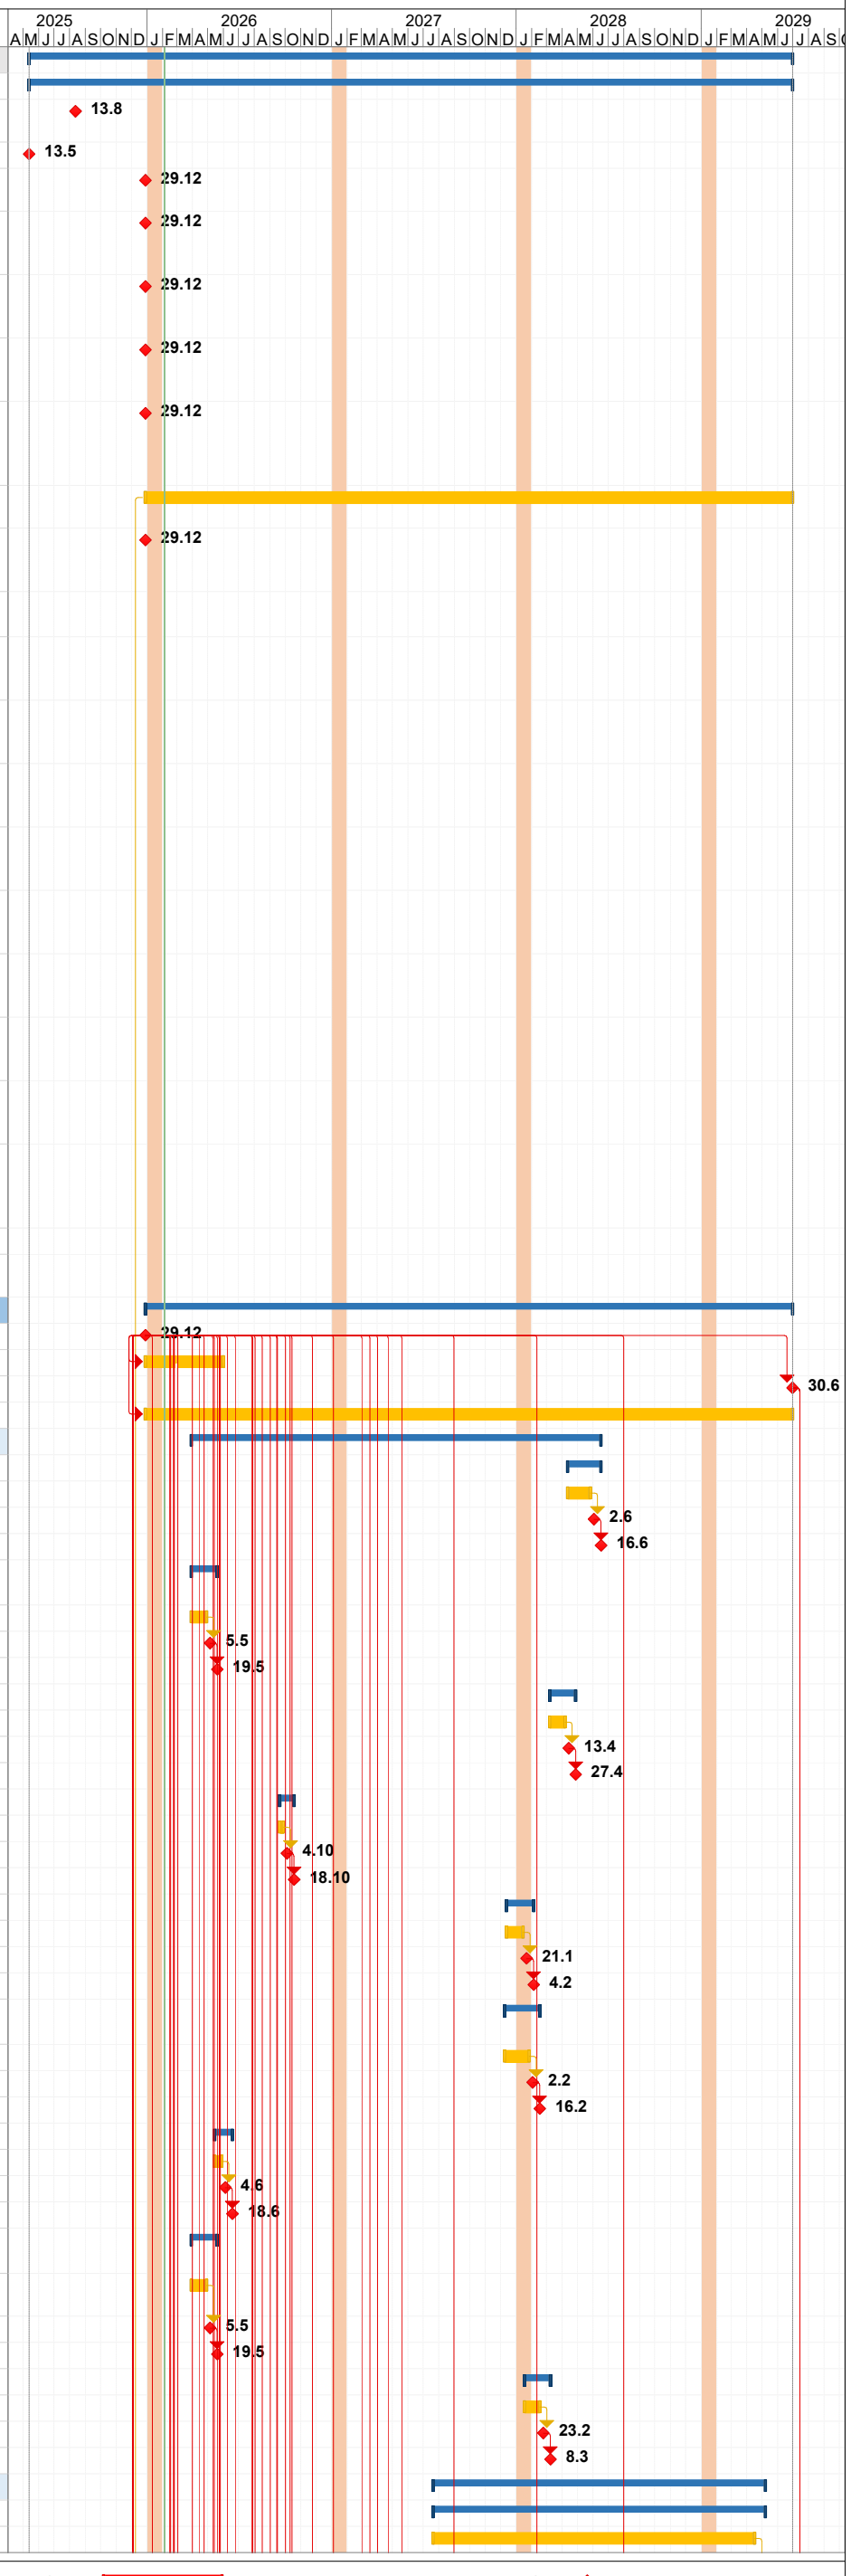

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
108	2.6.1.5	031-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
109	2.6.1.6	031-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
111	**2.6.2**	**032-00 Vegetačné úpravy cesty I/11**	**621 dni**	**21.7.2027**	**7.5.2029**
112	2.6.2.1	032-00 Vegetačné úpravy cesty I/11	600 dni	21.7.2027	16.4.2029
116	2.6.2.5	032-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
117	2.6.2.6	032-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
119	**2.7**	**Spätná rekultivácia**	**188 dni**	**1.11.2028**	**7.5.2029**
120	**2.7.1**	**052-01 Rekultivácia dočasných záberov PPF**	**171 dni**	**1.11.2028**	**7.5.2029**
121	2.7.1.1	052-01 Rekultivácia dočasných záberov PPF	150 dni	1.11.2028	16.4.2029
125	2.7.1.5	052-01 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
126	2.7.1.6	052-01 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
128	**2.7.2**	**052-02 Rekultivácia dočasných záberov LPF**	**171 dni**	**1.11.2028**	**7.5.2029**
129	2.7.2.1	052-02 Rekultivácia dočasných záberov LPF	150 dni	1.11.2028	16.4.2029
133	2.7.2.5	052-01 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
134	2.7.2.6	052-01 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
136	**2.8**	**Diaľnica, mimoúrovňové križovatky**	**1216 dni**	**8.1.2026**	**7.5.2029**
137	**2.8.1**	**101-00 Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925**	**1160 dni**	**8.1.2026**	**7.5.2029**
138	**2.8.1.1**	**101-00 Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925**	**1139 dni**	**8.1.2026**	**16.4.2029**
139	**2.8.1.1.1**	**101-00 Úsek km 22,300 - 27,500**	**1139 dni**	**8.1.2026**	**16.4.2029**
140	2.8.1.1.1.1	101-00 Zemné práce	900 dni	8.1.2026	3.8.2028
141	2.8.1.1.1.2	101-00 Vozovka	500 dni	29.9.2027	17.3.2029
142	2.8.1.1.1.3	101-00 Bezpečnostné zariadenia	180 dni	2.10.2028	16.4.2029
143	2.8.1.1.1.4	101-00 Dopravné značenie	150 dni	1.11.2028	16.4.2029
144	**2.8.1.1.2**	**101-00 Úsek km 27,500 - 31,925**	**1079 dni**	**9.3.2026**	**16.4.2029**
145	2.8.1.1.2.1	101-00 Zemné práce	900 dni	9.3.2026	2.10.2028
146	2.8.1.1.2.2	101-00 Vozovka	450 dni	18.11.2027	17.3.2029
147	2.8.1.1.2.3	101-00 Bezpečnostné zariadenia	210 dni	2.9.2028	16.4.2029
148	2.8.1.1.2.4	101-00 Dopravné značenie	180 dni	2.10.2028	16.4.2029
152	2.8.1.5	101-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
153	2.8.1.6	101-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
155	**2.8.2**	**102-00 Križovatka Krásno nad Kysucou**	**812 dni**	**11.1.2027**	**7.5.2029**
156	**2.8.2.1**	**102-00 Križovatka Krásno nad Kysucou**	**791 dni**	**11.1.2027**	**16.4.2029**
157	**2.8.2.1.1**	**102-00 Vetva A km 0,000 - 0,405**	**791 dni**	**11.1.2027**	**16.4.2029**
158	2.8.2.1.1.1	102-00 Zemné práce	660 dni	11.1.2027	19.11.2028
159	2.8.2.1.1.2	102-00 Vozovka	200 dni	13.8.2028	17.3.2029
160	2.8.2.1.1.3	102-00 Bezpečnostné zariadenia	120 dni	1.12.2028	16.4.2029
161	2.8.2.1.1.4	102-00 Dopravné značenie	60 dni	16.2.2029	16.4.2029
162	**2.8.2.1.2**	**102-00 Vetva B km 0,000 - 0,342915**	**360 dni**	**5.4.2028**	**16.4.2029**
163	2.8.2.1.2.1	102-00 Zemné práce	190 dni	5.4.2028	11.10.2028
164	2.8.2.1.2.2	102-00 Vozovka	200 dni	13.8.2028	17.3.2029
165	2.8.2.1.2.3	102-00 Bezpečnostné zariadenia	120 dni	1.12.2028	16.4.2029
166	2.8.2.1.2.4	102-00 Dopravné značenie	60 dni	16.2.2029	16.4.2029
167	**2.8.2.1.3**	**102-00 Vetva C km 0,000 - 0,298449**	**360 dni**	**5.4.2028**	**16.4.2029**
168	2.8.2.1.3.1	102-00 Zemné práce	260 dni	5.4.2028	20.12.2028
169	2.8.2.1.3.2	102-00 Vozovka	120 dni	1.11.2028	17.3.2029
170	2.8.2.1.3.3	102-00 Bezpečnostné zariadenia	90 dni	17.1.2029	16.4.2029
171	2.8.2.1.3.4	102-00 Dopravné značenie	45 dni	3.3.2029	16.4.2029
172	**2.8.2.1.4**	**102-00 Vetva D km 0,000 - 0,263311**	**791 dni**	**11.1.2027**	**16.4.2029**
173	2.8.2.1.4.1	102-00 Zemné práce	690 dni	11.1.2027	19.12.2028
174	2.8.2.1.4.2	102-00 Vozovka	200 dni	13.8.2028	17.3.2029
175	2.8.2.1.4.3	102-00 Bezpečnostné zariadenia	120 dni	1.12.2028	16.4.2029
176	2.8.2.1.4.4	102-00 Dopravné značenie	50 dni	26.2.2029	16.4.2029
177	**2.8.2.1.5**	**102-00 Vetva E km 0,000 - 0,246530**	**791 dni**	**11.1.2027**	**16.4.2029**
178	2.8.2.1.5.1	102-00 Zemné práce	700 dni	11.1.2027	15.1.2029
179	2.8.2.1.5.2	102-00 Vozovka	250 dni	24.6.2028	17.3.2029
180	2.8.2.1.5.3	102-00 Bezpečnostné zariadenia	120 dni	1.12.2028	16.4.2029
181	2.8.2.1.5.4	102-00 Dopravné značenie	45 dni	3.3.2029	16.4.2029
185	2.8.2.5	102-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
186	2.8.2.6	102-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
188	**2.9**	**Cesty I., II., III. triedy, miestne komunikácie, účelové komunikácie**	**1245 dni**	**8.1.2026**	**5.6.2029**
189	**2.9.1**	**110-00 Preložka cesty I/11 v km 22,833 - 23,638 D3**	**962 dni**	**8.1.2026**	**4.10.2028**
190	**2.9.1.1**	**110-00 Preložka cesty I/11 v km 22,833 - 23,638 D3**	**941 dni**	**8.1.2026**	**13.9.2028**
191	**2.9.1.1.1**	**110-00 Etapa 1 (realizácia mimo I/11)**	**761 dni**	**8.1.2026**	**17.3.2028**
192	2.9.1.1.1.1	110-00 Zemné práce	731 dni	8.1.2026	16.2.2028
193	2.9.1.1.1.2	110-00 Vozovka	50 dni	18.1.2028	7.3.2028
194	2.9.1.1.1.3	110-00 Bezpečnostné zariadenia	40 dni	7.2.2028	17.3.2028
195	2.9.1.1.1.4	110-00 Dopravné značenie	30 dni	17.2.2028	17.3.2028
196	**2.9.1.1.2**	**110-00 Etapa 2 (realizácia napojení na I/11)**	**180 dni**	**18.3.2028**	**13.9.2028**
197	2.9.1.1.2.1	110-00 Zemné práce	140 dni	18.3.2028	4.8.2028
198	2.9.1.1.2.2	110-00 Vozovka	90 dni	6.6.2028	3.9.2028
199	2.9.1.1.2.3	110-00 Bezpečnostné zariadenia	80 dni	26.6.2028	13.9.2028
200	2.9.1.1.2.4	110-00 Dopravné značenie	30 dni	15.8.2028	13.9.2028
204	2.9.1.5	110-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	20.9.2028	20.9.2028
205	2.9.1.6	110-00 Preberacie konanie	0 dni	4.10.2028	4.10.2028
207	**2.9.2**	**111-00 Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D3**	**511 dni**	**9.2.2026**	**24.7.2027**
208	**2.9.2.1**	**111-00 Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D3**	**490 dni**	**9.2.2026**	**3.7.2027**
209	2.9.2.1.1	111-00 Výruby	60 dni	9.2.2026	9.4.2026
210	**2.9.2.1.2**	**111-00 Etapa 1 (realizácia mimo I/11)**	**342 dni**	**23.2.2026**	**19.2.2027**
211	2.9.2.1.2.1	111-00 Zemné práce	256 dni	23.2.2026	5.11.2026
212	2.9.2.1.2.2	111-00 Vozovka	90 dni	17.10.2026	3.2.2027
213	2.9.2.1.2.3	111-00 Bezpečnostné zariadenia	120 dni	3.10.2026	19.2.2027
214	2.9.2.1.2.4	111-00 Dopravné značenie	50 dni	12.12.2026	19.2.2027
215	**2.9.2.1.3**	**111-00 Etapa 2 (realizácia napojení na I/11)**	**250 dni**	**7.10.2026**	**3.7.2027**
216	2.9.2.1.3.1	111-00 Zemné práce	230 dni	7.10.2026	13.6.2027
217	2.9.2.1.3.2	111-00 Priepust v km 0,825	40 dni	7.10.2026	4.2.2027
218	2.9.2.1.3.3	111-00 Vozovka	75 dni	31.3.2027	13.6.2027
219	2.9.2.1.3.4	111-00 Bezpečnostné zariadenia	80 dni	15.4.2027	3.7.2027
220	2.9.2.1.3.5	111-00 Dopravné značenie	50 dni	15.5.2027	3.7.2027
224	2.9.2.5	111-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.7.2027	10.7.2027
225	2.9.2.6	111-00 Preberacie konanie	0 dni	24.7.2027	24.7.2027
227	**2.9.3**	**111-00 Míľnik č.1 Úspešné preberacie konanie preložky cesty I/11 (SO 111-00) v zmysle čl. 10.2**	**0 dni**	**24.7.2027**	**24.7.2027**
228	**2.9.4**	**112-00 Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D3**	**692 dni**	**19.2.2026**	**19.2.2028**
229	**2.9.4.1**	**112-00 Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D3**	**671 dni**	**19.2.2026**	**29.1.2028**
230	2.9.4.1.1	112-00 Výruby	60 dni	19.2.2026	19.4.2026

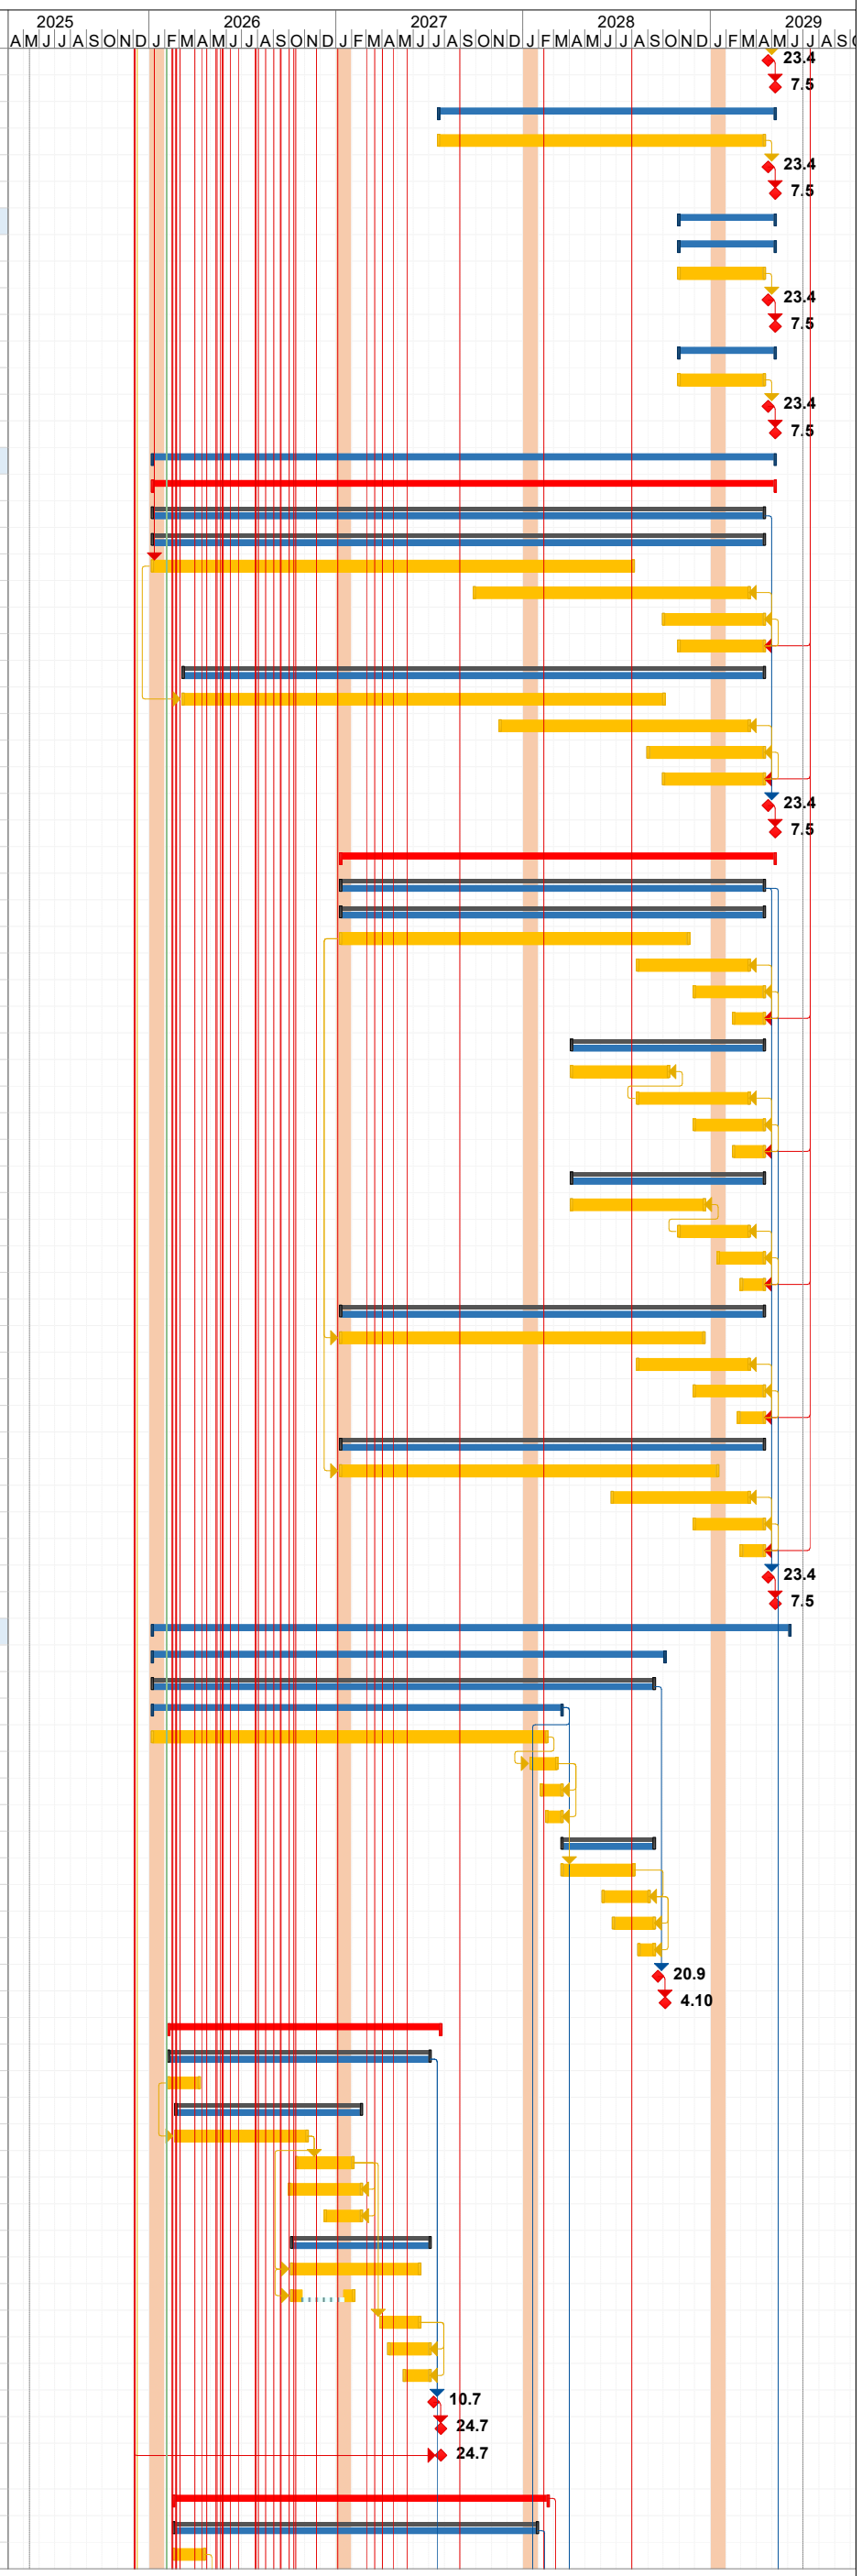

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
231	**2.9.4.1.2**	**112-00 Úsek km 0,000 - 0,200**	**174 dni**	**21.7.2027**	**29.1.2028**
232	2.9.4.1.2.1	112-00 Zemné práce	150 dni	21.7.2027	17.12.2027
233	2.9.4.1.2.2	112-00 Vozovka	79 dni	19.10.2027	24.1.2028
234	2.9.4.1.2.3	112-00 Bezpečnostné zariadenia	60 dni	12.11.2027	29.1.2028
235	2.9.4.1.2.4	112-00 Dopravné značenie	30 dni	12.12.2027	29.1.2028
236	**2.9.4.1.3**	**112-00 Úsek km 0,200 - 1,300**	**543 dni**	**20.4.2026**	**3.11.2027**
237	2.9.4.1.3.1	112-00 Zemné práce	500 dni	20.4.2026	21.9.2027
238	2.9.4.1.3.2	112-00 Vozovka	150 dni	22.5.2027	18.10.2027
239	2.9.4.1.3.3	112-00 Bezpečnostné zariadenia	120 dni	7.7.2027	3.11.2027
240	2.9.4.1.3.4	112-00 Dopravné značenie	48 dni	17.9.2027	3.11.2027
241	**2.9.4.1.4**	**112-00 Úsek km 1,300 - 2,100**	**506 dni**	**19.7.2026**	**14.1.2028**
242	2.9.4.1.4.1	112-00 Zemné práce	349 dni	19.7.2026	11.9.2027
243	2.9.4.1.4.2	112-00 Vozovka	110 dni	16.11.2026	10.10.2027
244	2.9.4.1.4.3	112-00 Bezpečnostné zariadenia	100 dni	11.12.2026	31.10.2027
245	2.9.4.1.4.4	112-00 Dopravné značenie	80 dni	20.1.2027	14.1.2028
249	2.9.4.5	112-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.2.2028	5.2.2028
250	2.9.4.6	112-00 Preberacie konanie	0 dni	19.2.2028	19.2.2028
252	**2.9.5**	**112-00 Míľnik č.2 Úspešné preberacie konanie preložky cesty I/11 (SO 112-00) a mostu SO 211-00 v zmysle čl. 10.2**	**0 dni**	**19.2.2028**	**19.2.2028**
253	**2.9.6**	**113-00 Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3**	**789 dni**	**8.9.2026**	**13.12.2028**
254	**2.9.6.1**	**113-00 Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3**	**768 dni**	**8.9.2026**	**22.11.2028**
255	**2.9.6.1.1**	**113-00 časť Smer Žilina**	**226 dni**	**11.4.2028**	**22.11.2028**
256	2.9.6.1.1.1	113-00 Zemné práce	175 dni	11.4.2028	2.10.2028
257	2.9.6.1.1.2	113-00 Vozovka	120 dni	10.7.2028	6.11.2028
258	2.9.6.1.1.3	113-00 Bezpečnostné zariadenia	80 dni	4.9.2028	22.11.2028
259	2.9.6.1.1.4	113-00 Dopravné značenie	70 dni	14.9.2028	22.11.2028
260	**2.9.6.1.2**	**113-00 časť Okružná križovatka**	**571 dni**	**13.4.2027**	**22.11.2028**
261	2.9.6.1.2.1	113-00 Zemné práce	515 dni	13.4.2027	27.9.2028
262	2.9.6.1.2.2	113-00 Vozovka	500 dni	7.6.2027	6.11.2028
263	2.9.6.1.2.3	113-00 Bezpečnostné zariadenia	80 dni	4.9.2028	22.11.2028
264	2.9.6.1.2.4	113-00 Dopravné značenie	48 dni	6.10.2028	22.11.2028
265	**2.9.6.1.3**	**113-00 časť Smer Oščadnica**	**561 dni**	**8.9.2026**	**29.4.2028**
266	2.9.6.1.3.1	113-00 Zemné práce	510 dni	8.9.2026	9.3.2028
267	2.9.6.1.3.2	113-00 Vozovka	500 dni	23.10.2026	13.4.2028
268	2.9.6.1.3.3	113-00 Bezpečnostné zariadenia	150 dni	13.11.2027	29.4.2028
269	2.9.6.1.3.4	113-00 Dopravné značenie	70 dni	20.2.2028	29.4.2028
273	2.9.6.5	113-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	29.11.2028	29.11.2028
274	2.9.6.6	113-00 Preberacie konanie	0 dni	13.12.2028	13.12.2028
276	**2.9.7**	**114-00 Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci**	**592 dni**	**21.2.2026**	**25.10.2027**
277	**2.9.7.1**	**114-00 Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci**	**571 dni**	**21.2.2026**	**4.10.2027**
278	2.9.7.1.1	114-00 Výruby	60 dni	21.2.2026	21.4.2026
279	2.9.7.1.2	114-00 Dočasná obchádzka	45 dni	12.5.2026	25.6.2026
280	2.9.7.1.3	114-00 Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci	446 dni	26.6.2026	4.10.2027
284	2.9.7.5	114-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	11.10.2027	11.10.2027
285	2.9.7.6	114-00 Preberacie konanie	0 dni	25.10.2027	25.10.2027
287	**2.9.8**	**115-00 Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Blažkove**	**857 dni**	**22.10.2026**	**21.4.2029**
288	2.9.8.1	115-00 Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Blažkove	836 dni	22.10.2026	31.3.2029
289	2.9.8.1.1	115-00 Časť 115-00A	180 dni	16.9.2028	31.3.2029
290	2.9.8.1.2	115-00 Časť 115-00B	411 dni	22.10.2026	14.1.2028
294	2.9.8.5	115-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.4.2029	7.4.2029
295	2.9.8.6	115-00 Preberacie konanie	0 dni	21.4.2029	21.4.2029
297	**2.9.9**	**116-00 Úprava cesty II/520 v Krásne n/K**	**860 dni**	**4.11.2026**	**7.5.2029**
298	**2.9.9.1**	**116-00 Úprava cesty II/520 v Krásne n/K**	**839 dni**	**4.11.2026**	**16.4.2029**
299	2.9.9.1.1	116-00 Úsek km 0,000 - 0,127	340 dni	14.11.2026	8.11.2027
300	2.9.9.1.2	116-00 Úsek km 0,127- 0,245	150 dni	1.11.2028	16.4.2029
304	2.9.9.5	116-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
305	2.9.9.6	116-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
307	**2.9.10**	**117-00 Úprava cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K**	**241 dni**	**28.9.2026**	**15.6.2027**
308	2.9.10.1	117-00 Úprava cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K	220 dni	28.9.2026	25.5.2027
312	2.9.10.5	117-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.6.2027	1.6.2027
313	2.9.10.6	117-00 Preberacie konanie	0 dni	15.6.2027	15.6.2027
315	**2.9.11**	**118-00 Napojenie cesty III/2014 (III/011060) do Ochodnice**	**201 dni**	**29.9.2027**	**5.5.2028**
316	2.9.11.1	118-00 Napojenie cesty III/2014 (III/011060) do Ochodnice	180 dni	29.9.2027	14.4.2028
320	2.9.11.5	118-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	21.4.2028	21.4.2028
321	2.9.11.6	118-00 Preberacie konanie	0 dni	5.5.2028	5.5.2028
323	**2.9.12**	**119-00 Napojenie miestnej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 23,025 D3**	**171 dni**	**2.2.2027**	**22.7.2027**
324	2.9.12.1	119-00 Napojenie miestnej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 23,025 D3	150 dni	2.2.2027	1.7.2027
328	2.9.12.5	119-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.7.2027	8.7.2027
329	2.9.12.6	119-00 Preberacie konanie	0 dni	22.7.2027	22.7.2027
331	**2.9.13**	**120-00 Napojenie účelovej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 22,644 D3**	**141 dni**	**16.1.2029**	**5.6.2029**
332	2.9.13.1	120-00 Napojenie účelovej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 22,644 D3	120 dni	16.1.2029	15.5.2029
336	2.9.13.5	120-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	22.5.2029	22.5.2029
337	2.9.13.6	120-00 Preberacie konanie	0 dni	5.6.2029	5.6.2029
339	**2.9.14**	**121-00 Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove**	**80 dni**	**27.4.2026**	**15.7.2026**
340	2.9.14.1	121-00 Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove	59 dni	27.4.2026	24.6.2026
344	2.9.14.5	121-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.7.2026	1.7.2026
345	2.9.14.6	121-00 Preberacie konanie	0 dni	15.7.2026	15.7.2026
347	**2.9.15**	**122-00 Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 29,750 D3**	**589 dni**	**8.1.2026**	**8.9.2027**
348	2.9.15.1	122-00 Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 29,750 D3	250 dni	8.1.2026	18.8.2027
352	2.9.15.5	122-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	25.8.2027	25.8.2027
353	2.9.15.6	122-00 Preberacie konanie	0 dni	8.9.2027	8.9.2027
355	**2.9.16**	**123-00 Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 30,700 D3**	**631 dni**	**8.1.2026**	**20.10.2027**
356	2.9.16.1	123-00 Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 30,700 D3	150 dni	8.1.2026	29.9.2027
360	2.9.16.5	123-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.10.2027	6.10.2027
361	2.9.16.6	123-00 Preberacie konanie	0 dni	20.10.2027	20.10.2027
363	**2.9.17**	**124-00 Úprava miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom**	**869 dni**	**28.9.2026**	**9.4.2029**
364	2.9.17.1	124-00 Úprava miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom	848 dni	28.9.2026	19.3.2029
368	2.9.17.5	124-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	26.3.2029	26.3.2029
369	2.9.17.6	124-00 Preberacie konanie	0 dni	9.4.2029	9.4.2029

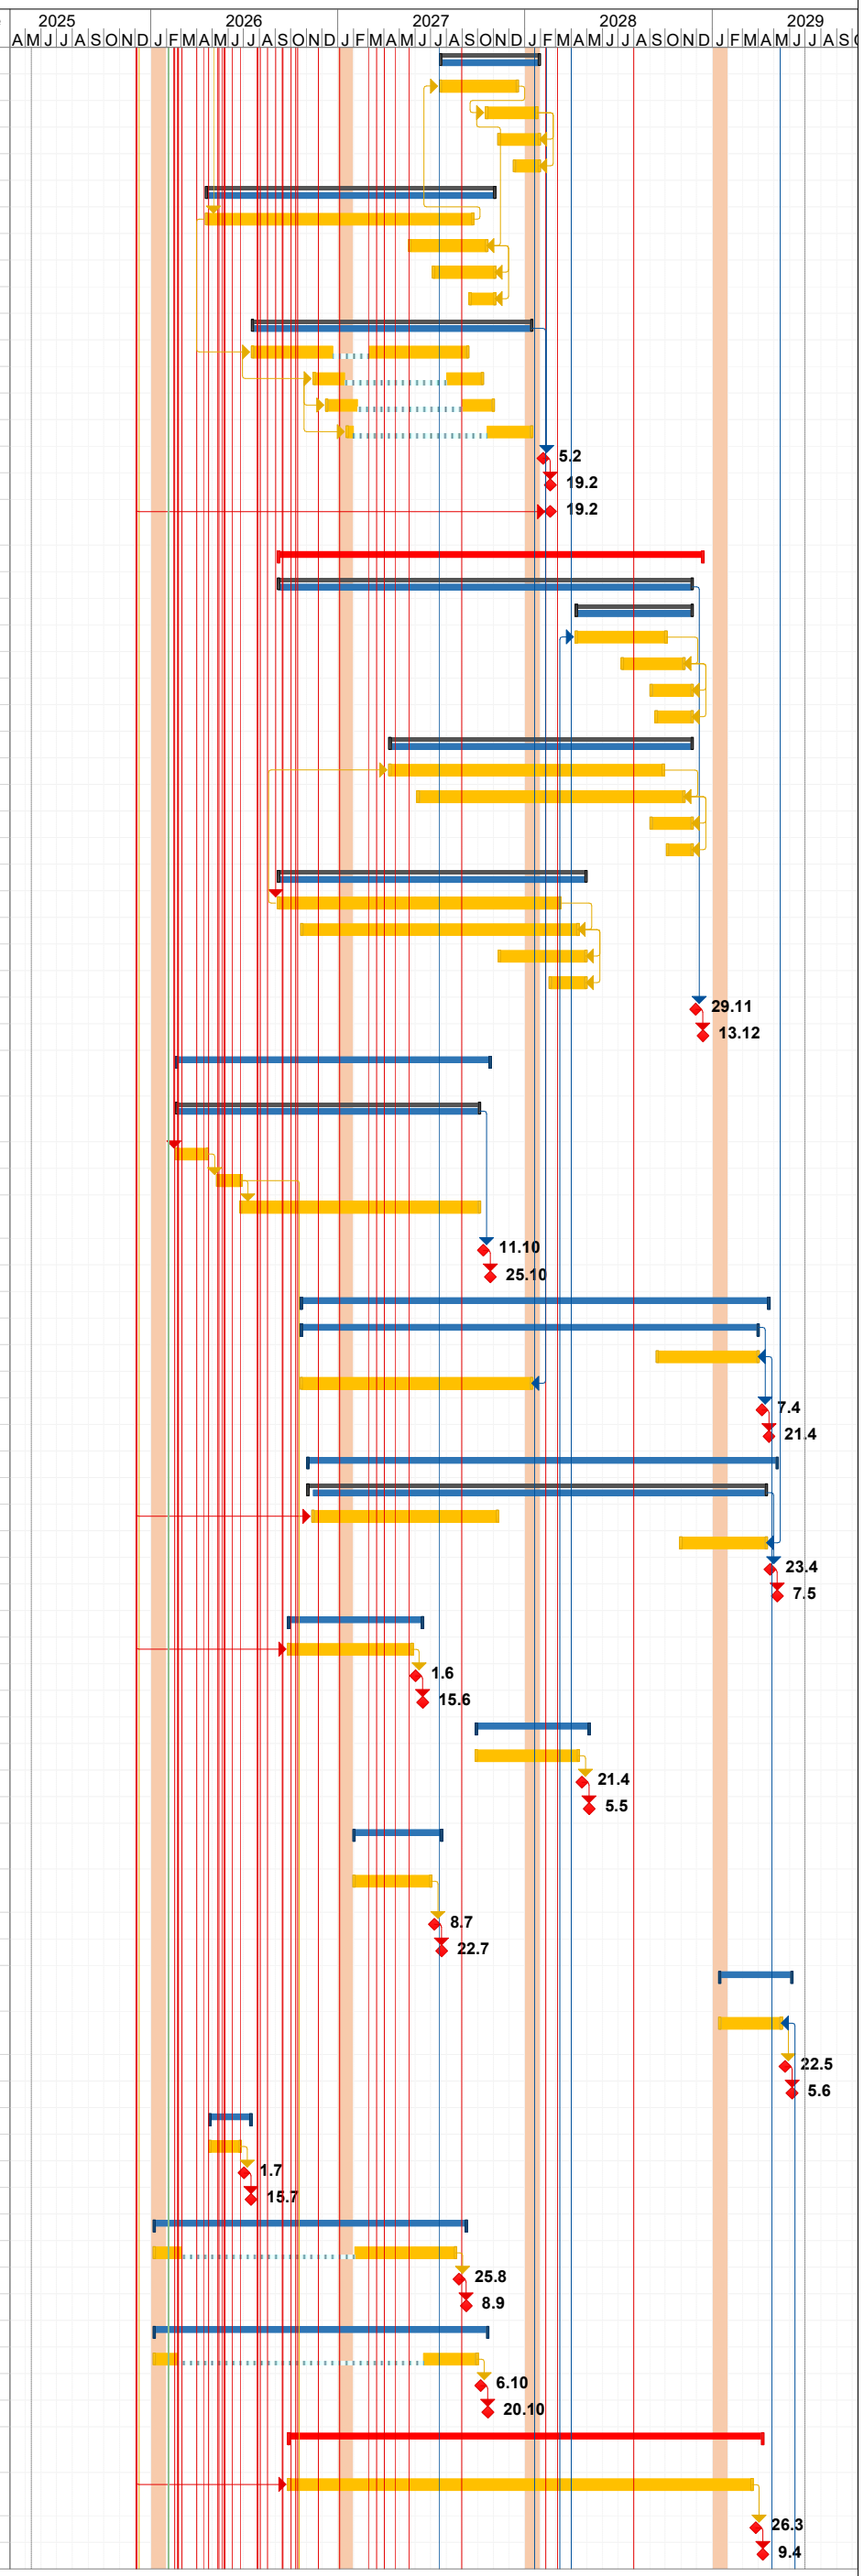

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
371	**2.9.18**	**125-00 Miestna komunikácia pri križovatke Krásno n/K**	**321 dni**	**11.8.2027**	**15.7.2028**
372	2.9.18.1	125-00 Miestna komunikácia pri križovatke Krásno n/K	300 dni	11.8.2027	24.6.2028
376	2.9.18.5	125-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.7.2028	1.7.2028
377	2.9.18.6	125-00 Preberacie konanie	0 dni	15.7.2028	15.7.2028
379	**2.10**	**Lesné, poľné cesty**	**1088 dni**	**23.2.2026**	**11.4.2029**
380	**2.10.1**	**132-00 Poľná cesta v km 23,725 D3**	**141 dni**	**4.3.2028**	**22.7.2028**
381	2.10.1.1	132-00 Poľná cesta v km 23,725 D3	120 dni	4.3.2028	1.7.2028
385	2.10.1.5	132-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.7.2028	8.7.2028
386	2.10.1.6	132-00 Preberacie konanie	0 dni	22.7.2028	22.7.2028
388	**2.10.2**	**133-00 Úprava lesnej cesty v km 28,500 - 28,640 D3 vpravo**	**211 dni**	**27.8.2028**	**11.4.2029**
389	2.10.2.1	133-00 Úprava lesnej cesty v km 28,500 - 28,640 D3 vpravo	190 dni	27.8.2028	21.3.2029
393	2.10.2.5	133-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.3.2029	28.3.2029
394	2.10.2.6	133-00 Preberacie konanie	0 dni	11.4.2029	11.4.2029
396	**2.10.3**	**134-00 Poľná cesta v km 29,650 - 29,725 D3 vpravo**	**1088 dni**	**23.2.2026**	**11.4.2029**
397	2.10.3.1	134-00 Poľná cesta v km 29,650 - 29,725 D3 vpravo	1067 dni	23.2.2026	21.3.2029
401	2.10.3.5	134-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.3.2029	28.3.2029
402	2.10.3.6	134-00 Preberacie konanie	0 dni	11.4.2029	11.4.2029
404	**2.10.4**	**135-00 Poľná cesta v km 31,250 - 31,530 D3 vpravo**	**584 dni**	**1.8.2027**	**11.4.2029**
405	2.10.4.1	135-00 Poľná cesta v km 31,250 - 31,530 D3 vpravo	563 dni	1.8.2027	21.3.2029
409	2.10.4.5	135-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.3.2029	28.3.2029
410	2.10.4.6	135-00 Preberacie konanie	0 dni	11.4.2029	11.4.2029
412	**2.10.5**	**137-00 Poľná cesta v km 23,153 D3 vľavo**	**821 dni**	**17.10.2026**	**11.3.2029**
413	2.10.5.1	137-00 Poľná cesta v km 23,153 D3 vľavo	800 dni	17.10.2026	18.2.2029
417	2.10.5.5	137-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	25.2.2029	25.2.2029
418	2.10.5.6	137-00 Preberacie konanie	0 dni	11.3.2029	11.3.2029
420	**2.11**	**Chodníky**	**388 dni**	**21.3.2028**	**12.4.2029**
421	**2.11.1**	**170-00 Chodník pre peších v Kysuckom Lieskovci**	**221 dni**	**29.4.2028**	**5.12.2028**
422	2.11.1.1	170-00 Chodník pre peších v Kysuckom Lieskovci	200 dni	29.4.2028	14.11.2028
426	2.11.1.5	170-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	21.11.2028	21.11.2028
427	2.11.1.6	170-00 Preberacie konanie	0 dni	5.12.2028	5.12.2028
429	**2.11.2**	**171-00 Chodník pre peších v Krásne n/K do Blažkova**	**271 dni**	**29.6.2028**	**12.4.2029**
430	2.11.2.1	171-00 Chodník pre peších v Krásne n/K do Blažkova	250 dni	29.6.2028	22.3.2029
434	2.11.2.5	171-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	29.3.2029	29.3.2029
435	2.11.2.6	171-00 Preberacie konanie	0 dni	12.4.2029	12.4.2029
437	**2.11.3**	**171-01 Chodníky pre peších v Krásne n/K**	**271 dni**	**21.3.2028**	**16.12.2028**
438	2.11.3.1	171-01 Chodníky pre peších v Krásne n/K	250 dni	21.3.2028	25.11.2028
442	2.11.3.5	171-01 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	2.12.2028	2.12.2028
443	2.11.3.6	171-01 Preberacie konanie	0 dni	16.12.2028	16.12.2028
445	**2.12**	**Mosty**	**1181 dni**	**7.4.2026**	**30.6.2029**
446	**2.12.1**	**203-00 Most na D3 nad potokom Lodnianka v km 22,313**	**811 dni**	**11.1.2027**	**6.5.2029**
447	**2.12.1.1**	**203-00 Most na D3 nad potokom Lodnianka v km 22,313**	**790 dni**	**11.1.2027**	**15.4.2029**
448	2.12.1.1.1	203-00 Zakladanie	70 dni	11.1.2027	21.3.2027
449	2.12.1.1.2	203-00 Spodná stavba	240 dni	22.3.2027	16.11.2027
450	**2.12.1.1.3**	**203-00 Nosná konštrukcia - predpätá doska h. 1,1m, 18,15m**	**160 dni**	**18.9.2027**	**14.3.2028**
451	2.12.1.1.3.1	203-00 ĽM	80 dni	18.9.2027	6.12.2027
452	2.12.1.1.3.2	203-00 PM	80 dni	7.12.2027	14.3.2028
453	2.12.1.1.4	203-00 Príslušenstvo	223,74 dı	15.3.2028	15.4.2029
457	2.12.1.5	203-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	22.4.2029	22.4.2029
458	2.12.1.6	203-00 Preberacie konanie	0 dni	6.5.2029	6.5.2029
460	**2.12.2**	**204-00 Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643**	**921 dni**	**4.8.2026**	**6.4.2029**
461	**2.12.2.1**	**204-00 Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643**	**900 dni**	**4.8.2026**	**16.3.2029**
462	2.12.2.1.1	204-00 Štrkový vankúš	21 dni	4.8.2026	24.8.2026
463	2.12.2.1.2	204-00 Základy	84 dni	25.8.2026	16.11.2026
464	**2.12.2.1.3**	**204-00 Nosná konštrukcia**	**240 dni**	**17.11.2026**	**3.8.2027**
465	2.12.2.1.3.1	204-00 ĽM - monolitický polorám	120 dni	17.11.2026	5.4.2027
466	2.12.2.1.3.2	204-00 PM - monolitický polorám	120 dni	6.4.2027	3.8.2027
467	2.12.2.1.4	204-00 Príslušenstvo	180 dni	1.9.2028	16.3.2029
471	2.12.2.5	204-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.3.2029	23.3.2029
472	2.12.2.6	204-00 Preberacie konanie	0 dni	6.4.2029	6.4.2029
474	**2.12.3**	**205-00 Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3**	**1011 dni**	**1.7.2026**	**1.6.2029**
475	**2.12.3.1**	**205-00 Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3**	**990 dni**	**1.7.2026**	**11.5.2029**
476	**2.12.3.1.1**	**205-00 Zakladanie**	**615 dni**	**1.7.2026**	**14.4.2028**
477	2.12.3.1.1.1	Etapa 1 (O1, O2, P3, P4, P5, P6)	90 dni	1.7.2026	28.9.2026
478	2.12.3.1.1.2	Etapa 2 (O7, O8)	28 dni	18.3.2028	14.4.2028
479	**2.12.3.1.2**	**205-00 Spodná stavba**	**615 dni**	**29.7.2026**	**12.5.2028**
480	2.12.3.1.2.1	205-00 Piliere	200 dni	29.7.2026	5.3.2027
481	2.12.3.1.2.2	205-00 Opory O1, O2	577 dni	22.8.2026	28.4.2028
482	2.12.3.1.2.3	205-00 Opory O7, O8	28 dni	15.4.2028	12.5.2028
483	**2.12.3.1.3**	**205-00 Nosná konštrukcia**	**632 dni**	**9.3.2027**	**18.12.2028**
484	2.12.3.1.3.1	205-00 Nosná konštrukcia - ĽM	512 dni	9.3.2027	20.8.2028
485	2.12.3.1.3.2	205-00 Nosná konštrukcia - PM	512 dni	7.7.2027	18.12.2028
486	2.12.3.1.4	205-00 Príslušenstvo	250 dni	18.8.2028	11.5.2029
490	2.12.3.5	205-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	18.5.2029	18.5.2029
491	2.12.3.6	205-00 Preberacie konanie	0 dni	1.6.2029	1.6.2029
493	**2.12.4**	**206-00 Most na D3 nad chodníkom v km 23,315**	**242 dni**	**17.8.2028**	**2.5.2029**
494	**2.12.4.1**	**206-00 Most na D3 nad chodníkom v km 23,315**	**221 dni**	**17.8.2028**	**11.4.2029**
495	2.12.4.1.1	206-00 Zakladanie (štrkový vankúš)	21 dni	17.8.2028	6.9.2028
496	2.12.4.1.2	206-00 Nosná konštrukcia	150 dni	7.9.2028	20.2.2029
497	2.12.4.1.3	206-00 Zásyp a príslušenstvo	50 dni	21.2.2029	11.4.2029
501	2.12.4.5	206-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	18.4.2029	18.4.2029
502	2.12.4.6	206-00 Preberacie konanie	0 dni	2.5.2029	2.5.2029
504	**2.12.5**	**206-10 Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322**	**638 dni**	**30.11.2026**	**6.10.2028**
505	**2.12.5.1**	**206-10 Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322**	**617 dni**	**30.11.2026**	**15.9.2028**
506	**2.12.5.1.1**	**206-10 Etapa A - 37,35m (4xDC)**	**183 dni**	**30.11.2026**	**20.6.2027**
507	2.12.5.1.1.1	206-10 Zakladanie (štrkový vankúš)	21 dni	30.11.2026	20.12.2026
508	2.12.5.1.1.2	206-10 Nosná konštrukcia	112 dni	21.12.2026	1.5.2027
509	2.12.5.1.1.3	206-10 Zásyp a príslušenstvo	50 dni	2.5.2027	20.6.2027
510	**2.12.5.1.2**	**206-10 Etapa B - 57,00m (6xDC)**	**207 dni**	**22.2.2028**	**15.9.2028**
511	2.12.5.1.2.1	206-10 Zakladanie (štrkový vankúš)	28 dni	22.2.2028	20.3.2028
512	2.12.5.1.2.2	206-10 Nosná konštrukcia	149 dni	21.3.2028	16.8.2028
513	2.12.5.1.2.3	206-10 Zásyp a príslušenstvo	50 dni	28.7.2028	15.9.2028
517	2.12.5.5	206-10 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	22.9.2028	22.9.2028
518	2.12.5.6	206-10 Preberacie konanie	0 dni	6.10.2028	6.10.2028
520	**2.12.6**	**207-00 Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726**	**721 dni**	**8.3.2027**	**2.4.2029**
521	**2.12.6.1**	**207-00 Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726**	**700 dni**	**8.3.2027**	**12.3.2029**

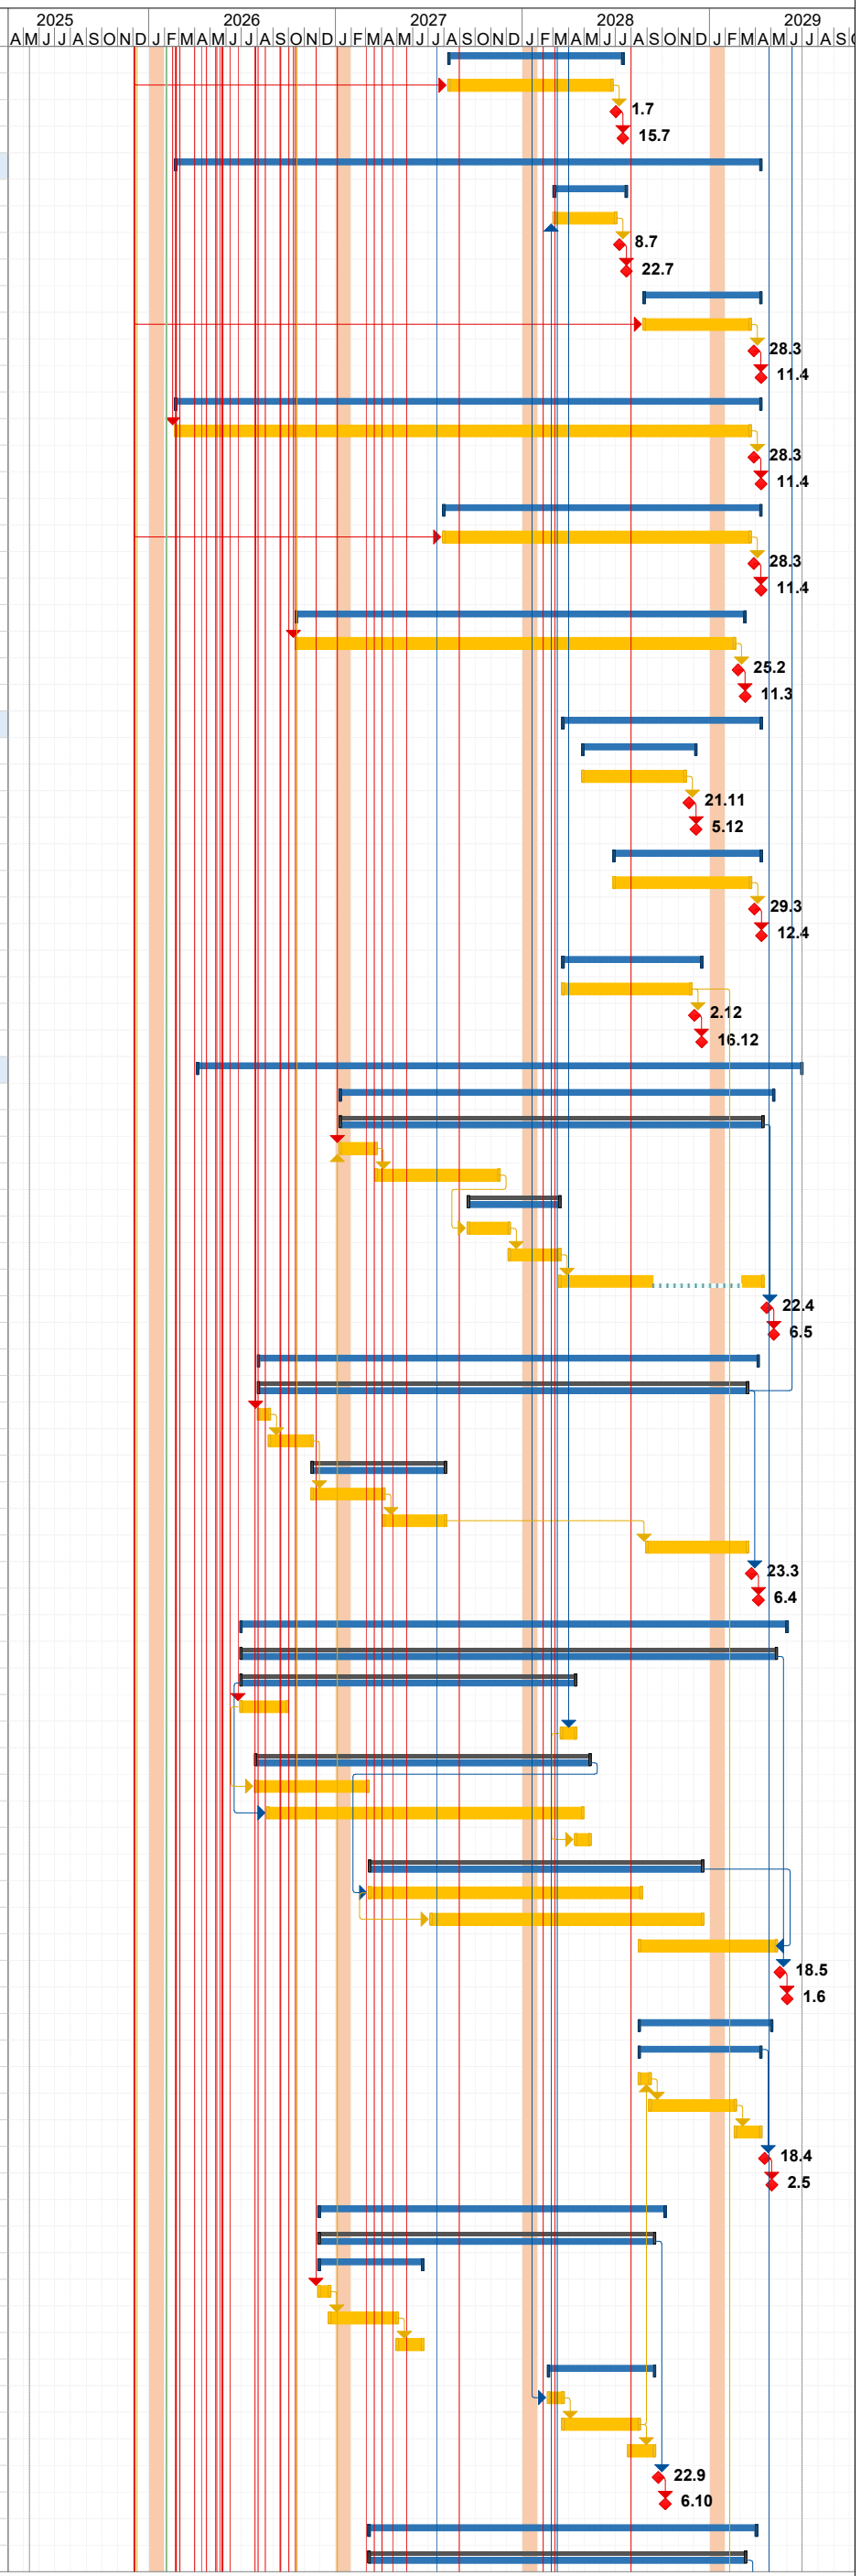

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
522	**2.12.6.1.1**	**207-00 Spodná stavba**	**364 dni**	**8.3.2027**	**24.3.2028**
523	2.12.6.1.1.1	207-00 Základy	84 dni	8.3.2027	30.5.2027
524	2.12.6.1.1.2	207-00 Krídla	112 dni	15.11.2027	24.3.2028
525	**2.12.6.1.2**	**207-00 Nosná konštrukcia**	**168 dni**	**31.5.2027**	**14.11.2027**
526	2.12.6.1.2.1	207-00 ĽM - monolitický polorám	84 dni	31.5.2027	22.8.2027
527	2.12.6.1.2.2	207-00 PM - monolitický polorám	84 dni	23.8.2027	14.11.2027
528	2.12.6.1.3	207-00 Príslušenstvo	336 dni	25.3.2028	12.3.2029
532	2.12.6.5	207-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	19.3.2029	19.3.2029
533	2.12.6.6	207-00 Preberacie konanie	0 dni	2.4.2029	2.4.2029
535	**2.12.7**	**208-00 Most na ceste III/2017 (III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24,52**	**821 dni**	**7.4.2026**	**13.8.2028**
536	**2.12.7.1**	**208-00 Most na ceste III/2017 (III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24,521**	**800 dni**	**7.4.2026**	**23.7.2028**
537	2.12.7.1.1	208-00 Prípravné práce	60 dni	7.4.2026	5.6.2026
538	**2.12.7.1.2**	**208-00 Zakladanie**	**351 dni**	**24.10.2026**	**29.10.2027**
539	**2.12.7.1.2.1**	**208-00 Zakladanie pilierov**	**85 dni**	**24.10.2026**	**5.2.2027**
540	2.12.7.1.2.1.1	208-00 Štetovnice	60 dni	24.10.2026	11.1.2027
541	2.12.7.1.2.1.2	208-00 Výkop základov a štrkové vankúše	60 dni	18.11.2026	5.2.2027
542	**2.12.7.1.2.2**	**208-00 Zakladanie opôr**	**210 dni**	**3.4.2027**	**29.10.2027**
543	2.12.7.1.2.2.1	208-00 Vystužený násyp opory 1	120 dni	3.4.2027	31.7.2027
544	2.12.7.1.2.2.2	208-00 Vystužený násyp opory 7	90 dni	1.8.2027	29.10.2027
545	**2.12.7.1.3**	**208-00 Spodná stavba**	**323 dni**	**9.12.2026**	**16.11.2027**
546	**2.12.7.1.3.1**	**208-00 Piliere 2, 3, 4, 5, 6 (5 pilierov)**	**134 dni**	**9.12.2026**	**11.5.2027**
547	2.12.7.1.3.1.1	208-00 Základy	75 dni	9.12.2026	13.3.2027
548	2.12.7.1.3.1.2	208-00 Drieky a hlavice	120 dni	12.1.2027	11.5.2027
549	**2.12.7.1.3.2**	**208-00 Opory 1, 7**	**108 dni**	**1.8.2027**	**16.11.2027**
550	2.12.7.1.3.2.1	208-00 Opora 1	48 dni	1.8.2027	17.9.2027
551	2.12.7.1.3.2.2	208-00 Opora 7	48 dni	30.9.2027	16.11.2027
552	**2.12.7.1.4**	**208-00 Nosná konštrukcia - predpätá doska; 17+4x23+17 m**	**145 dni**	**18.9.2027**	**28.2.2028**
553	2.12.7.1.4.1	208-00 NK - Lamela 1(45,8 m)	60 dni	18.9.2027	16.11.2027
554	2.12.7.1.4.2	208-00 NK - Lamela 2 (23,0 m)	50 dni	2.11.2027	21.12.2027
555	2.12.7.1.4.3	208-00 NK - Lamela 3 (33,0 m)	40 dni	7.12.2027	3.2.2028
556	2.12.7.1.4.4	208-00 NK - Lamela 4 (35,8 m)	40 dni	20.1.2028	28.2.2028
557	2.12.7.1.5	208-00 Príslušenstvo	194 dni	12.1.2028	23.7.2028
561	2.12.7.5	208-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	30.7.2028	30.7.2028
562	2.12.7.6	208-00 Preberacie konanie	0 dni	13.8.2028	13.8.2028
564	**2.12.8**	**209-00 Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850**	**671 dni**	**4.7.2027**	**9.6.2029**
565	**2.12.8.1**	**209-00 Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850**	**650 dni**	**4.7.2027**	**19.5.2029**
566	2.12.8.1.1	209-00 Búranie jestvujúceho mosta	40 dni	4.7.2027	12.8.2027
567	**2.12.8.1.2**	**209-00 Zakladanie**	**144 dni**	**13.8.2027**	**22.1.2028**
568	2.12.8.1.2.1	209-00 Veľkopriemerové pilóty	60 dni	13.8.2027	11.10.2027
569	2.12.8.1.2.2	209-00 Základy 1, 2, 3, 4	84 dni	12.10.2027	22.1.2028
570	**2.12.8.1.3**	**209-00 Nosná konštrukcia**	**196 dni**	**23.1.2028**	**5.8.2028**
571	2.12.8.1.3.1	209-00 ĽM - monolitický polorám	98 dni	23.1.2028	29.4.2028
572	2.12.8.1.3.2	209-00 PM - monolitický polorám	98 dni	30.4.2028	5.8.2028
573	2.12.8.1.4	209-00 Príslušenstvo	270 dni	6.8.2028	19.5.2029
577	2.12.8.5	209-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	26.5.2029	26.5.2029
578	2.12.8.6	209-00 Preberacie konanie	0 dni	9.6.2029	9.6.2029
580	**2.12.9**	**209-10 Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3**	**431 dni**	**30.4.2026**	**24.7.2027**
581	**2.12.9.1**	**209-10 Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3**	**410 dni**	**30.4.2026**	**3.7.2027**
582	**2.12.9.1.1**	**209-10 Búranie časti jestvujúceho mosta**	**60 dni**	**30.4.2026**	**28.6.2026**
583	2.12.9.1.1.1	209-10 Odkop a baranenie štetovnice	60 dni	30.4.2026	28.6.2026
584	2.12.9.1.1.2	209-10 Búranie	40 dni	10.5.2026	18.6.2026
585	**2.12.9.1.2**	**209-10 Zakladanie**	**100 dni**	**13.7.2026**	**20.10.2026**
586	2.12.9.1.2.1	209-10 Pilóty	30 dni	13.7.2026	11.8.2026
587	2.12.9.1.2.2	209-10 Základy 1,2	56 dni	26.8.2026	20.10.2026
588	**2.12.9.1.3**	**209-10 Nosná konštrukcia**	**84 dni**	**21.10.2026**	**1.2.2027**
589	2.12.9.1.3.1	209-10 Nosná konštrukcia - monolitický polorám	84 dni	21.10.2026	1.2.2027
590	2.12.9.1.4	209-10 Príslušenstvo	152 dni	2.2.2027	3.7.2027
594	2.12.9.5	209-10 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.7.2027	10.7.2027
595	2.12.9.6	209-10 Preberacie konanie	0 dni	24.7.2027	24.7.2027
597	**2.12.10**	**210-00 Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955**	**351 dni**	**20.2.2028**	**21.2.2029**
598	**2.12.10.1**	**210-00 Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955**	**330 dni**	**20.2.2028**	**31.1.2029**
599	**2.12.10.1.1**	**210-00 Zakladanie**	**145 dni**	**20.2.2028**	**13.7.2028**
600	2.12.10.1.1.1	210-00 Výkopy	25 dni	20.2.2028	15.3.2028
601	2.12.10.1.1.2	210-00 Pilóty	90 dni	1.3.2028	29.5.2028
602	2.12.10.1.1.3	210-00 Základy	90 dni	15.4.2028	13.7.2028
603	**2.12.10.1.2**	**210-00 Nosná konštrukcia**	**95 dni**	**14.7.2028**	**16.10.2028**
604	2.12.10.1.2.1	210-00 Montáž	40 dni	14.7.2028	22.8.2028
605	2.12.10.1.2.2	210-00 Zmonolitnenie päty klenby	75 dni	3.8.2028	16.10.2028
606	2.12.10.1.3	210-00 Príslušenstvo	180 dni	19.7.2028	31.1.2029
610	2.12.10.5	210-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.2.2029	7.2.2029
611	2.12.10.6	210-00 Preberacie konanie	0 dni	21.2.2029	21.2.2029
613	**2.12.11**	**210-10 Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom**	**437 dni**	**4.8.2026**	**3.11.2027**
614	**2.12.11.1**	**210-10 Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom**	**416 dni**	**4.8.2026**	**13.10.2027**
615	**2.12.11.1.1**	**210-10 Zakladanie**	**166 dni**	**4.8.2026**	**5.2.2027**
616	2.12.11.1.1.1	210-10 Výkop pre pilotovanie	46 dni	4.8.2026	18.9.2026
617	2.12.11.1.1.2	210-10 Pilóty	60 dni	19.9.2026	17.11.2026
618	2.12.11.1.1.3	210-10 Základy	60 dni	18.11.2026	5.2.2027
619	**2.12.11.1.2**	**210-10 Nosná konštrukcia**	**102 dni**	**20.2.2027**	**1.6.2027**
620	2.12.11.1.2.1	210-10 Montáž	42 dni	20.2.2027	2.4.2027
621	2.12.11.1.2.2	210-10 Zmonolitnenie päty klenby	60 dni	3.4.2027	1.6.2027
622	2.12.11.1.3	210-10 Príslušenstvo	104 dni	2.7.2027	13.10.2027
626	2.12.11.5	210-10 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	20.10.2027	20.10.2027
627	2.12.11.6	210-10 Preberacie konanie	0 dni	3.11.2027	3.11.2027
629	**2.12.12**	**211-00 Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3**	**596 dni**	**26.5.2026**	**19.2.2028**
630	**2.12.12.1**	**211-00 Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3**	**575 dni**	**26.5.2026**	**29.1.2028**
631	**2.12.12.1.1**	**211-00 Zakladanie**	**409 dni**	**26.5.2026**	**28.7.2027**
632	2.12.12.1.1.1	211-00 Zakladanie - opora 1	30 dni	24.8.2026	22.9.2026
633	2.12.12.1.1.2	211-00 Zakladanie - piliere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	90 dni	26.5.2026	23.8.2026
634	2.12.12.1.1.3	211-00 Zakladanie - opora 10	20 dni	9.7.2027	28.7.2027
635	**2.12.12.1.2**	**211-00 Spodná stavba**	**347 dni**	**24.8.2026**	**25.8.2027**
636	2.12.12.1.2.1	211-00 Piliere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	240 dni	24.8.2026	10.5.2027
637	2.12.12.1.2.2	211-00 Opora 1	28 dni	23.9.2026	20.10.2026
638	2.12.12.1.2.3	211-00 Opora 10	28 dni	29.7.2027	25.8.2027

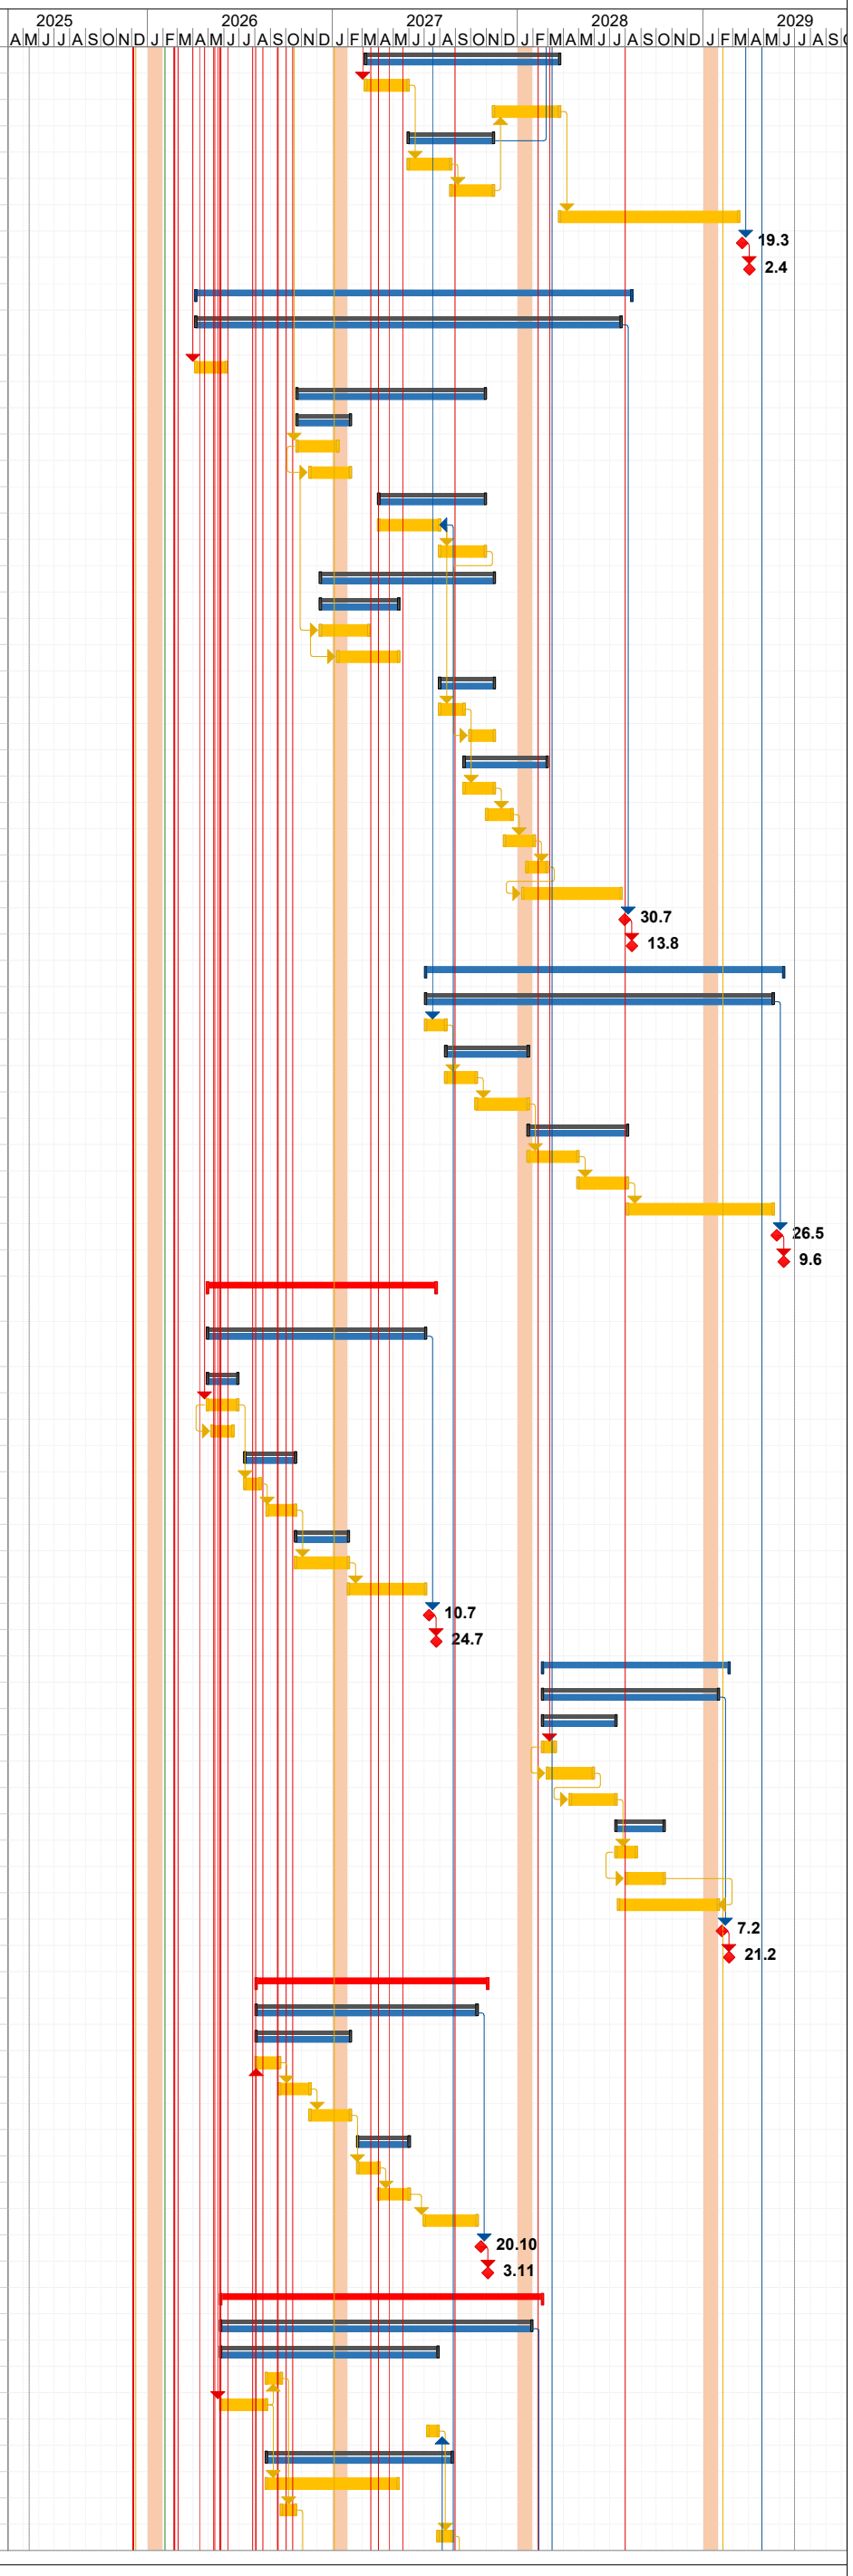

Súhrn | Úloha | Kritická cesta | Rozdeliť | Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
639	**2.12.12.1.3**	**211-00 Nosná konštrukcia - predpätý dvojtrám; 30+7x40+30 m**	**357 dni**	**21.10.2026**	**1.11.2027**
640	2.12.12.1.3.1	211-00 Etapa 1 (39 m)	72 dni	21.10.2026	20.1.2027
641	2.12.12.1.3.2	211-00 Etapa 2 až 7 - (6x 40 m)	240 dni	21.1.2027	17.9.2027
642	2.12.12.1.3.3	211-00 Etapa 8 (63 m)	60 dni	3.9.2027	1.11.2027
643	2.12.12.1.4	211-00 Príslušenstvo	250 dni	6.5.2027	29.1.2028
647	2.12.12.5	211-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.2.2028	5.2.2028
648	2.12.12.6	211-00 Preberacie konanie	0 dni	19.2.2028	19.2.2028
650	**2.12.12.8**	**211-00 Míľnik č.2 Úspešné preberacie konanie preložky cesty I/11 (SO 112-00) a mostu SO 211-00 v zmysle čl. 10.2**	**0 dni**	**19.2.2028**	**19.2.2028**
651	**2.12.13**	**212-00 Most na D3 nad údolím v km 29,728**	**921 dni**	**9.8.2026**	**11.4.2029**
652	**2.12.13.1**	**212-00 Most na D3 nad údolím v km 29,728**	**900 dni**	**9.8.2026**	**21.3.2029**
653	**2.12.13.1.1**	**212-00 Zakladanie**	**180 dni**	**9.8.2026**	**24.2.2027**
654	2.12.13.1.1.1	212-00 Piliere 3, 4, 5, 6	84 dni	9.8.2026	31.10.2026
655	2.12.13.1.1.2	212-00 Opory 1, 2, 7, 8	96 dni	1.11.2026	24.2.2027
656	**2.12.13.1.2**	**212-00 Spodná stavba**	**256 dni**	**1.11.2026**	**3.8.2027**
657	2.12.13.1.2.1	212-00 Piliere 3, 4, 5, 6	168 dni	1.11.2026	7.5.2027
658	2.12.13.1.2.2	212-00 Opory 1, 2, 7, 8	88 dni	8.5.2027	3.8.2027
659	**2.12.13.1.3**	**212-00 Nosná konštrukcia**	**190 dni**	**13.10.2027**	**8.5.2028**
660	2.12.13.1.3.1	212-00 Nosná konštrukcia - ľavý most	90 dni	13.10.2027	29.1.2028
661	2.12.13.1.3.2	212-00 Nosná konštrukcia - pravý most	183 dni	20.10.2027	8.5.2028
662	2.12.13.1.4	212-00 Príslušenstvo	300 dni	9.5.2028	21.3.2029
666	2.12.13.5	212-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.3.2029	28.3.2029
667	2.12.13.6	212-00 Preberacie konanie	0 dni	11.4.2029	11.4.2029
669	**2.12.14**	**213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793**	**1112 dni**	**20.4.2026**	**30.6.2029**
670	2.12.14.1	213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793	1091 dni	20.4.2026	9.6.2029
671	**2.12.14.1.1**	**213-00 Pravý most**	**662 dni**	**20.4.2026**	**20.3.2028**
672	**2.12.14.1.1.1**	**213-00 Pravý most - Zakladanie**	**280 dni**	**20.4.2026**	**13.2.2027**
673	2.12.14.1.1.1.1	213-00 Zakladanie - Opora 18	60 dni	20.4.2026	18.6.2026
674	2.12.14.1.1.1.2	213-00 Zakladanie - Piliere 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	164 dni	10.7.2026	20.12.2026
675	2.12.14.1.1.1.3	213-00 Zakladanie - Opora 2	21 dni	24.1.2027	13.2.2027
676	**2.12.14.1.1.2**	**213-00 Pravý most - Spodná stavba**	**371 dni**	**19.6.2026**	**14.7.2027**
677	2.12.14.1.1.2.1	213-00 Opora 18	60 dni	19.6.2026	17.8.2026
678	2.12.14.1.1.2.2	213-00 Drieky pilierov 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	296 dni	24.7.2026	4.6.2027
679	2.12.14.1.1.2.3	213-00 Opora 2	40 dni	5.6.2027	14.7.2027
680	**2.12.14.1.1.3**	**213-00 Pravý most - Nosná konštrukcia**	**365 dni**	**16.10.2026**	**4.11.2027**
681	2.12.14.1.1.3.1	213-00 NK - PM 1. etapa - 39 m	90 dni	16.10.2026	2.2.2027
682	2.12.14.1.1.3.2	213-00 NK - PM 2. až 6. etapa - 5x 40 m	250 dni	14.1.2027	20.9.2027
683	2.12.14.1.1.3.3	213-00 NK - PM 7. etapa - 63 m	45 dni	21.9.2027	4.11.2027
684	2.12.14.1.1.4	213-00 Pravý most - Príslušenstvo	178 dni	6.9.2027	20.3.2028
685	**2.12.14.1.2**	**213-00 Ľavý most**	**1031 dni**	**19.6.2026**	**9.6.2029**
686	**2.12.14.1.2.1**	**213-00 Ľavý most - Zakladanie**	**241 dni**	**19.6.2026**	**6.3.2027**
687	2.12.14.1.2.1.1	213-00 Zakladanie - Opora 17	21 dni	19.6.2026	9.7.2026
688	2.12.14.1.2.1.2	213-00 Zakladanie - Piliere 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15	164 dni	24.7.2026	23.1.2027
689	2.12.14.1.2.1.3	213-00 Zakladanie - Opora 1	21 dni	14.2.2027	6.3.2027
690	**2.12.14.1.2.2**	**213-00 Ľavý most - Spodná stavba**	**471 dni**	**18.8.2026**	**21.12.2027**
691	2.12.14.1.2.2.1	213-00 Opora 17	42 dni	18.8.2026	28.9.2026
692	2.12.14.1.2.2.2	213-00 Drieky pilierov 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	324 dni	4.9.2026	13.8.2027
693	2.12.14.1.2.2.3	213-00 Opora 1 + krídlo	160 dni	15.7.2027	21.12.2027
694	**2.12.14.1.2.3**	**213-00 Ľavý most - Nosná konštrukcia**	**345 dni**	**5.12.2027**	**2.12.2028**
695	2.12.14.1.2.3.1	213-00 NK - ĽM 1. etapa - 39 m	70 dni	5.12.2027	2.3.2028
696	2.12.14.1.2.3.2	213-00 NK - ĽM 2. až 6. etapa - 5x 40 m	250 dni	12.2.2028	18.10.2028
697	2.12.14.1.2.3.3	213-00 NK - ĽM 7. etapa - 63 m	60 dni	4.10.2028	2.12.2028
698	2.12.14.1.2.4	213-00 Ľavý most - Príslušenstvo	218 dni	18.10.2028	9.6.2029
702	2.12.14.5	213-00 Pravý most - Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	27.3.2028	27.3.2028
703	2.12.14.6	213-00 Pravý most - Preberacie konanie	0 dni	10.4.2028	10.4.2028
704	2.12.14.7	213-00 Ľavý most - Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	16.6.2029	16.6.2029
705	2.12.14.8	213-00 Ľavý most - Preberacie konanie	0 dni	30.6.2029	30.6.2029
707	**2.12.15**	**213-00 Míľnik č.3 Úspešné preberacie konanie pravého mostu SO 213-00 v zmysle čl. 10.2**	**0 dni**	**1.2.2029**	**1.2.2029**
708	**2.12.16**	**214-00 Most na ceste I/11 v km 30,722 D3**	**429 dni**	**11.4.2028**	**30.6.2029**
709	**2.12.16.1**	**214-00 Most na ceste I/11 v km 30,722 D3**	**408 dni**	**11.4.2028**	**9.6.2029**
710	**2.12.16.1.1**	**214-00 Búranie existujúceho mosta**	**95 dni**	**11.4.2028**	**14.7.2028**
711	2.12.16.1.1.1	214-00 Búranie príslušenstva mosta	60 dni	11.4.2028	9.6.2028
712	2.12.16.1.1.2	214-00 Búranie NK mosta (nosníky I-73 - 9ks v priečnom reze)	40 dni	11.5.2028	19.6.2028
713	2.12.16.1.1.3	214-00 Búranie časti spodnej stavby	50 dni	26.5.2028	14.7.2028
714	**2.12.16.1.2**	**214-00 Zakladanie**	**74 dni**	**15.7.2028**	**26.9.2028**
715	2.12.16.1.2.1	214-00 Zakladanie - Opory 1, 5	55 dni	15.7.2028	7.9.2028
716	2.12.16.1.2.2	214-00 Zakladanie - Piliere 2, 3, 4	60 dni	29.7.2028	26.9.2028
717	**2.12.16.1.3**	**214-00 Spodná stavba**	**139 dni**	**8.9.2028**	**10.2.2029**
718	2.12.16.1.3.1	214-00 Opory 1, 5	110 dni	8.9.2028	12.1.2029
719	2.12.16.1.3.2	214-00 Piliere 2, 3, 4	120 dni	27.9.2028	10.2.2029
720	**2.12.16.1.4**	**214-00 Nosná konštrukcia**	**138 dni**	**27.11.2028**	**30.4.2029**
721	2.12.16.1.4.1	214-00 NK - 1. etapa	60 dni	27.11.2028	11.2.2029
722	2.12.16.1.4.2	214-00 NK - 2. etapa	45 dni	12.2.2029	28.3.2029
723	2.12.16.1.4.3	214-00 NK - 3. etapa	33 dni	29.3.2029	30.4.2029
724	2.12.16.1.5	214-00 Príslušenstvo	180 dni	25.11.2028	9.6.2029
728	2.12.16.5	214-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	16.6.2029	16.6.2029
729	2.12.16.6	214-00 Preberacie konanie	0 dni	30.6.2029	30.6.2029
731	**2.12.17**	**215-00 Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172**	**369 dni**	**6.9.2027**	**27.9.2028**
732	**2.12.17.1**	**215-00 Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172**	**348 dni**	**6.9.2027**	**6.9.2028**
733	**2.12.17.1.1**	**215-00 Zakladanie**	**90 dni**	**6.9.2027**	**4.12.2027**
734	2.12.17.1.1.1	215-00 Výkop pre založenie opôr	30 dni	6.9.2027	5.10.2027
735	2.12.17.1.1.2	215-00 Pilóty	80 dni	16.9.2027	4.12.2027
736	**2.12.17.1.2**	**215-00 Spodná stavba**	**120 dni**	**26.10.2027**	**12.3.2028**
737	2.12.17.1.2.1	215-00 Opory 1, 2, 3, 4	120 dni	26.10.2027	12.3.2028
738	**2.12.17.1.3**	**215-00 Nosná konštrukcia**	**154 dni**	**6.2.2028**	**8.7.2028**
739	2.12.17.1.3.1	215-00 Spodné časti priečnikov	50 dni	6.2.2028	26.3.2028
740	2.12.17.1.3.2	215-00 Montáž nosníkov	14 dni	27.3.2028	9.4.2028
741	2.12.17.1.3.3	215-00 ĽM spriahnutie	45 dni	10.4.2028	24.5.2028
742	2.12.17.1.3.4	215-00 PM spriahnutie	45 dni	25.5.2028	8.7.2028
743	2.12.17.1.4	215-00 Príslušenstvo	150 dni	10.4.2028	6.9.2028
747	2.12.17.5	215-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.9.2028	13.9.2028
748	2.12.17.6	215-00 Preberacie konanie	0 dni	27.9.2028	27.9.2028
750	**2.12.18**	**216-00 Most na vetve C v Krásne n/K**	**646 dni**	**24.3.2027**	**2.2.2029**
751	**2.12.18.1**	**216-00 Most na vetve C v Krásne n/K**	**625 dni**	**24.3.2027**	**12.1.2029**
752	2.12.18.1.1	216-00 Zakladanie (štrkový vankúš)	30 dni	24.3.2027	22.4.2027

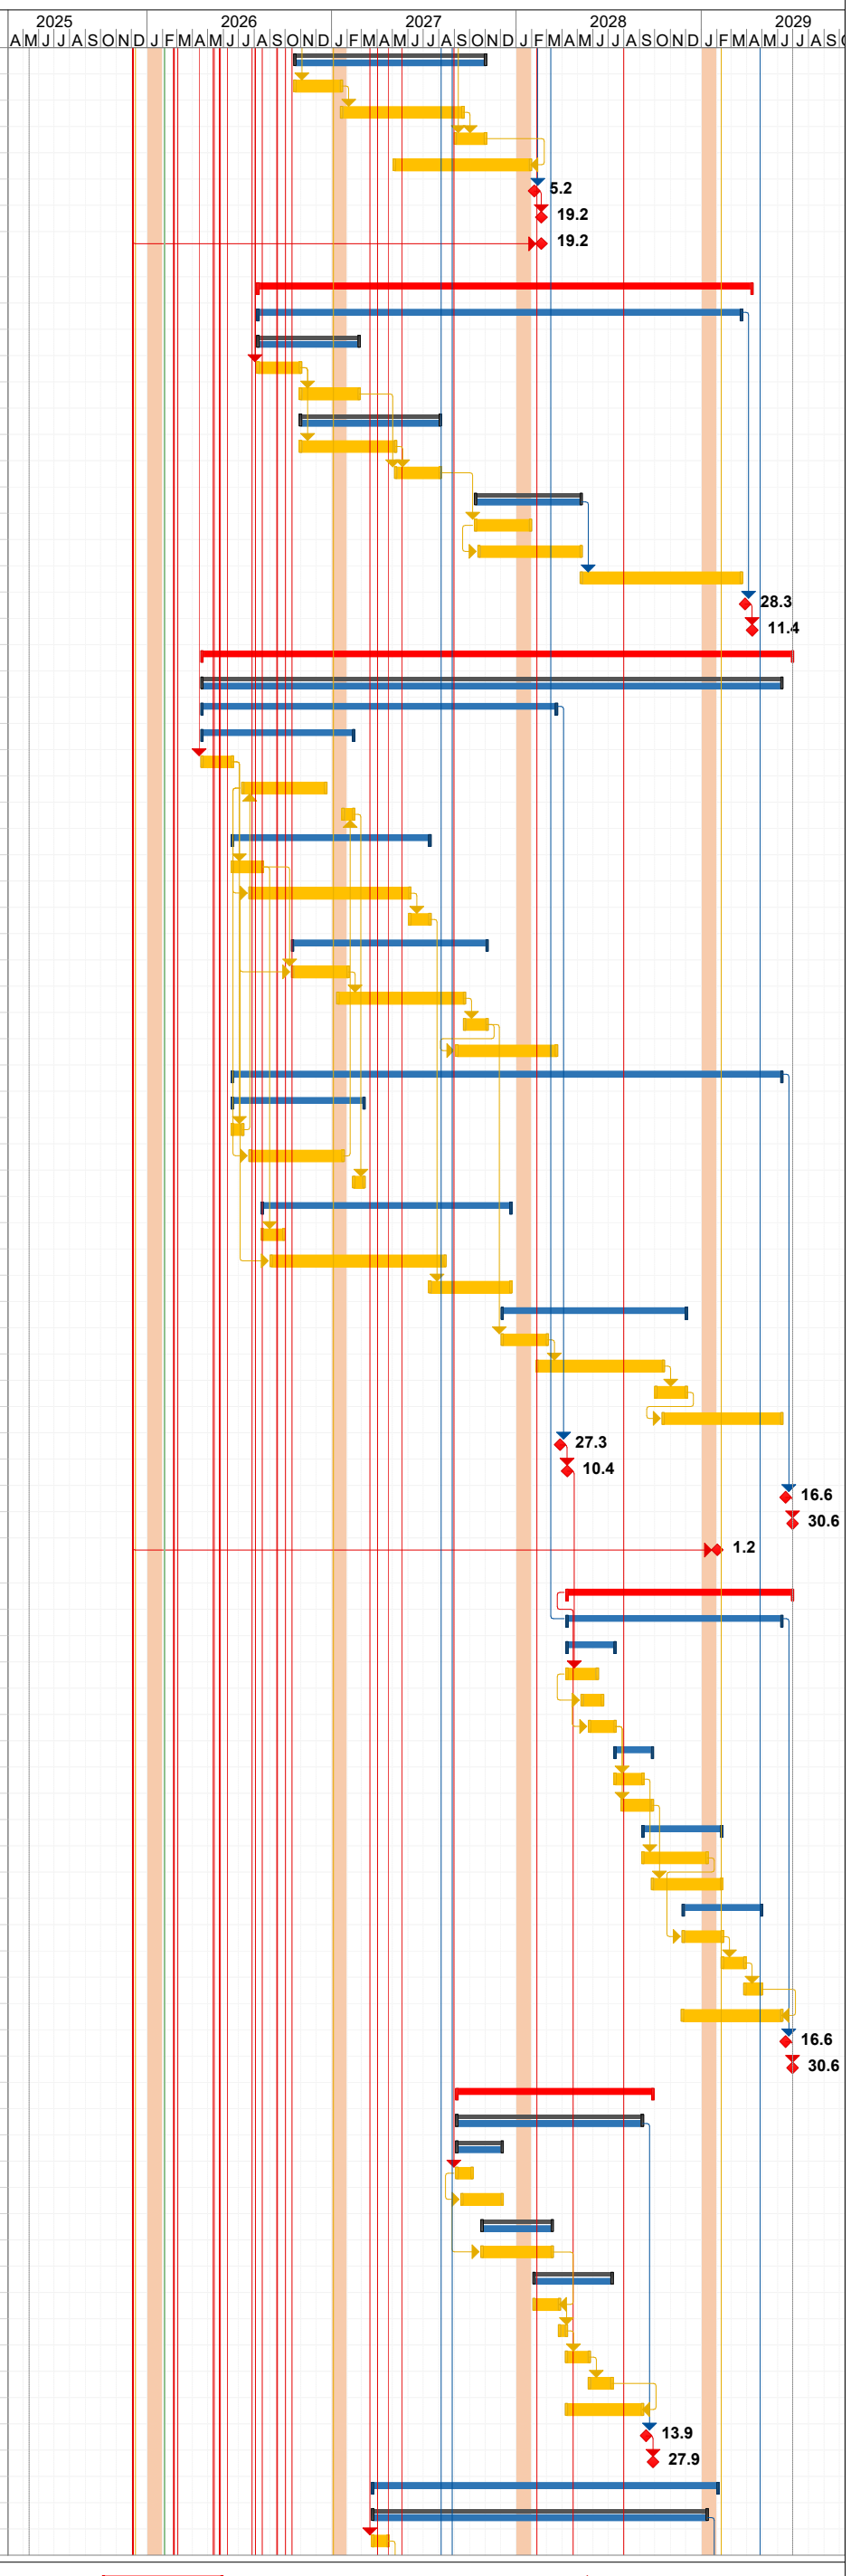

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
753	**2.12.18.1.2**	**216-00 Nosná konštrukcia**	**195 dni**	**23.4.2027**	**3.11.2027**
754	2.12.18.1.2.1	216-00 Spodná doska	42 dni	23.4.2027	3.6.2027
755	2.12.18.1.2.2	216-00 Steny	90 dni	4.6.2027	1.9.2027
756	2.12.18.1.2.3	216-00 Horná doska	63 dni	2.9.2027	3.11.2027
757	2.12.18.1.3	216-00 Príslušenstvo	120 dni	29.8.2028	12.1.2029
761	2.12.18.5	216-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	19.1.2029	19.1.2029
762	2.12.18.6	216-00 Preberacie konanie	0 dni	2.2.2029	2.2.2029
764	**2.12.19**	**216-10 Most na vetve C v Krásne n/K**	**651 dni**	**8.4.2027**	**22.2.2029**
765	**2.12.19.1**	**216-10 Most na vetve C v Krásne n/K**	**630 dni**	**8.4.2027**	**1.2.2029**
766	2.12.19.1.1	216-10 Zakladanie (štrkový vankúš)	30 dni	8.4.2027	7.5.2027
767	**2.12.19.1.2**	**216-10 Nosná konštrukcia**	**195 dni**	**18.11.2027**	**18.6.2028**
768	2.12.19.1.2.1	216-10 Spodná doska	42 dni	18.11.2027	17.1.2028
769	2.12.19.1.2.2	216-10 Steny	90 dni	18.1.2028	16.4.2028
770	2.12.19.1.2.3	216-10 Horná doska	63 dni	17.4.2028	18.6.2028
771	2.12.19.1.3	216-10 Príslušenstvo	211 dni	19.6.2028	1.2.2029
775	2.12.19.5	216-10 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.2.2029	8.2.2029
776	2.12.19.6	216-10 Preberacie konanie	0 dni	22.2.2029	22.2.2029
778	**2.12.20**	**218-00 Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578**	**642 dni**	**15.6.2026**	**25.4.2028**
779	**2.12.20.1**	**218-00 Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578**	**621 dni**	**15.6.2026**	**4.4.2028**
780	2.12.20.1.1	218-00 Búranie jestvujúcej lávky	75 dni	15.6.2026	28.8.2026
781	**2.12.20.1.2**	**218-00 Spodná stavba**	**210 dni**	**29.8.2026**	**15.4.2027**
782	2.12.20.1.2.1	218-00 Gabionový múr pri opore 1	60 dni	29.8.2026	27.10.2026
783	2.12.20.1.2.2	218-00 Sanácia a zosilnenie spodnej stavby	150 dni	28.10.2026	15.4.2027
784	**2.12.20.1.3**	**218-00 Nosná konštrukcia**	**197 dni**	**17.3.2027**	**29.9.2027**
785	2.12.20.1.3.1	218-00 NK - Etapa 1 (polia I, II, II a IV)	95 dni	17.3.2027	19.6.2027
786	2.12.20.1.3.2	218-00 NK - Etapa 2 (polia V a VI)	60 dni	1.8.2027	29.9.2027
787	2.12.20.1.4	218-00 Príslušenstvo	169 dni	30.9.2027	4.4.2028
791	2.12.20.5	218-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	11.4.2028	11.4.2028
792	2.12.20.6	218-00 Preberacie konanie	0 dni	25.4.2028	25.4.2028
794	**2.12.21**	**219-00 Oprava mosta nad D3 v km 28,548**	**241 dni**	**7.8.2028**	**21.4.2029**
795	**2.12.21.1**	**219-00 Oprava mosta nad D3 v km 28,548**	**220 dni**	**7.8.2028**	**31.3.2029**
796	**2.12.21.1.1**	**219-00 Búranie mosta**	**60 dni**	**7.8.2028**	**5.10.2028**
797	2.12.21.1.1.1	219-00 Búranie mostného príslušenstva	60 dni	7.8.2028	5.10.2028
798	2.12.21.1.1.2	219-00 Frézovanie asfaltov a izolácie	7 dni	29.9.2028	5.10.2028
799	**2.12.21.1.2**	**219-00 Nový most**	**160 dni**	**6.10.2028**	**31.3.2029**
800	2.12.21.1.2.1	219-00 Realizácia novej spriahajúcej dosky	90 dni	6.10.2028	20.1.2029
801	2.12.21.1.2.2	219-00 Vyspravenie pohľadových plôch SS	30 dni	2.3.2029	31.3.2029
802	2.12.21.1.2.3	219-00 Vyspravenie pohľadových plôch NK	60 dni	21.1.2029	21.3.2029
803	2.12.21.1.2.4	219-00 Príslušenstvo	100 dni	5.12.2028	31.3.2029
807	2.12.21.5	219-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.4.2029	7.4.2029
808	2.12.21.6	219-00 Preberacie konanie	0 dni	21.4.2029	21.4.2029
810	**2.12.22**	**220-00 Ekodukt Dunajov nad diaľnicou D3 v km 24,300**	**1011 dni**	**20.5.2026**	**20.4.2029**
811	**2.12.22.1**	**220-00 Ekodukt Dunajov nad diaľnicou D3 v km 24,300**	**990 dni**	**20.5.2026**	**30.3.2029**
812	**2.12.22.1.1**	**220-00 Zakladanie**	**385 dni**	**20.5.2026**	**28.6.2027**
813	2.12.22.1.1.1	220-00 Výkop a výmena podložia	60 dni	20.5.2026	18.7.2026
814	2.12.22.1.1.2	220-00 Podkladný betón	45 dni	15.5.2027	28.6.2027
815	**2.12.22.1.2**	**220-00 Nosná konštrukcia - dvojklenba dĺ. 125m**	**138 dni**	**29.6.2027**	**13.11.2027**
816	2.12.22.1.2.1	220-00 Montáž NK	90 dni	29.6.2027	26.9.2027
817	2.12.22.1.2.2	220-00 Zmonolitnenie päty klenby	110 dni	27.7.2027	13.11.2027
818	2.12.22.1.3	220-00 Zásyp a príslušenstvo	171 dni	14.11.2027	30.3.2029
822	2.12.22.5	220-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.4.2029	6.4.2029
823	2.12.22.6	220-00 Preberacie konanie	0 dni	20.4.2029	20.4.2029
825	**2.12.23**	**220-10 Ekodukt Dunajov nad cestou I/11**	**916 dni**	**23.8.2026**	**20.4.2029**
826	**2.12.23.1**	**220-10 Ekodukt Dunajov nad cestou I/11**	**895 dni**	**23.8.2026**	**30.3.2029**
827	**2.12.23.1.1**	**220-10 Zakladanie**	**770 dni**	**23.8.2026**	**8.11.2028**
828	2.12.23.1.1.1	220-10 Prípravné práce	21 dni	23.8.2026	12.9.2026
829	2.12.23.1.1.2	220-10 Dočasné presmerovanie dopravy z I/11 pod 220-00	300 dni	14.1.2028	8.11.2028
830	2.12.23.1.1.3	220-10 Štetovnice pozdĺž jestvujúcej cesty I/11	70 dni	21.1.2028	30.3.2028
831	2.12.23.1.1.4	220-10 Výkop a výmena podložia	40 dni	31.3.2028	9.5.2028
832	2.12.23.1.1.5	220-10 Podkladný betón	30 dni	10.5.2028	8.6.2028
833	**2.12.23.1.2**	**220-10 Nosná konštrukcia**	**125 dni**	**9.6.2028**	**11.10.2028**
834	2.12.23.1.2.1	220-10 Montáž NK	65 dni	9.6.2028	12.8.2028
835	2.12.23.1.2.2	220-10 Zmonolitnenie päty klenby	75 dni	29.7.2028	11.10.2028
836	2.12.23.1.3	220-10 Zásyp a príslušenstvo	153 dni	12.10.2028	30.3.2029
840	2.12.23.5	220-10 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.4.2029	6.4.2029
841	2.12.23.6	220-10 Preberacie konanie	0 dni	20.4.2029	20.4.2029
843	**2.13**	**Oporné múry, zárubné múry**	**1175 dni**	**1.3.2026**	**18.5.2029**
844	**2.13.1**	**230-00 Oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 50 vpravo**	**645 dni**	**1.3.2026**	**13.1.2028**
845	**2.13.1.1**	**230-00 Oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 50 vpravo**	**624 dni**	**1.3.2026**	**4.12.2027**
846	**2.13.1.1.1**	**230-00 Zakladanie**	**60 dni**	**1.3.2026**	**29.4.2026**
847	2.13.1.1.1.1	230-00 Štrkový vankúš	21 dni	1.3.2026	21.3.2026
848	2.13.1.1.1.2	230-00 Základ múru 108m	60 dni	1.3.2026	29.4.2026
849	**2.13.1.1.2**	**230-00 Konštrukcia múru**	**247 dni**	**30.4.2026**	**21.1.2027**
850	2.13.1.1.2.1	230-00 Pohľadové tvarovky + geomreže	240 dni	30.4.2026	14.1.2027
851	2.13.1.1.2.2	230-00 Zásyp	240 dni	7.5.2026	21.1.2027
852	2.13.1.1.3	230-00 Príslušenstvo	197 dni	22.5.2027	4.12.2027
856	2.13.1.5	230-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	11.12.2027	11.12.2027
857	2.13.1.6	230-00 Preberacie konanie	0 dni	13.1.2028	13.1.2028
859	**2.13.2**	**231-00 Oporný múr na D3 v km 24,363 - 26,080 vľavo**	**1101 dni**	**1.3.2026**	**30.4.2029**
860	**2.13.2.1**	**231-00 Oporný múr na D3 v km 24,363 - 26,080 vľavo**	**1080 dni**	**1.3.2026**	**9.4.2029**
861	**2.13.2.1.1**	**231-00 km 24,363 - 24,520 (DC01 - DC66)**	**457 dni**	**1.3.2026**	**20.6.2027**
862	2.13.2.1.1.1	231-00 Hĺbkové zakladanie	165 dni	1.3.2026	12.8.2026
863	2.13.2.1.1.2	231-00 Základy	264 dni	15.3.2026	3.12.2026
864	2.13.2.1.1.3	231-00 Driek	422 dni	5.4.2026	20.6.2027
865	**2.13.2.1.2**	**231-00 km 24,750 (DC39 - DC42)**	**60 dni**	**28.10.2028**	**12.1.2029**
866	2.13.2.1.2.1	231-00 Dobudovanie konštrukcie múru v mieste obchádzky 114-(	60 dni	28.10.2028	12.1.2029
867	**2.13.2.1.3**	**231-00 km 25,020 - 26,082 (DC67 - DC172)**	**788 dni**	**13.8.2026**	**16.11.2028**
868	2.13.2.1.3.1	231-00 Hĺbkové zakladanie	263 dni	13.8.2026	22.5.2027
869	2.13.2.1.3.2	231-00 Základy	420 dni	4.12.2026	6.3.2028
870	2.13.2.1.3.3	231-00 Driek	496 dni	21.6.2027	16.11.2028
871	2.13.2.1.4	231-00 Príslušenstvo	240 dni	27.7.2028	9.4.2029
875	2.13.2.5	231-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	16.4.2029	16.4.2029
876	2.13.2.6	231-00 Preberacie konanie	0 dni	30.4.2029	30.4.2029
878	**2.13.3**	**232-00 Oporný múr na D3 v km 26,080 - 26,370 vľavo**	**343 dni**	**29.4.2027**	**24.4.2028**
879	2.13.3.1	232-00 Oporný múr na D3 v km 26,080 - 26,370 vľavo	322 dni	29.4.2027	3.4.2028

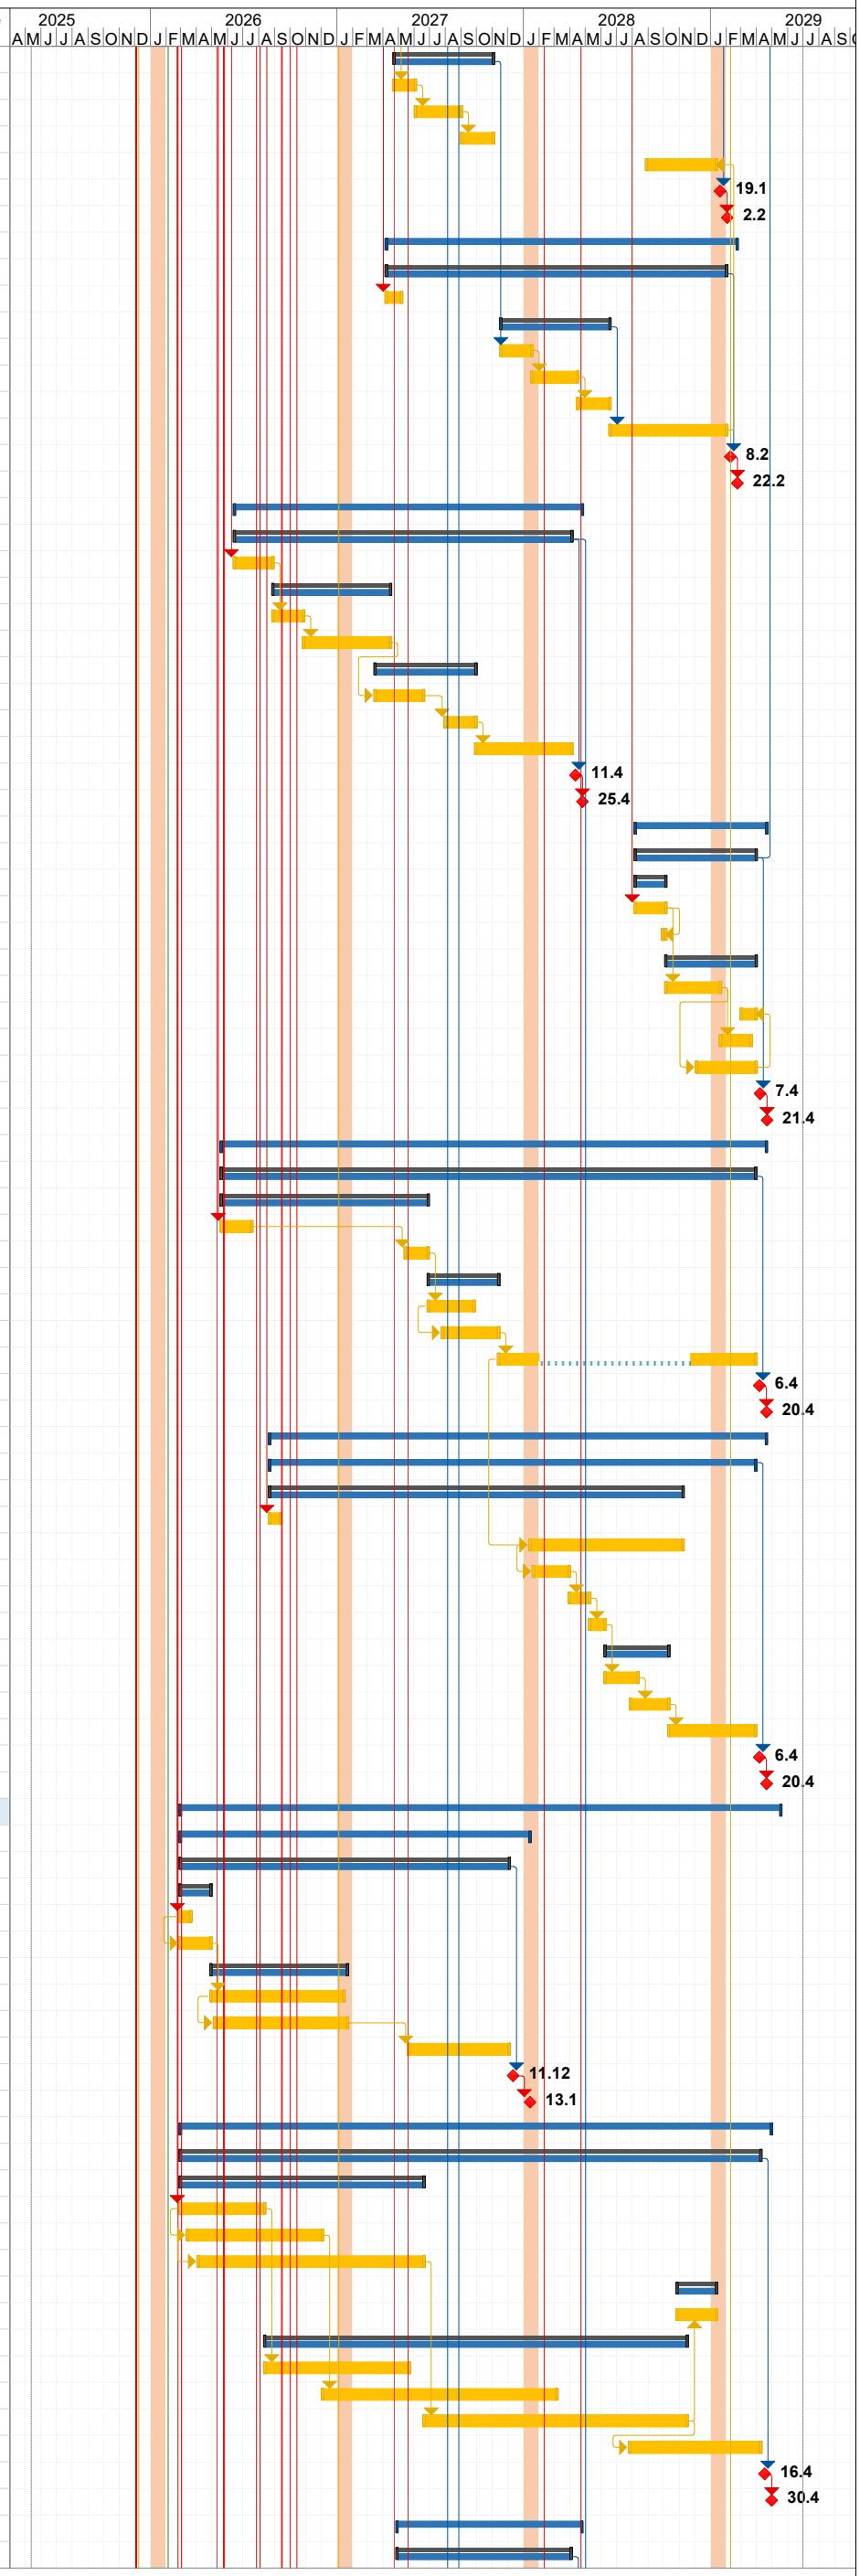

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
880	2.13.3.1.1	232-00 Hĺbkové zakladanie	80 dni	29.4.2027	17.7.2027
881	2.13.3.1.2	232-00 Základy	100 dni	27.5.2027	3.9.2027
882	2.13.3.1.3	232-00 Driek	160 dni	10.6.2027	16.11.2027
883	2.13.3.1.4	232-00 Príslušenstvo	120 dni	17.11.2027	3.4.2028
887	2.13.3.5	232-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.4.2028	10.4.2028
888	2.13.3.6	232-00 Preberacie konanie	0 dni	24.4.2028	24.4.2028
890	**2.13.4**	**233-00 Oporný múr na D3 v km 26,857 - 27,715 vľavo**	**604 dni**	**21.9.2026**	**24.6.2028**
891	**2.13.4.1**	**233-00 Oporný múr na D3 v km 26,857 - 27,715 vľavo**	**583 dni**	**21.9.2026**	**3.6.2028**
892	**2.13.4.1.1**	**233-00 km 27,095 - 27.435 (DC25 - DC58) 340m**	**261 dni**	**21.9.2026**	**28.6.2027**
893	2.13.4.1.1.1	233-00 Hĺbkové zakladanie	110 dni	21.9.2026	28.1.2027
894	2.13.4.1.1.2	233-00 Základy	148 dni	2.11.2026	18.4.2027
895	2.13.4.1.1.3	233-00 Driek	198 dni	23.11.2026	28.6.2027
896	**2.13.4.1.2**	**233-00 km 27.435 - 27,715 (DC59 - DC86) 280m**	**313 dni**	**29.1.2027**	**7.12.2027**
897	2.13.4.1.2.1	233-00 Hĺbkové zakladanie	90 dni	29.1.2027	28.4.2027
898	2.13.4.1.2.2	233-00 Základy	122 dni	19.4.2027	18.8.2027
899	2.13.4.1.2.3	233-00 Driek	162 dni	29.6.2027	7.12.2027
900	**2.13.4.1.3**	**233-00 km 26,857 - 27.095 (DC01 - DC24) 240m**	**337 dni**	**29.4.2027**	**18.4.2028**
901	2.13.4.1.3.1	233-00 Hĺbkové zakladanie	70 dni	29.4.2027	7.7.2027
902	2.13.4.1.3.2	233-00 Základy	108 dni	19.8.2027	4.12.2027
903	2.13.4.1.3.3	233-00 Driek	114 dni	8.12.2027	18.4.2028
904	2.13.4.1.4	233-00 Príslušenstvo	210 dni	19.10.2027	3.6.2028
908	2.13.4.5	233-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.6.2028	10.6.2028
909	2.13.4.6	233-00 Preberacie konanie	0 dni	24.6.2028	24.6.2028
911	**2.13.5**	**234-00 Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,285 50 vpravo**	**872 dni**	**21.10.2026**	**5.5.2029**
912	**2.13.5.1**	**234-00 Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,285 50 vpravo**	**851 dni**	**21.10.2026**	**14.4.2029**
913	2.13.5.1.1	234-00 Výkop	21 dni	21.10.2026	10.11.2026
914	2.13.5.1.2	234-00 Základy	60 dni	11.11.2026	29.1.2027
915	2.13.5.1.3	234-00 Driek	120 dni	30.1.2027	29.5.2027
916	2.13.5.1.4	234-00 Príslušenstvo	80 dni	25.1.2029	14.4.2029
920	2.13.5.5	234-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	21.4.2029	21.4.2029
921	2.13.5.6	234-00 Preberacie konanie	0 dni	5.5.2029	5.5.2029
923	**2.13.6**	**235-00 Oporný múr na D3 v km 28,780 - 29,280 vľavo**	**775 dni**	**17.2.2027**	**7.5.2029**
924	**2.13.6.1**	**235-00 Oporný múr na D3 v km 28,780 - 29,280 vľavo**	**754 dni**	**17.2.2027**	**16.4.2029**
925	2.13.6.1.1	235-00 Výkop	120 dni	17.2.2027	16.6.2027
926	2.13.6.1.2	235-00 Základy	250 dni	10.3.2027	14.11.2027
927	2.13.6.1.3	235-00 Driek	350 dni	9.5.2027	11.5.2028
928	2.13.6.1.4	235-00 Príslušenstvo	323 dni	12.5.2028	16.4.2029
932	2.13.6.5	235-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
933	2.13.6.6	235-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
935	**2.13.7**	**236-00 Oporný múr na D3 v km 31,299 - 31,445 vľavo**	**392 dni**	**26.5.2027**	**9.7.2028**
936	**2.13.7.1**	**236-00 Oporný múr na D3 v km 31,299 - 31,445 vľavo**	**371 dni**	**26.5.2027**	**18.6.2028**
937	2.13.7.1.1	236-00 Výkop	45 dni	26.5.2027	9.7.2027
938	2.13.7.1.2	236-00 Základy	90 dni	9.6.2027	6.9.2027
939	2.13.7.1.3	236-00 Driek	195 dni	8.8.2027	8.3.2028
940	2.13.7.1.4	236-00 Príslušenstvo	102 dni	9.3.2028	18.6.2028
944	2.13.7.5	236-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	25.6.2028	25.6.2028
945	2.13.7.6	236-00 Preberacie konanie	0 dni	9.7.2028	9.7.2028
947	**2.13.8**	**239-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316**	**873 dni**	**8.10.2026**	**23.4.2029**
948	**2.13.8.1**	**239-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316**	**852 dni**	**8.10.2026**	**2.4.2029**
949	**2.13.8.1.1**	**239-00 km 25,925 - 25,525 (DC90 - DC51) 400m**	**272 dni**	**8.10.2026**	**26.7.2027**
950	2.13.8.1.1.1	239-00 Klincovaný výkop	145 dni	8.10.2026	21.3.2027
951	2.13.8.1.1.2	239-00 Základy	125 dni	28.10.2026	21.3.2027
952	2.13.8.1.1.3	239-00 Driek	240 dni	9.11.2026	26.7.2027
953	**2.13.8.1.2**	**239-00 km 25,025 - 25,525 (DC01 - DC50) 500m**	**367 dni**	**22.3.2027**	**10.4.2028**
954	2.13.8.1.2.1	239-00 Klincovaný výkop	150 dni	22.3.2027	18.8.2027
955	2.13.8.1.2.2	239-00 Základy	150 dni	22.3.2027	18.8.2027
956	2.13.8.1.2.3	239-00 Driek	240 dni	27.7.2027	10.4.2028
957	**2.13.8.1.3**	**239-00 km 25,925 - 26,316 (DC91-DC129) 390m**	**459 dni**	**17.8.2027**	**6.12.2028**
958	2.13.8.1.3.1	239-00 Klincovaný výkop	40 dni	17.8.2027	25.9.2027
959	2.13.8.1.3.2	239-00 Základy	125 dni	19.8.2027	21.12.2027
960	2.13.8.1.3.3	239-00 Driek	240 dni	11.4.2028	6.12.2028
961	2.13.8.1.4	239-00 Príslušenstvo	300 dni	21.5.2028	2.4.2029
965	2.13.8.5	239-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	9.4.2029	9.4.2029
966	2.13.8.6	239-00 Preberacie konanie	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
968	**2.13.9**	**240-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625**	**876 dni**	**4.8.2026**	**20.2.2029**
969	**2.13.9.1**	**240-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625**	**855 dni**	**4.8.2026**	**30.1.2029**
970	**2.13.9.1.1**	**240-00 km 28,200 - 28,630 (DC01 - DC43) 430m**	**241 dni**	**4.8.2026**	**21.4.2027**
971	2.13.9.1.1.1	240-00 Násyp, výkop	60 dni	4.8.2026	2.10.2026
972	2.13.9.1.1.2	240-00 Základy	172 dni	18.8.2026	25.2.2027
973	2.13.9.1.1.3	240-00 Driek	215 dni	30.8.2026	21.4.2027
974	**2.13.9.1.2**	**240-00 km 28,630 - 29,625 (DC44 - DC142) 995m**	**559 dni**	**16.2.2027**	**15.9.2028**
975	2.13.9.1.2.1	240-00 Výkop	80 dni	16.2.2027	6.5.2027
976	2.13.9.1.2.2	240-00 Základy	392 dni	26.2.2027	11.4.2028
977	2.13.9.1.2.3	240-00 Driek	494 dni	22.4.2027	15.9.2028
978	2.13.9.1.3	240-00 Príslušenstvo	280 dni	9.4.2028	30.1.2029
982	2.13.9.5	240-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.2.2029	6.2.2029
983	2.13.9.6	240-00 Preberacie konanie	0 dni	20.2.2029	20.2.2029
985	**2.13.10**	**250-00 Zárubný múr na D3 v km 25,140 - 25,902 vpravo**	**981 dni**	**30.5.2026**	**31.3.2029**
986	**2.13.10.1**	**250-00 Zárubný múr na D3 v km 25,140 - 25,902 vpravo**	**960 dni**	**30.5.2026**	**10.3.2029**
987	**2.13.10.1.1**	**250-00 Úsek I - km 25,902 - 25,512**	**489 dni**	**28.5.2027**	**16.10.2028**
988	**2.13.10.1.1.1**	**250-00 Úsek I - 2. stupeň**	**289 dni**	**28.5.2027**	**30.3.2028**
989	2.13.10.1.1.1.1	250-00 Klincovaný výkop 2. stupeň	120 dni	28.5.2027	24.9.2027
990	2.13.10.1.1.1.2	250-00 Horný kotevný prah 50+170m	110 dni	26.8.2027	13.12.2027
991	2.13.10.1.1.1.3	250-00 Lanové kotvy	100 dni	23.9.2027	19.1.2028
992	2.13.10.1.1.1.4	250-00 Pohľadový betón DC100 -DC67, DC112 - DC103	150 dni	14.10.2027	30.3.2028
993	**2.13.10.1.1.2**	**250-00 Úsek I - 1. stupeň**	**319 dni**	**14.11.2027**	**16.10.2028**
994	2.13.10.1.1.2.1	250-00 Klincovaný výkop 1. stupeň	120 dni	14.11.2027	31.3.2028
995	2.13.10.1.1.2.2	250-00 Dolný kotevný prah 295m	150 dni	2.3.2028	29.7.2028
996	2.13.10.1.1.2.3	250-00 Lanové kotvy	120 dni	30.3.2028	27.7.2028
997	2.13.10.1.1.2.4	250-00 Pohľadový betón DC126 - DC102, DC100 - DC67	180 dni	20.4.2028	16.10.2028
998	2.13.10.1.1.2.5	250-00 Gravitačný múr - základ 85+15m (DC134-DC127, DC1	150 dni	1.4.2028	28.8.2028
999	2.13.10.1.1.2.6	250-00 Gravitačný múr - driek 85+15m (DC134-DC127, DC10	180 dni	16.3.2028	11.9.2028
1000	**2.13.10.1.2**	**250-00 Úsek II - km 25,140 - 25,512**	**960 dni**	**30.5.2026**	**10.3.2029**
1001	**2.13.10.1.2.1**	**250-00 Úsek II - 3. stupeň**	**177 dni**	**30.5.2026**	**22.11.2026**
1002	2.13.10.1.2.1.1	250-00 Odkop	40 dni	30.5.2026	8.7.2026

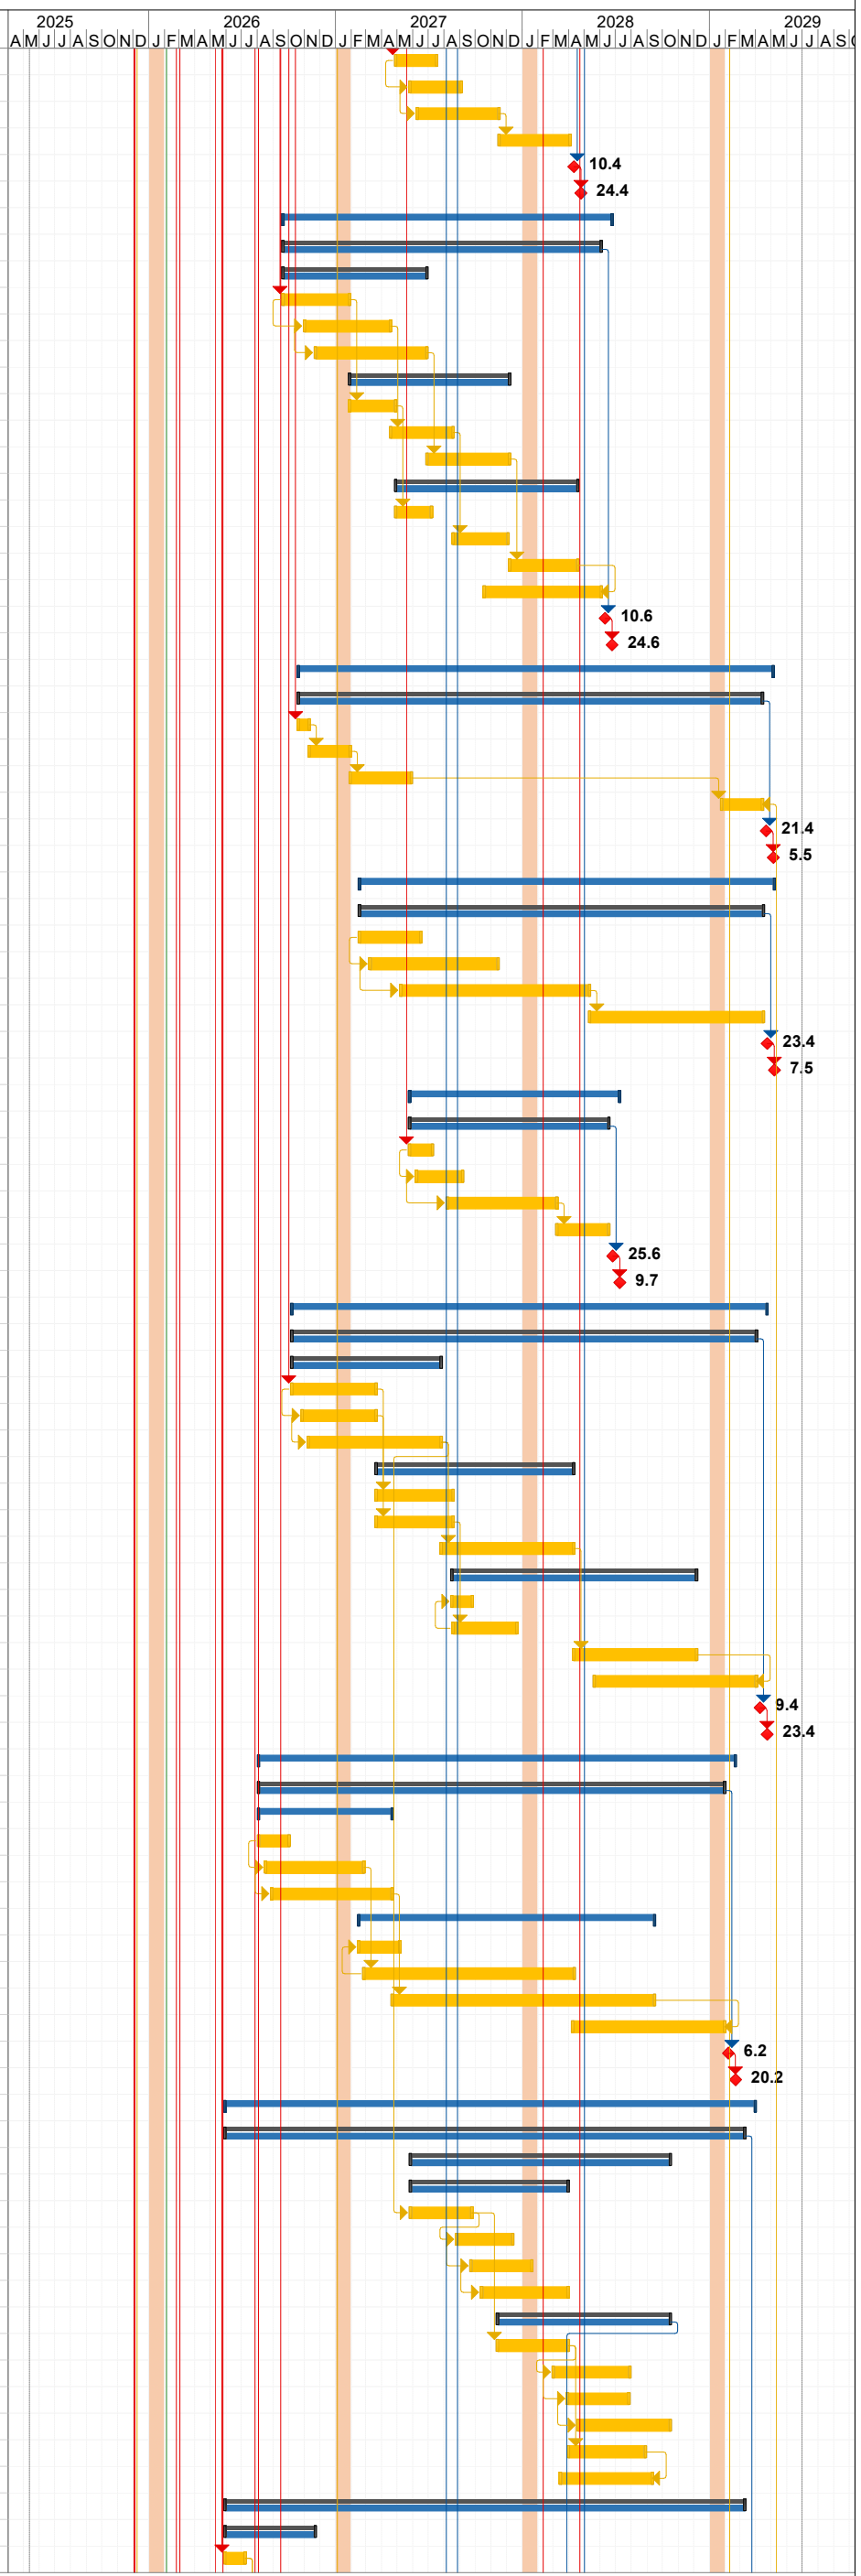

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1003	2.13.10.1.2.1.2	250-00 Kotevný prah (vrátane lanových kotiev)	67 dni	9.7.2026	13.9.2026
1004	2.13.10.1.2.1.3	250-00 Pohľadový betón	70 dni	14.9.2026	22.11.2026
1005	**2.13.10.1.2.2**	**250-00 Úsek II - 2. stupeň**	**289 dni**	**9.7.2026**	**13.5.2027**
1006	2.13.10.1.2.2.1	250-00 Klincovaný výkop 2. stupeň	120 dni	9.7.2026	5.11.2026
1007	2.13.10.1.2.2.2	250-00 Horný kotevný prah 275m	120 dni	7.10.2026	23.2.2027
1008	2.13.10.1.2.2.3	250-00 Lanové kotvy	120 dni	4.11.2026	23.3.2027
1009	2.13.10.1.2.2.4	250-00 Pohľadový betón DC10 - DC64	150 dni	25.11.2026	13.5.2027
1010	**2.13.10.1.2.3**	**250-00 Úsek II - 1. stupeň**	**269 dni**	**23.2.2027**	**18.11.2027**
1011	2.13.10.1.2.3.1	250-00 Klincovaný výkop 1. stupeň	120 dni	23.2.2027	22.6.2027
1012	2.13.10.1.2.3.2	250-00 Dolný kotevný prah 295m	120 dni	4.5.2027	31.8.2027
1013	2.13.10.1.2.3.3	250-00 Lanové kotvy	120 dni	1.6.2027	28.9.2027
1014	2.13.10.1.2.3.4	250-00 Pohľadový betón DC108 - DC66	150 dni	22.6.2027	18.11.2027
1015	2.13.10.1.2.3.5	250-00 Gravitačný múr - základ 75m (DC01-DC07)	75 dni	23.6.2027	5.9.2027
1016	2.13.10.1.2.3.6	250-00 Gravitačný múr - driek 75m (DC01-DC07)	100 dni	12.6.2027	19.9.2027
1017	2.13.10.1.2.4	250-00 Príslušenstvo	298 dni	30.4.2028	10.3.2029
1021	2.13.10.5	250-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.3.2029	17.3.2029
1022	2.13.10.6	250-00 Preberacie konanie	0 dni	31.3.2029	31.3.2029
1024	**2.13.11**	**251-00 Zárubný múr na D3 v km 25,930 - 26,020 vpravo**	**365 dni**	**17.2.2028**	**4.3.2029**
1025	**2.13.11.1**	**251-00 Zárubný múr na D3 v km 25,930 - 26,020 vpravo**	**344 dni**	**17.2.2028**	**11.2.2029**
1026	2.13.11.1.1	251-00 Klincovaný výkop	50 dni	17.2.2028	6.4.2028
1027	2.13.11.1.2	251-00 Základy DC01 - DC08	90 dni	7.4.2028	5.7.2028
1028	2.13.11.1.3	251-00 Driek DC01-DC08	120 dni	6.7.2028	2.11.2028
1029	2.13.11.1.4	251-00 Príslušenstvo	120 dni	28.9.2028	11.2.2029
1033	2.13.11.5	251-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	18.2.2029	18.2.2029
1034	2.13.11.6	251-00 Preberacie konanie	0 dni	4.3.2029	4.3.2029
1036	**2.13.12**	**252-00 Zárubný múr na D3 v km 26,150 - 26,480 vpravo**	**921 dni**	**3.8.2026**	**5.4.2029**
1037	**2.13.12.1**	**252-00 Zárubný múr na D3 v km 26,150 - 26,480 vpravo**	**900 dni**	**3.8.2026**	**15.3.2029**
1038	**2.13.12.1.1**	**252-00 2. stupeň**	**390 dni**	**3.8.2026**	**16.9.2027**
1039	2.13.12.1.1.1	252-00 Klincovaný výkop 2. stupeň	120 dni	3.8.2026	30.11.2026
1040	2.13.12.1.1.2	252-00 Horný základ - 197m	90 dni	1.11.2026	18.2.2027
1041	2.13.12.1.1.3	252-00 Zvislé rebrá	150 dni	19.2.2027	18.7.2027
1042	2.13.12.1.1.4	252-00 Pohľadové gabióny	150 dni	20.4.2027	16.9.2027
1043	**2.13.12.1.2**	**252-00 1. stupeň**	**498 dni**	**9.6.2027**	**6.11.2028**
1044	2.13.12.1.2.1	252-00 Klincovaný výkop 1. stupeň	180 dni	9.6.2027	5.12.2027
1045	2.13.12.1.2.2	252-00 Spodný základ - 295m	120 dni	28.8.2027	13.1.2028
1046	2.13.12.1.2.3	252-00 Odvodňovacie vrty	90 dni	14.1.2028	12.4.2028
1047	2.13.12.1.2.4	252-00 Základový múr - 295m	120 dni	30.3.2028	27.7.2028
1048	2.13.12.1.2.5	252-00 Zvislé rebrá	180 dni	20.4.2028	16.10.2028
1049	2.13.12.1.2.6	252-00 Pohľadové gabióny	180 dni	11.5.2028	6.11.2028
1050	**2.13.12.1.3**	**252-00 Gravitačný múr 4 DC - spolu 35,37m**	**120 dni**	**14.1.2028**	**12.5.2028**
1051	2.13.12.1.3.1	252-00 Základy	60 dni	14.1.2028	13.3.2028
1052	2.13.12.1.3.2	252-00 Driek	60 dni	14.3.2028	12.5.2028
1053	2.13.12.1.4	252-00 Príslušenstvo	212 dni	30.7.2028	15.3.2029
1057	2.13.12.5	252-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	22.3.2029	22.3.2029
1058	2.13.12.6	252-00 Preberacie konanie	0 dni	5.4.2029	5.4.2029
1060	**2.13.13**	**253-00 Zárubný múr na D3 v km 28,630 - 29,640 vpravo**	**1111 dni**	**9.3.2026**	**18.5.2029**
1061	**2.13.13.1**	**253-00 Zárubný múr na D3 v km 28,630 - 29,640 vpravo**	**1090 dni**	**9.3.2026**	**27.4.2029**
1062	**2.13.13.1.1**	**253-00 3. stupeň**	**370 dni**	**9.3.2026**	**2.4.2027**
1063	2.13.13.1.1.1	253-00 Výkop 3. stupeň	90 dni	9.3.2026	6.6.2026
1064	2.13.13.1.1.2	253-00 Úprava svahu	280 dni	7.6.2026	2.4.2027
1065	**2.13.13.1.2**	**253-00 2.stupeň**	**518 dni**	**7.6.2026**	**26.11.2027**
1066	2.13.13.1.2.1	253-00 Klincovaný výkop 2. stupeň	300 dni	7.6.2026	22.4.2027
1067	2.13.13.1.2.2	253-00 Horný kotevný veniec	220 dni	5.10.2026	1.6.2027
1068	2.13.13.1.2.3	253-00 Lanové kotvy	220 dni	2.11.2026	29.6.2027
1069	2.13.13.1.2.4	253-00 Zvislé rebrá	250 dni	21.1.2027	27.9.2027
1070	2.13.13.1.2.5	253-00 Pohľadové gabióny	250 dni	22.3.2027	26.11.2027
1071	**2.13.13.1.3**	**253-00 1. stupeň**	**638 dni**	**23.4.2027**	**24.2.2029**
1072	2.13.13.1.3.1	253-00 Klincovaný výkop 1. stupeň	350 dni	23.4.2027	25.4.2028
1073	2.13.13.1.3.2	253-00 Odvodňovacie vrty	180 dni	10.10.2027	25.4.2028
1074	2.13.13.1.3.3	253-00 Dolný kotevný veniec	280 dni	7.11.2027	31.8.2028
1075	2.13.13.1.3.4	253-00 Lanové kotvy	280 dni	5.12.2027	28.9.2028
1076	2.13.13.1.3.5	253-00 Zvislé rebrá	320 dni	25.1.2028	9.12.2028
1077	2.13.13.1.3.6	253-00 Pohľadové gabióny	320 dni	25.3.2028	24.2.2029
1078	2.13.13.1.4	253-00 Príslušenstvo	450 dni	17.1.2028	27.4.2029
1082	2.13.13.5	253-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	4.5.2029	4.5.2029
1083	2.13.13.6	253-00 Preberacie konanie	0 dni	18.5.2029	18.5.2029
1085	**2.13.14**	**254-00 Zárubný múr na D3 v km 30,335 - 30,649 vpravo**	**1041 dni**	**17.5.2026**	**17.5.2029**
1086	**2.13.14.1**	**254-00 Zárubný múr na D3 v km 30,335 - 30,649 vpravo**	**1020 dni**	**17.5.2026**	**26.4.2029**
1087	**2.13.14.1.1**	**254-00 Etapa 1**	**670 dni**	**17.5.2026**	**24.4.2028**
1088	2.13.14.1.1.1	254-00 Odkop svahu nad múrom	90 dni	17.5.2026	14.8.2026
1089	2.13.14.1.1.2	254-00 Klincovaný výkop horný stupeň (po ZŠ DC01 - DC 17)	180 dni	15.8.2026	2.3.2027
1090	2.13.14.1.1.3	254-00 Odvodňovacie vrty	100 dni	3.3.2027	10.6.2027
1091	2.13.14.1.1.4	254-00 Pohľadový betón DC01-DC17	150 dni	11.6.2027	7.11.2027
1092	2.13.14.1.1.5	254-00 Pohľadový betón DC18-DC36 - horná časť	150 dni	8.11.2027	24.4.2028
1093	**2.13.14.1.2**	**254-00 Spodný stupeň**	**550 dni**	**3.3.2027**	**21.9.2028**
1094	2.13.14.1.2.1	254-00 Klincovaný výkop dolný stupeň (ZŠ DC 18 - DC36)	180 dni	3.3.2027	29.8.2027
1095	2.13.14.1.2.2	254-00 Pohľadový betón DC18-DC36 - dolná časť	150 dni	25.4.2028	21.9.2028
1096	2.13.14.1.3	254-00 Príslušenstvo	250 dni	3.8.2028	26.4.2029
1100	2.13.14.5	254-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	3.5.2029	3.5.2029
1101	2.13.14.6	254-00 Preberacie konanie	0 dni	17.5.2029	17.5.2029
1103	**2.13.15**	**260-00 Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci**	**399 dni**	**1.6.2026**	**24.7.2027**
1104	**2.13.15.1**	**260-00 Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci**	**378 dni**	**1.6.2026**	**3.7.2027**
1105	**2.13.15.1.1**	**260-00 Typ A km 0,025 – km 0,075 (DC01 - DC05)**	**306 dni**	**1.7.2026**	**22.5.2027**
1106	2.13.15.1.1.1	260-00 Zemné práce	30 dni	1.7.2026	30.7.2026
1107	2.13.15.1.1.2	260-00 Búracie práce	30 dni	31.7.2026	29.8.2026
1108	2.13.15.1.1.3	260-00 Základy	45 dni	19.12.2026	21.2.2027
1109	2.13.15.1.1.4	260-00 Driek	90 dni	22.2.2027	22.5.2027
1110	**2.13.15.1.2**	**260-00 Typ B km 0,075 – km 0,275 (DC06 - DC25)**	**215 dni**	**1.6.2026**	**21.1.2027**
1111	2.13.15.1.2.1	260-00 Zemné práce	30 dni	1.6.2026	30.6.2026
1112	2.13.15.1.2.2	260-00 Základy	90 dni	1.7.2026	28.9.2026
1113	2.13.15.1.2.3	260-00 Driek	150 dni	22.7.2026	18.12.2026
1114	2.13.15.1.2.4	260-00 Konzola	75 dni	19.10.2026	21.1.2027
1115	2.13.15.1.3	260-00 Príslušenstvo	180 dni	16.12.2026	3.7.2027
1119	2.13.15.5	260-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.7.2027	10.7.2027
1120	2.13.15.6	260-00 Preberacie konanie	0 dni	24.7.2027	24.7.2027

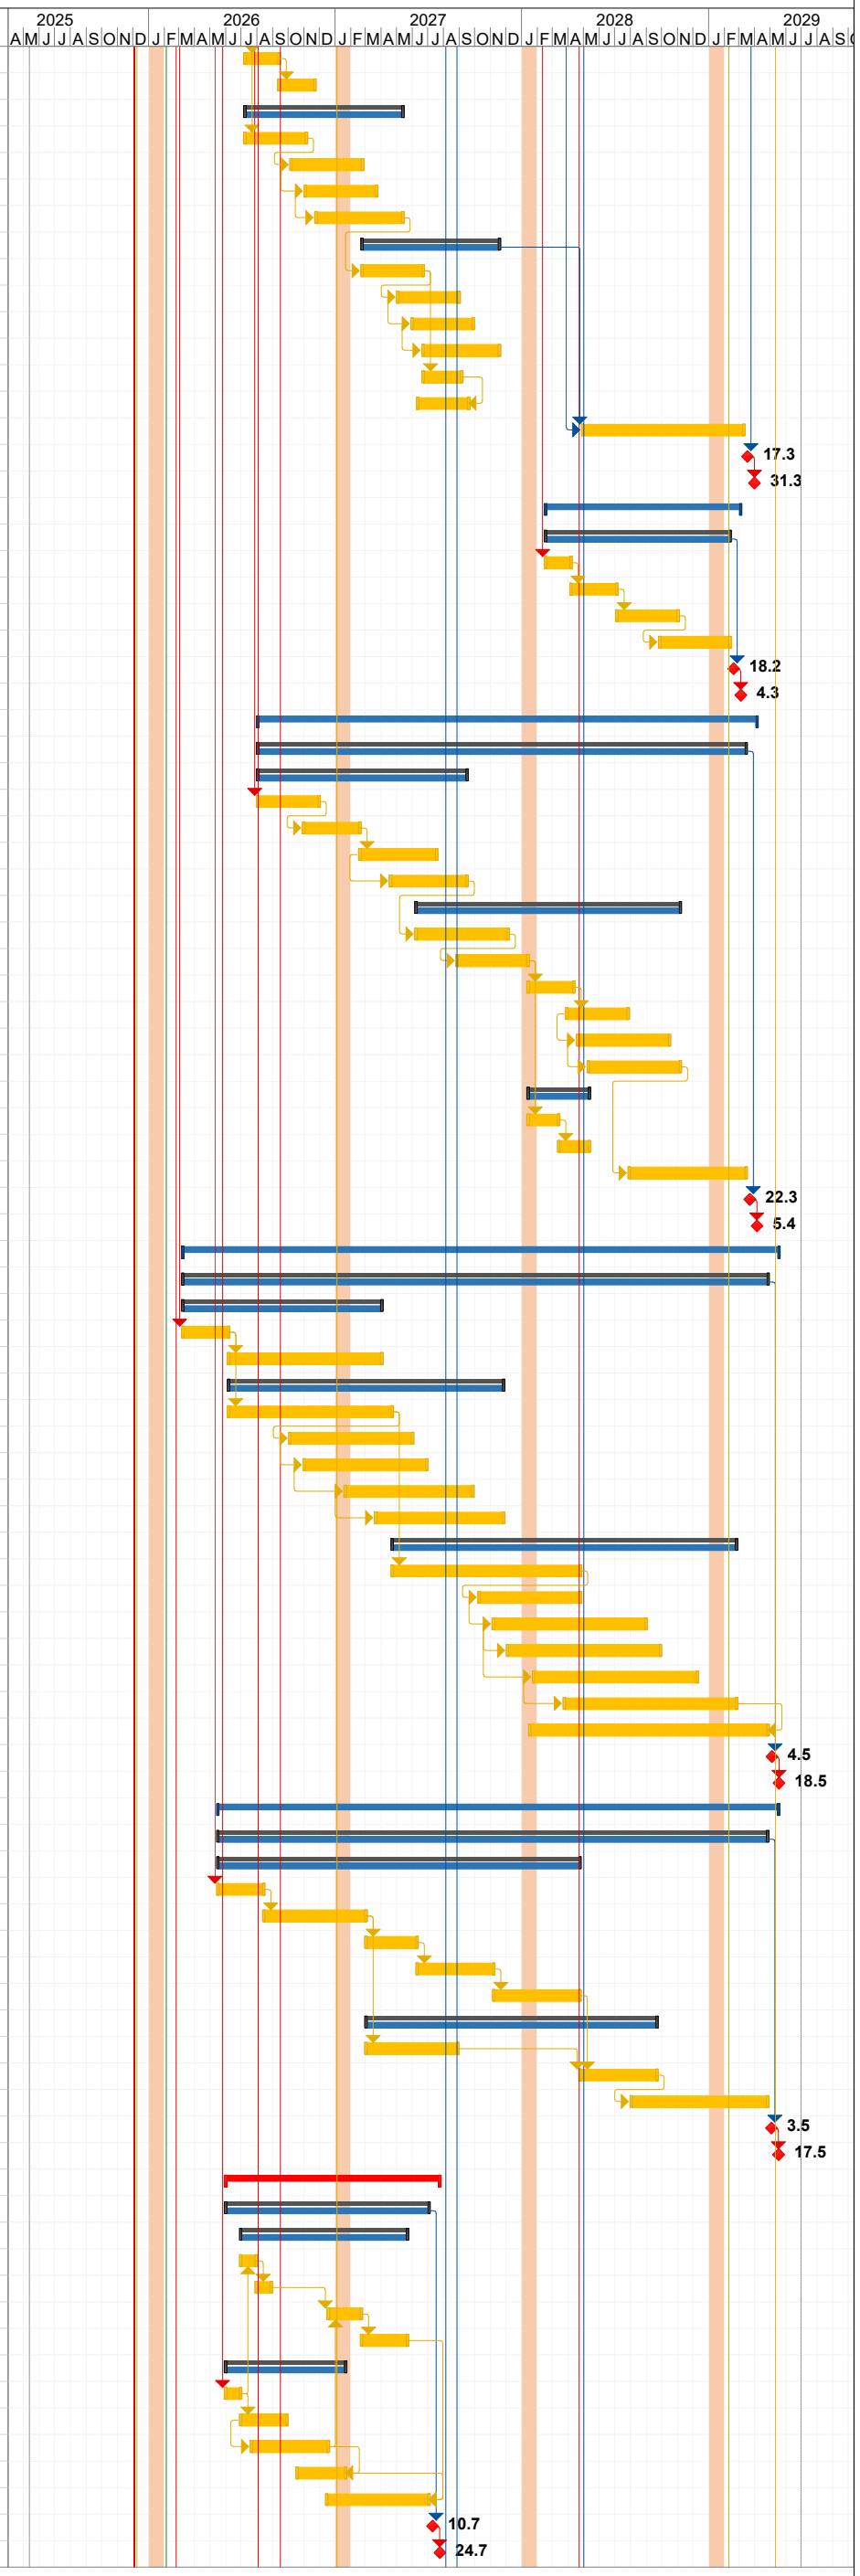

Súhrn | Úloha | Kritická cesta | Rozdeliť | Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1122	**2.13.16**	**261-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 pri ČOV Krásno nad Kysucou**	**797 dni**	**2.3.2026**	**14.6.2028**
1123	**2.13.16.1**	**261-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 pri ČOV Krásno nad Kysucou**	**776 dni**	**2.3.2026**	**24.5.2028**
1124	**2.13.16.1.1**	**261-00 Etapa 1 - po korunu 1. stupňa**	**250 dni**	**2.3.2026**	**6.11.2026**
1125	2.13.16.1.1.1	261-00 Klincovaný výkop a založenie 1. stupeň	90 dni	2.3.2026	30.5.2026
1126	2.13.16.1.1.2	261-00 Pohľadové panely, geomreže, zásyp	160 dni	31.5.2026	6.11.2026
1127	2.13.16.1.1.3	261-00 Inštalácia kotevných tyčí	120 dni	10.6.2026	7.10.2026
1128	**2.13.16.1.2**	**261-00 Etapa 2 - po korunu 2. stupňa**	**133 dni**	**7.11.2026**	**8.4.2027**
1129	2.13.16.1.2.1	261-00 Klincovaný výkop a založenie 2. stupeň	28 dni	7.11.2026	4.12.2026
1130	2.13.16.1.2.2	261-00 Pohľadové panely, geomreže, zásyp	105 dni	5.12.2026	8.4.2027
1131	**2.13.16.1.3**	**261-00 Etapa 3 - po korunu 3. stupňa**	**105 dni**	**9.4.2027**	**22.7.2027**
1132	2.13.16.1.3.1	261-00 Založenie 3. stupňa	15 dni	9.4.2027	23.4.2027
1133	2.13.16.1.3.2	261-00 Pohľ panely, geomreže, zásyp	90 dni	24.4.2027	22.7.2027
1134	2.13.16.1.4	261-00 Príslušenstvo	288 dni	23.7.2027	24.5.2028
1138	2.13.16.5	261-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	31.5.2028	31.5.2028
1139	2.13.16.6	261-00 Preberacie konanie	0 dni	14.6.2028	14.6.2028
1141	**2.13.17**	**262-00 Oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovci**	**414 dni**	**22.9.2026**	**29.11.2027**
1142	**2.13.17.1**	**262-00 Oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovci**	**393 dni**	**22.9.2026**	**8.11.2027**
1143	**2.13.17.1.1**	**262-00 Založenie**	**89 dni**	**22.9.2026**	**19.12.2026**
1144	2.13.17.1.1.1	262-00 Zemné práce	45 dni	22.9.2026	5.11.2026
1145	2.13.17.1.1.2	262-00 Základ múru 148,5m	75 dni	6.10.2026	19.12.2026
1146	**2.13.17.1.2**	**262-00 Konštrukcia múru**	**264 dni**	**21.10.2026**	**31.7.2027**
1147	2.13.17.1.2.1	262-00 Pohľadové tvarovky + geomreže	250 dni	21.10.2026	17.7.2027
1148	2.13.17.1.2.2	262-00 Zásyp	250 dni	4.11.2026	31.7.2027
1149	2.13.17.1.3	262-00 Príslušenstvo	220 dni	3.4.2027	8.11.2027
1153	2.13.17.5	262-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	15.11.2027	15.11.2027
1154	2.13.17.6	262-00 Preberacie konanie	0 dni	29.11.2027	29.11.2027
1156	**2.14**	**Protihlukové opatrenia**	**962 dni**	**23.7.2026**	**5.5.2029**
1157	**2.14.1**	**290-02 Protihluková stena na D3 v km 22,300 - 23,506 vpravo**	**223 dni**	**6.4.2028**	**14.11.2028**
1158	2.14.1.1	290-02 Protihluková stena na D3 v km 22,300 - 23,506 vpravo	202 dni	6.4.2028	24.10.2028
1162	2.14.1.5	290-02 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	31.10.2028	31.10.2028
1163	2.14.1.6	290-02 Preberacie konanie	0 dni	14.11.2028	14.11.2028
1165	**2.14.2**	**290-03 Protihluková stena na D3 v km 23,244 - 24,156 vľavo**	**187 dni**	**19.9.2028**	**10.4.2029**
1166	2.14.2.1	290-03 Protihluková stena na D3 v km 23,244 - 24,156 vľavo	166 dni	19.9.2028	20.3.2029
1170	2.14.2.5	290-03 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	27.3.2029	27.3.2029
1171	2.14.2.6	290-03 Preberacie konanie	0 dni	10.4.2029	10.4.2029
1173	**2.14.3**	**290-04 Protihluková stena na D3 v km 24,364 - 25,380 vľavo**	**187 dni**	**7.2.2028**	**11.8.2028**
1174	2.14.3.1	290-04 Protihluková stena na D3 v km 24,364 - 25,380 vľavo	166 dni	7.2.2028	21.7.2028
1178	2.14.3.5	290-04 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.7.2028	28.7.2028
1179	2.14.3.6	290-04 Preberacie konanie	0 dni	11.8.2028	11.8.2028
1181	**2.14.4**	**290-05 Protihluková stena na D3 v km 25,380 - 26,400 vľavo**	**177 dni**	**16.6.2028**	**9.12.2028**
1182	2.14.4.1	290-05 Protihluková stena na D3 v km 25,380 - 26,400 vľavo	156 dni	16.6.2028	18.11.2028
1186	2.14.4.5	290-05 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	25.11.2028	25.11.2028
1187	2.14.4.6	290-05 Preberacie konanie	0 dni	9.12.2028	9.12.2028
1189	**2.14.5**	**290-06 Protihluková stena na D3 v km 25,081 - 26,254 v strednom pás**	**187 dni**	**16.6.2028**	**19.12.2028**
1190	2.14.5.1	290-06 Protihluková stena na D3 v km 25,081 - 26,254 v strednom pás	166 dni	16.6.2028	28.11.2028
1194	2.14.5.5	290-06 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.12.2028	5.12.2028
1195	2.14.5.6	290-06 Preberacie konanie	0 dni	19.12.2028	19.12.2028
1197	**2.14.6**	**290-07 Protihluková stena na ceste I/11 v km 0,000 - 0,879 vľavo**	**946 dni**	**23.7.2026**	**19.4.2029**
1198	2.14.6.1	290-07 Protihluková stena na ceste I/11 v km 0,000 - 0,879 vľavo	925 dni	23.7.2026	29.3.2029
1202	2.14.6.5	290-07 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.4.2029	5.4.2029
1203	2.14.6.6	290-07 Preberacie konanie	0 dni	19.4.2029	19.4.2029
1205	**2.14.7**	**290-09 Protihluková stena na D3 v km 26,400 - 28,556 vľavo**	**187 dni**	**14.10.2028**	**5.5.2029**
1206	2.14.7.1	290-09 Protihluková stena na D3 v km 26,400 - 28,556 vľavo	166 dni	14.10.2028	14.4.2029
1210	2.14.7.5	290-09 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	21.4.2029	21.4.2029
1211	2.14.7.6	290-09 Preberacie konanie	0 dni	5.5.2029	5.5.2029
1213	**2.14.8**	**290-10 Protihluková stena na D3 v km 26,483 - 28,440 vpravo**	**187 dni**	**14.10.2028**	**5.5.2029**
1214	2.14.8.1	290-10 Protihluková stena na D3 v km 26,483 - 28,440 vpravo	166 dni	14.10.2028	14.4.2029
1218	2.14.8.5	290-10 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	21.4.2029	21.4.2029
1219	2.14.8.6	290-10 Preberacie konanie	0 dni	5.5.2029	5.5.2029
1221	**2.14.9**	**290-11 Protihluková stena na D3 v km 29,046 - 30,977 vľavo**	**217 dni**	**26.5.2028**	**14.1.2029**
1222	2.14.9.1	290-11 Protihluková stena na D3 v km 29,046 - 30,977 vľavo	196 dni	26.5.2028	7.12.2028
1226	2.14.9.5	290-11 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	14.12.2028	14.12.2028
1227	2.14.9.6	290-11 Preberacie konanie	0 dni	14.1.2029	14.1.2029
1229	**2.14.10**	**290-12 Protihluková stena na D3 v km 29,640 - 29,931 vpravo**	**137 dni**	**7.3.2028**	**21.7.2028**
1230	2.14.10.1	290-12 Protihluková stena na D3 v km 29,640 - 29,931 vpravo	116 dni	7.3.2028	30.6.2028
1234	2.14.10.5	290-12 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.7.2028	7.7.2028
1235	2.14.10.6	290-12 Preberacie konanie	0 dni	21.7.2028	21.7.2028
1237	**2.14.11**	**290-13 Protihluková stena na D3 v km 30,619 -31,430 vpravo**	**481 dni**	**28.11.2027**	**27.4.2029**
1238	2.14.11.1	290-13 Protihluková stena na D3 v km 30,619 -31,430 vpravo	460 dni	28.11.2027	6.4.2029
1242	2.14.11.5	290-13 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.4.2029	13.4.2029
1243	2.14.11.6	290-13 Preberacie konanie	0 dni	27.4.2029	27.4.2029
1245	**2.14.12**	**290-14 Protihluková stena na vetve A a vetve B v križovatke Krásno n/K**	**137 dni**	**17.10.2028**	**19.3.2029**
1246	2.14.12.1	290-14 Protihluková stena na vetve A a vetve B v križovatke Krásno n/I	116 dni	17.10.2028	26.2.2029
1250	2.14.12.5	290-14 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.3.2029	5.3.2029
1251	2.14.12.6	290-14 Preberacie konanie	0 dni	19.3.2029	19.3.2029
1253	**2.14.13**	**290-17 Protihluková stena na úprave cesty I/11 v km 0,000 - 0,300**	**131 dni**	**27.9.2028**	**21.2.2029**
1254	2.14.13.1	290-17 Protihluková stena na úprave cesty I/11 v km 0,000 - 0,300	110 dni	27.9.2028	31.1.2029
1258	2.14.13.5	290-17 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.2.2029	7.2.2029
1259	2.14.13.6	290-17 Preberacie konanie	0 dni	21.2.2029	21.2.2029
1261	**2.15**	**Oplotenia**	**312 dni**	**3.6.2028**	**27.4.2029**
1262	**2.15.1**	**301-00 Oplotenie diaľnice D3**	**312 dni**	**3.6.2028**	**27.4.2029**
1263	2.15.1.1	301-00 Oplotenie diaľnice D3	291 dni	3.6.2028	6.4.2029
1267	2.15.1.5	301-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.4.2029	13.4.2029
1268	2.15.1.6	301-00 Preberacie konanie	0 dni	27.4.2029	27.4.2029
1270	**2.15.2**	**302-00 Náhradné oplotenie v Krásne n/K**	**142 dni**	**20.11.2028**	**27.4.2029**
1271	2.15.2.1	302-00 Náhradné oplotenie v Krásne n/K	121 dni	20.11.2028	6.4.2029
1275	2.15.2.5	302-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.4.2029	13.4.2029
1276	2.15.2.6	302-00 Preberacie konanie	0 dni	27.4.2029	27.4.2029
1278	**2.15.3**	**303-00 Oplotenie cesty I/11**	**312 dni**	**3.6.2028**	**27.4.2029**
1279	2.15.3.1	303-00 Oplotenie cesty I/11	291 dni	3.6.2028	6.4.2029
1283	2.15.3.5	303-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.4.2029	13.4.2029
1284	2.15.3.6	303-00 Preberacie konanie	0 dni	27.4.2029	27.4.2029

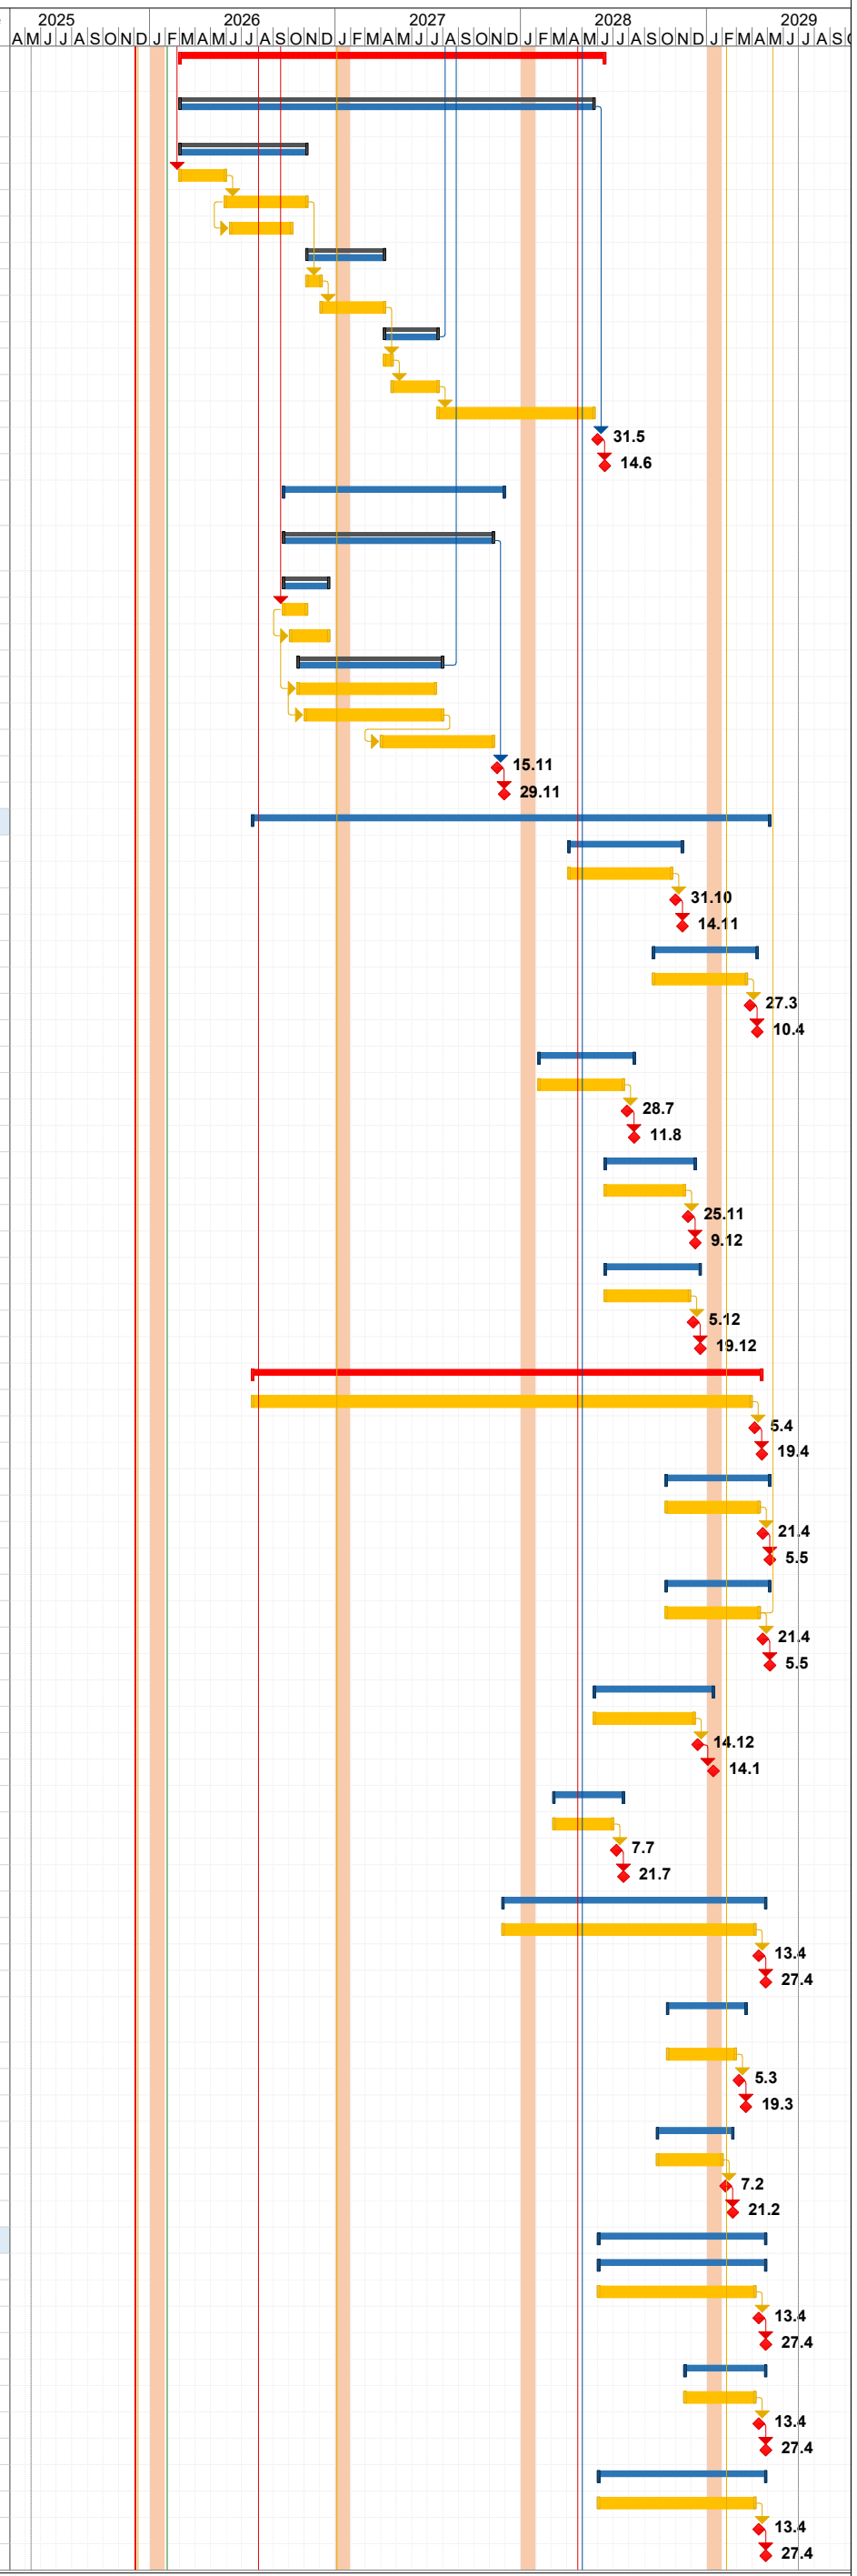

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1286	**2.16**	**Odpočívadlo**	**1040 dni**	**27.4.2026**	**26.4.2029**
1287	2.16.1	311-01 Sadovnícke úpravy	120 dni	20.11.2028	5.4.2029
1288	2.16.2	311-02 Terénne úpravy	1000 dni	27.4.2026	17.3.2029
1289	2.16.3	311-11 Spevnené plochy	172 dni	14.9.2028	21.3.2029
1290	2.16.4	311-31 Drobná architektúra	50 dni	16.1.2029	6.3.2029
1291	2.16.5	311-51 Vonkajšia kanalizácia dažďová a odlučovač ropných látok	90 dni	3.9.2028	1.12.2028
1292	2.16.6	311-53 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo	846 dni	25.5.2026	25.10.2028
1293	2.16.7	311-61 Prípojka VN - 22 kV pre ts odpočívadlo Krásno nad Kysucou	85 dni	26.9.2028	19.12.2028
1294	2.16.8	311-62 Kiosková trafostanica	60 dni	30.10.2028	14.1.2029
1295	2.16.9	311-63 Vonkajšie osvetlenie	160 dni	9.10.2028	3.4.2029
1296	2.16.10	311-64 NN prípojka k dynamickým váham	75 dni	16.10.2028	15.1.2029
1297	2.16.11	311-65 Telefónna prípojka pre odpočívadlo	45 dni	14.8.2028	27.9.2028
1298	2.16.12	311-66 Nabíjacie stanice pre elektromobily	123 dni	12.11.2028	31.3.2029
1299	2.16.13	311-67 NN prípojka pre čerpaciu stanicu	75 dni	9.10.2028	8.1.2029
1300	2.16.14	311-71 Plynovodná prípojka NTL pre odpočívadlo	60 dni	4.11.2026	22.1.2027
1301	2.16.15	311-80 Korporátne toalety	280 dni	13.6.2028	5.4.2029
1305	2.16.19	311-XX Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	12.4.2029	12.4.2029
1306	2.16.20	311-XX Preberacie konanie	0 dni	26.4.2029	26.4.2029
1308	**2.17**	**Kanalizácie**	**1098 dni**	**8.1.2026**	**6.3.2029**
1309	**2.17.1**	**501-00 Kanalizácia diaľnice km 22,300 – 31,925**	**1098 dni**	**8.1.2026**	**6.3.2029**
1310	2.17.1.1	501-00 Kanalizácia diaľnice km 22,300 – 31,925	1077 dni	8.1.2026	13.2.2029
1314	2.17.1.5	501-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	20.2.2029	20.2.2029
1315	2.17.1.6	501-00 Preberacie konanie	0 dni	6.3.2029	6.3.2029
1317	**2.17.2**	**502-00 Dažďová kanalizácia cesty II/520 v Krásne n/K**	**170 dni**	**19.11.2026**	**27.5.2027**
1318	2.17.2.1	502-00 Dažďová kanalizácia cesty II/520 v Krásne n/K	149 dni	19.11.2026	6.5.2027
1322	2.17.2.5	502-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.5.2027	13.5.2027
1323	2.17.2.6	502-00 Preberacie konanie	0 dni	27.5.2027	27.5.2027
1325	**2.17.3**	**503-00 Dažďová kanalizácia cesty I/11**	**591 dni**	**29.3.2027**	**27.11.2028**
1326	2.17.3.1	503-00 Dažďová kanalizácia cesty I/11	570 dni	29.3.2027	6.11.2028
1330	2.17.3.5	503-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.11.2028	13.11.2028
1331	2.17.3.6	503-00 Preberacie konanie	0 dni	27.11.2028	27.11.2028
1333	**2.17.4**	**504-00 Dažďová kanalizácia cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K**	**111 dni**	**3.5.2027**	**21.8.2027**
1334	2.17.4.1	504-00 Dažďová kanalizácia cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K	90 dni	3.5.2027	31.7.2027
1338	2.17.4.5	504-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.8.2027	7.8.2027
1339	2.17.4.6	504-00 Preberacie konanie	0 dni	21.8.2027	21.8.2027
1341	**2.17.5**	**505-00 Dažďová kanalizácia miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom**	**141 dni**	**5.9.2027**	**11.2.2028**
1342	2.17.5.1	505-00 Dažďová kanalizácia miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom	120 dni	5.9.2027	21.1.2028
1346	2.17.5.5	505-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.1.2028	28.1.2028
1347	2.17.5.6	505-00 Preberacie konanie	0 dni	11.2.2028	11.2.2028
1349	**2.17.6**	**507-00 Preložka tlakovej kanalizácie v km 27.970**	**216 dni**	**14.7.2027**	**4.3.2028**
1350	2.17.6.1	507-00 Preložka tlakovej kanalizácie v km 27.970	195 dni	14.7.2027	12.2.2028
1354	2.17.6.5	507-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	19.2.2028	19.2.2028
1355	2.17.6.6	507-00 Preberacie konanie	0 dni	4.3.2028	4.3.2028
1357	**2.17.7**	**508-00 Splašková kanalizácia z odpočívadla KnK**	**435 dni**	**8.6.2026**	**5.9.2027**
1358	2.17.7.1	508-00 Splašková kanalizácia z odpočívadla KnK vrátane technologickej časti 508-01	414 dni	8.6.2026	15.8.2027
1362	2.17.7.5	508-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	22.8.2027	22.8.2027
1363	2.17.7.6	508-00 Preberacie konanie	0 dni	5.9.2027	5.9.2027
1365	**2.17.8**	**509-00 Preložka splaškovej kanalizácie v km 29.760**	**141 dni**	**11.3.2028**	**29.7.2028**
1366	2.17.8.1	509-00 Preložka splaškovej kanalizácie v km 29.760	120 dni	11.3.2028	8.7.2028
1370	2.17.8.5	509-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	15.7.2028	15.7.2028
1371	2.17.8.6	509-00 Preberacie konanie	0 dni	29.7.2028	29.7.2028
1373	**2.17.9**	**510-00 Úprava kanalizácie DN 250 v križovatke Krásno nad Kysucou**	**379 dni**	**21.9.2026**	**24.10.2027**
1374	2.17.9.1	510-00 Úprava kanalizácie DN 250 v križovatke Krásno nad Kysucou	358 dni	21.9.2026	3.10.2027
1378	2.17.9.5	510-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.10.2027	10.10.2027
1379	2.17.9.6	510-00 Preberacie konanie	0 dni	24.10.2027	24.10.2027
1381	**2.17.10**	**511-00 Preložka kanalizácie Komad**	**124 dni**	**21.9.2026**	**11.2.2027**
1382	2.17.10.1	511-00 Preložka kanalizácie Komad	103 dni	21.9.2026	21.1.2027
1386	2.17.10.5	511-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.1.2027	28.1.2027
1387	2.17.10.6	511-00 Preberacie konanie	0 dni	11.2.2027	11.2.2027
1389	**2.17.11**	**512-00 Úprava kanalizácie Sevak v križovatke KnK**	**399 dni**	**21.9.2026**	**13.11.2027**
1390	2.17.11.1	512-00 Úprava kanalizácie Sevak v križovatke KnK	378 dni	21.9.2026	23.10.2027
1394	2.17.11.5	512-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	30.10.2027	30.10.2027
1395	2.17.11.6	512-00 Preberacie konanie	0 dni	13.11.2027	13.11.2027
1397	**2.17.12**	**513-00 Dažďová kanalizácia miestnej komunikácie pri križovatke Krásno n/K**	**171 dni**	**10.1.2028**	**28.6.2028**
1398	2.17.12.1	513-00 Dažďová kanalizácia miestnej komunikácie pri križovatke Krásno n/K	150 dni	10.1.2028	7.6.2028
1402	2.17.12.5	513-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	14.6.2028	14.6.2028
1403	2.17.12.6	513-00 Preberacie konanie	0 dni	28.6.2028	28.6.2028
1405	**2.18**	**Vodovody**	**870 dni**	**26.1.2026**	**22.7.2028**
1406	**2.18.1**	**521-00 Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525**	**171 dni**	**26.1.2026**	**15.7.2026**
1407	2.18.1.1	521-00 Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525	150 dni	26.1.2026	24.6.2026
1411	2.18.1.5	521-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.7.2026	1.7.2026
1412	2.18.1.6	521-00 Preberacie konanie	0 dni	15.7.2026	15.7.2026
1414	**2.18.2**	**521-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525 D3**	**100 dni**	**7.4.2026**	**15.7.2026**
1415	2.18.2.1	521-01 Katódová ochrana	100 dni	7.4.2026	15.7.2026
1416	**2.18.3**	**522-00 Preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 23,294 – 23,365**	**111 dni**	**27.3.2026**	**15.7.2026**
1417	2.18.3.1	522-00 Preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 23,294 – 23,365	90 dni	27.3.2026	24.6.2026
1421	2.18.3.5	522-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.7.2026	1.7.2026
1422	2.18.3.6	522-00 Preberacie konanie	0 dni	15.7.2026	15.7.2026
1424	**2.18.4**	**523-00 Preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 – 23,361**	**111 dni**	**27.3.2026**	**15.7.2026**
1425	2.18.4.1	523-00 Preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 – 23,361	90 dni	27.3.2026	24.6.2026
1429	2.18.4.5	523-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.7.2026	1.7.2026
1430	2.18.4.6	523-00 Preberacie konanie	0 dni	15.7.2026	15.7.2026
1432	**2.18.5**	**524-00 Preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352**	**111 dni**	**27.3.2026**	**15.7.2026**
1433	2.18.5.1	524-00 Preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352	90 dni	27.3.2026	24.6.2026
1437	2.18.5.5	524-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.7.2026	1.7.2026
1438	2.18.5.6	524-00 Preberacie konanie	0 dni	15.7.2026	15.7.2026
1440	**2.18.6**	**526-00 Preložka vodovodu DN 80 km 27,885 – 27,975**	**111 dni**	**3.4.2028**	**22.7.2028**
1441	2.18.6.1	526-00 Preložka vodovodu DN 80 km 27,885 – 27,975	90 dni	3.4.2028	1.7.2028

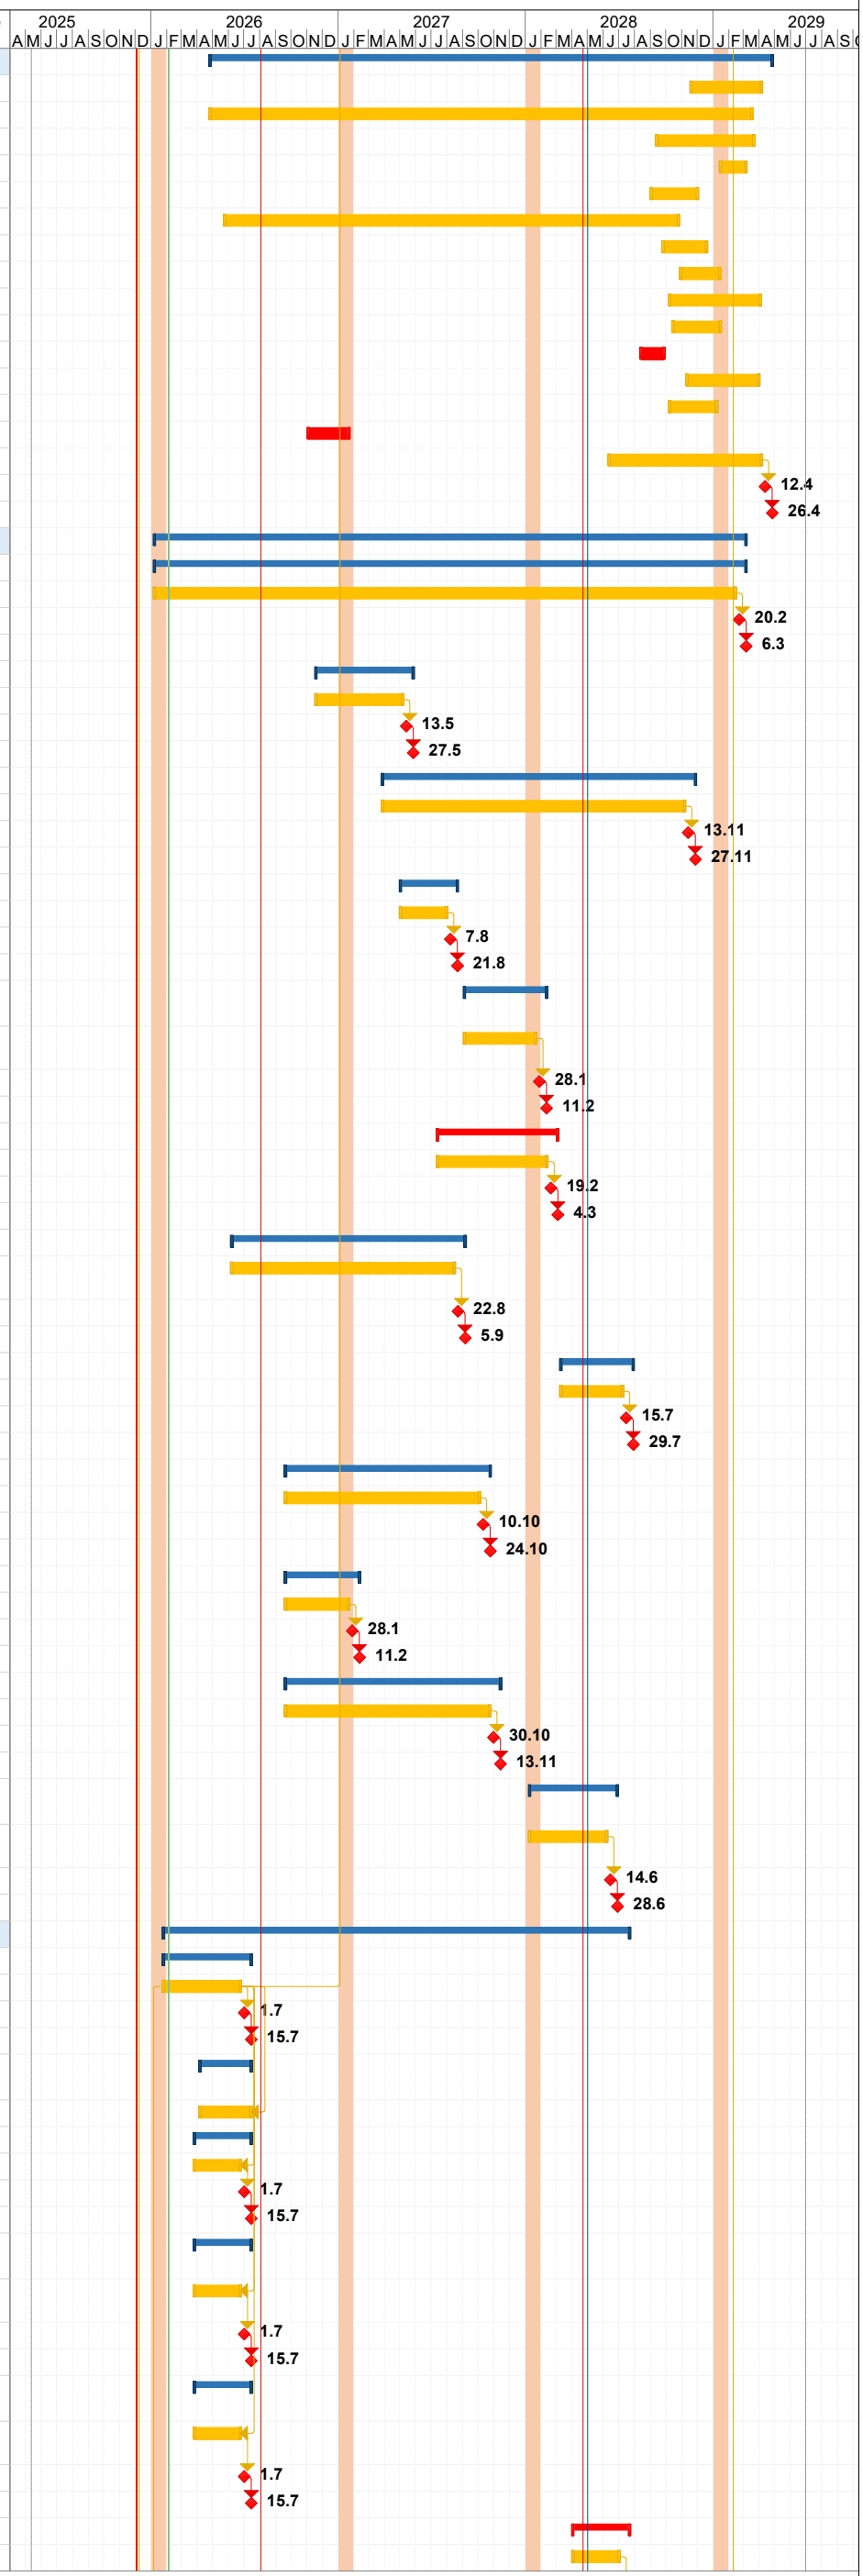

Súhrn — Úloha — Kritická cesta — Rozdeliť — Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1445	2.18.6.5	526-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.7.2028	8.7.2028
1446	2.18.6.6	526-00 Preberacie konanie	0 dni	22.7.2028	22.7.2028
1448	**2.18.7**	**527-00 Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,165**	**171 dni**	**27.3.2026**	**13.9.2026**
1449	2.18.7.1	527-00 Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,165	150 dni	27.3.2026	23.8.2026
1453	2.18.7.5	527-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	30.8.2026	30.8.2026
1454	2.18.7.6	527-00 Preberacie konanie	0 dni	13.9.2026	13.9.2026
1456	**2.18.8**	**527-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,150 D3**	**85 dni**	**7.2.2026**	**2.5.2026**
1457	2.18.8.1	527-01 Katódová ochrana	85 dni	7.2.2026	2.5.2026
1458	**2.18.9**	**528-00 Preložka vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766**	**141 dni**	**1.8.2027**	**19.12.2027**
1459	2.18.9.1	528-00 Preložka vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766	120 dni	1.8.2027	28.11.2027
1463	2.18.9.5	528-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.12.2027	5.12.2027
1464	2.18.9.6	528-00 Preberacie konanie	0 dni	19.12.2027	19.12.2027
1466	**2.18.10**	**528-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766 D3**	**100 dni**	**21.8.2027**	**28.11.2027**
1467	2.18.10.1	528-01 Katódová ochrana	100 dni	21.8.2027	28.11.2027
1468	**2.18.11**	**530-00 Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 – 30,673**	**111 dni**	**2.4.2026**	**21.7.2026**
1469	2.18.11.1	530-00 Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 – 30,673	90 dni	2.4.2026	30.6.2026
1473	2.18.11.5	530-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.7.2026	7.7.2026
1474	2.18.11.6	530-00 Preberacie konanie	0 dni	21.7.2026	21.7.2026
1476	**2.18.12**	**531-00 Preložka vodovodu DN 100 km 30,800 – 30,930**	**111 dni**	**7.6.2027**	**25.9.2027**
1477	2.18.12.1	531-00 Preložka vodovodu DN 100 km 30,800 – 30,930	90 dni	7.6.2027	4.9.2027
1481	2.18.12.5	531-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	11.9.2027	11.9.2027
1482	2.18.12.6	531-00 Preberacie konanie	0 dni	25.9.2027	25.9.2027
1484	**2.18.13**	**532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30,805 - 31,170**	**141 dni**	**8.4.2027**	**26.8.2027**
1485	2.18.13.1	532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30,805 - 31,170	120 dni	8.4.2027	5.8.2027
1489	2.18.13.5	532-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	12.8.2027	12.8.2027
1490	2.18.13.6	532-00 Preberacie konanie	0 dni	26.8.2027	26.8.2027
1492	**2.18.14**	**533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,130 – 31,170**	**141 dni**	**8.4.2027**	**26.8.2027**
1493	2.18.14.1	533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,130 – 31,170	120 dni	8.4.2027	5.8.2027
1497	2.18.14.5	533-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	12.8.2027	12.8.2027
1498	2.18.14.6	533-00 Preberacie konanie	0 dni	26.8.2027	26.8.2027
1500	**2.18.15**	**534-00 Preložka vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459**	**141 dni**	**6.4.2026**	**24.8.2026**
1501	2.18.15.1	534-00 Preložka vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459	120 dni	6.4.2026	3.8.2026
1505	2.18.15.5	534-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.8.2026	10.8.2026
1506	2.18.15.6	534-00 Preberacie konanie	0 dni	24.8.2026	24.8.2026
1508	2.18.16	534-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459 D3	100 dni	11.4.2026	19.7.2026
1509	2.18.16.1	534-01 Katódová ochrana	100 dni	11.4.2026	19.7.2026
1510	**2.18.17**	**536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31,170 – 31,942**	**171 dni**	**1.2.2027**	**21.7.2027**
1511	2.18.17.1	536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31,170 – 31,942	150 dni	1.2.2027	30.6.2027
1515	2.18.17.5	536-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.7.2027	7.7.2027
1516	2.18.17.6	536-00 Preberacie konanie	0 dni	21.7.2027	21.7.2027
1518	**2.18.18**	**538-00 Preložka vodovodnej prípojky pre RD s.č. 915 v KnK**	**111 dni**	**5.9.2027**	**12.1.2028**
1519	2.18.18.1	538-00 Preložka vodovodnej prípojky pre RD s.č. 915 v KnK	90 dni	5.9.2027	3.12.2027
1523	2.18.18.5	538-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.12.2027	10.12.2027
1524	2.18.18.6	538-00 Preberacie konanie	0 dni	12.1.2028	12.1.2028
1526	**2.19**	**Potoky, meliorácie**	**1110 dni**	**8.1.2026**	**18.3.2029**
1527	**2.19.1**	**573-00 Úprava potoka Lodnianka**	**1006 dni**	**8.1.2026**	**17.11.2028**
1528	2.19.1.1	573-00 Úprava potoka Lodnianka	985 dni	8.1.2026	27.10.2028
1532	2.19.1.5	573-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	3.11.2028	3.11.2028
1533	2.19.1.6	573-00 Preberacie konanie	0 dni	17.11.2028	17.11.2028
1535	**2.19.2**	**574-00 Úprava Marusovho potoka**	**1040 dni**	**8.1.2026**	**21.12.2028**
1536	2.19.2.1	574-00 Úprava Marusovho potoka	1019 dni	8.1.2026	30.11.2028
1540	2.19.2.5	574-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.12.2028	7.12.2028
1541	2.19.2.6	574-00 Preberacie konanie	0 dni	21.12.2028	21.12.2028
1543	**2.19.3**	**575-00 Úprava bezmenného potoka v km 23,924 D3**	**404 dni**	**8.1.2026**	**7.3.2027**
1544	2.19.3.1	575-00 Úprava bezmenného potoka v km 23,924 D3	383 dni	8.1.2026	14.2.2027
1548	2.19.3.5	575-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	21.2.2027	21.2.2027
1549	2.19.3.6	575-00 Preberacie konanie	0 dni	7.3.2027	7.3.2027
1551	**2.19.4**	**576-00 Úprava bezmenného potoka v km 26,520 D3**	**694 dni**	**8.1.2026**	**10.1.2028**
1552	2.19.4.1	576-00 Úprava bezmenného potoka v km 26,520 D3	673 dni	8.1.2026	1.12.2027
1556	2.19.4.5	576-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.12.2027	8.12.2027
1557	2.19.4.6	576-00 Preberacie konanie	0 dni	10.1.2028	10.1.2028
1559	**2.19.5**	**577-00 Úprava Drozdovho potoka**	**828 dni**	**8.1.2026**	**23.5.2028**
1560	2.19.5.1	577-00 Úprava Drozdovho potoka	807 dni	8.1.2026	2.5.2028
1564	2.19.5.5	577-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	9.5.2028	9.5.2028
1565	2.19.5.6	577-00 Preberacie konanie	0 dni	23.5.2028	23.5.2028
1567	**2.19.6**	**578-00 Úprava bezmenného potoka v km 27,448 D3**	**391 dni**	**8.1.2026**	**22.2.2027**
1568	2.19.6.1	578-00 Úprava bezmenného potoka v km 27,448 D3	370 dni	8.1.2026	1.2.2027
1572	2.19.6.5	578-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.2.2027	8.2.2027
1573	2.19.6.6	578-00 Preberacie konanie	0 dni	22.2.2027	22.2.2027
1575	**2.19.7**	**579-00 Úprava bezmenného potoka v km 27,954 D3**	**1110 dni**	**8.1.2026**	**18.3.2029**
1576	2.19.7.1	579-00 Úprava bezmenného potoka v km 27,954 D3	1089 dni	8.1.2026	25.2.2029
1580	2.19.7.5	579-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	4.3.2029	4.3.2029
1581	2.19.7.6	579-00 Preberacie konanie	0 dni	18.3.2029	18.3.2029
1583	**2.19.8**	**581-00 Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3**	**156 dni**	**28.2.2028**	**1.8.2028**
1584	2.19.8.1	581-00 Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3	135 dni	28.2.2028	11.7.2028
1588	2.19.8.5	581-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	18.7.2028	18.7.2028
1589	2.19.8.6	581-00 Preberacie konanie	0 dni	1.8.2028	1.8.2028
1591	**2.19.9**	**583-00 Úprava bezmenného potoka v km 31,692 D3**	**951 dni**	**8.1.2026**	**23.9.2028**
1592	2.19.9.1	583-00 Úprava bezmenného potoka v km 31,692 D3	930 dni	8.1.2026	2.9.2028
1596	2.19.9.5	583-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	9.9.2028	9.9.2028
1597	2.19.9.6	583-00 Preberacie konanie	0 dni	23.9.2028	23.9.2028
1599	**2.20**	**Objekty elektrických vedení NN, VN, VVN, oznamovacie vedenia**	**1062 dni**	**15.2.2026**	**8.3.2029**
1600	**2.20.1**	**601-01 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3**	**150 dni**	**21.2.2026**	**20.7.2026**
1601	2.20.1.1	601-01 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3	99 dni	21.2.2026	30.5.2026
1605	2.20.1.5	601-01 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.6.2026	6.6.2026
1606	2.20.1.6	601-01 Preberacie konanie	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
1607	2.20.1.7	601-01 Kolaudácia	0 dni	20.7.2026	20.7.2026
1608	**2.20.2**	**601-02 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 26,800 D3**	**150 dni**	**21.2.2026**	**20.7.2026**
1609	2.20.2.1	601-02 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 26,800 D3	99 dni	21.2.2026	30.5.2026
1613	2.20.2.5	601-02 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.6.2026	6.6.2026
1614	2.20.2.6	601-02 Preberacie konanie	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
1615	2.20.2.7	601-02 Kolaudácia	0 dni	20.7.2026	20.7.2026

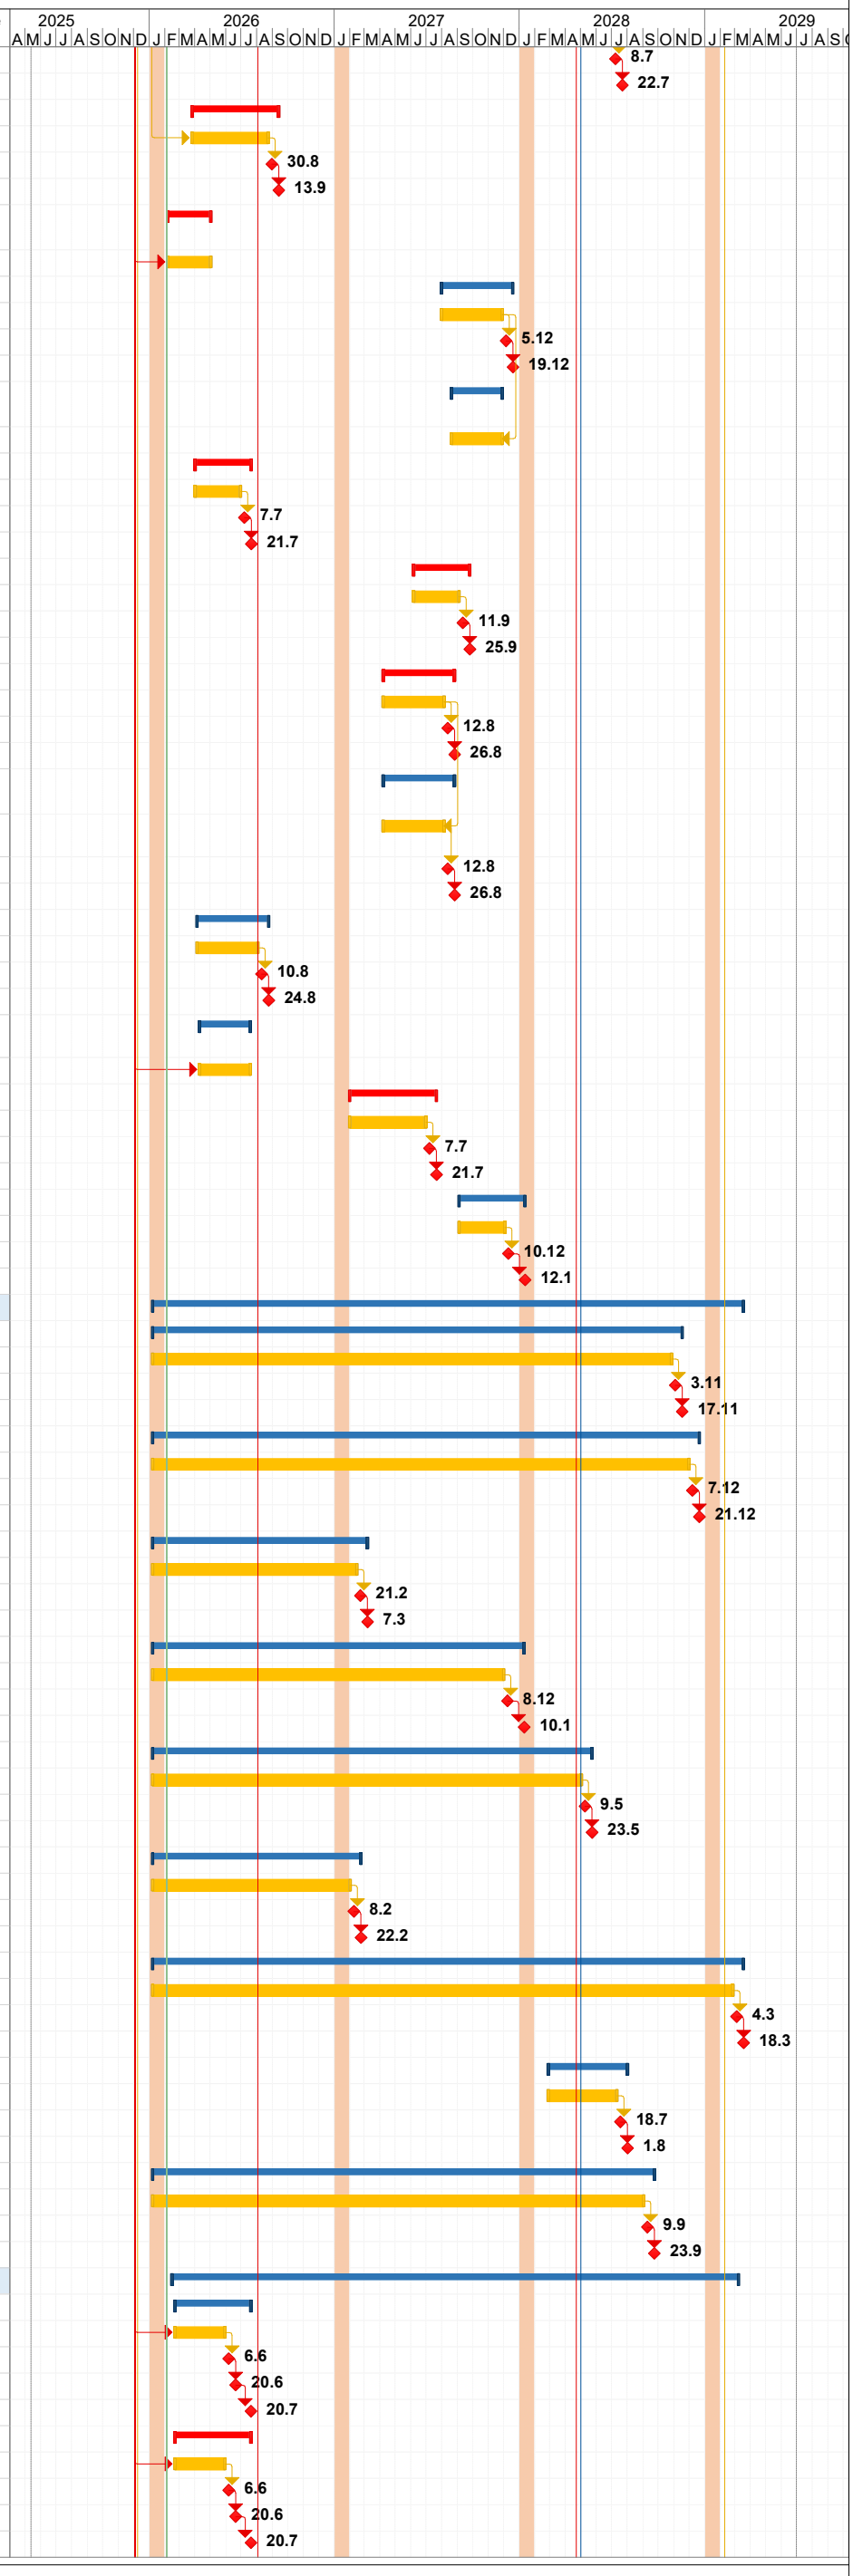

Súhrn | Úloha | Kritická cesta | Rozdeliť | Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1616	**2.20.3**	**601-03 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 29,100 D3**	**150 dni**	**2.5.2026**	**28.9.2026**
1617	2.20.3.1	601-03 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 29,100 D3	99 dni	2.5.2026	8.8.2026
1621	2.20.3.5	601-03 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	15.8.2026	15.8.2026
1622	2.20.3.6	601-03 Preberacie konanie	0 dni	29.8.2026	29.8.2026
1623	2.20.3.7	601-03 Kolaudácia	0 dni	28.9.2026	28.9.2026
1624	**2.20.4**	**612-00 Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22.543 D3**	**90 dni**	**21.2.2026**	**21.5.2026**
1625	2.20.4.1	612-00 Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22.543 D3	39 dni	21.2.2026	31.3.2026
1629	2.20.4.5	612-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.4.2026	7.4.2026
1630	2.20.4.6	612-00 Preberacie konanie	0 dni	21.4.2026	21.4.2026
1631	2.20.4.7	612-00 Kolaudácia	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1632	**2.20.5**	**613-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 23.046 D3**	**90 dni**	**21.2.2026**	**21.5.2026**
1633	2.20.5.1	613-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 23.046 D3	39 dni	21.2.2026	31.3.2026
1637	2.20.5.5	613-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.4.2026	7.4.2026
1638	2.20.5.6	613-00 Preberacie konanie	0 dni	21.4.2026	21.4.2026
1639	2.20.5.7	613-00 Kolaudácia	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1640	**2.20.6**	**614-00 Preložka TS SSE 6195, 22/0.4 kV, 100kVA, Km 23.297 D3**	**60 dni**	**21.2.2026**	**21.4.2026**
1641	2.20.6.1	614-00 Preložka TS SSE 6195, 22/0.4 kV, 100kVA, Km 23.297 D3	9 dni	21.2.2026	1.3.2026
1645	2.20.6.5	614-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.3.2026	8.3.2026
1646	2.20.6.6	614-00 Preberacie konanie	0 dni	22.3.2026	22.3.2026
1647	2.20.6.7	614-00 Kolaudácia	0 dni	21.4.2026	21.4.2026
1648	**2.20.7**	**615-00 Preložka 22 kV prípojky pre pílu, km 23.195 D3**	**111 dni**	**7.5.2026**	**25.8.2026**
1649	2.20.7.1	615-00 Preložka 22 kV prípojky pre pílu, km 23.195 D3	90 dni	7.5.2026	4.8.2026
1653	2.20.7.5	615-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	11.8.2026	11.8.2026
1654	2.20.7.6	615-00 Preberacie konanie	0 dni	25.8.2026	25.8.2026
1656	**2.20.8**	**616-00 Preložka 22 kV prípojky Ochodnica, km 23.758 D3**	**90 dni**	**21.2.2026**	**21.5.2026**
1657	2.20.8.1	616-00 Preložka 22 kV prípojky Ochodnica, km 23.758 D3	39 dni	21.2.2026	31.3.2026
1661	2.20.8.5	616-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.4.2026	7.4.2026
1662	2.20.8.6	616-00 Preberacie konanie	0 dni	21.4.2026	21.4.2026
1663	2.20.8.7	616-00 Kolaudácia	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1664	**2.20.9**	**617-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 25.2 D3**	**90 dni**	**21.2.2026**	**21.5.2026**
1665	2.20.9.1	617-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 25.2 D3	39 dni	21.2.2026	31.3.2026
1669	2.20.9.5	617-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.4.2026	7.4.2026
1670	2.20.9.6	617-00 Preberacie konanie	0 dni	21.4.2026	21.4.2026
1671	2.20.9.7	617-00 Kolaudácia	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1672	**2.20.10**	**618-00 Preložka 22 kV prípojky Drozdovci, km 26.7 D3**	**90 dni**	**17.4.2026**	**15.7.2026**
1673	2.20.10.1	618-00 Preložka 22 kV prípojky Drozdovci, km 26.7 D3	39 dni	17.4.2026	25.5.2026
1677	2.20.10.5	618-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.6.2026	1.6.2026
1678	2.20.10.6	618-00 Preberacie konanie	0 dni	15.6.2026	15.6.2026
1679	2.20.10.7	618-00 Kolaudácia	0 dni	15.7.2026	15.7.2026
1680	**2.20.11**	**619-00 Preložka 22 kV prípojky Michálkovci, km 27.2 D3**	**90 dni**	**17.4.2026**	**15.7.2026**
1681	2.20.11.1	619-00 Preložka 22 kV prípojky Michálkovci, km 27.2 D3	39 dni	17.4.2026	25.5.2026
1685	2.20.11.5	619-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.6.2026	1.6.2026
1686	2.20.11.6	619-00 Preberacie konanie	0 dni	15.6.2026	15.6.2026
1687	2.20.11.7	619-00 Kolaudácia	0 dni	15.7.2026	15.7.2026
1688	**2.20.12**	**620-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 27.9 – 29.15 D3**	**150 dni**	**21.2.2026**	**20.7.2026**
1689	2.20.12.1	620-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 27.9 – 29.15 D3	99 dni	21.2.2026	30.5.2026
1693	2.20.12.5	620-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.6.2026	6.6.2026
1694	2.20.12.6	620-00 Preberacie konanie	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
1695	2.20.12.7	620-00 Kolaudácia	0 dni	20.7.2026	20.7.2026
1696	**2.20.13**	**621-00 Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Ústredie, km 29.8 D3**	**60 dni**	**18.6.2026**	**16.8.2026**
1697	2.20.13.1	621-00 Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Ústredie, km 29.8 D3	9 dni	18.6.2026	26.6.2026
1701	2.20.13.5	621-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	3.7.2026	3.7.2026
1702	2.20.13.6	621-00 Preberacie konanie	0 dni	17.7.2026	17.7.2026
1703	2.20.13.7	621-00 Kolaudácia	0 dni	16.8.2026	16.8.2026
1704	**2.20.14**	**622-00 Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Pri jasliach, km 30.26 D3**	**150 dni**	**21.2.2026**	**20.7.2026**
1705	2.20.14.1	622-00 Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Pri jasliach, km 30.26 D3	99 dni	21.2.2026	30.5.2026
1709	2.20.14.5	622-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.6.2026	6.6.2026
1710	2.20.14.6	622-00 Preberacie konanie	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
1711	2.20.14.7	622-00 Kolaudácia	0 dni	20.7.2026	20.7.2026
1712	**2.20.15**	**623-00 Preložka 22 kV l.č. 114 v križovatke Krásno nad Kysucou**	**90 dni**	**23.3.2026**	**20.6.2026**
1713	2.20.15.1	623-00 Preložka 22 kV l.č. 114 v križovatke Krásno nad Kysucou	39 dni	23.3.2026	30.4.2026
1717	2.20.15.5	623-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.5.2026	7.5.2026
1718	2.20.15.6	623-00 Preberacie konanie	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1719	2.20.15.7	623-00 Kolaudácia	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
1720	**2.20.16**	**623-01 Preložka TS 22/0,4 kV – SOUND Krásno nad Kysucou**	**90 dni**	**23.3.2026**	**20.6.2026**
1721	2.20.16.1	623-01 Preložka TS 22/0,4 kV – SOUND Krásno nad Kysucou	39 dni	23.3.2026	30.4.2026
1725	2.20.16.5	623-01 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.5.2026	7.5.2026
1726	2.20.16.6	623-01 Preberacie konanie	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1727	2.20.16.7	623-01 Kolaudácia	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
1728	**2.20.17**	**623-02 Preložka 22 kV prípojky – TS KOMAD**	**60 dni**	**23.3.2026**	**21.5.2026**
1729	2.20.17.1	623-02 Preložka 22 kV prípojky – TS KOMAD	39 dni	23.3.2026	30.4.2026
1733	2.20.17.5	623-02 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.5.2026	7.5.2026
1734	2.20.17.6	623-02 Preberacie konanie	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1736	**2.20.18**	**624-00 Preložka 22 kV l.č. 109 pri súbehu s cestným obj.135-00**	**90 dni**	**23.3.2026**	**20.6.2026**
1737	2.20.18.1	624-00 Preložka 22 kV l.č. 109 pri súbehu s cestným obj.135-00	39 dni	23.3.2026	30.4.2026
1741	2.20.18.5	624-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.5.2026	7.5.2026
1742	2.20.18.6	624-00 Preberacie konanie	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1743	2.20.18.7	624-00 Kolaudácia	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
1744	**2.20.19**	**626-00 Preložka 22 kV káblového vedenia na c.I/11, km 0,420**	**96 dni**	**15.2.2026**	**21.5.2026**
1745	2.20.19.1	626-00 Preložka 22 kV káblového vedenia na c.I/11, km 0,420	75 dni	15.2.2026	30.4.2026
1749	2.20.19.5	626-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.5.2026	7.5.2026
1750	2.20.19.6	626-00 Preberacie konanie	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1752	**2.20.20**	**627-00 Preložka 22 kV káblového vedenia, km 31.648 D3**	**90 dni**	**23.6.2027**	**20.9.2027**
1753	2.20.20.1	627-00 Preložka 22 kV káblového vedenia, km 31.648 D3	39 dni	23.6.2027	31.7.2027
1757	2.20.20.5	627-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.8.2027	7.8.2027
1758	2.20.20.6	627-00 Preberacie konanie	0 dni	21.8.2027	21.8.2027
1759	2.20.20.7	627-00 Kolaudácia	0 dni	20.9.2027	20.9.2027
1760	**2.20.21**	**632-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 23.335 D3**	**60 dni**	**21.2.2026**	**21.4.2026**
1761	2.20.21.1	632-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 23.335 D3	9 dni	21.2.2026	1.3.2026
1765	2.20.21.5	632-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.3.2026	8.3.2026
1766	2.20.21.6	632-00 Preberacie konanie	0 dni	22.3.2026	22.3.2026
1767	2.20.21.7	632-00 Kolaudácia	0 dni	21.4.2026	21.4.2026
1768	**2.20.22**	**633-00 Preložka 0.4 kV prípojky pre zariadenia SVS a.s., km 23.328**	**171 dni**	**7.10.2026**	**15.4.2027**
1769	2.20.22.1	633-00 Preložka 0.4 kV prípojky pre zariadenia SVS a.s., km 23.328	150 dni	7.10.2026	25.3.2027
1773	2.20.22.5	633-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.4.2027	1.4.2027

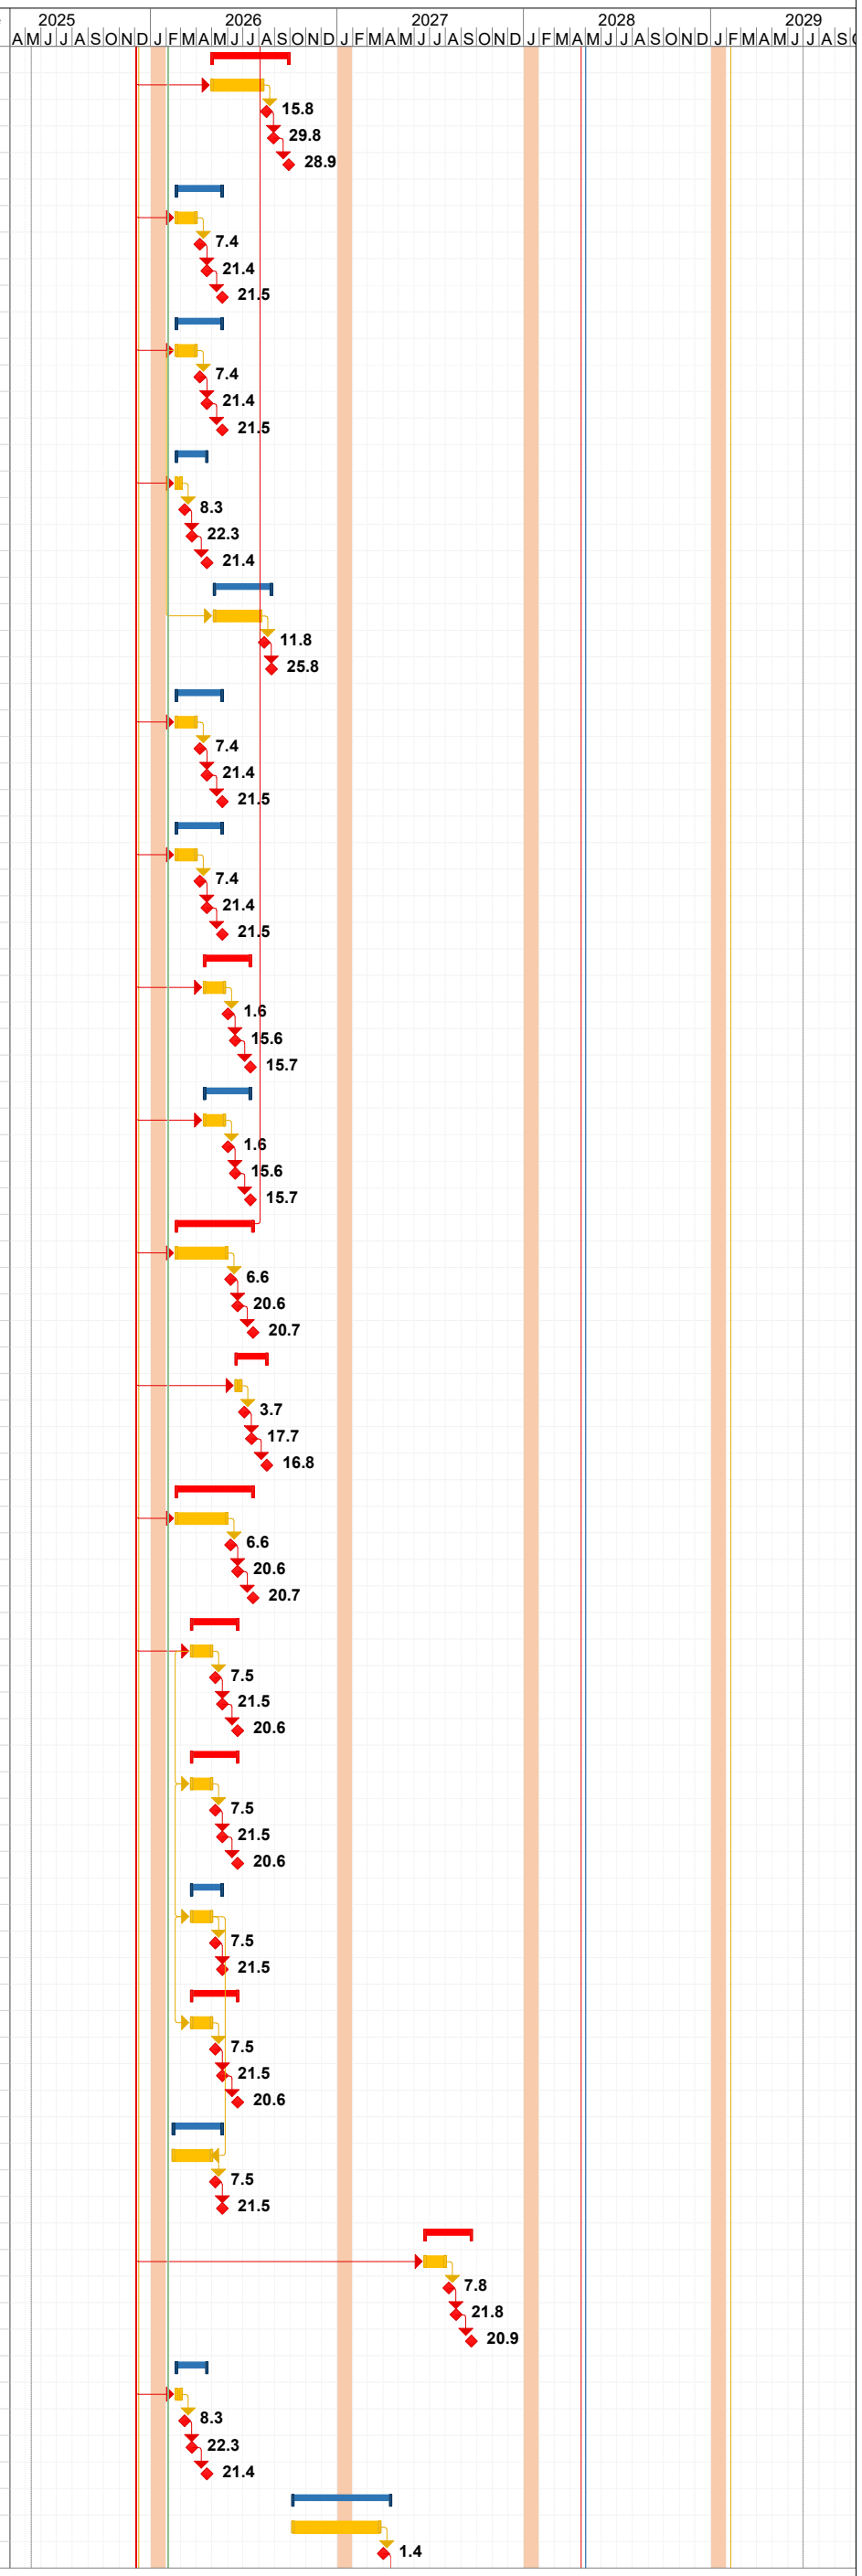

Súhrn | Úloha | Kritická cesta | Rozdeliť | Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1774	2.20.22.6	633-00 Preberacie konanie	0 dni	15.4.2027	15.4.2027
1776	**2.20.23**	**634-00 Preložka 0.4 kV vedenia (do Blažkova), km 28.14 D3**	**90 dni**	**9.3.2026**	**6.6.2026**
1777	2.20.23.1	634-00 Preložka 0.4 kV vedenia (do Blažkova), km 28.14 D3	39 dni	9.3.2026	16.4.2026
1781	2.20.23.5	634-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2026	23.4.2026
1782	2.20.23.6	634-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2026	7.5.2026
1783	2.20.23.7	634-00 Kolaudácia	0 dni	6.6.2026	6.6.2026
1784	**2.20.24**	**635-00 Preložka 0.4 kV prípojky (ku skup RD), km 29.8 D3**	**90 dni**	**20.4.2026**	**18.7.2026**
1785	2.20.24.1	635-00 Preložka 0.4 kV prípojky (ku skup RD), km 29.8 D3	39 dni	20.4.2026	28.5.2026
1789	2.20.24.5	635-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	4.6.2026	4.6.2026
1790	2.20.24.6	635-00 Preberacie konanie	0 dni	18.6.2026	18.6.2026
1791	2.20.24.7	635-00 Kolaudácia	0 dni	18.7.2026	18.7.2026
1792	**2.20.25**	**636-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.680 D3**	**90 dni**	**15.6.2026**	**12.9.2026**
1793	2.20.25.1	636-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.680 D3	39 dni	15.6.2026	23.7.2026
1797	2.20.25.5	636-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	30.7.2026	30.7.2026
1798	2.20.25.6	636-00 Preberacie konanie	0 dni	13.8.2026	13.8.2026
1799	2.20.25.7	636-00 Kolaudácia	0 dni	12.9.2026	12.9.2026
1800	**2.20.26**	**637-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.840 D3**	**90 dni**	**15.6.2026**	**12.9.2026**
1801	2.20.26.1	637-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.840 D3	39 dni	15.6.2026	23.7.2026
1805	2.20.26.5	637-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	30.7.2026	30.7.2026
1806	2.20.26.6	637-00 Preberacie konanie	0 dni	13.8.2026	13.8.2026
1807	2.20.26.7	637-00 Kolaudácia	0 dni	12.9.2026	12.9.2026
1808	**2.20.27**	**638-00 Preložka 0.4 kV vedení, km 31.240 D3**	**90 dni**	**15.6.2026**	**12.9.2026**
1809	2.20.27.1	638-00 Preložka 0.4 kV vedení, km 31.240 D3	39 dni	15.6.2026	23.7.2026
1813	2.20.27.5	638-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	30.7.2026	30.7.2026
1814	2.20.27.6	638-00 Preberacie konanie	0 dni	13.8.2026	13.8.2026
1815	2.20.27.7	638-00 Kolaudácia	0 dni	12.9.2026	12.9.2026
1816	**2.20.28**	**639-00 Preložka NN prípojky Slovak Telekom km 29,5-29,6 D3**	**90 dni**	**21.2.2026**	**21.5.2026**
1817	2.20.28.1	639-00 Preložka NN prípojky Slovak Telekom km 29,5-29,6 D3	39 dni	21.2.2026	31.3.2026
1821	2.20.28.5	639-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.4.2026	7.4.2026
1822	2.20.28.6	639-00 Preberacie konanie	0 dni	21.4.2026	21.4.2026
1823	2.20.28.7	639-00 Kolaudácia	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1824	**2.20.29**	**640-00 Preložka 0.4 kV prípojky pre RStP - SPP**	**90 dni**	**21.2.2026**	**21.5.2026**
1825	2.20.29.1	640-00 Preložka 0.4 kV prípojky pre RStP - SPP	39 dni	21.2.2026	31.3.2026
1829	2.20.29.5	640-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	7.4.2026	7.4.2026
1830	2.20.29.6	640-00 Preberacie konanie	0 dni	21.4.2026	21.4.2026
1831	2.20.29.7	640-00 Kolaudácia	0 dni	21.5.2026	21.5.2026
1832	**2.20.30**	**641-00 Prípojka 0.4 kV pre VO v Krásne nad Kysucou**	**111 dni**	**9.11.2026**	**19.3.2027**
1833	2.20.30.1	641-00 Prípojka 0.4 kV pre VO v Krásne nad Kysucou	90 dni	9.11.2026	26.2.2027
1837	2.20.30.5	641-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.3.2027	5.3.2027
1838	2.20.30.6	641-00 Preberacie konanie	0 dni	19.3.2027	19.3.2027
1840	**2.20.31**	**642-00 Preložka VO na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci**	**171 dni**	**16.3.2028**	**2.9.2028**
1841	2.20.31.1	642-00 Preložka VO na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci	150 dni	16.3.2028	12.8.2028
1845	2.20.31.5	642-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	19.8.2028	19.8.2028
1846	2.20.31.6	642-00 Preberacie konanie	0 dni	2.9.2028	2.9.2028
1848	**2.20.32**	**643-00 VO chodníka do Blažkova Krásno n/Kys.**	**221 dni**	**14.7.2028**	**8.3.2029**
1849	2.20.32.1	643-00 VO chodníka do Blažkova Krásno n/Kys.	200 dni	14.7.2028	15.2.2029
1853	2.20.32.5	643-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	22.2.2029	22.2.2029
1854	2.20.32.6	643-00 Preberacie konanie	0 dni	8.3.2029	8.3.2029
1856	**2.20.33**	**644-00 Preložka VO v Krásne nad Kysucou**	**121 dni**	**19.9.2028**	**3.2.2029**
1857	2.20.33.1	644-00 Preložka VO v Krásne nad Kysucou	100 dni	19.9.2028	13.1.2029
1861	2.20.33.5	644-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	20.1.2029	20.1.2029
1862	2.20.33.6	644-00 Preberacie konanie	0 dni	3.2.2029	3.2.2029
1864	**2.20.34**	**645-00 Osvetlenie diaľničných privádzačov v Krásne nad Kysucou**	**271 dni**	**7.3.2028**	**2.12.2028**
1865	2.20.34.1	645-00 Osvetlenie diaľničných privádzačov v Krásne nad Kysucou	250 dni	7.3.2028	11.11.2028
1869	2.20.34.5	645-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	18.11.2028	18.11.2028
1870	2.20.34.6	645-00 Preberacie konanie	0 dni	2.12.2028	2.12.2028
1872	**2.20.35**	**646-00 NN prípojka pre ISD, km 23,330**	**66 dni**	**5.6.2028**	**9.8.2028**
1873	2.20.35.1	646-00 NN prípojka pre ISD, km 23,330	45 dni	5.6.2028	19.7.2028
1877	2.20.35.5	646-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	26.7.2028	26.7.2028
1878	2.20.35.6	646-00 Preberacie konanie	0 dni	9.8.2028	9.8.2028
1880	**2.20.36**	**647-00 Úprava VO na lávke pre peších nad D3 v km 26,578**	**141 dni**	**18.11.2027**	**25.4.2028**
1881	2.20.36.1	647-00 Úprava VO na lávke pre peších nad D3 v km 26,578	120 dni	18.11.2027	4.4.2028
1885	2.20.36.5	647-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	11.4.2028	11.4.2028
1886	2.20.36.6	647-00 Preberacie konanie	0 dni	25.4.2028	25.4.2028
1888	**2.20.37**	**648-00 Preložka NN vedenia z ČS Kys. Lieskovec, km 23,200 – 23,320 D3**	**111 dni**	**4.5.2026**	**22.8.2026**
1889	2.20.37.1	648-00 Preložka NN vedenia z ČS Kys. Lieskovec, km 23,200 – 23,320	90 dni	4.5.2026	1.8.2026
1893	2.20.37.5	648-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	8.8.2026	8.8.2026
1894	2.20.37.6	648-00 Preberacie konanie	0 dni	22.8.2026	22.8.2026
1896	**2.20.38**	**649-00 NN prípojka pre vodomernú šachtu, km 31,150 D3**	**81 dni**	**29.3.2027**	**17.6.2027**
1897	2.20.38.1	649-00 NN prípojka pre vodomernú šachtu, km 31,150 D3	60 dni	29.3.2027	27.5.2027
1901	2.20.38.5	649-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	3.6.2027	3.6.2027
1902	2.20.38.6	649-00 Preberacie konanie	0 dni	17.6.2027	17.6.2027
1904	**2.20.39**	**650-00 Preložka NN vedenia Skytoll**	**81 dni**	**23.6.2026**	**11.9.2026**
1905	2.20.39.1	650-00 Preložka NN vedenia Skytoll	60 dni	23.6.2026	21.8.2026
1909	2.20.39.5	650-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.8.2026	28.8.2026
1910	2.20.39.6	650-00 Preberacie konanie	0 dni	11.9.2026	11.9.2026
1912	**2.20.40**	**651-00 Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
1913	2.20.40.1	651-00 Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
1917	2.20.40.5	651-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
1918	2.20.40.6	651-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
1919	2.20.40.7	651-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
1920	**2.20.41**	**652-00 Preložka oblastného optického kábla v km 24,5 – 26,6**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
1921	2.20.41.1	652-00 Preložka oblastného optického kábla v km 24,5 – 26,6	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
1925	2.20.41.5	652-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
1926	2.20.41.6	652-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
1927	2.20.41.7	652-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
1928	**2.20.42**	**653-00 Preložka oblastného optického kábla v km 26,6 – 29,8**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
1929	2.20.42.1	653-00 Preložka oblastného optického kábla v km 26,6 – 29,8	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
1933	2.20.42.5	653-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
1934	2.20.42.6	653-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
1935	2.20.42.7	653-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
1936	**2.20.43**	**654-00 Preložka oblastného optického kábla v km 29,8 – 30,7**	**101 dni**	**9.3.2026**	**17.6.2026**
1937	2.20.43.1	654-00 Preložka oblastného optického kábla v km 29,8 – 30,7	50 dni	9.3.2026	27.4.2026
1941	2.20.43.5	654-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	4.5.2026	4.5.2026

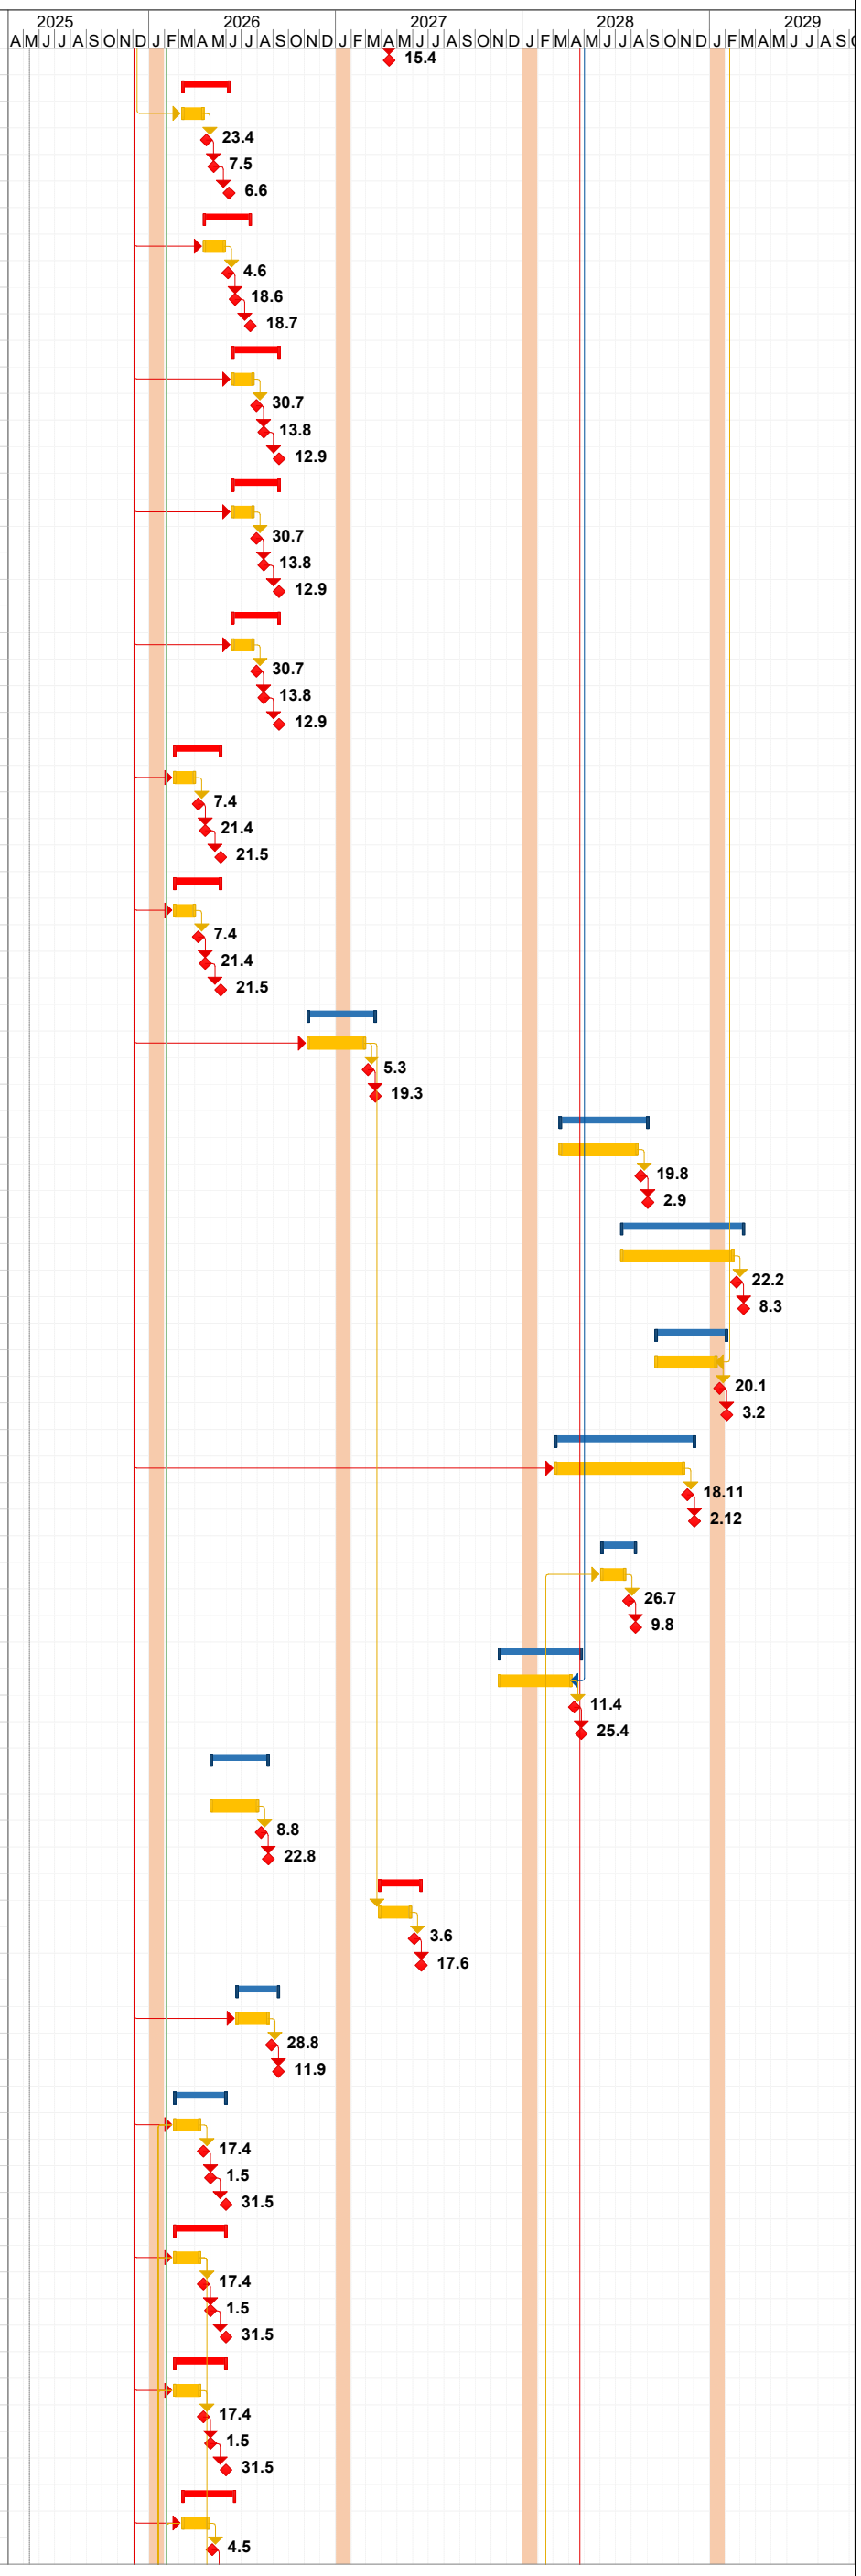

Súhrn | Úloha | Kritická cesta | Rozdeliť | Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1942	2.20.43.6	654-00 Preberacie konanie	0 dni	18.5.2026	18.5.2026
1943	2.20.43.7	654-00 Kolaudácia	0 dni	17.6.2026	17.6.2026
1944	**2.20.44**	**655-00 Preložka oblastného optického kábla v km 30,9 – 31,4**	**100 dni**	**16.3.2026**	**23.6.2026**
1945	2.20.44.1	655-00 Preložka oblastného optického kábla v km 30,9 – 31,4	49 dni	16.3.2026	3.5.2026
1949	2.20.44.5	655-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.5.2026	10.5.2026
1950	2.20.44.6	655-00 Preberacie konanie	0 dni	24.5.2026	24.5.2026
1951	2.20.44.7	655-00 Kolaudácia	0 dni	23.6.2026	23.6.2026
1952	**2.20.45**	**656-00 Preložka prípojného oblastného optického kábla Dunajov**	**60 dni**	**11.4.2026**	**9.6.2026**
1953	2.20.45.1	656-00 Preložka prípojného oblastného optického kábla Dunajov	9 dni	11.4.2026	19.4.2026
1957	2.20.45.5	656-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	26.4.2026	26.4.2026
1958	2.20.45.6	656-00 Preberacie konanie	0 dni	10.5.2026	10.5.2026
1959	2.20.45.7	656-00 Kolaudácia	0 dni	9.6.2026	9.6.2026
1960	**2.20.46**	**657-00 Preložka prípojného oblastného optického kábla Krásno nad Kysucou**	**90 dni**	**9.3.2026**	**6.6.2026**
1961	2.20.46.1	657-00 Preložka prípojného oblastného optického kábla Krásno nad Kysucou	39 dni	9.3.2026	16.4.2026
1965	2.20.46.5	657-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2026	23.4.2026
1966	2.20.46.6	657-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2026	7.5.2026
1967	2.20.46.7	657-00 Kolaudácia	0 dni	6.6.2026	6.6.2026
1968	**2.20.47**	**661-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
1969	2.20.47.1	661-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
1973	2.20.47.5	661-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
1974	2.20.47.6	661-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
1975	2.20.47.7	661-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
1976	**2.20.48**	**662-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
1977	2.20.48.1	662-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
1981	2.20.48.5	662-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
1982	2.20.48.6	662-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
1983	2.20.48.7	662-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
1984	**2.20.49**	**663-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 24,5 – 26,6**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
1985	2.20.49.1	663-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 24,5 – 26,6	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
1989	2.20.49.5	663-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
1990	2.20.49.6	663-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
1991	2.20.49.7	663-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
1992	**2.20.50**	**664-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 26,6– 29,8**	**126 dni**	**21.2.2026**	**26.6.2026**
1993	2.20.50.1	664-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 26,6– 29,8	75 dni	21.2.2026	6.5.2026
1997	2.20.50.5	664-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.5.2026	13.5.2026
1998	2.20.50.6	664-00 Preberacie konanie	0 dni	27.5.2026	27.5.2026
1999	2.20.50.7	664-00 Kolaudácia	0 dni	26.6.2026	26.6.2026
2000	**2.20.51**	**665-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 28,4 – 29,0**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
2001	2.20.51.1	665-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 28,4 – 29,0	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
2005	2.20.51.5	665-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
2006	2.20.51.6	665-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
2007	2.20.51.7	665-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
2008	**2.20.52**	**666-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 29,8 – 30,7**	**100 dni**	**9.3.2026**	**16.6.2026**
2009	2.20.52.1	666-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 29,8 – 30,7	49 dni	9.3.2026	26.4.2026
2013	2.20.52.5	666-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	3.5.2026	3.5.2026
2014	2.20.52.6	666-00 Preberacie konanie	0 dni	17.5.2026	17.5.2026
2015	2.20.52.7	666-00 Kolaudácia	0 dni	16.6.2026	16.6.2026
2016	**2.20.53**	**667-00 Preložka uzlového kábla v km 29,8 – 30,7**	**100 dni**	**9.3.2026**	**16.6.2026**
2017	2.20.53.1	667-00 Preložka uzlového kábla v km 29,8 – 30,7	49 dni	9.3.2026	26.4.2026
2021	2.20.53.5	667-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	3.5.2026	3.5.2026
2022	2.20.53.6	667-00 Preberacie konanie	0 dni	17.5.2026	17.5.2026
2023	2.20.53.7	667-00 Kolaudácia	0 dni	16.6.2026	16.6.2026
2024	**2.20.54**	**668-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 31,2 – 31,4**	**90 dni**	**16.3.2026**	**13.6.2026**
2025	2.20.54.1	668-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 31,2 – 31,4	39 dni	16.3.2026	23.4.2026
2029	2.20.54.5	668-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	30.4.2026	30.4.2026
2030	2.20.54.6	668-00 Preberacie konanie	0 dni	14.5.2026	14.5.2026
2031	2.20.54.7	668-00 Kolaudácia	0 dni	13.6.2026	13.6.2026
2032	**2.20.55**	**669-00 Preložka uzlového kábla v km 31,0 – 31,4**	**100 dni**	**16.3.2026**	**23.6.2026**
2033	2.20.55.1	669-00 Preložka uzlového kábla v km 31,0 – 31,4	49 dni	16.3.2026	3.5.2026
2037	2.20.55.5	669-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.5.2026	10.5.2026
2038	2.20.55.6	669-00 Preberacie konanie	0 dni	24.5.2026	24.5.2026
2039	2.20.55.7	669-00 Kolaudácia	0 dni	23.6.2026	23.6.2026
2040	**2.20.56**	**670-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca na ceste I/11**	**90 dni**	**16.3.2026**	**13.6.2026**
2041	2.20.56.1	670-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca na ceste I/11	39 dni	16.3.2026	23.4.2026
2045	2.20.56.5	670-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	30.4.2026	30.4.2026
2046	2.20.56.6	670-00 Preberacie konanie	0 dni	14.5.2026	14.5.2026
2047	2.20.56.7	670-00 Kolaudácia	0 dni	13.6.2026	13.6.2026
2048	**2.20.57**	**671-00 Preložka MTS v km 23,0 - 24,1**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
2049	2.20.57.1	671-00 Preložka MTS v km 23,0 - 24,1	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
2053	2.20.57.5	671-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
2054	2.20.57.6	671-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
2055	2.20.57.7	671-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
2056	**2.20.58**	**672-00 Preložka MTS v km 26,6**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
2057	2.20.58.1	672-00 Preložka MTS v km 26,6	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
2061	2.20.58.5	672-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
2062	2.20.58.6	672-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
2063	2.20.58.7	672-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
2064	**2.20.59**	**673-00 Preložka MTS v km 27,0 - 29,8**	**100 dni**	**21.2.2026**	**31.5.2026**
2065	2.20.59.1	673-00 Preložka MTS v km 27,0 - 29,8	49 dni	21.2.2026	10.4.2026
2069	2.20.59.5	673-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.4.2026	17.4.2026
2070	2.20.59.6	673-00 Preberacie konanie	0 dni	1.5.2026	1.5.2026
2071	2.20.59.7	673-00 Kolaudácia	0 dni	31.5.2026	31.5.2026
2072	**2.20.60**	**674-00 Preložka kábla MTS pripoloženého k UK v km 29,8 - 30,7**	**100 dni**	**9.3.2026**	**16.6.2026**
2073	2.20.60.1	674-00 Preložka kábla MTS pripoloženého k UK v km 29,8 - 30,7	49 dni	9.3.2026	26.4.2026
2077	2.20.60.5	674-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	3.5.2026	3.5.2026
2078	2.20.60.6	674-00 Preberacie konanie	0 dni	17.5.2026	17.5.2026
2079	2.20.60.7	674-00 Kolaudácia	0 dni	16.6.2026	16.6.2026
2080	**2.20.61**	**675-00 Preložka MTS v km 29,8 - 30,7**	**100 dni**	**9.3.2026**	**16.6.2026**
2081	2.20.61.1	675-00 Preložka MTS v km 29,8 - 30,7	49 dni	9.3.2026	26.4.2026
2085	2.20.61.5	675-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	3.5.2026	3.5.2026
2086	2.20.61.6	675-00 Preberacie konanie	0 dni	17.5.2026	17.5.2026
2087	2.20.61.7	675-00 Kolaudácia	0 dni	16.6.2026	16.6.2026
2088	**2.20.62**	**676-00 Preložka MTS v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11**	**100 dni**	**16.3.2026**	**23.6.2026**
2089	2.20.62.1	676-00 Preložka MTS v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11	49 dni	16.3.2026	3.5.2026

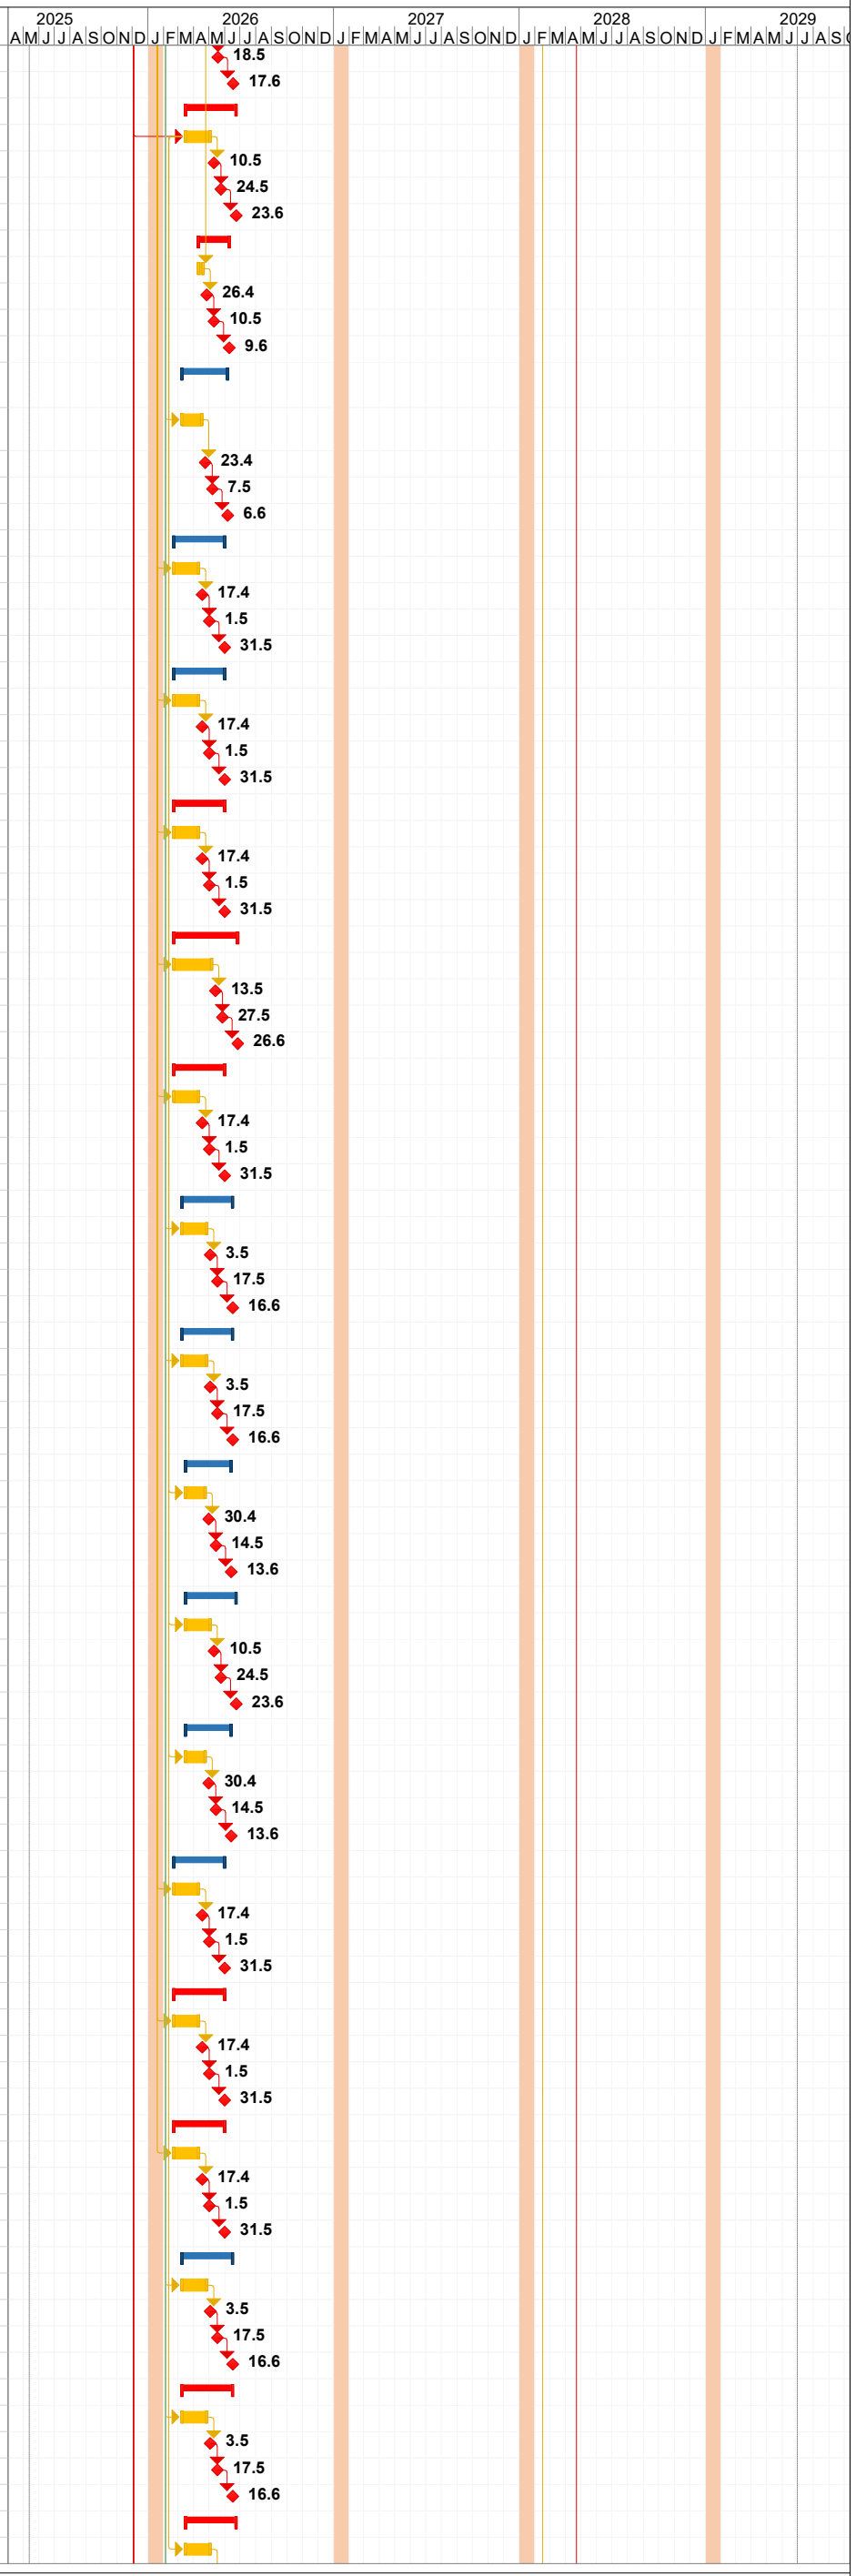

Súhrn | Úloha | Kritická cesta | Rozdeliť | Medzník

HMG - Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vecný harmonogram

Identifik	Štruktúra rozdelenia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
2093	2.20.62.5	676-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	10.5.2026	10.5.2026
2094	2.20.62.6	676-00 Preberacie konanie	0 dni	24.5.2026	24.5.2026
2095	2.20.62.7	676-00 Kolaudácia	0 dni	23.6.2026	23.6.2026
2096	**2.20.63**	**681-00 Preložka MR Kysucký Lieskovec**	**121 dni**	**10.4.2026**	**8.8.2026**
2097	2.20.63.1	681-00 Preložka MR Kysucký Lieskovec	100 dni	10.4.2026	18.7.2026
2101	2.20.63.5	681-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	25.7.2026	25.7.2026
2102	2.20.63.6	681-00 Preberacie konanie	0 dni	8.8.2026	8.8.2026
2104	**2.20.64**	**682-00 Preložka MR Krásno nad Kysucou**	**131 dni**	**14.9.2026**	**11.2.2027**
2105	2.20.64.1	682-00 Preložka MR Krásno nad Kysucou	110 dni	14.9.2026	21.1.2027
2109	2.20.64.5	682-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	28.1.2027	28.1.2027
2110	2.20.64.6	682-00 Preberacie konanie	0 dni	11.2.2027	11.2.2027
2112	**2.21**	**Informačný systém diaľnice**	**430 dni**	**7.3.2028**	**27.5.2029**
2113	**2.21.1**	**694-10 Informačný systém diaľnice - stavebná časť**	**321 dni**	**7.3.2028**	**7.2.2029**
2114	2.21.1.1	694-10 Informačný systém diaľnice - stavebná časť	300 dni	7.3.2028	17.1.2029
2118	2.21.1.5	694-10 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	24.1.2029	24.1.2029
2119	2.21.1.6	694-10 Preberacie konanie	0 dni	7.2.2029	7.2.2029
2121	**2.21.2**	**694-11 Informačný systém diaľnice - technologická časť**	**231 dni**	**22.9.2028**	**27.5.2029**
2122	2.21.2.1	694-11 Informačný systém diaľnice - technologická časť	210 dni	22.9.2028	6.5.2029
2126	2.21.2.5	694-11 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.5.2029	13.5.2029
2127	2.21.2.6	694-11 Preberacie konanie	0 dni	27.5.2029	27.5.2029
2129	**2.22**	**Plynovody**	**241 dni**	**21.2.2026**	**19.10.2026**
2130	**2.22.1**	**711-00 Preložka STL plynovodu v km 23,350 D3**	**150 dni**	**21.2.2026**	**20.7.2026**
2131	2.22.1.1	711-00 Preložka STL plynovodu v km 23,350 D3	99 dni	21.2.2026	30.5.2026
2135	2.22.1.5	711-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.6.2026	6.6.2026
2136	2.22.1.6	711-00 Preberacie konanie	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
2137	2.22.1.7	711-00 Kolaudácia	0 dni	20.7.2026	20.7.2026
2138	**2.22.2**	**712-00 Preložka STL plynovodu v km 28,100 D3**	**150 dni**	**8.5.2026**	**4.10.2026**
2139	2.22.2.1	712-00 Preložka STL plynovodu v km 28,100 D3	99 dni	8.5.2026	14.8.2026
2143	2.22.2.5	712-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	21.8.2026	21.8.2026
2144	2.22.2.6	712-00 Preberacie konanie	0 dni	4.9.2026	4.9.2026
2145	2.22.2.7	712-00 Kolaudácia	0 dni	4.10.2026	4.10.2026
2146	**2.22.3**	**713-00 Preložka STL plynovodu v km 31,200 D3**	**200 dni**	**30.3.2026**	**15.10.2026**
2147	2.22.3.1	713-00 Preložka STL plynovodu v km 31,200 D3	149 dni	30.3.2026	25.8.2026
2151	2.22.3.5	713-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	1.9.2026	1.9.2026
2152	2.22.3.6	713-00 Preberacie konanie	0 dni	15.9.2026	15.9.2026
2153	2.22.3.7	713-00 Kolaudácia	0 dni	15.10.2026	15.10.2026
2154	**2.22.4**	**714-00 Preložka regulačnej stanice plynovodu v križovatke Krásno n/**	**100 dni**	**12.7.2026**	**19.10.2026**
2155	2.22.4.1	714-00 Preložka regulačnej stanice plynovodu v križovatke Krásno n/K	49 dni	12.7.2026	29.8.2026
2159	2.22.4.5	714-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	5.9.2026	5.9.2026
2160	2.22.4.6	714-00 Preberacie konanie	0 dni	19.9.2026	19.9.2026
2161	2.22.4.7	714-00 Kolaudácia	0 dni	19.10.2026	19.10.2026
2162	**2.22.5**	**716-00 Preložka STL plynovodu v km 29,757 D3**	**150 dni**	**30.3.2026**	**26.8.2026**
2163	2.22.5.1	716-00 Preložka STL plynovodu v km 29,757 D3	99 dni	30.3.2026	6.7.2026
2167	2.22.5.5	716-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	13.7.2026	13.7.2026
2168	2.22.5.6	716-00 Preberacie konanie	0 dni	27.7.2026	27.7.2026
2169	2.22.5.7	716-00 Kolaudácia	0 dni	26.8.2026	26.8.2026
2170	**2.22.6**	**717-00 Preložka STL plynovodu v rekonštrukcii cesty I/11 v km 0,340 až 0,680**	**150 dni**	**21.2.2026**	**20.7.2026**
2171	2.22.6.1	717-00 Preložka STL plynovodu v rekonštrukcii cesty I/11 v km 0,340 až 0,680	99 dni	21.2.2026	30.5.2026
2175	2.22.6.5	717-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.6.2026	6.6.2026
2176	2.22.6.6	717-00 Preberacie konanie	0 dni	20.6.2026	20.6.2026
2177	2.22.6.7	717-00 Kolaudácia	0 dni	20.7.2026	20.7.2026
2178	**2.23**	**Dočasné komunikácie**	**676 dni**	**27.4.2026**	**10.4.2028**
2179	**2.23.1**	**801-00 Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11**	**91 dni**	**11.1.2028**	**10.4.2028**
2180	2.23.1.1	801-00 Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11	70 dni	11.1.2028	20.3.2028
2184	2.23.1.5	802-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	27.3.2028	27.3.2028
2185	2.23.1.6	802-00 Preberacie konanie	0 dni	10.4.2028	10.4.2028
2187	**2.23.2**	**802-00 Prístupová cesta k opornému múru na ceste I/11**	**66 dni**	**27.4.2026**	**1.7.2026**
2188	2.23.2.1	802-00 Prístupová cesta k opornému múru na ceste I/11	45 dni	27.4.2026	10.6.2026
2192	2.23.2.5	802-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	17.6.2026	17.6.2026
2193	2.23.2.6	802-00 Preberacie konanie	0 dni	1.7.2026	1.7.2026
2195	**2.24**	**Úprava krytu vozoviek**	**1060 dni**	**1.6.2026**	**20.6.2029**
2196	**2.24.1**	**811-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy**	**171 dni**	**10.10.2027**	**16.4.2028**
2197	2.24.1.1	811-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy	150 dni	10.10.2027	26.3.2028
2201	2.24.1.5	811-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	2.4.2028	2.4.2028
2202	2.24.1.6	811-00 Preberacie konanie	0 dni	16.4.2028	16.4.2028
2204	**2.24.2**	**812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy**	**1016 dni**	**1.6.2026**	**7.5.2029**
2205	2.24.2.1	812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy	995 dni	1.6.2026	16.4.2029
2209	2.24.2.5	812-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	23.4.2029	23.4.2029
2210	2.24.2.6	812-00 Preberacie konanie	0 dni	7.5.2029	7.5.2029
2212	**2.24.3**	**813-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách**	**271 dni**	**6.9.2028**	**20.6.2029**
2213	2.24.3.1	813-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách	250 dni	6.9.2028	30.5.2029
2217	2.24.3.5	813-00 Najskorší termín na schválenie čistopisu DSV	0 dni	6.6.2029	6.6.2029
2218	2.24.3.6	813-00 Preberacie konanie	0 dni	20.6.2029	20.6.2029

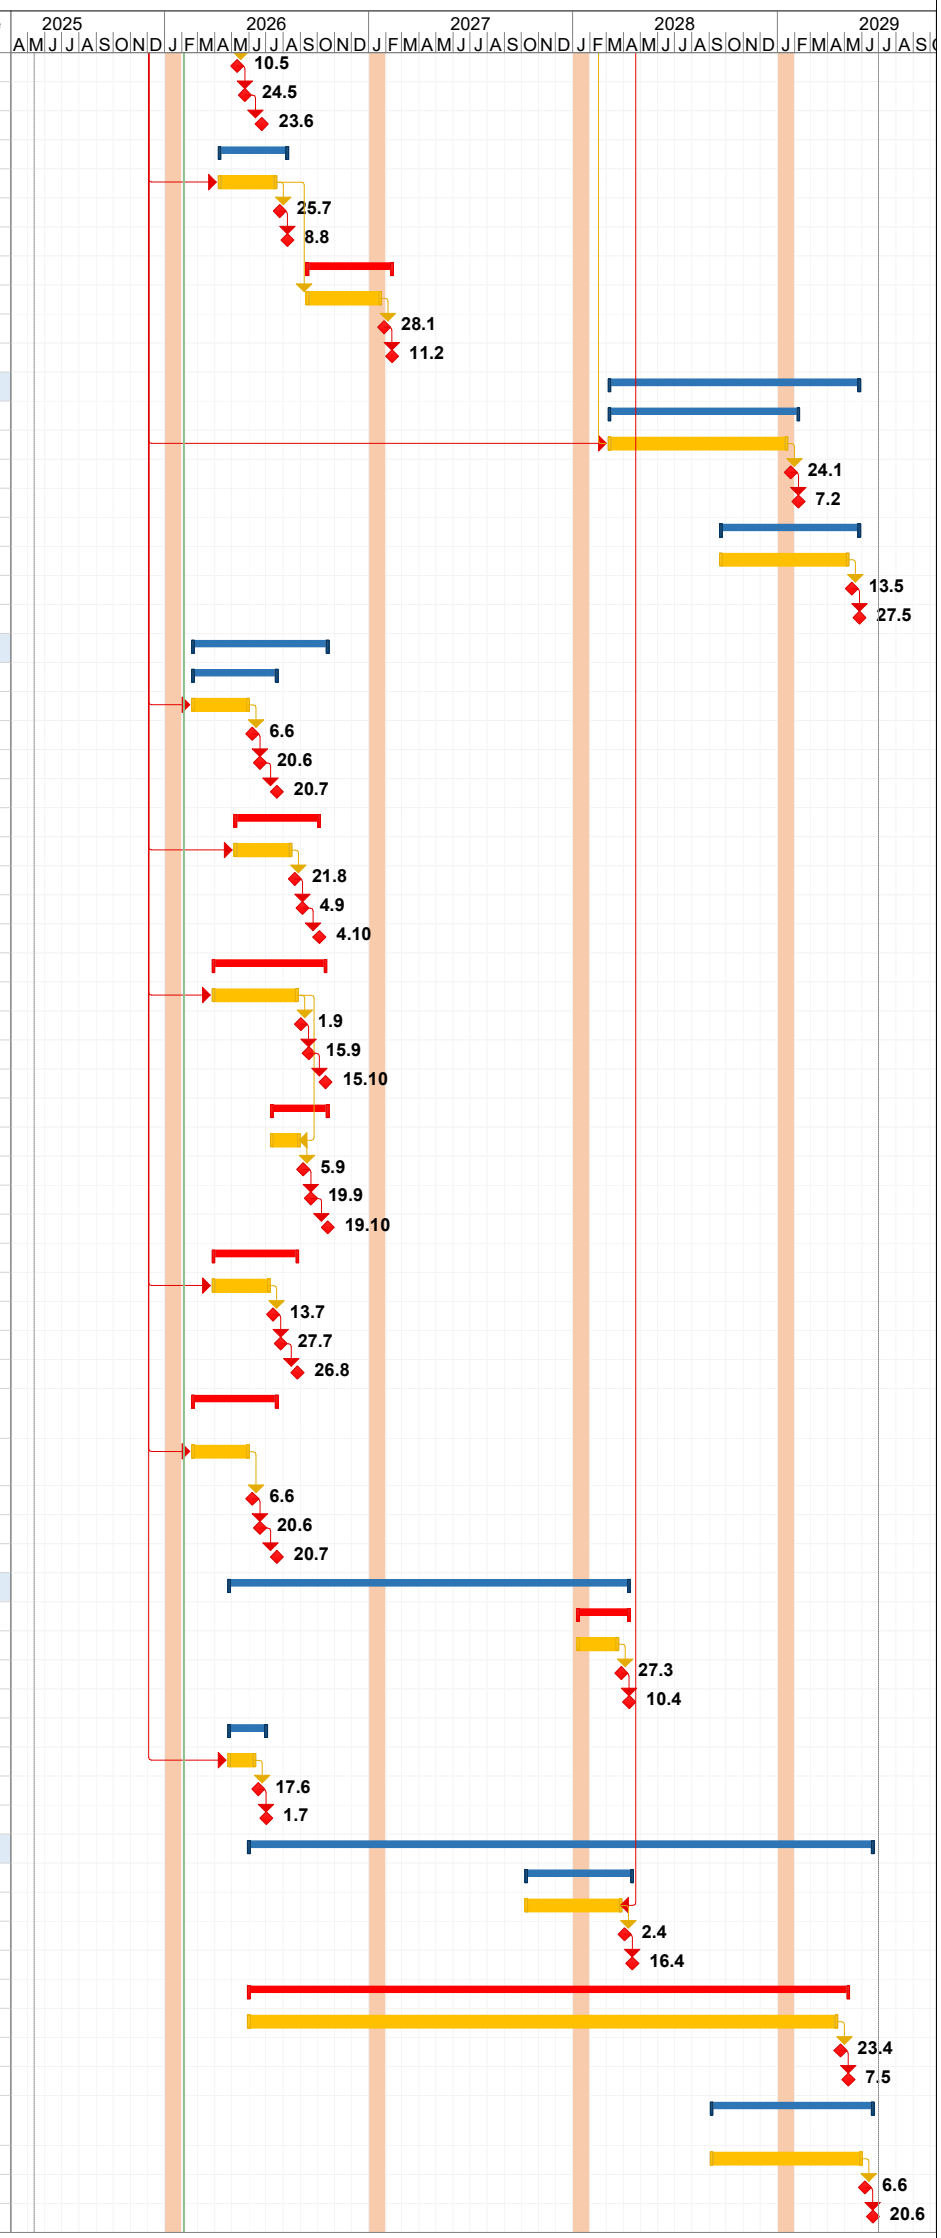

Súhrn | Úloha | Kritická cesta | Rozdeliť | Medzník
