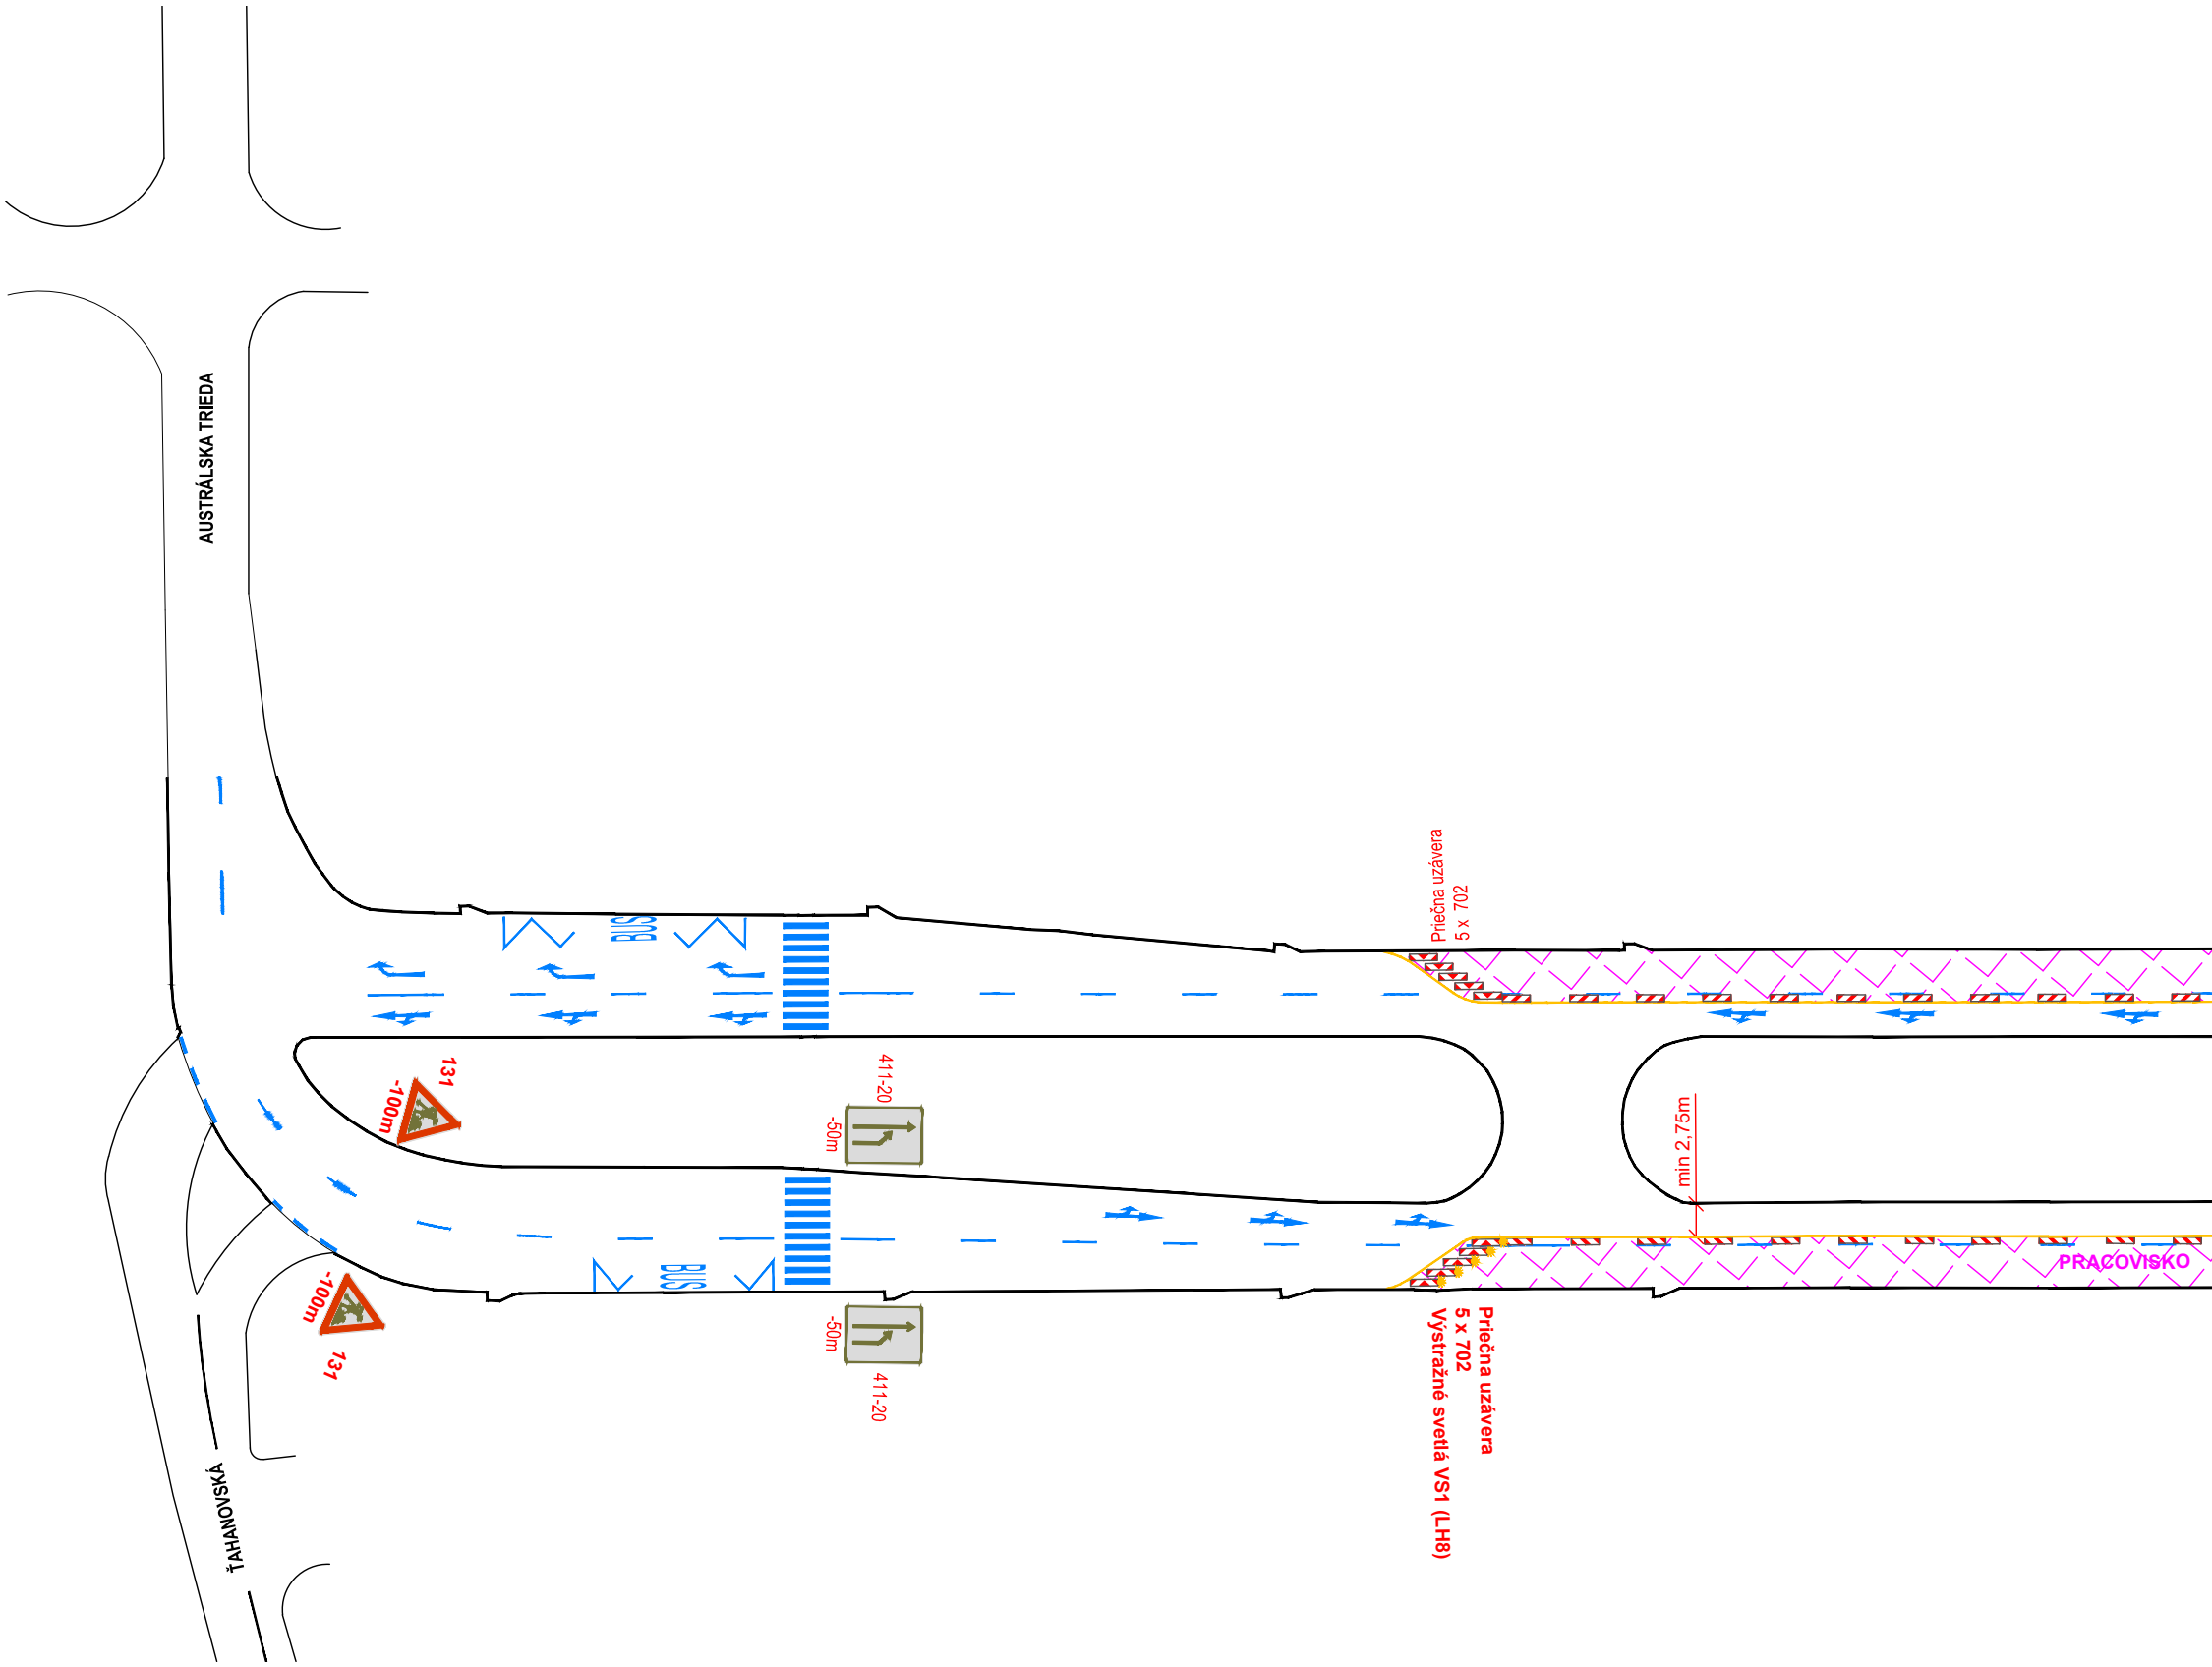
AUSTRÁLSKA TRIEDA
ŤAHANOVSKÁ
BUS
BUS
131
-100m
131
-100m
411-20
-50m
411-20
-50m
Priečna uzávera
5 x 702
min 2,75m
PRACOVISKO
Priečna uzávera
5 x 702
Výstražné svetlá VS1 (LH8)


1. ETAPA
2. ETAPA
3. ETAPA
4. ETAPA
5. ETAPA

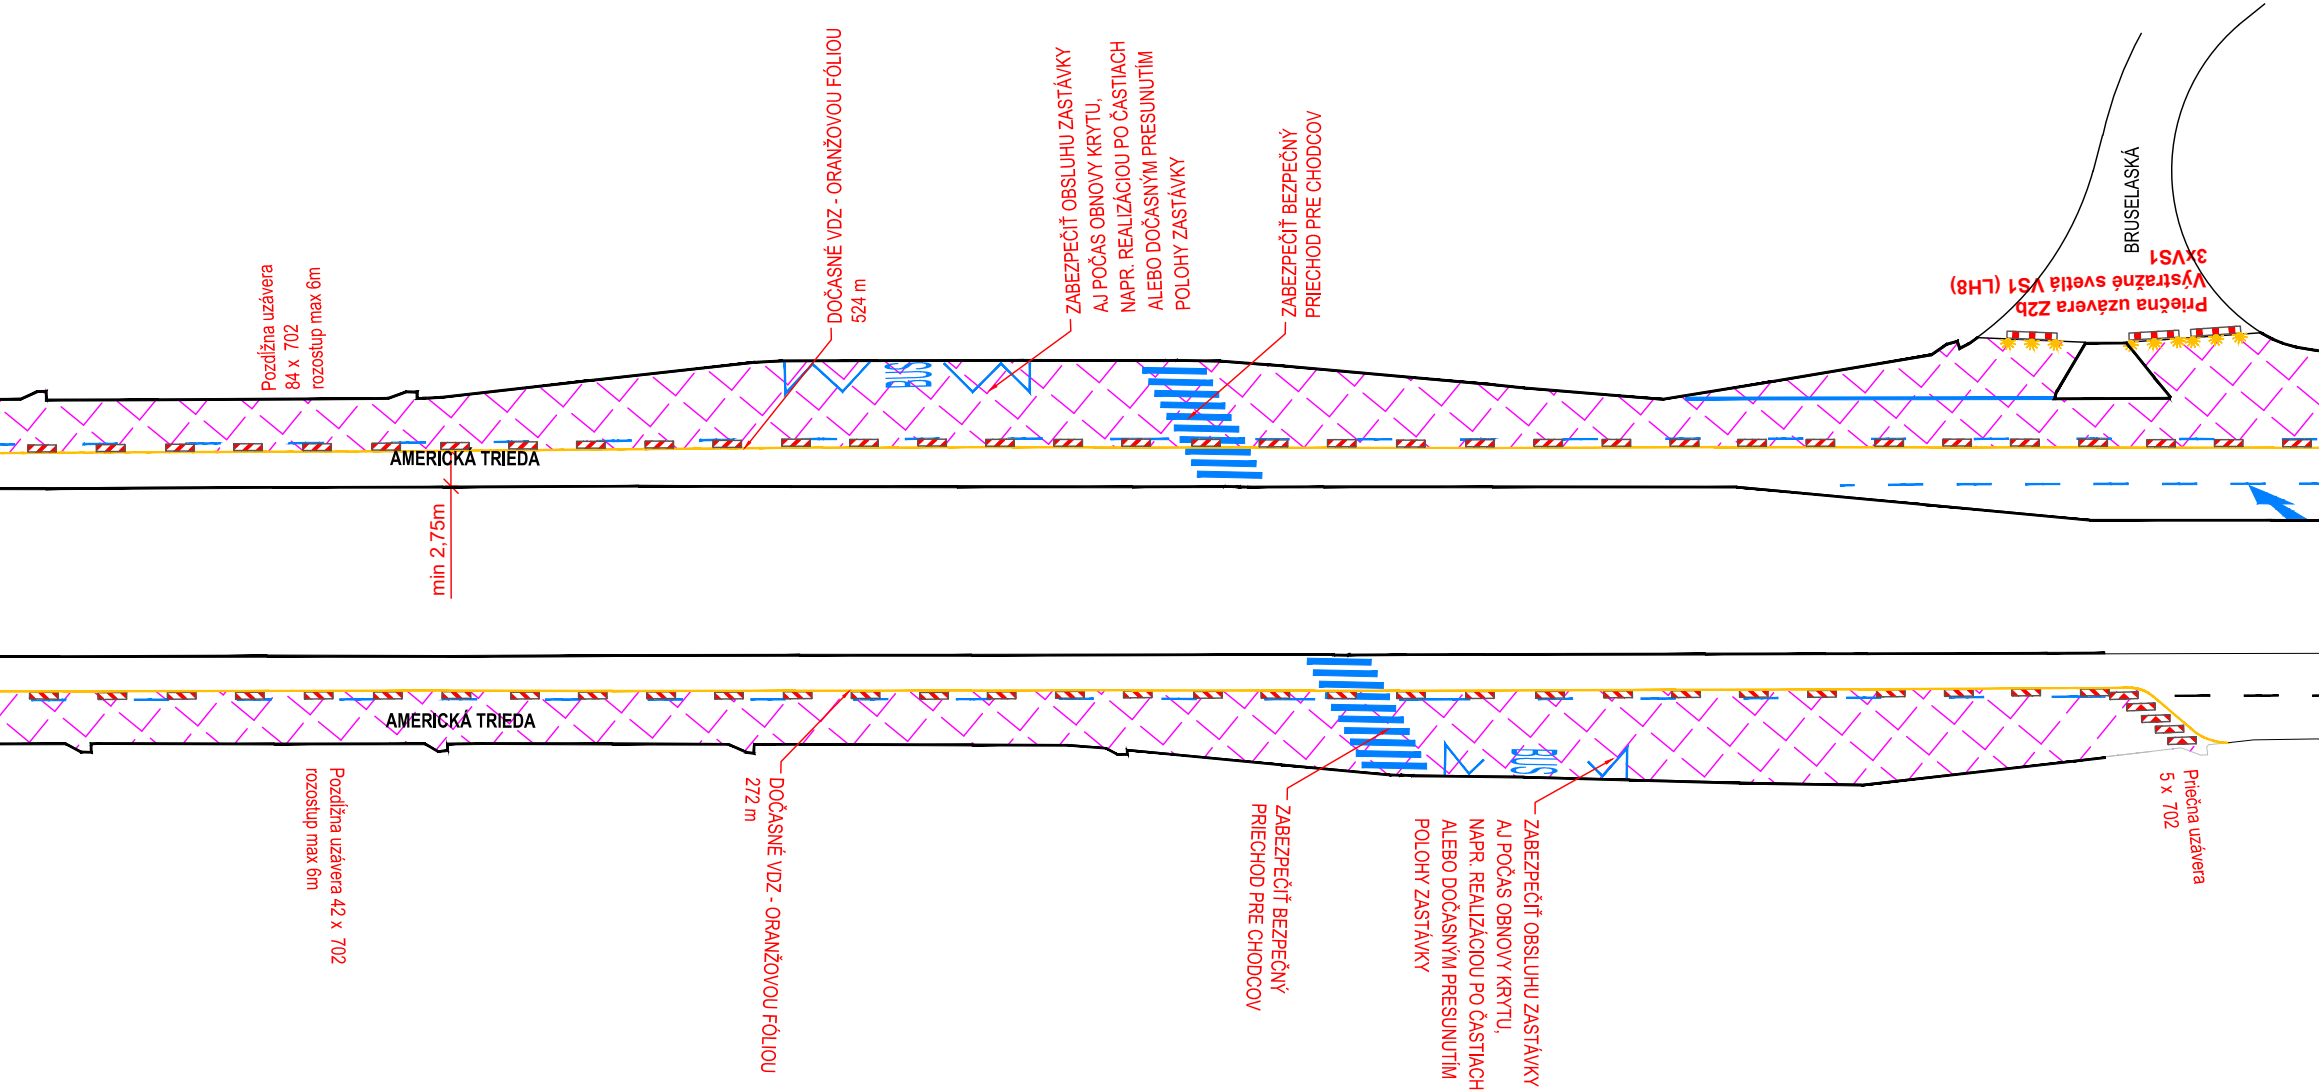
Pozdĺžna uzávera
84 x 702
rozostup max 6m
DOČASNÉ VDZ - ORANŽOVOU FÓLIOU
524 m
ZABEZPEČIŤ OBSLUHU ZASTÁVKY
AJ POČAS OBNOVY KRYTU,
NAPR. REALIZÁCIOU PO ČASTIACH
ALEBO DOČASNÝM PRESUNUTÍM
POLOHY ZASTÁVKY
ZABEZPEČIŤ BEZPEČNÝ
PRIECHOD PRE CHODCOV
BRUSELASKÁ
Priečna uzávera Z2b
Výstražné svetlá VS1 (LH8)
3xVS1
BUS
AMERICKÁ TRIEDA
min 2,75m
AMERICKÁ TRIEDA
BUS
Pozdĺžna uzávera 42 x 702
rozostup max 6m
DOČASNÉ VDZ - ORANŽOVOU FÓLIOU
272 m
ZABEZPEČIŤ BEZPEČNÝ
PRIECHOD PRE CHODCOV
ZABEZPEČIŤ OBSLUHU ZASTÁVKY
AJ POČAS OBNOVY KRYTU,
NAPR. REALIZÁCIOU PO ČASTIACH
ALEBO DOČASNÝM PRESUNUTÍM
POLOHY ZASTÁVKY
Priečna uzávera
5 x 702

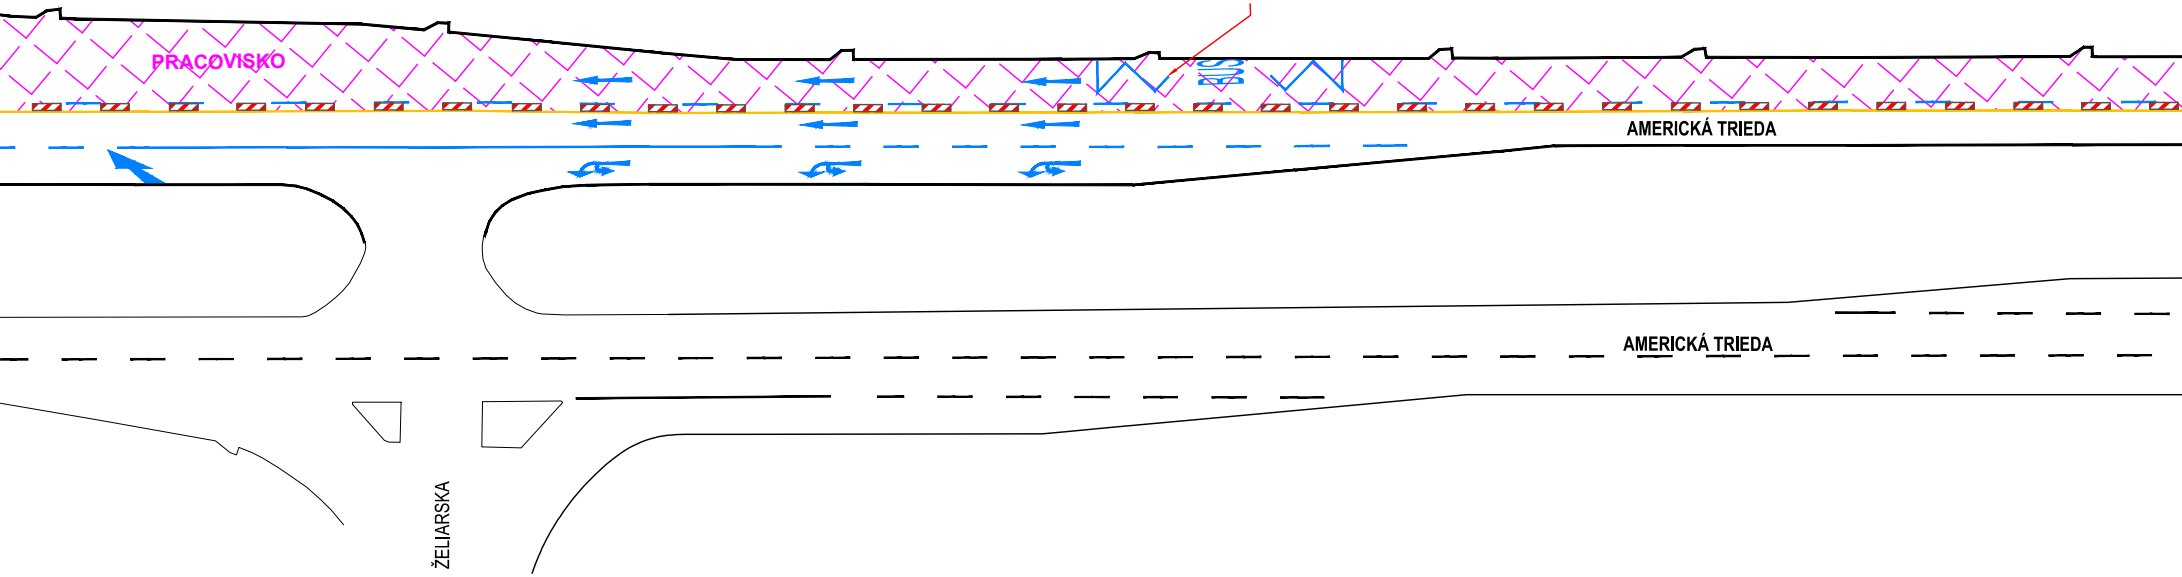

ZABEZPEČIŤ OBSLUHU ZASTÁVKY
AJ POČAS OBNOVY KRYTU,
NAPR. REALIZÁCIOU PO ČASTIACH
ALEBO DOČASNÝM PRESUNUTÍM
POLOHY ZASTÁVKY

PRACOVISKO
BUS
AMERICKÁ TRIEDA
AMERICKÁ TRIEDA
ŽELIARSKA

SO 01 AMERICKÁ TRIEDA

Značka		Popis značky
131		Práca
411-20		Zníženie počtu jazdných pruhov
503-20		Smerová šípka
702		Smerovacia doska (šípová)
702		Smerovacia doska (šrafovaná)
701		Zábrana na označenie uzávierky

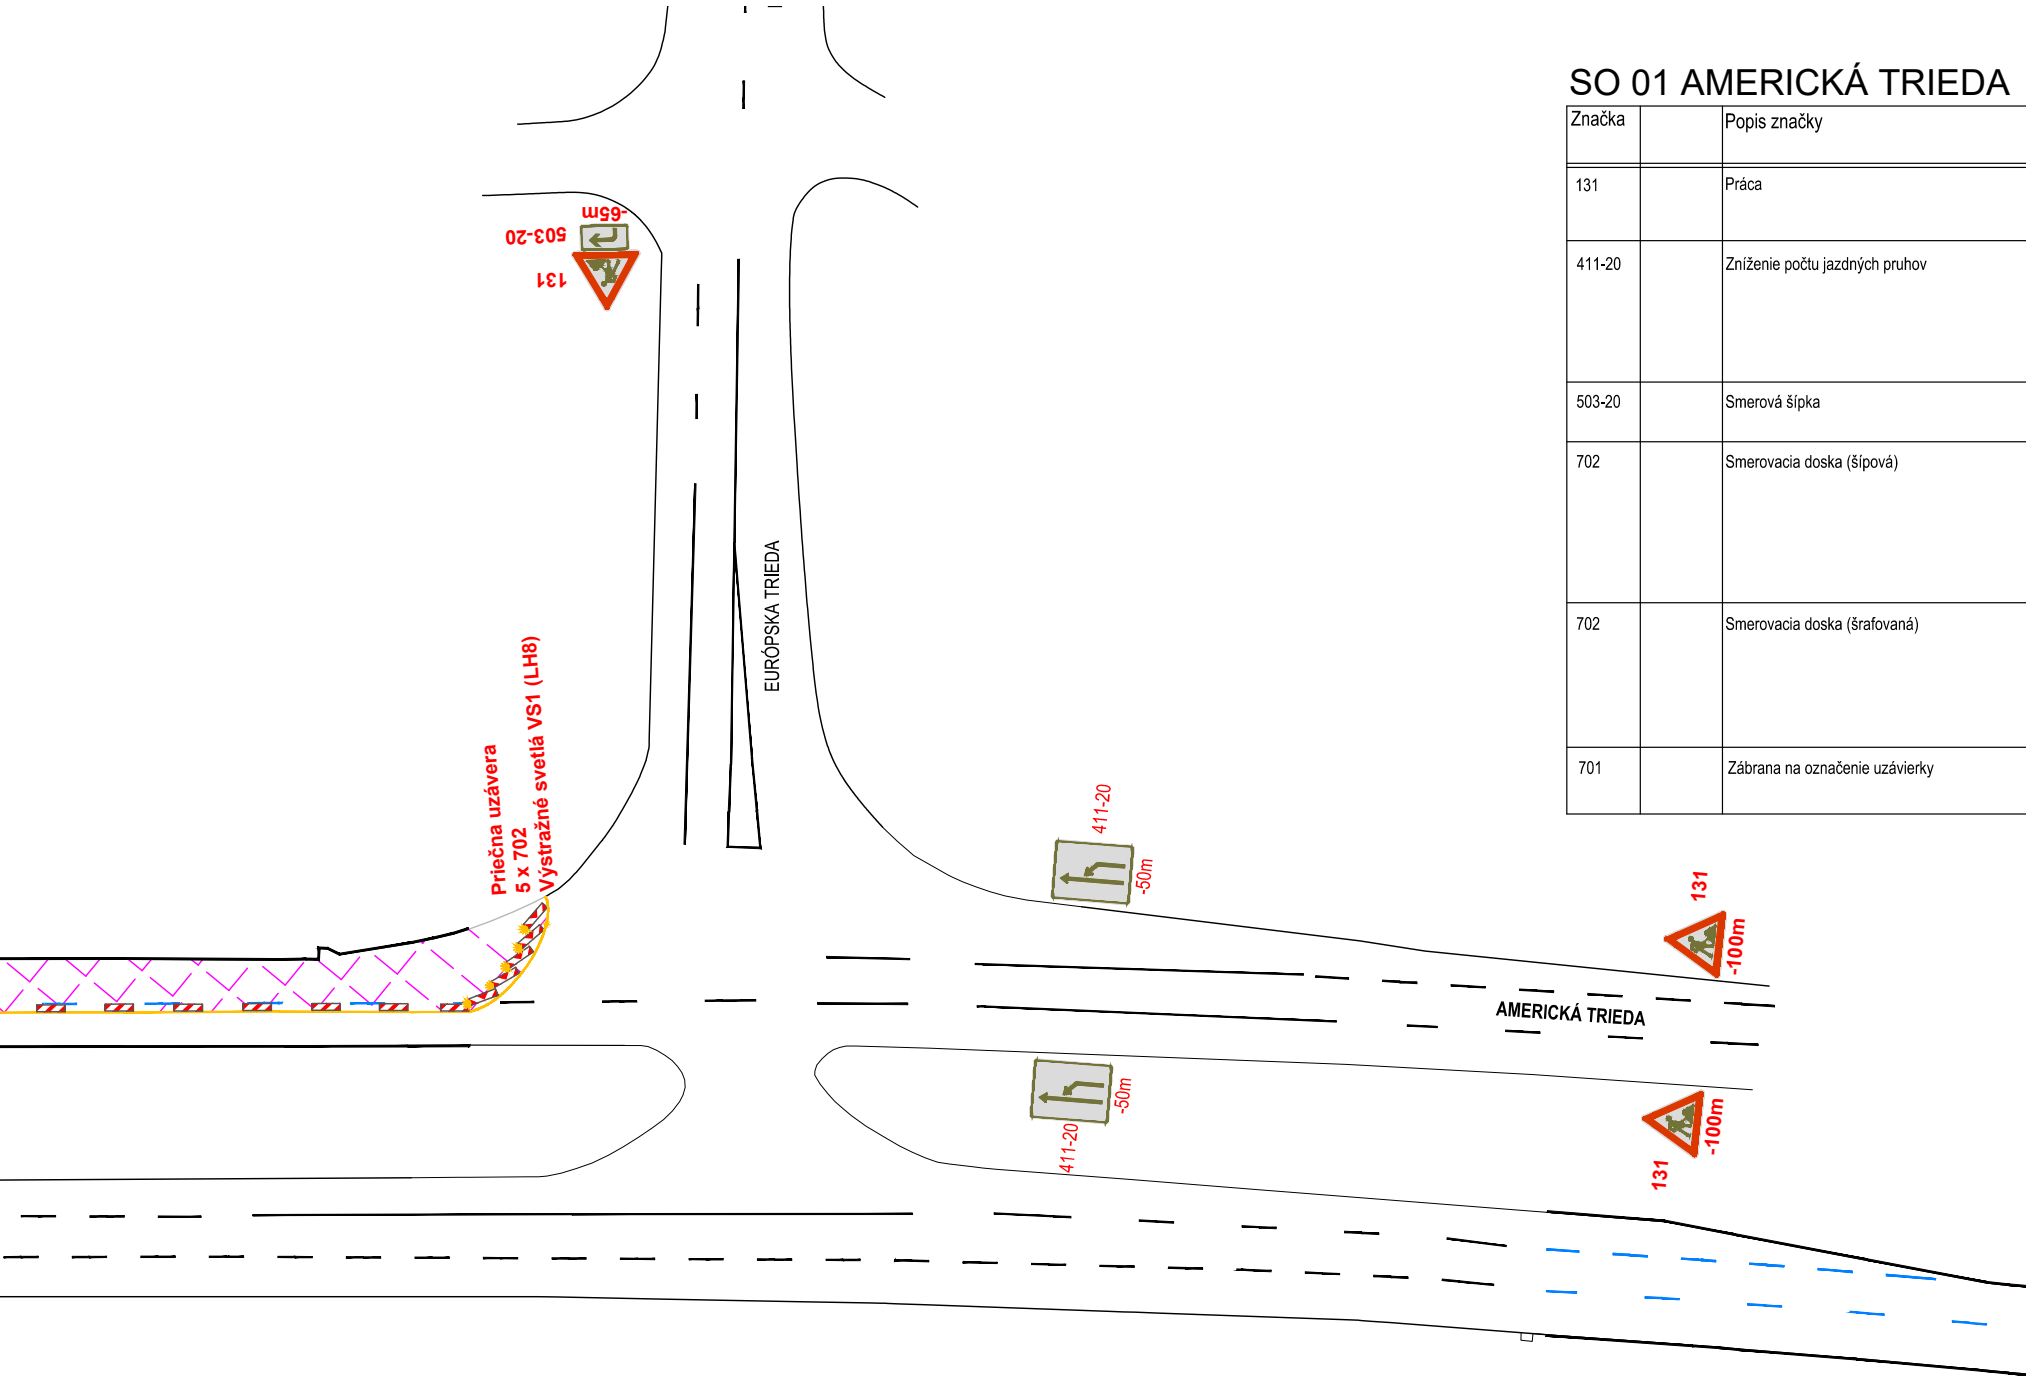
-65m
503-20
131
Priečna uzávera
5 x 702
Výstražné svetlá VS1 (LH8)
EURÓPSKA TRIEDA
411-20
-50m
131
-100m
AMERICKÁ TRIEDA
411-20
-50m
131
-100m

VÝKAZ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

	Zobrazenie značky	Rozmer značky	Spôsob upevnenia značky
		a = 900 5 ks	Samostatný stojan
		1600 x 1200 4 ks	Samostatný stojan
		330 x 600 1 ks	Spoločný stojan s 131
		250 x 1000 10 ks s VS1 10 ks bez VS1	Samostatný stojan
		250 x 1000 126 ks	Samostatný stojan
		250 x 1000 3 ks s VS1	Samostatný stojan


AMERICKÁ TRIEDA

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ľubomír Chromý	
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Marek Balko	
Navrhol, vypracoval:	Ing. Lenka Mandulová	Mandulova
Kontroloval:	Ing. Marek Balko	

Miesto stavby: Košice MČ. Sídlisko Ťahanovce

Okres: Košice

Investor - stavebník:
Mesto Košice
TR.SNP 48/A
040 11 Košice

Stavba: **Mesto Košice, Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, oprava komunikácie Americká trieda a Magnezitárska ul.**

SO/PS: SO 01 Americká trieda

Názov prílohy: Dočasné dopravné značenie - 5. etapa

SUDOP KOŠICE a.s.
Žriedlová č. 1, 040 01 KOŠICE

Riaditeľ: Ing. Ján Tóth

Zákazkové číslo:	2107
Dátum:	02/2022
Stupeň - účel:	DSPRS
Počet A4	9
Časť:	
Mierka:	1:500
Súprava:	
Príloha:	4.5
