

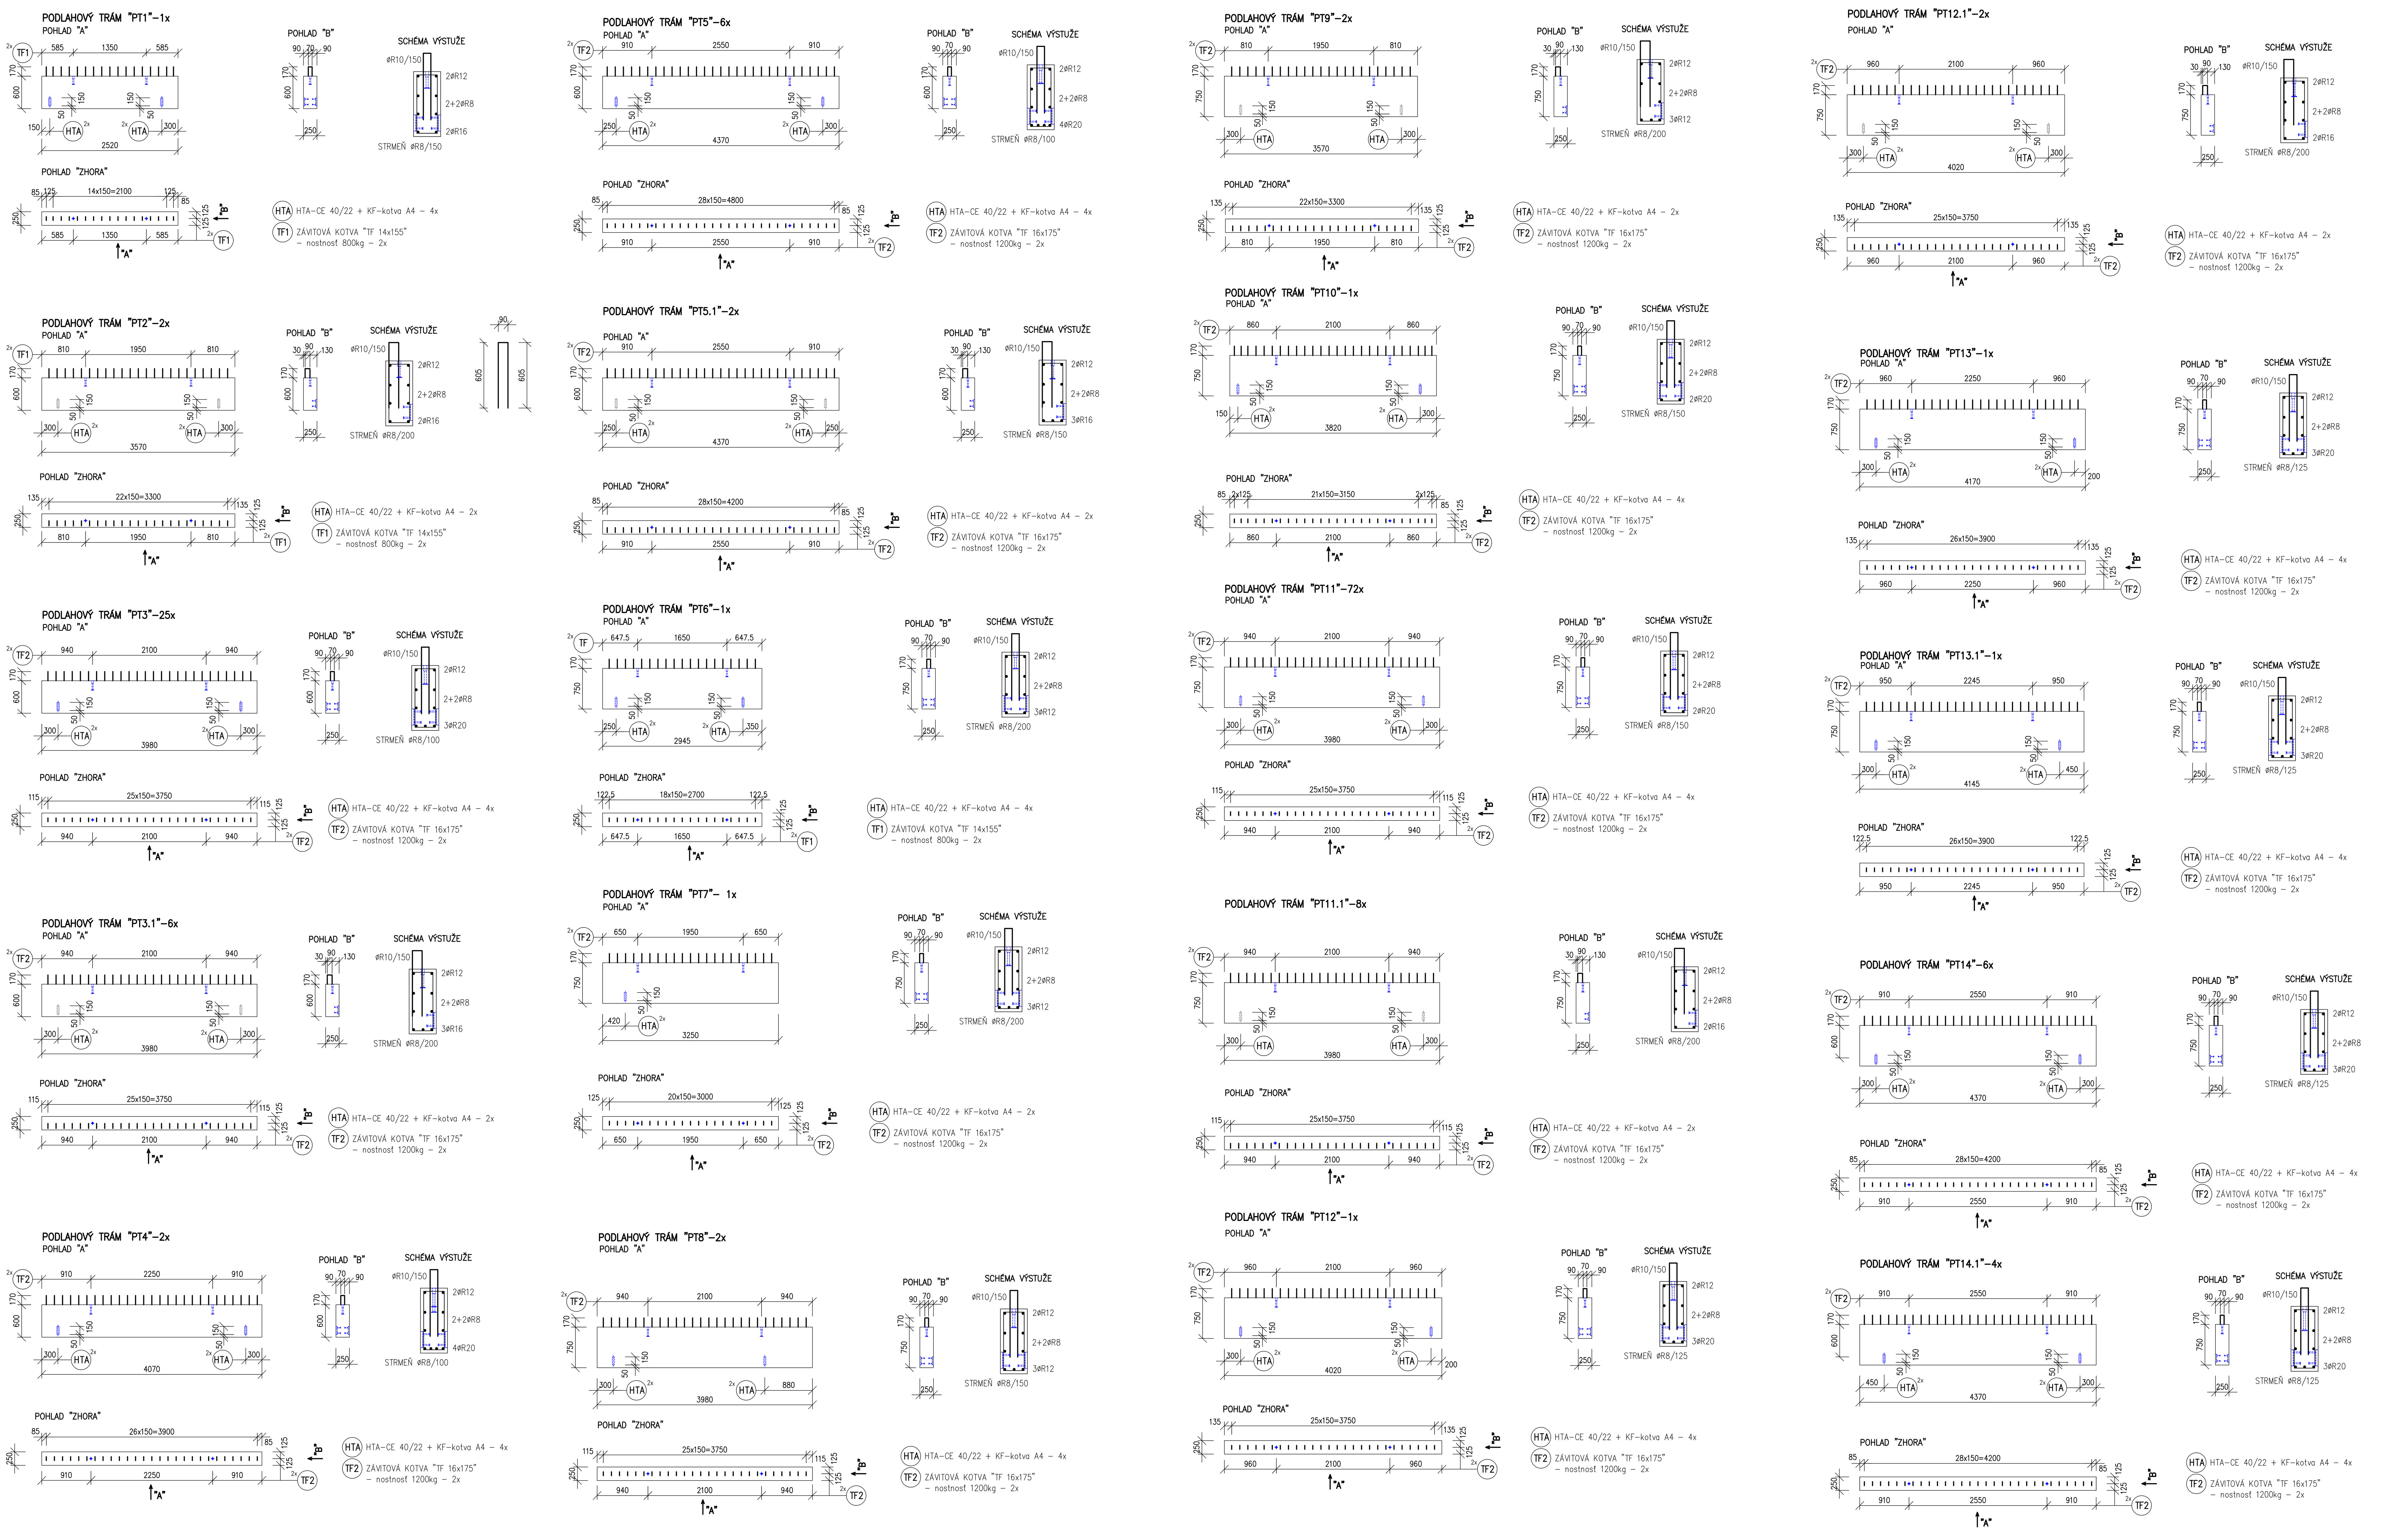


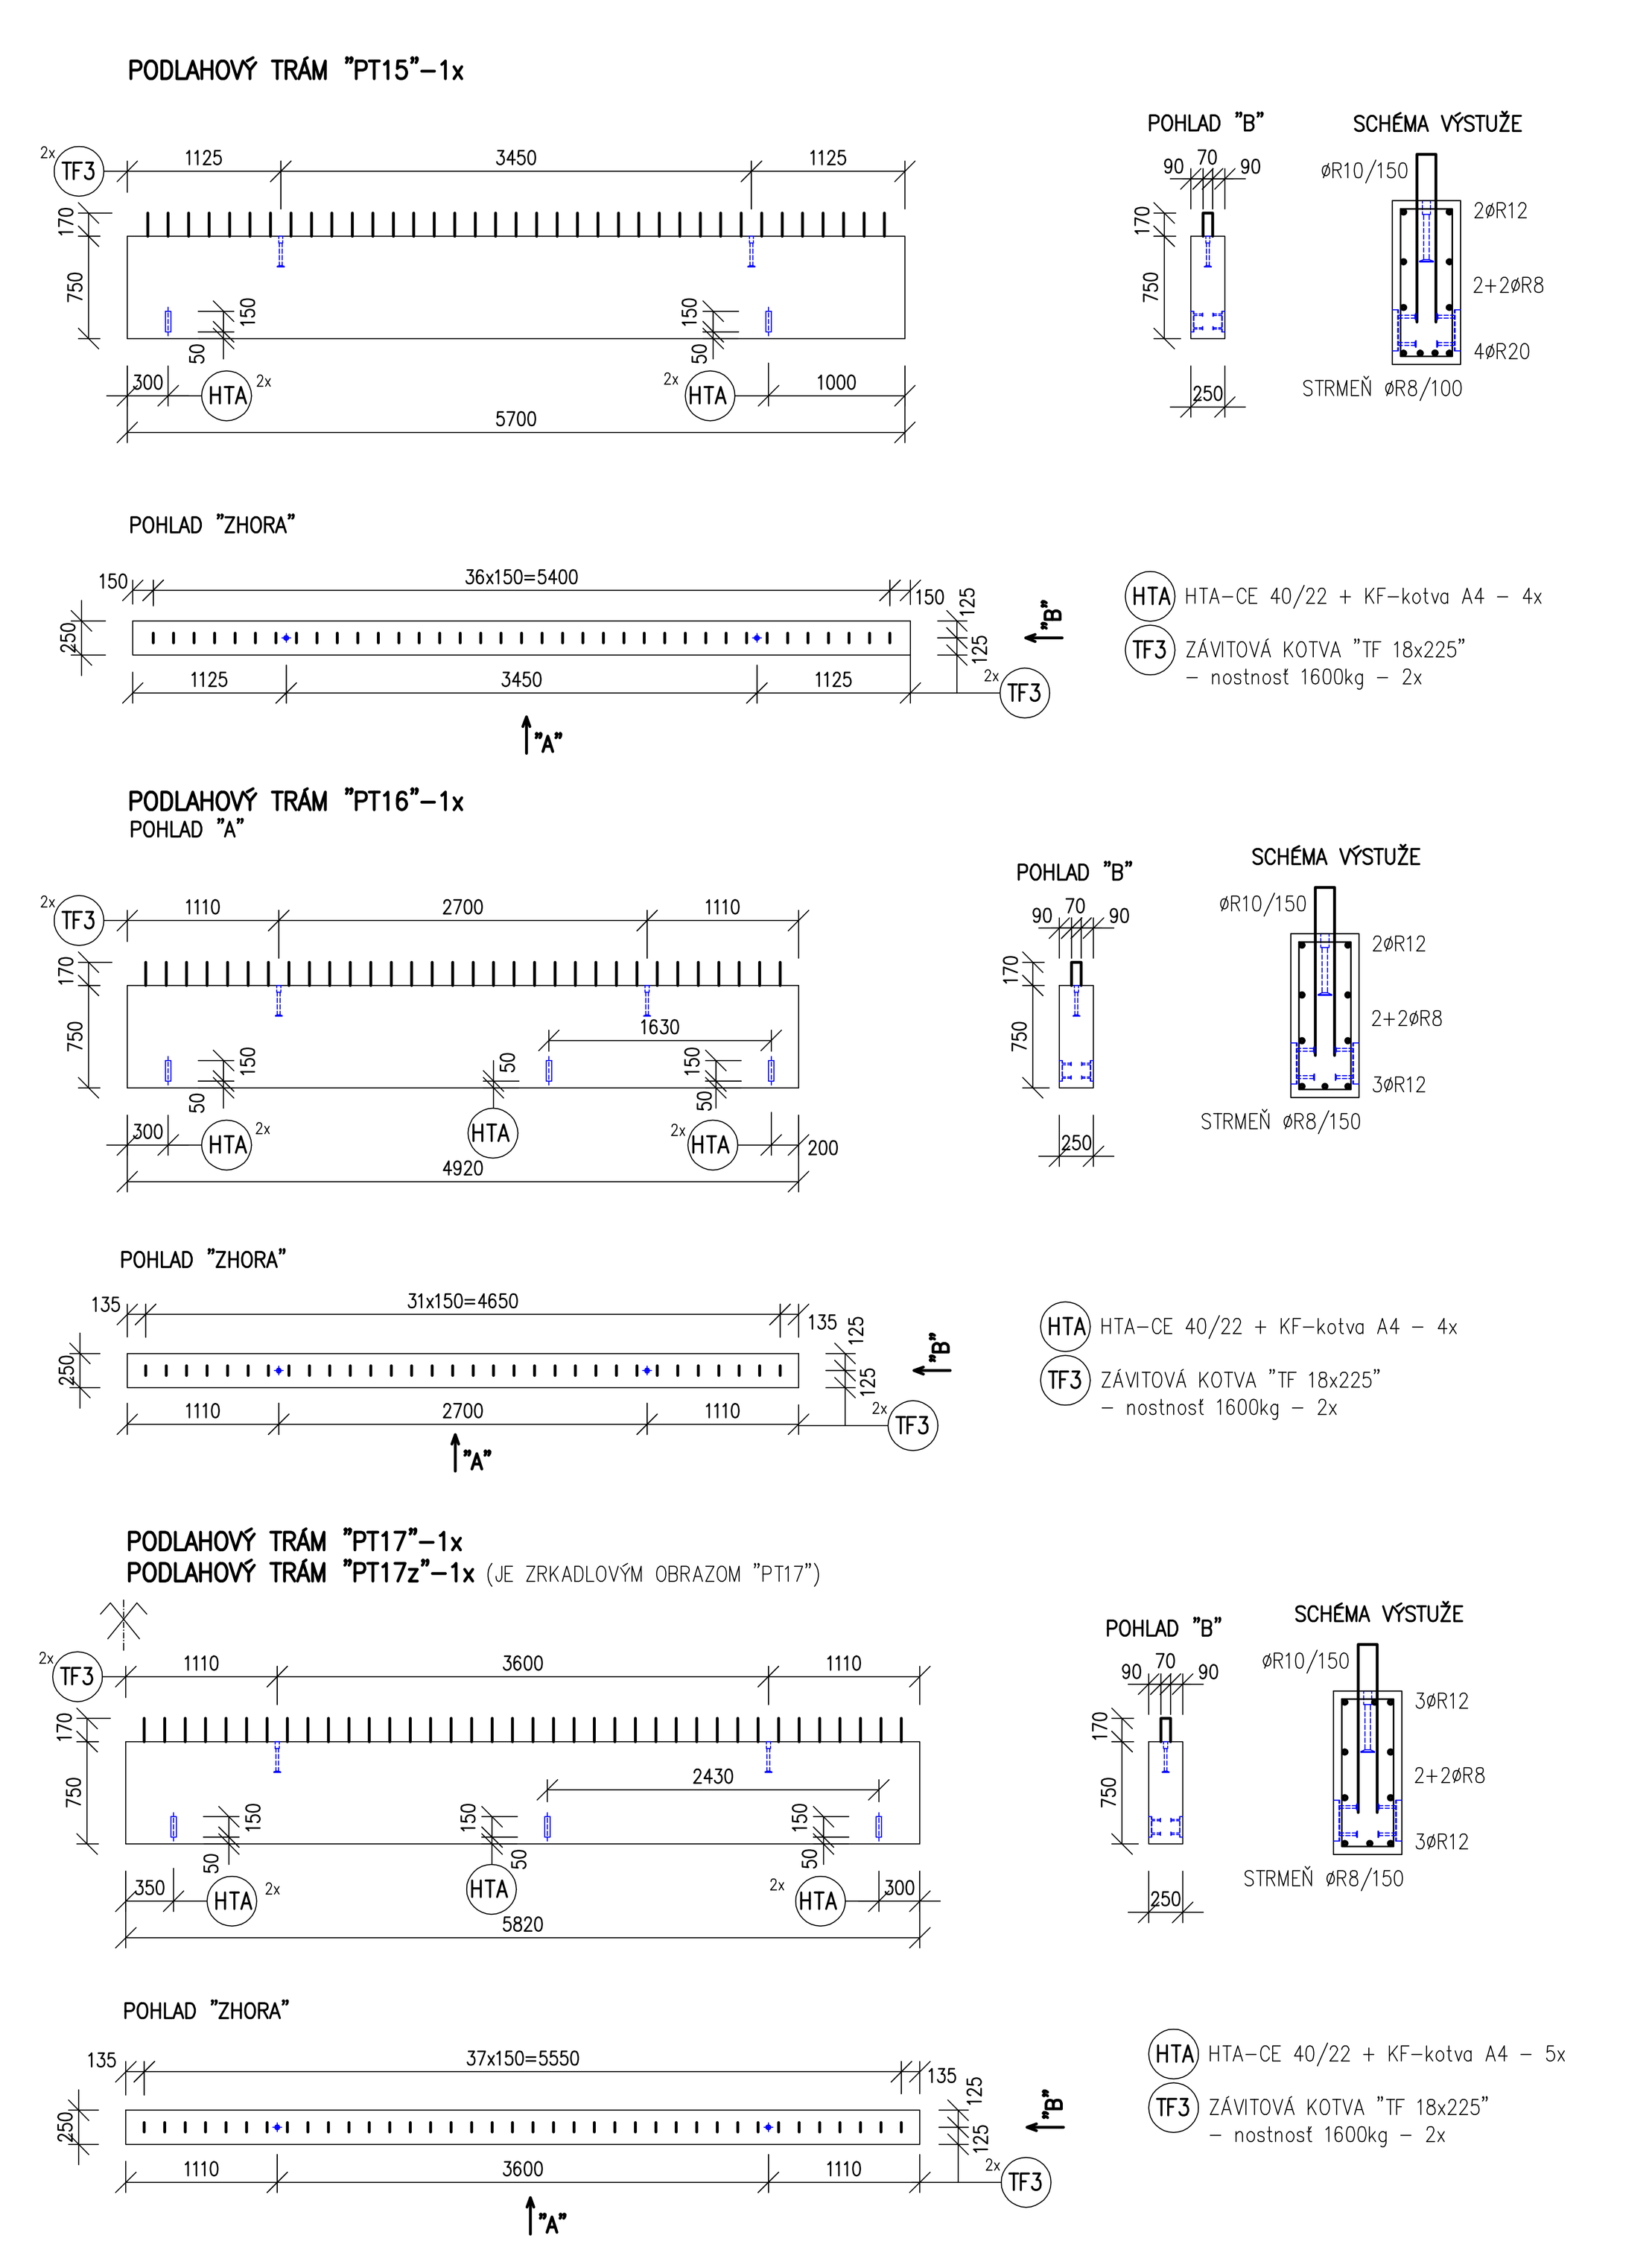

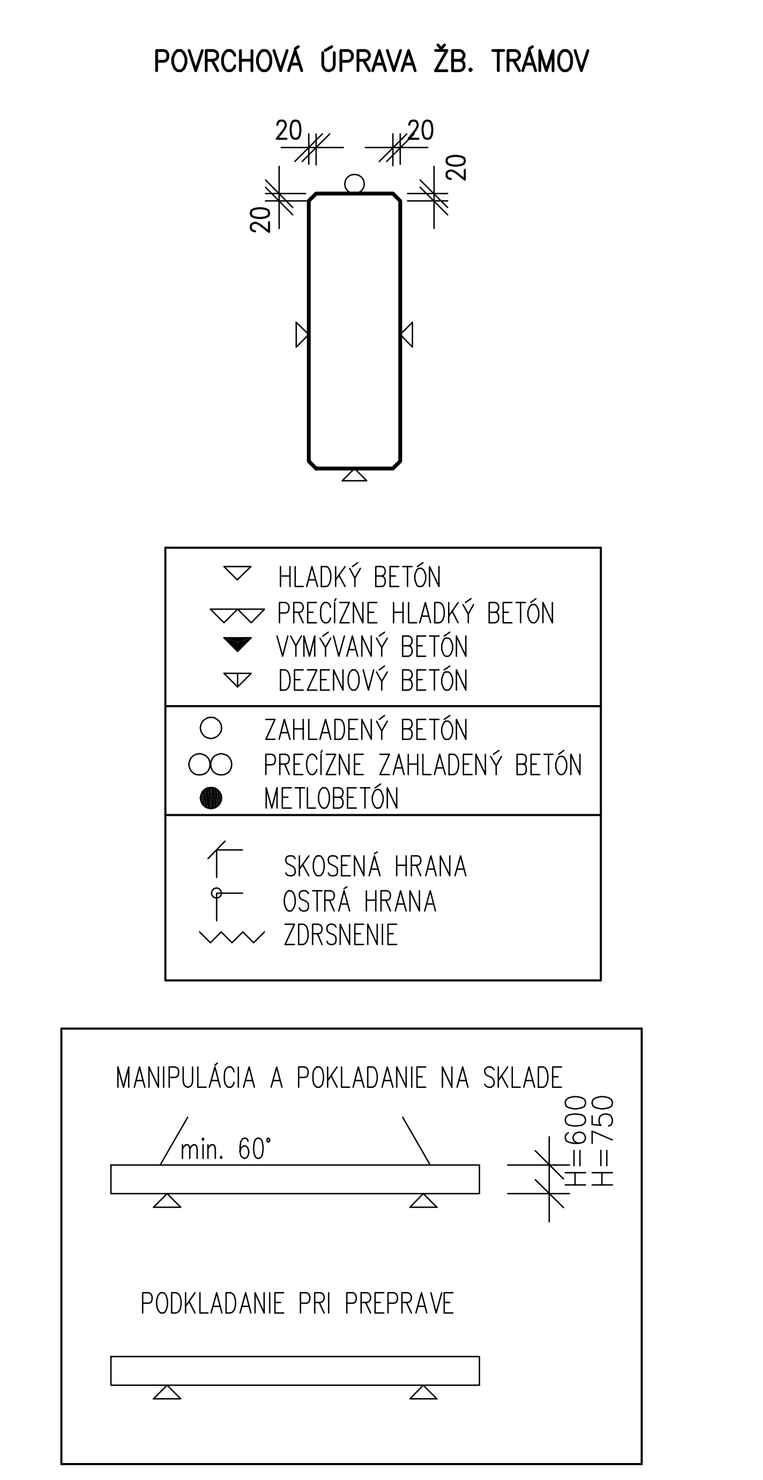

VÝKAZ ŽB. PREFABRIKOVANÝCH PODLAHOVÝCH TRÁMOV

OZNAČ.	POČET [ks]	DĹŽKA [mm]	ŠÍRKA [mm]	VÝŠKA [mm]	TRIEDA BETÓNU PODĽA STN EN 206	OBJEM [m³]	HMOTNOSŤ [kg]
PODLAHOVÉ TRÁMY							
PT1	1	2520	250	600	C 25/30–XC3(SK)	0,378	945
PT2	2	3570	250	600		0,428	1071
PT3	25	3980	250	600		0,597	1492,5
PT3.1	6	3980	250	600		0,597	1492,5
PT4	2	4070	250	600		0,610	1526,2
PT5	6	4370	250	600		0,655	1637,5
PT5.1	2	4370	250	600		0,655	1637,5
PT6	1	2945	250	750		0,552	1380
PT7	1	3250	250	750		0,609	1552,5
PT8	2	3980	250	750		0,746	1865
PT9	2	3570	250	750		0,669	1672,5
PT10	1	3820	250	750		0,716	1790,6
PT11	72	3980	250	750		0,746	1865
PT11.1	8	3980	250	750		0,746	1865
PT12	1	4020	250	750		0,753	1882,5
PT12.1	2	4020	250	750		0,753	1882,5
PT13	1	4170	250	750		0,781	1952,5
PT13.1	1	4170	250	750		0,781	1952,5
PT14	6	4370	250	750		0,819	2047,5
PT14.1	4	4370	250	750		0,819	2047,5
PT15	1	5700	250	750		1,068	2670
PT16	1	4920	250	750		0,922	2305
PT17	1	5820	250	750		1,091	2727,5
PT17z	1	5820	250	750		1,091	2727,5

ARMOVANIE ŽB. PREFA PODLAHOVÝCH TRÁMOV "PT..." BUDE SPODROBNENÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII ICH VÝROBCU !!!
BETÓN tr. STN EN260 C25/30–XC3(SK)–Cl0,4–Dmax16–S4
OCEĽ tr. B500B (10 505 R)

HLAVNÝ ING. PROJEKTU: ING. Miloš JANÍČEK	STATIK STAVBY: ING. Marián PETRÁŠ	VYPRACOVAL: Janka MIKUŠOVÁ	HIP
INVESTOR: HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany			

*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***
TEL. 0905–422156, 033–5511714
917 01 TRNAVA, HVIEZDOSLAVOVA 10

STAVBA:
NOVÁ EXPEDÍCIA – HYZA TOPOĽČANY
SO – 21 EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ
SO – 22 SOCIÁLNO–ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

OBSAH VÝKRESU:
NÁVRH TVARU A ARMOVANIA ŽB. TRÁMOV "PT..."

ŠPEC.	STATIKA – BETÓN
TK	
MIERKA	1:50
POČET A4	12 A4
STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
DÁTUM	APRÍL 2022
ZÁK. ČÍSLO	A–07/2022
ARCHÍVNE ČÍSLO	
ČÍS.VÝKR.	S–4
