

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. SNM-HUM-ZOD-2023/2103

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

1) Objednávateľ:

Názov:

Slovenské národné múzeum

Oprávnené konať na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea vydanéj rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK- 1062/2002-1 z 1. júla 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea.

Sídlo:

Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06
Bratislava 16

Štatutárny zástupca:

Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ

Zástupca oprávnený konať
a rozhodovať vo veciach

a) zmluvných:

PhDr. Zlatica Kendrová, PhD.,
riaditeľka SNM – Hudobné múzeum v Bratislave

b) plat.podmienok a fakturácie:

Ing. Dana Slobodová – projektová manažérka

Právna forma:

Štátna príspevková organizácia

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu/IBAN:

SK5881800000007000243821

BIC:

SPSRSKBA Štátna pokladnica

IČO:

00164721

DIČ:

2020603068

IČ DPH:

SK 2020603068

Fakturačná adresa:

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,
P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

(ďalej len „objednávateľ“)

2) Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Metrostav Slovakia a.s.

Sídlo:

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Adresa na doručovanie:

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaný:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sa, Vložka č. 5753/B

Bankové spojenie:

Komerční banka, a.s.

Mena:

EUR

IBAN: SK75 8100 0001 2319 2174 0227
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Matúš Mačej
- b) technických: Ing. Matúš Mačej, Ing. Daniel Deset

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“, jednotlivito „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.06.2023 Zmluvu o dielo č. SNM-HUM-ZOD-2023/2103 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.09.2023 (ďalej ako „Zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s postupom zadávania nadlimitných zákaziek podľa ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ“.
- 2) Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 14 bod 14.3 Zmluvy dohodli na zmene jej znenia formou tohto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 1) Zmluvné strany sa na základe bodu 2.2.2 Článku 2 Zmluvy dohodli, že z dôvodu nepredvídateľných nálezov odkrytých v priebehu reštaurátorských prác sa týmto Dodatkom mení - v zmysle vyššie uvedeného - termín dokončenia a odovzdania diela zhotoviteľom uvedený v bode 2.1.3 Článku 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že termín dokončenia a odovzdania diela sa predlžuje a zhotoviteľ dokončí a odovzdá dielo objednávateľovi najneskôr do 31.12.2023. Textové zdôvodnenie zmeny tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2) Predmetom Dodatku je zároveň aktualizácia Prílohy č. 2 Zmluvy „Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby“ s tým, že sa táto v plnom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 2 Zmluvy „Vecný, finančný a časový harmonogram“ tvoriacou Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 1) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2) Tento Dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento Dodatok a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto Dodatku v plnom rozsahu.

- 3) Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy prevezme zhotoviteľ a štyri rovnopisy prevezme objednávateľ.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah je určitý, zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 5) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Zdôvodnenie zmien, textová časť
Príloha č. 2 – Vecný, finančný a časový harmonogram

V Bratislave, dňa29. NOV. 2023

V BRATISLAVE dňa 29.11.2023

Za objednávateľa:

.....


Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ
Slovenské národné múzeum

.....


PhDr. Zlatica Kendrová, PhD.
riaditeľka
Slovenské národné múzeum –
Hudobné múzeum v Bratislave

Za zhotoviteľa:



na základe poverenia
Metrostav Slovakia a.s.

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(55)

ZDÔVODNENIE ZMIEN

k Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. SNM-HuM-ZOD-2023/2103

KAŠTIEĽ DOLNÁ KRUPÁ

Vzhľadom na vzácne nálezy, stav, charakter objektu a jeho prevádzku je vhodné optimalizovať postup pri určitých druhoch prác, ktoré mali byť realizované v ďalších etapách rekonštrukcie. Optimalizáciou určitých prác je možné zabezpečiť lepšie vlhkosťné pomery v objekte, zachovanie nálezov vzácnej freskovej výzdoby, vhodnejšie podmienky a pozície pre slaboprúdovú technológiu ako aj elimináciu prípadných duplicitných nákladov pri určitých prácach vzhľadom aj na požiadavky KPÚ.

Reštaurovanie m.č. 112 a presun ústredne EPS do m.č. 004a:

Pri reštaurátorských prácach v miestnosti č. 112 na prízemí (bývalá kancelária) reštaurátori odkryli vzácne nálezy malieb z konca 18. stor. Na fotografii vidieť prebiehajúci plošný odkryv spoločne s vyvedenými káblami na ústredne EPS (elektrická požiarne signalizácia) a CCTV (kamier), ktoré mali byť drážkované v stene a ukončené centrálnou ústredňou EPS a na bočnej stene ústredňou CCTV. Plošný odkryv ukázal, že vzácne maľby sú na všetkých stenách miestnosti.

Na KD č. 18 zo dňa 15.11.2023 sa spoločne s KPÚ, TDI, GP a zhotoviteľom konzultovala možnosť presunu týchto technických zariadení do miestnosti č. 004a (telefónna ústredňa) na 1.PP, kde je aj ústredňa EZS (elektronický zabezpečovací systém). Toto riešenie sa ukázalo po obhliadke ako realizovateľné cez povalu a komín bez poškodenia vzácnych častí výzdoby kaštieľa. KPÚ trvá na zachovaní malieb v plnom rozsahu ako aj nutnosti presunu daných ústrední do inej časti kaštieľa (viď zápis v stavebnom denníku z KD č. 18).


Denné záznamy stavby	List č. 015065	Dátum
BOLA VYKONANÁ OBHLIADKA PLOŠNÉHO ODKRYVU V M.Č. 112. BOLO ZISTENÉ, ŽE SLOHOVÁ VÝRAČBA JE ZACHOVANÁ V CELOM ROZSAHU MIESTNOSTI. VZHLADOM K TOTO KPÚ TERAZ POŽADUJE ÚPRAVU PROJEKTU VRA- TIA NAVRHOVANÝCH SLABOPRÚDOVÝCH PRVKOV Z TĚJTO MIESTNOSTI.		15.11.2023
KPÚ		
TDI		

Zápis z KD č. 18 zo dňa 15.11.2023


Túto závažnú zmenu projektu požiarnej ochrany je nutné najskôr spracovať s autorizovaným projektantom, s projektantom požiarnej ochrany a následne požiadať o schválenie OR HaZZ – tento proces bude trvať a nemožno ho stihnúť do 30.11.2023; tieto úkony zabezpečuje objednávateľ. Z dôvodu potreby uvedenia objektu do predčasného užívania je nevyhnutné zabezpečiť funkčnosť EPS a teda presun káblových rozvodov do m.č. 004a. Konkrétny rozsah prác a dodávok súvisiacich s touto zmenou (s presunom káblových rozvodov do m.č. 004a) a ich dopady na cenu diela budú predmetom osobitných rokovaní medzi zmluvnými stranami a budú riešené v súlade so zmluvou.




m.č. 112 – aktuálny stav

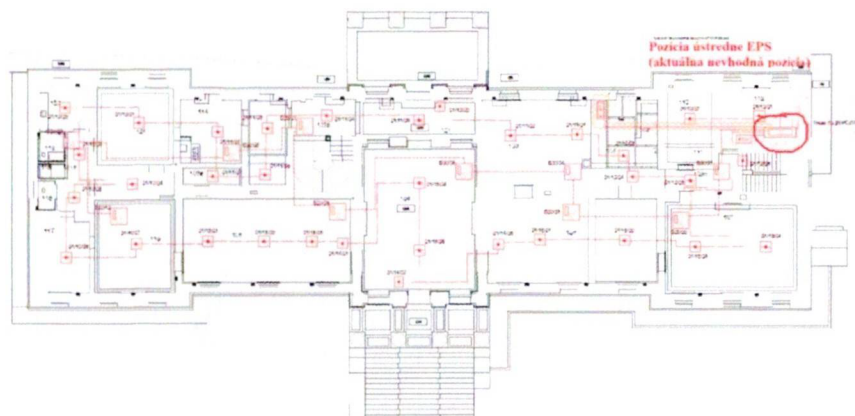

Nežiaduca pozícia ústredne EPS v m.č. 112

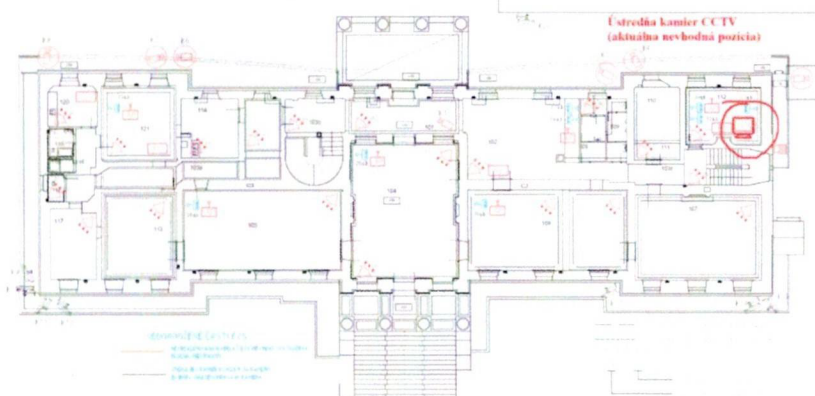

Nežiaduca pozícia ústredne kamier v m.č. 112

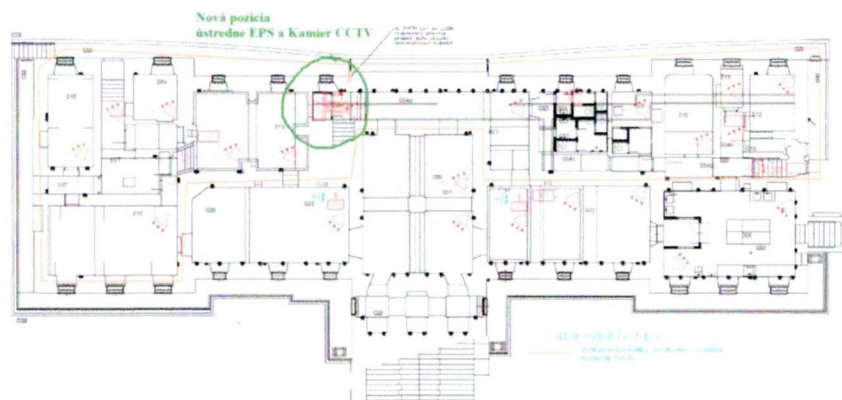

Nová pozícia ústredne EPS a kamier v m.č. 004a v 1.PP

