

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 05.05.2020

č. [199/2020, K-2020/05/01-ZD]
uzatvorený medzi zmluvnými stranami
(ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Názov: **CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.**
Sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO: 31 737 862
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 302/P
Zastúpený: Ing. Vladimír Balog – predseda predstavenstva
Ing. Peter Ferjanček – podpredseda predstavenstva

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KONOMET s.r.o.**
Sídlo: Michalovská 43, 040 11 Košice
IČO: 31 736 700
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8707/V
V mene spoločnosti
koná: Ing. Róbert Guzej – konateľ spoločnosti
Ing. Rastislav Aschmann – konateľ spoločnosti

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA, bod 4.12.5 Zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa 5.5.2020, evidovanej pod číslom: 199/2020, K-2020/05/01-ZD (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 V súlade s bodom 3.6.3 Článku 3 Zmluvy, z dôvodu vzniku skutočností za ktoré nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ, majúci povahu vyššej moci súvisiacich s dlhotrvajúcou celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19, v dôsledku ktorých nebolo objektívne možné bez prerušenia zabezpečiť dodávky materiálu potrebného k vykonávaniu Diela, ako aj realizovať samotné práce na Diele, na základe čoho dochádza k oneskoreniu dokončenia Diela, zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela, t. z. znenie bodu 3.6.2., bodu 3.6. Článku 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením:
- „3.6.2 Lehota na vykonanie Diela je 05.10.2021 (t.j. sedemnást (17) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby vyhovelo Funkčným skúškam, bolo pripravené na úspešné absolvovanie konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby alebo obdobného rozhodnutia alebo schválenia, a aby bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy.“,
- 1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy, „Harmonogram prác“ v časti „Harmonogram prác stavby – CHEMOSVIT a FINCHEM vetva východ“ sa ruší a nahrádza sa novým harmonogram ako: Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 k Zmluve pod názvom „Harmonogram prác stavby – CHEMOSVIT a FINCHEM vetva východ / zmena1“.
- 1.1.3 Príloha č. 1 Zmluvy, Špecifikácia predmetu Zákazky v prevádzkových súboroch pod označením PS 01 PRIMÁRNE HORÚCOVODNÉ ROZVODY, PS-01.01 Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch - vetva **Východ**, 600-UZEMNENIE a PS 01 PRIMÁRNE HORÚCOVODNÉ ROZVODY, PS-01.02 Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch - vetva **Západ**, 600-UZEMNENIE sa ruší a nahrádza sa novou projektovou dokumentáciou s identickým názvom prevádzkových súborov a je označená ako zmena č.1.

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Štúrova 101, 05921 Svit

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom
založených na dopyte po využití tepla

1

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 k Zmluve pod názvom „Harmonogram prác stavby – CHEMOSVIT a FINCHEM vetva východ / zmena1“

- 1.1.4 Na základe zmeny technického riešenia (predchádzajúci bod dodatku) je upravená aj celková Zmluvná cena. Na základe uvedenej skutočnosti sa bod 4.1.2. Zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením: Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 5 090 203,14 EUR

Sadzba DPH: 1 018 040,63 EUR

Cena s DPH: 6 108 243,77 EUR

(slovom: šesťmiliónovstoosemtisícdeväťstoštyridsaťtri a sedemdesiatšesť centov).

- 1.1.5 Na základe zmeny technického riešenia (predchádzajúci bod dodatku) je upravená aj Príloha č. 2 Zmluvy Rozpočet. Ruší sa pôvodný Rozpočet a nahrádza sa novým Rozpočtom pod označením Rozpočet / zmena 1

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy:

Príloha č. 1 Realizačný projekt / zmena 1

Príloha č. 1.1 PS-01.01 Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch – vetva Východ, 600-UZEMNENIE / zmena 1

Príloha č. 1.2 PS-01.02 Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch – vetva Západ, 600-UZEMNENIE / zmena 1

Príloha č. 1.3 Výkaz Výmer

Príloha č. 1.4 Rozpočet

Príloha č. 2 Rozpočet / zmena 1, KONOMET s.r.o.

Príloha č. 3 Harmonogram prác, Harmonogram prác stavby – CHEMOSVIT a FINCHEM vetva východ / zmena 1

Objednávateľ Vo Svite Dňa 3.9.2021	Zhotoviteľ V Košiciach Dňa 3.9.2021
Za CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Ing. Vladimír Balog predseda predstavenstva	Za KONOMET s.r.o. Ing. Róbert Guzej konateľ spoločnosti
Za CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Ing. Peter Ferjanček podpredseda predstavenstva	Za KONOMET s.r.o. Ing. Rastislav Aschmann konateľ spoločnosti

Č.V.	NÁZOV VYKRESU	FORMÁT
601	DETAIL PEVNÉHO BODU OSADENIA	2 A4
602	DETAIL KLZNEHO ULOŽENIA	2 A4
603	DETAIL KLZNEHO ULOŽENIA S OSOVÝM VEDENÍM	2 A4
604/1	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA - VYZNAČENIE UZEMŇOVACÍCH BODOV časť č.1	12 A4
604/2	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA - VYZNAČENIE UZEMŇOVACÍCH BODOV časť č.2	14 A4
604/3	ZOZNAM UZEMŇOVACÍCH BODOV + SÚPIS MATERIÁLU	1 A4

Generálny projektant:  Termoklima, s r. o., Košická 3646/68 058 01 Poprad		Projektant:  EZPRO, s r. o. Ul. Ludvíka Svobodu 4885/93 058 01 Poprad																						
Investor: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit																								
Názov projektu: ROZVOJ ÚČINNEJŠÍCH SYSTÉMOV CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM ZALOŽENÝCH NA DOPYTE PO VYUŽITELNOM TEPLE V MESTE SVIT A PRIEMYSELNÝCH AREÁLOCH CHEMOSVIT A FINCHEM			Stupeň: REALIZAČNÝ PROJEKT																					
Časť: PS 01 PRIMÁRNE HORÚCOVODNÉ ROZVODY PS-01.02 Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch - vetva Západ			Poradové číslo: 1																					
Profesia: 600-UZEMNENIE																								
Miesto stavby: SVIT																								
Vedúci projektant: Ing. Ján Stanek	Zodpovedný projektant: Ing. Milan Buranovský	Dátum - zmena: 06 / 2021 - č.1	Zákazka: TK-2017-044																					
Obsah:  A. Technická správa B. Výkaz / výmer C. Výkresová časť: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Č.v.</th> <th>NÁZOV VYKRESU</th> <th>FORMÁT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601</td> <td>DETAIL PEVNÉHO BODU OSADENIA</td> <td>2 A4</td> </tr> <tr> <td>602</td> <td>DETAIL KLZNEHO ULOŽENIA</td> <td>2 A4</td> </tr> <tr> <td>603</td> <td>DETAIL KLZNEHO ULOŽENIA S OSOVÝM VEDENÍM</td> <td>2 A4</td> </tr> <tr> <td>604/1</td> <td>AXONOMETRICKÁ SCHÉMA - VYZNAČENIE UZEMŇOVACÍCH BODOV časť č.1</td> <td>10 A4</td> </tr> <tr> <td>604/2</td> <td>AXONOMETRICKÁ SCHÉMA - VYZNAČENIE UZEMŇOVACÍCH BODOV časť č.2</td> <td>12 A4</td> </tr> <tr> <td>604/3</td> <td>ZOZNAM UZEMŇOVACÍCH BODOV + SÚPIS MATERIÁLU</td> <td>1 A4</td> </tr> </tbody> </table>				Č.v.	NÁZOV VYKRESU	FORMÁT	601	DETAIL PEVNÉHO BODU OSADENIA	2 A4	602	DETAIL KLZNEHO ULOŽENIA	2 A4	603	DETAIL KLZNEHO ULOŽENIA S OSOVÝM VEDENÍM	2 A4	604/1	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA - VYZNAČENIE UZEMŇOVACÍCH BODOV časť č.1	10 A4	604/2	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA - VYZNAČENIE UZEMŇOVACÍCH BODOV časť č.2	12 A4	604/3	ZOZNAM UZEMŇOVACÍCH BODOV + SÚPIS MATERIÁLU	1 A4
Č.v.	NÁZOV VYKRESU	FORMÁT																						
601	DETAIL PEVNÉHO BODU OSADENIA	2 A4																						
602	DETAIL KLZNEHO ULOŽENIA	2 A4																						
603	DETAIL KLZNEHO ULOŽENIA S OSOVÝM VEDENÍM	2 A4																						
604/1	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA - VYZNAČENIE UZEMŇOVACÍCH BODOV časť č.1	10 A4																						
604/2	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA - VYZNAČENIE UZEMŇOVACÍCH BODOV časť č.2	12 A4																						
604/3	ZOZNAM UZEMŇOVACÍCH BODOV + SÚPIS MATERIÁLU	1 A4																						

Rekapitulácia stavieb / Zmena 1

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o. Košice

Miesto: Svit

Spracoval:

Dátum: 27.8.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
TK-2017-044	Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM	5 090 203,14	1 018 040,63	6 108 243,77	2 280,96	4 983 806,20	91 112,48	13 003,50	
Hlavná aktivita č. 1	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia horúcovodných rozvodov tepla – mesto Svit	334 445,95	66 889,19	401 335,14	2 280,96	332 164,99			
Hlavná aktivita č. 2	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia horúcovodných roz. t. – areály CHEMOSVIT a FINCHEM	4 755 757,19	951 151,44	5 706 908,63		4 651 641,21	91 112,48	13 003,50	
Celkom		5 090 203,14	1 018 040,63	6 108 243,77	2 280,96	4 983 806,20	91 112,48	13 003,50	

Rekapitulácia objektov stavby / Zmena 1

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o. Košice

Miesto: Svit

Spracoval:

Dátum: 27.7.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
TK-2017-044	Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM	5 090 203,14	1 018 040,63	6 108 243,77	2 280,96	4 983 806,20	91 112,48	13 003,50	
Hlavná aktivita č. 1	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia horúcovodných rozvodov tepla – mesto Svit	334 445,95	66 889,19	401 335,14	2 280,96	332 164,99			
SO 01	Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)	159 637,64	31 927,53	191 565,17	1 140,48	158 497,16			
100	SO 01 - Stavebné úpravy	30 389,96	6 077,99	36 467,95		30 389,96			
400	SO 01 - Ústredné vykurovanie	109 927,05	21 985,41	131 912,46	1 140,48	108 766,57			
700	SO 01 - Komunikácie a sadové úpravy	19 320,63	3 864,13	23 184,76		19 320,63			
SO 02	Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)	145 927,75	29 185,55	175 113,30	1 140,48	144 787,27			
100	SO 02 - Stavebné úpravy	31 047,35	6 209,47	37 256,82		31 047,35			
400	SO 02 - Ústredné vykurovanie	96 860,78	19 372,16	116 232,94	1 140,48	95 720,30			
700	SO 02 - Komunikácie a sadové úpravy	18 019,62	3 603,92	21 623,54		18 019,62			
DZ	SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-306), časť E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby	26 959,00	5 391,80	32 350,80		26 959,00			
TPV	SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby typovými schémami	1 921,56	384,31	2 305,87		1 921,56			
Hlavná aktivita č. 2	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia horúcovodných roz. t. – areály CHEMOSVIT a FINCHEM	4 755 757,19	951 151,44	5 706 908,63		4 651 641,21	91 112,48	13 003,50	
PS 01	Primárne horúcovodné rozvody	2 999 773,61	599 954,72	3 599 728,33		2 942 173,79	44 596,32	13 003,50	
PS 01.01	Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch - vetva Východ	1 348 174,31	269 634,86	1 617 809,17		1 325 375,63	17 647,68	5 151,00	
100	PS01.01 Východ - Stavebné úpravy	8 557,09	1 711,42	10 268,51		8 557,09			
200	PS01.01 Východ - Statika	478 984,66	95 796,93	574 781,59		467 397,46	11 587,20		
400	PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie	831 580,61	166 316,12	997 896,73		830 440,13	1 140,48		
PS01.01-600	PRIMÁRNE ROZVODY NA POTRUBNÝCH MOSTOCH - VETVA VÝCHOD	28 951,95	5 790,39	34 742,34		18 880,95	4 920,00	5 151,00	
ON	PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady	100,00	20,00	120,00		100,00			
PS 01.02	Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch - vetva Západ	1 486 999,06	297 399,81	1 784 398,87		1 458 978,88	20 167,68	7 852,50	
100	PS01.02 Západ - Stavebné úpravy	17 818,24	3 563,65	21 381,89		17 818,24			

Rekapitulácia objektov stavby / Zmena 1

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o. Košice

Miesto: Svit

Spracoval:

Dátum: 27.7.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
200	PS01.02 Západ - Statika	433 480,70	86 696,14	520 176,84		421 893,50	11 587,20		
400	PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie	992 035,92	198 407,18	1 190 443,10		990 895,44	1 140,48		
PS01.02-600	PRIMÁRNE ROZVODY NA POTRUBNÝCH MOSTOCH - VETVA ZÁPAD	43 564,20	8 712,84	52 277,04		28 271,70	7 440,00	7 852,50	
ON	PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady	100,00	20,00	120,00		100,00			
PS 01.03	Vnútorne nadzemné primárne rozvody vo výrobných halách - vetva Východ	25 133,82	5 026,76	30 160,58		23 993,34	1 140,48		
100	PS01.03 Východ - Stavebné úpravy	2 766,89	553,38	3 320,27		2 766,89			
400	PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie	22 266,93	4 453,39	26 720,32		21 126,45	1 140,48		
ON	PS01.03 Východ - Vnútorne rozvody - Ostatné náklady	100,00	20,00	120,00		100,00			
PS 01.04	Vnútorne nadzemné primárne rozvody vo výrobných halách - vetva Západ	35 559,41	7 111,88	42 671,29		34 418,93	1 140,48		
100	PS01.04 Západ - Stavebné úpravy	2 546,56	509,31	3 055,87		2 546,56			
400	PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie	32 912,85	6 582,57	39 495,42		31 772,37	1 140,48		
ON	PS01.04 Západ - Vnútorne rozvody - Ostatné náklady	100,00	20,00	120,00		100,00			
PS 01.05	Vonkajšie podzemné primárne rozvody - v areáli CHEMOSVIT a FINCHEM	103 907,01	20 781,40	124 688,41		99 407,01	4 500,00		
100	PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné úpravy	16 299,03	3 259,81	19 558,84		16 299,03			
400	PS01.05 Podzemné rozvody - Ústredné vykurovanie	87 482,98	17 496,60	104 979,58		82 982,98	4 500,00		
400.1	PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 94b	17 085,48	3 417,10	20 502,58		16 006,92	1 078,56		
400.2	PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt STROJCHEM 63	10 315,74	2 063,15	12 378,89		9 175,26	1 140,48		
400.3	PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt VÚCHV 15	11 449,19	2 289,84	13 739,03		10 308,71	1 140,48		
400.4	PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt AB, SC, 07a	48 632,57	9 726,51	58 359,08		47 492,09	1 140,48		
ON	PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné náklady	125,00	25,00	150,00		125,00			
PS 02	Kompaktné odovzdávacie stanice tepla	1 013 534,86	202 706,97	1 216 241,83		967 018,70	46 516,16		

Rekapitulácia objektov stavby / Zmena 1

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o. Košice

Miesto: Svit

Spracoval:

Dátum: 27.7.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
PS 02.01	Kompaktné odovzdávacie stanice tepla - vetva Východ	402 952,96	80 590,59	483 543,55		390 405,20	12 547,76		
KOST 01	VIGORA 1	25 725,03	5 145,01	30 870,04		24 584,55	1 140,48		
400	KOST 01 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	17 542,19	3 508,44	21 050,63		16 401,71	1 140,48		
500	KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	8 182,84	1 636,57	9 819,41		8 182,84			
KOST 03	Garáže CHEMOSVIT 7a	19 721,88	3 944,38	23 666,26		18 581,40	1 140,48		
400	KOST 03 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	11 623,71	2 324,74	13 948,45		10 483,23	1 140,48		
500	KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	8 098,17	1 619,63	9 717,80		8 098,17			
KOST 05	VÚCHV 16	26 679,87	5 335,97	32 015,84		25 539,39	1 140,48		
400	KOST 05 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	18 590,01	3 718,00	22 308,01		17 449,53	1 140,48		
500	KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	8 089,86	1 617,97	9 707,83		8 089,86			
KOST 07	PROVENT 18	22 530,48	4 506,10	27 036,58		21 387,52	1 142,96		
100	KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy	4 047,03	809,41	4 856,44		4 047,03			
400	KOST 07 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	10 481,84	2 096,37	12 578,21		9 338,88	1 142,96		
500	KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	8 001,61	1 600,32	9 601,93		8 001,61			
KOST 08	TATRAFAN 23	36 647,88	7 329,58	43 977,46		35 507,40	1 140,48		
400	KOST 08 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	25 344,18	5 068,84	30 413,02		24 203,70	1 140,48		
500	KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	11 303,70	2 260,74	13 564,44		11 303,70			
KOST 11	VÚCHV 33	22 009,22	4 401,84	26 411,06		20 868,74	1 140,48		
400	KOST 11 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	13 734,16	2 746,83	16 480,99		12 593,68	1 140,48		
500	KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	8 275,06	1 655,01	9 930,07		8 275,06			
KOST 12	CHEMOSVIT FÓLIE 34.1	68 122,14	13 624,43	81 746,57		66 981,66	1 140,48		
400	KOST 12 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	57 961,52	11 592,30	69 553,82		56 821,04	1 140,48		
500	KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 160,62	2 032,12	12 192,74		10 160,62			
KOST 13	CHEMOSVIT FÓLIE 35	75 486,19	15 097,24	90 583,43		74 345,71	1 140,48		

Rekapitulácia objektov stavby / Zmena 1

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o. Košice

Miesto: Svit

Spracoval:

Dátum: 27.7.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
400	KOST 13 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	65 432,06	13 086,41	78 518,47		64 291,58	1 140,48		
500	KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 054,13	2 010,83	12 064,96		10 054,13			
KOST 15	CHEMOSVIT FÓLIE 42.1	45 866,07	9 173,21	55 039,28		44 725,59	1 140,48		
400	KOST 15 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	37 002,34	7 400,47	44 402,81		35 861,86	1 140,48		
500	KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	8 863,73	1 772,75	10 636,48		8 863,73			
KOST 16	CHEMOSVIT FÓLIE 42.2, 42.3	29 602,60	5 920,52	35 523,12		28 462,12	1 140,48		
400	KOST 16 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	21 166,18	4 233,24	25 399,42		20 025,70	1 140,48		
500	KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS	8 436,42	1 687,28	10 123,70		8 436,42			
KOST 20	CHEMOSVIT FÓLIE 45	30 241,82	6 048,36	36 290,18		29 101,34	1 140,48		
400	KOST 20 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie	21 910,10	4 382,02	26 292,12		20 769,62	1 140,48		
500	KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia	8 331,72	1 666,34	9 998,06		8 331,72			
ON	PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady	100,00	20,00	120,00		100,00			
PM	PS02.01 KOST Východ - MaR premiestnenia meračov	219,78	43,96	263,74		219,78			
500	KOST 14 - PS02.01 - MaR, elektroinštalácia	219,78	43,96	263,74		219,78			
PS 02.02	Kompaktné odovzdávacie stanice tepla - vetva Západ	610 581,90	122 116,38	732 698,28		576 613,50	33 968,40		
KOST 17	CHEDOS 43	22 079,86	4 415,97	26 495,83		20 221,06	1 858,80		
400	KOST 17 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	11 768,85	2 353,77	14 122,62		10 628,37	1 140,48		
500	KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 311,01	2 062,20	12 373,21		9 592,69	718,32		
KOST 19	CHEMOSVIT FÓLIE 44d	23 828,86	4 765,77	28 594,63		21 970,06	1 858,80		
400	KOST 19 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	13 557,19	2 711,44	16 268,63		12 416,71	1 140,48		
500	KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 271,67	2 054,33	12 326,00		9 553,35	718,32		
KOST 21	ENERGOCHEM 55b	21 733,94	4 346,79	26 080,73		19 875,14	1 858,80		
400	KOST 21 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	11 432,48	2 286,50	13 718,98		10 292,00	1 140,48		
500	KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 301,46	2 060,29	12 361,75		9 583,14	718,32		
KOST 23	CHEMOSVIT FÓLIE 61	28 961,31	5 792,26	34 753,57		27 102,51	1 858,80		

Rekapitulácia objektov stavby / Zmena 1

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o. Košice

Miesto: Svit

Spracoval:

Dátum: 27.7.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
100	KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy	617,43	123,49	740,92		617,43			
400	KOST 23 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	18 205,42	3 641,08	21 846,50		17 064,94	1 140,48		
500	KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 138,46	2 027,69	12 166,15		9 420,14	718,32		
KOST 24	STROJCHEM 63	56 436,53	11 287,31	67 723,84		54 577,73	1 858,80		
100	KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy	633,15	126,63	759,78		633,15			
400	KOST 24 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	44 550,78	8 910,16	53 460,94		43 410,30	1 140,48		
500	KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	11 252,60	2 250,52	13 503,12		10 534,28	718,32		
KOST 25	STROJCHEM 64.1	26 017,14	5 203,43	31 220,57		23 918,34	2 098,80		
400	KOST 25 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	15 242,24	3 048,45	18 290,69		14 101,76	1 140,48		
500	KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 774,90	2 154,98	12 929,88		9 816,58	958,32		
KOST 26	STROJCHEM 64.2	26 112,80	5 222,56	31 335,36		24 254,00	1 858,80		
100	KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy	3 195,63	639,13	3 834,76		3 195,63			
400	KOST 26 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	12 865,41	2 573,08	15 438,49		11 724,93	1 140,48		
500	KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 051,76	2 010,35	12 062,11		9 333,44	718,32		
KOST 27	STROJCHEM 65	41 421,56	8 284,31	49 705,87		39 532,76	1 888,80		
100	KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy	7 587,22	1 517,44	9 104,66		7 587,22			
400	KOST 27 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	21 934,81	4 386,96	26 321,77		20 794,33	1 140,48		
500	KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	11 899,53	2 379,91	14 279,44		11 151,21	748,32		
KOST 29	STROJCHEM 73	31 443,03	6 288,61	37 731,64		29 584,23	1 858,80		
100	KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy	9 600,89	1 920,18	11 521,07		9 600,89			
400	KOST 29 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	11 680,06	2 336,01	14 016,07		10 539,58	1 140,48		
500	KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 162,08	2 032,42	12 194,50		9 443,76	718,32		
KOST 31	STROJCHEM 75	29 808,48	5 961,70	35 770,18		27 949,68	1 858,80		
100	KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy	6 186,40	1 237,28	7 423,68		6 186,40			
400	KOST 31 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	13 533,06	2 706,61	16 239,67		12 392,58	1 140,48		

Rekapitulácia objektov stavby / Zmena 1

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o. Košice

Miesto: Svit

Spracoval:

Dátum: 27.7.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
500	KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 089,02	2 017,80	12 106,82		9 370,70	718,32		
KOST 33	STROJCHEM 76.1, CHEDOS 76.2	32 053,78	6 410,76	38 464,54		29 954,98	2 098,80		
100	KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy	4 410,07	882,01	5 292,08		4 410,07			
400	KOST 33 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	17 296,29	3 459,26	20 755,55		16 155,81	1 140,48		
500	KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 347,42	2 069,48	12 416,90		9 389,10	958,32		
KOST 35	TATRAFAN 83	22 612,92	4 522,58	27 135,50		20 754,12	1 858,80		
400	KOST 35 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	12 309,10	2 461,82	14 770,92		11 168,62	1 140,48		
500	KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 303,82	2 060,76	12 364,58		9 585,50	718,32		
KOST 36	TATRAFAN 91	47 607,99	9 521,60	57 129,59		45 749,19	1 858,80		
400	KOST 36 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	36 528,76	7 305,75	43 834,51		35 388,28	1 140,48		
500	KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	11 079,23	2 215,85	13 295,08		10 360,91	718,32		
KOST 37	CHEMOSVIT FÓLIE 92	23 740,99	4 748,20	28 489,19		21 882,19	1 858,80		
400	KOST 37 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	13 534,97	2 706,99	16 241,96		12 394,49	1 140,48		
500	KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 206,02	2 041,20	12 247,22		9 487,70	718,32		
KOST 39	CHEMOSVIT FÓLIE 92c	24 887,33	4 977,47	29 864,80		23 028,53	1 858,80		
400	KOST 39 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	14 531,73	2 906,35	17 438,08		13 391,25	1 140,48		
500	KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 355,60	2 071,12	12 426,72		9 637,28	718,32		
KOST 40	TERICHEM 94.1, ENERGOCHEM 94.3	63 296,56	12 659,31	75 955,87		61 437,76	1 858,80		
400	KOST 40 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	51 397,92	10 279,58	61 677,50		50 257,44	1 140,48		
500	KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	11 898,64	2 379,73	14 278,37		11 180,32	718,32		
KOST 41	ENERGOCHEM 94b	25 434,18	5 086,84	30 521,02		23 575,38	1 858,80		
100	KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy	887,24	177,45	1 064,69		887,24			
400	KOST 41 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	13 779,41	2 755,88	16 535,29		12 638,93	1 140,48		
500	KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	10 767,53	2 153,51	12 921,04		10 049,21	718,32		

Rekapitulácia objektov stavby / Zmena 1

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o. Košice

Miesto: Svit

Spracoval:

Dátum: 27.7.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
KOST 42	FIBROCHEM 94.2	61 907,70	12 381,54	74 289,24		60 048,90	1 858,80		
100	KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy	1 498,50	299,70	1 798,20		1 498,50			
400	KOST 42 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie	48 973,94	9 794,79	58 768,73		47 833,46	1 140,48		
500	KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia	11 435,26	2 287,05	13 722,31		10 716,94	718,32		
ON	PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady	100,00	20,00	120,00		100,00			
PM	PS02.02 KOST Západ - MaR premiestnenia meračov	1 096,94	219,39	1 316,33		1 096,94			
500.1	KOST 18 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia	437,62	87,52	525,14		437,62			
500.2	KOST 38 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia	439,54	87,91	527,45		439,54			
500.3	KOST 44 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia	219,78	43,96	263,74		219,78			
PS 03	Energocentrum - úpravy MaR	699 623,98	139 924,80	839 548,78		699 623,98			
500	500.1 Úpravy v nadradenom riadiacom systéme Simatic v Energocentre + 500.2 Úpravy RIS	699 623,98	139 924,80	839 548,78		699 623,98			
E.	Projekt organizácie výstavby	42 824,74	8 564,95	51 389,69		42 824,74			
E.2	Dopravné zabezpečenie počas výstavby	13 966,90	2 793,38	16 760,28		13 966,90			
E.3	Dočasné prepoje počas výstavby	28 857,84	5 771,57	34 629,41		28 857,84			

Celkom

5090203,14

1018040,63

6 108 243,77

2 280,96

4 983 806,20

91 112,48

13 003,50




Príloha č. 3 k Dodatku č.1 Harmonogram prác stavby – CHEMOSVIT a FINCHEM vetva východ / zmena 1

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o.

Harmonogram prác stavby

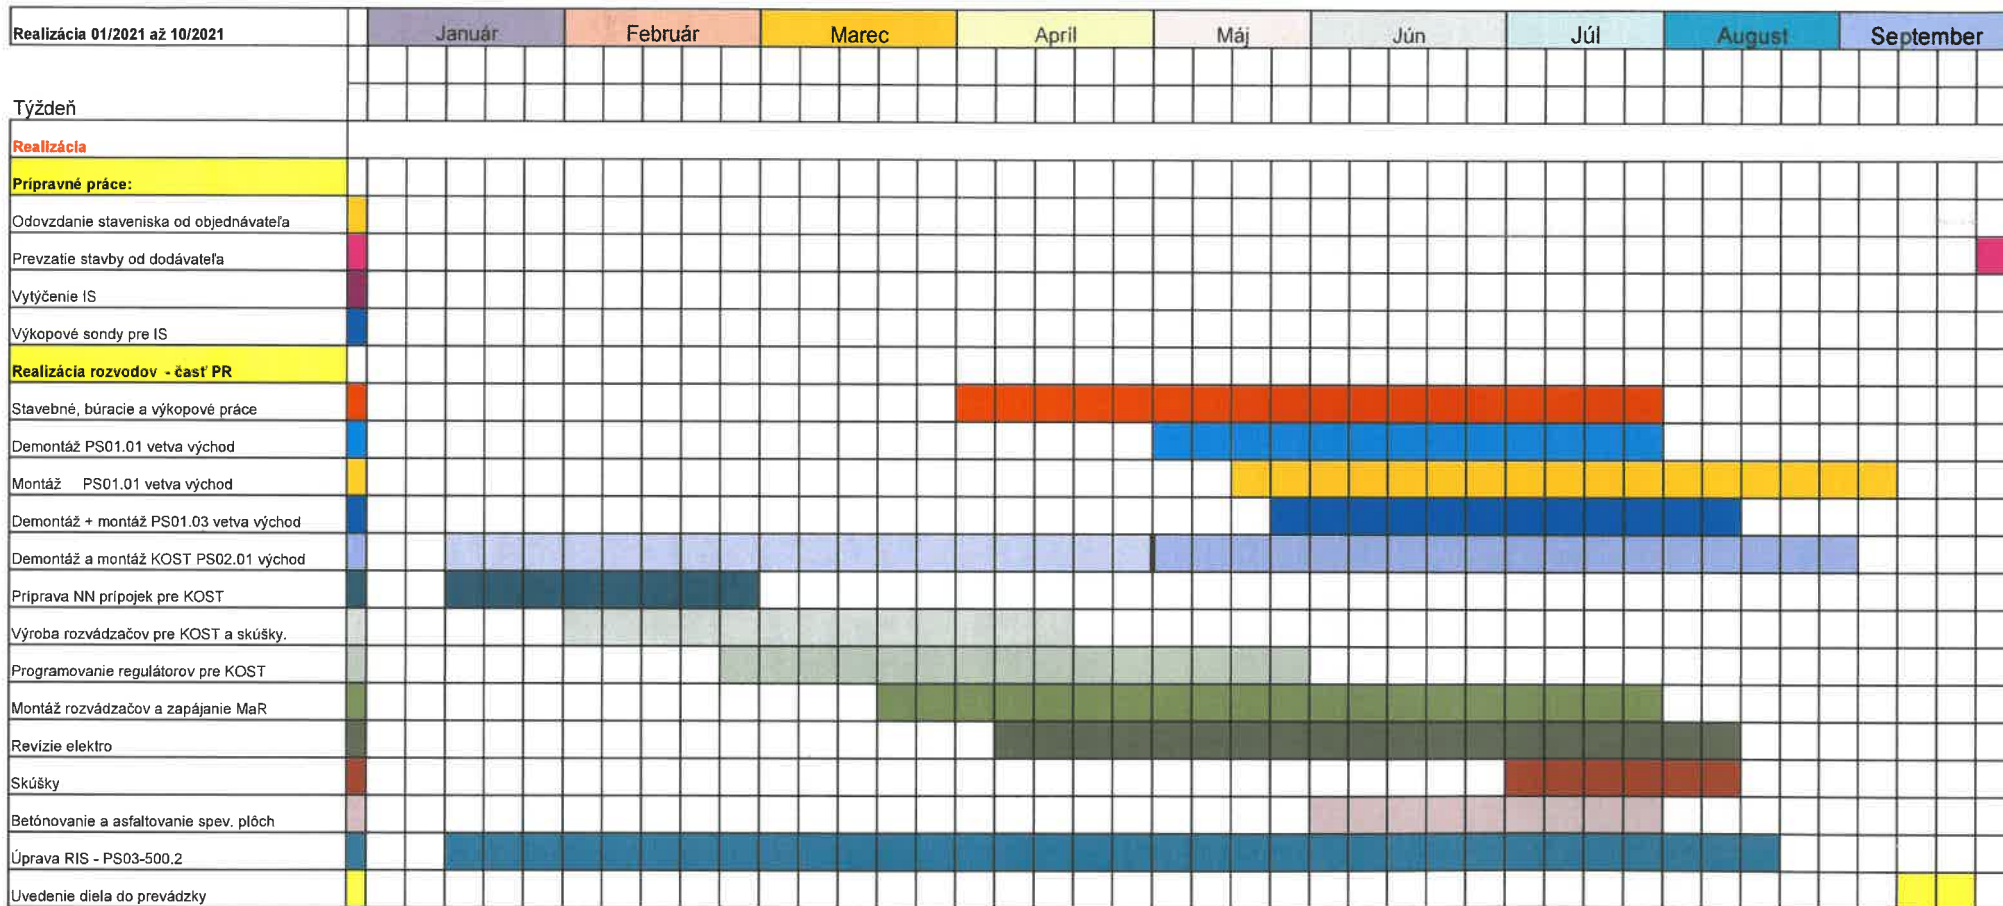

Harmonogram je spracovaný podľa známych skutočností.

V prípade výskytu nepredvídateľných udalostí, ktoré môžu ovplyvniť postup prác, môže dôjsť k jeho úprave.

■ - Prípravné práce - KOST PS02.01 východ.

V Košiciach 29.07.2021
