




	Meno	Trvanie	Zaiatok
1		Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - RI 2022	145 dní?	2.5.2022 8:00
2		III/2463 Kalinka	7 dní?	2.5.2022 8:00
3		frézovanie s naložením a odvozom do 30 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	1 de?	2.5.2022 8:00
4		cistenie vozovky-zametanie	1 de?	3.5.2022 8:00
5		zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zaiatku a konca úseku	1 de?	4.5.2022 8:00
6		postrek spojovací	1 de?	4.5.2022 8:00
7		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	1 de?	5.5.2022 8:00
8		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	1 de?	6.5.2022 8:00
9		asfaltová zálievka pracovných spojov	1 de?	9.5.2022 8:00
10		spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm	1 de?	10.5.2022 8:00
11		III/2690 Vígaš žel. stanica	6 dní?	11.5.2022 8:00
12		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	1 de?	11.5.2022 8:00
13		cistenie vozovky-zametanie	1 de?	12.5.2022 8:00
14		výškova úprava poklopov kanalizaných šácht, vpustí	1 de?	13.5.2022 8:00
15		postrek spojovací	1 de?	16.5.2022 8:00
16		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	1 de?	17.5.2022 8:00
17		asfaltová zálievka pracovných spojov	1 de?	18.5.2022 8:00
18		III/2715 Málinec - Polianky okres Detva	16 dní?	10.5.2022 8:00
19		recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	3 dní	10.5.2022 8:00
20		technologická prestavka	7 dní	13.5.2022 8:00
21		postrek infiltraný	1 de?	24.5.2022 8:00
22		ACo 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	2 dní	25.5.2022 8:00
23		asfaltová zálievka pracovných spojov	1 de?	27.5.2022 8:00
24		dosýpanie krajníc s dovozom, rozprestrením a zhutnením do výšky 100 mm, šírka 0,50 m po oboch stranách	2 dní	30.5.2022 8:00
25		II/526 Hriová	3 dní?	1.6.2022 8:00
26		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	1 de?	1.6.2022 8:00
27		cistenie vozovky-zametanie	1 de?	2.6.2022 8:00
28		zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zaiatku a konca úseku	1 de?	3.6.2022 8:00
29		postrek spojovací	1 de?	3.6.2022 8:00
30		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	1 de?	3.6.2022 8:00
31		II/526 Detvianska Huta (Žabica) - Látky	8 dní?	6.6.2022 8:00
32		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	3 dní	6.6.2022 8:00
33		cistenie vozovky-zametanie	1 de?	9.6.2022 8:00
34		zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zaiatku a konca úseku	1 de?	10.6.2022 8:00
Harmonogram vyzva .20 - stránka1				




Koniec	Predchodcovia	Mená zdrojov	7 mar 22							14 mar 22							21 mar 22							28 mar 22							4 apr 22							11 apr		
			P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U								
18.11.2022 17:00																																								
10.5.2022 17:00																																								
2.5.2022 17:00																																								
3.5.2022 17:00	3																																							
4.5.2022 17:00	4																																							
4.5.2022 17:00	4																																							
5.5.2022 17:00	6																																							
6.5.2022 17:00	7																																							
9.5.2022 17:00	8																																							
10.5.2022 17:00	9																																							
18.5.2022 17:00																																								
11.5.2022 17:00																																								
12.5.2022 17:00	12																																							
13.5.2022 17:00	13																																							
16.5.2022 17:00	14																																							
17.5.2022 17:00	15																																							
18.5.2022 17:00	16																																							
31.5.2022 17:00																																								
12.5.2022 17:00																																								
23.5.2022 17:00	19																																							
24.5.2022 17:00	20																																							
26.5.2022 17:00	21																																							
27.5.2022 17:00	22																																							
31.5.2022 17:00	23																																							
3.6.2022 17:00																																								
1.6.2022 17:00	24																																							
2.6.2022 17:00	26																																							
3.6.2022 17:00	27																																							
3.6.2022 17:00	27																																							
3.6.2022 17:00	27																																							
15.6.2022 17:00																																								
8.6.2022 17:00	30																																							
9.6.2022 17:00	32																																							
10.6.2022 17:00	33																																							



[illegible]

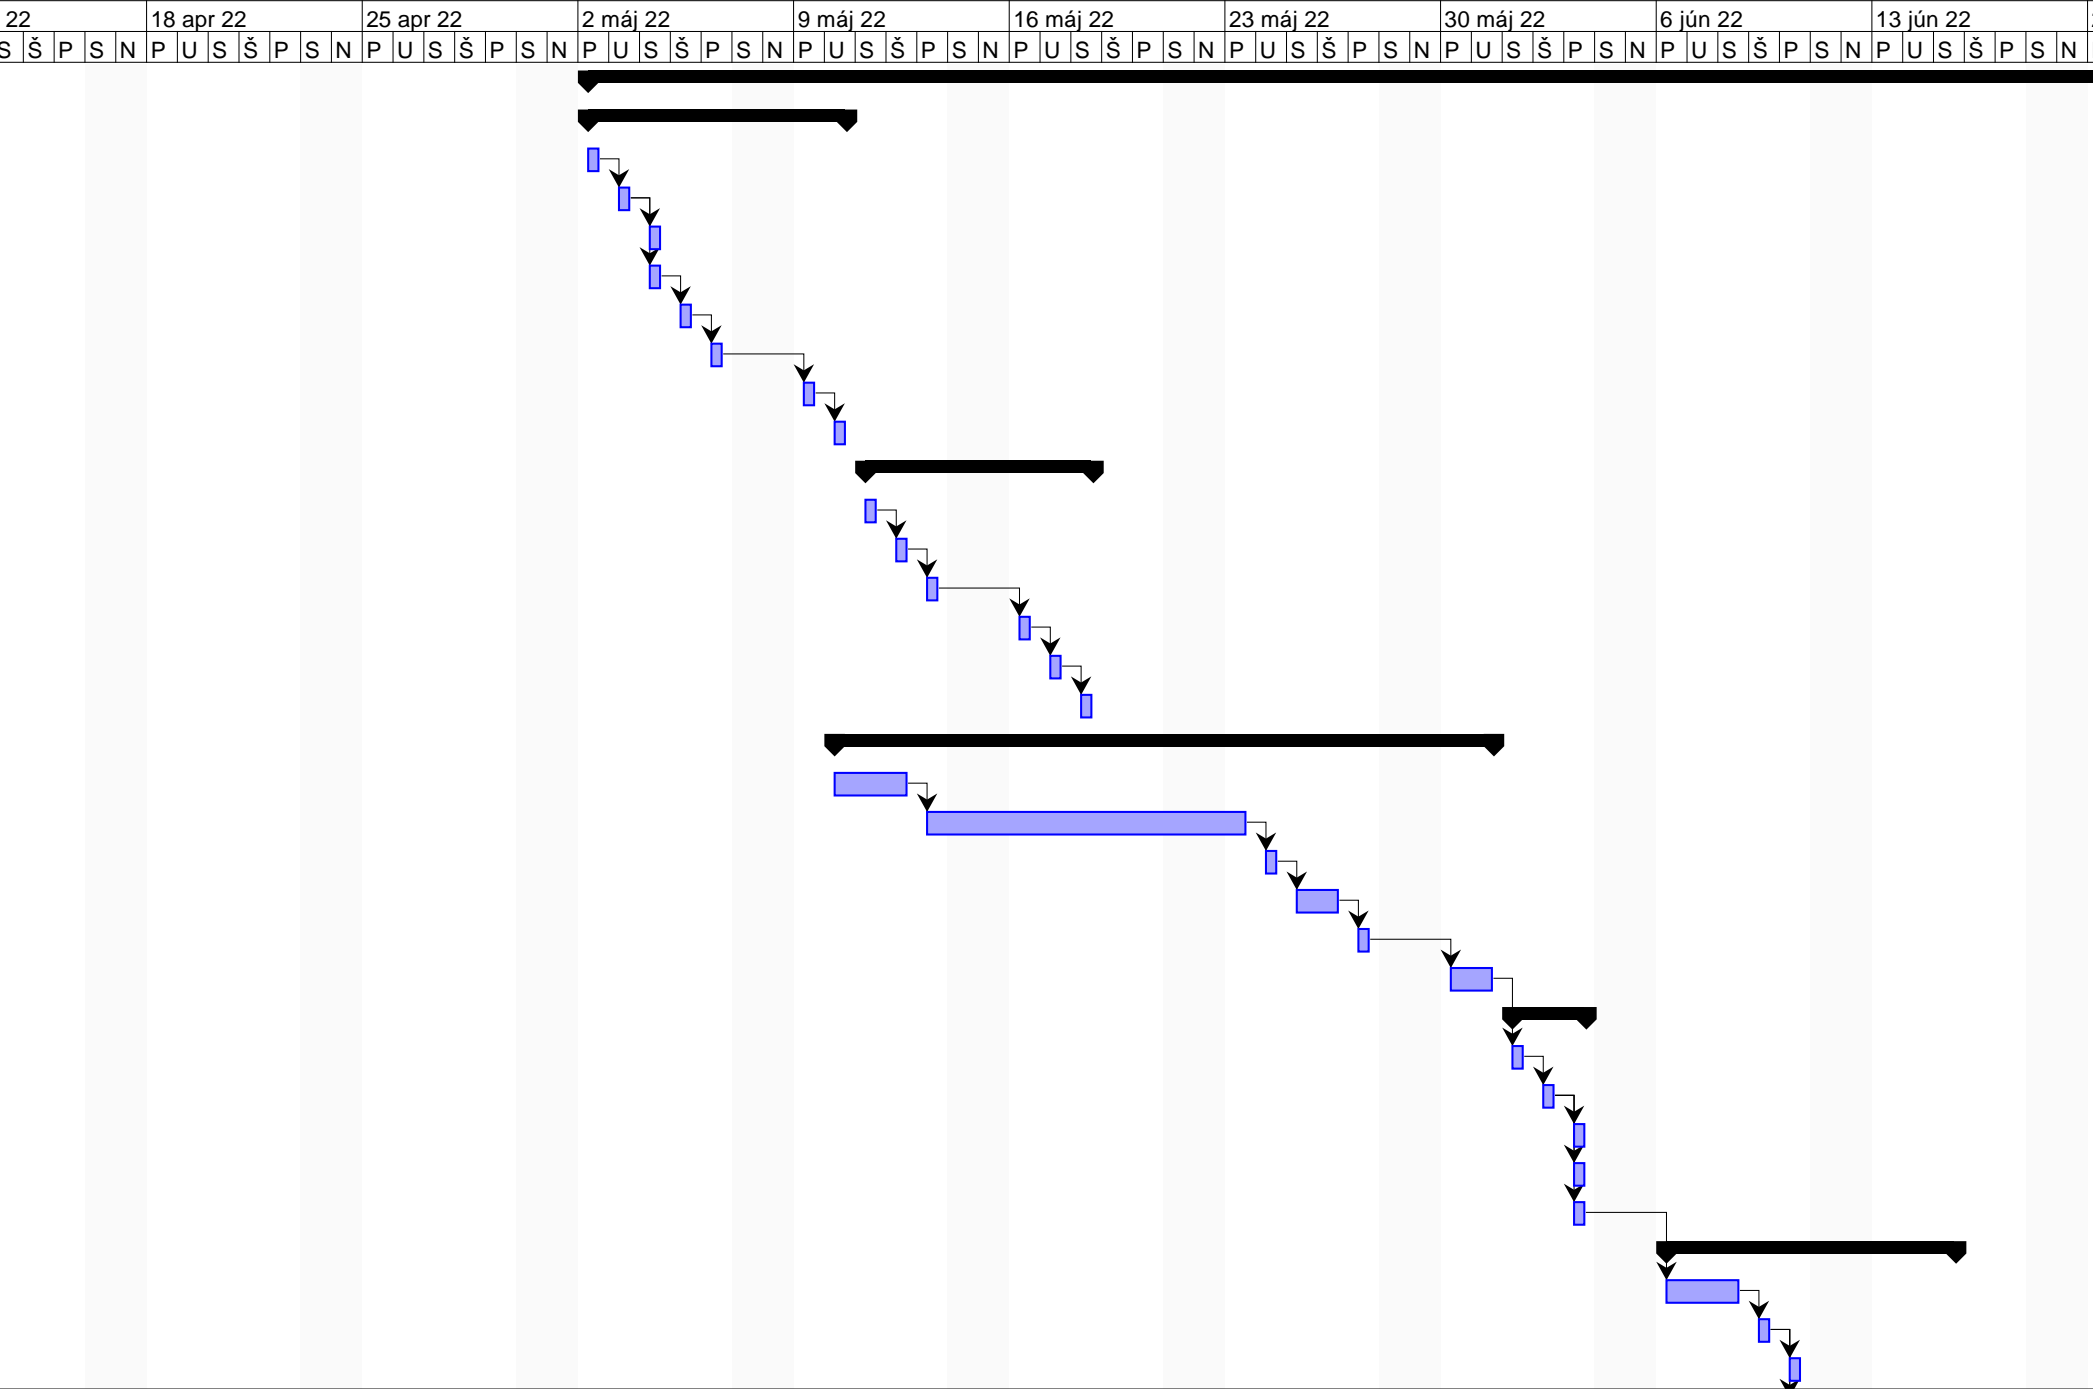


		29 aug 22					5 sep 22					12 sep 22					19 sep 22					26 sep 22					3 okt 22					10 okt 22					17 okt 22					24 okt 22					31 okt 22						
S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S

Harmonogram vyzva .20 - stránka5

		Meno	Trvanie	Zaiatok
35		postrek spojovací	1 de?	10.6.2022 8:00
36		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	3 dní	10.6.2022 8:00
37		asfaltová zálievka pracovných spojov	1 de?	15.6.2022 8:00
38		III/2569 Senohrad - Lackov - Litava	24 dní?	16.6.2022 8:00
39		frézovanie s naložením a odvozom do 20 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	1 de?	16.6.2022 8:00
40		cistenie vozovky-zametanie	2 dní	17.6.2022 8:00
41		postrek spojovací	10 dní	21.6.2022 8:00
42		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	6 dní?	21.6.2022 8:00
43		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	8 dní	29.6.2022 8:00
44		asfaltová zálievka pracovných spojov	4 dní	11.7.2022 8:00
45		spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm	3 dní	15.7.2022 8:00
46		III/2566 Hrušov	17 dní?	20.7.2022 8:00
47		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	1 de?	20.7.2022 8:00
48		cistenie vozovky-zametanie	2 dní	21.7.2022 8:00
49		zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zaiatku a konca úseku	1 de?	25.7.2022 8:00
50		postrek spojovací	1 de?	25.7.2022 8:00
51		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní	26.7.2022 8:00
52		postrek spojovací	1 de?	1.8.2022 8:00
53		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní	2.8.2022 8:00
54		asfaltová zálievka pracovných spojov	2 dní	8.8.2022 8:00
55		spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm	2 dní	10.8.2022 8:00
56		III/2588 Pôtor	8 dní?	25.7.2022 8:00
57		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	1 de?	25.7.2022 8:00
58		cistenie vozovky-zametanie	1 de?	26.7.2022 8:00
59		zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zaiatku a konca úseku	1 de?	27.7.2022 8:00
60		postrek spojovací	1 de?	28.7.2022 8:00
61		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	1 de?	29.7.2022 8:00
62		postrek spojovací	1 de?	1.8.2022 8:00
63		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	1 de?	1.8.2022 8:00
64		asfaltová zálievka pracovných spojov	1 de?	2.8.2022 8:00
65		spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm	1 de?	3.8.2022 8:00
66		III/2605 ebovce	29 dní?	8.8.2022 8:00
67		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	2 dní	8.8.2022 8:00
68		cistenie vozovky-zametanie	2 dní	10.8.2022 8:00
Harmonogram vyzva .20 - stránka7				

Koniec	Predchodcovia	Mená zdrojov	7 mar 22							14 mar 22							21 mar 22							28 mar 22							4 apr 22							11 apr	
			P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U							
10.6.2022 17:00	33																																						
14.6.2022 17:00	33																																						
15.6.2022 17:00	36																																						
19.7.2022 17:00																																							
16.6.2022 17:00	37																																						
20.6.2022 17:00	39																																						
4.7.2022 17:00	40																																						
28.6.2022 17:00	40																																						
8.7.2022 17:00	42																																						
14.7.2022 17:00	43																																						
19.7.2022 17:00	44																																						
11.8.2022 17:00																																							
20.7.2022 17:00	45																																						
22.7.2022 17:00	47																																						
25.7.2022 17:00	48																																						
25.7.2022 17:00	48																																						
29.7.2022 17:00	49																																						
1.8.2022 17:00	51																																						
5.8.2022 17:00	52																																						
9.8.2022 17:00	53																																						
11.8.2022 17:00	54																																						
3.8.2022 17:00																																							
25.7.2022 17:00																																							
26.7.2022 17:00	57																																						
27.7.2022 17:00	58																																						
28.7.2022 17:00	59																																						
29.7.2022 17:00	60																																						
1.8.2022 17:00	61																																						
1.8.2022 17:00	61																																						
2.8.2022 17:00	63																																						
3.8.2022 17:00	64																																						
15.9.2022 17:00																																							
9.8.2022 17:00																																							
11.8.2022 17:00	67																																						

22	18 apr 22					25 apr 22					2 máj 22					9 máj 22					16 máj 22					23 máj 22					30 máj 22					6 jún 22					13 jún 22					:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S


		Meno	Trvanie	Zaiatok
69		zriadenie priepustu z rúr DN 400 mm kompletne, cena =zemné práce, dodanie rúr, obsyp, lôžko	4 dní	12.8.2022 8:00
70		zriadenie ulinej vpuste - kompletne	3 dní	18.8.2022 8:00
71		výšková úprava poklopov kanalizaných šácht, vpustí	4 dní	23.8.2022 8:00
72		zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zaiatku a konca úseku	1 de?	29.8.2022 8:00
73		postrek spojovací	1 de?	30.8.2022 8:00
74		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní	31.8.2022 8:00
75		postrek spojovací	1 de?	6.9.2022 8:00
76		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní	7.9.2022 8:00
77		asfaltová zálievka pracovných spojov	2 dní	13.9.2022 8:00
78		spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm	1 de?	15.9.2022 8:00
79		III/2610 Mua - Bušince	19 dní?	19.9.2022 8:00
80		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaiatky a konce, most, MO, MK, obrubníková úprava)	1 de?	19.9.2022 8:00
81		cistenie vozovky-zametanie	2 dní	20.9.2022 8:00
82		osadenie mriežok na moste	1 de?	22.9.2022 8:00
83		zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zaiatku a konca úseku	1 de?	23.9.2022 8:00
84		postrek spojovací	1 de?	26.9.2022 8:00
85		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	5 dní	27.9.2022 8:00
86		postrek spojovací	1 de?	4.10.2022 8:00
87		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	1 de?	5.10.2022 8:00
88		rezanie živiného krytu do hr. 50 mm -mostné závery	1 de?	6.10.2022 8:00
89		zálievky mostných záverov	1 de?	7.10.2022 8:00
90		asfaltová zálievka pracovných spojov	2 dní	10.10.2022 8:00
91		spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm	2 dní	12.10.2022 8:00
92		II/527 Suchá	20 dní?	24.10.2022 8:00
93		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	1 de?	24.10.2022 8:00
94		cistenie vozovky-zametanie	2 dní	25.10.2022 8:00
95		zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zaiatku a konca úseku	1 de?	27.10.2022 8:00
96		postrek spojovací	1 de?	28.10.2022 8:00
97		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní	31.10.2022 8:00
98		postrek spojovací	1 de?	4.11.2022 8:00
99		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	5 dní	7.11.2022 8:00
100		asfaltová zálievka pracovných spojov	2 dní	14.11.2022 8:00
101		spevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm x 500mm	2 dní	16.11.2022 8:00
102		VDZ : 601 - Pozdžna súvilá iara - vodiaca	1 de?	18.11.2022 8:00
Harmonogram vyzva .20 - stránka13				

Koniec	Predchodcovia	Mená zdrojov	7 mar 22							14 mar 22							21 mar 22							28 mar 22							4 apr 22							11 apr	
			P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U							
17.8.2022 17:00	68																																						
22.8.2022 17:00	69																																						
26.8.2022 17:00	70																																						
29.8.2022 17:00	71																																						
30.8.2022 17:00	72																																						
5.9.2022 17:00	73																																						
6.9.2022 17:00	74																																						
12.9.2022 17:00	75																																						
14.9.2022 17:00	76																																						
15.9.2022 17:00	77																																						
13.10.2022 17:00																																							
19.9.2022 17:00																																							
21.9.2022 17:00	80																																						
22.9.2022 17:00	81																																						
23.9.2022 17:00	82																																						
26.9.2022 17:00	83																																						
3.10.2022 17:00	84																																						
4.10.2022 17:00	85																																						
5.10.2022 17:00	86																																						
6.10.2022 17:00	87																																						
7.10.2022 17:00	88																																						
11.10.2022 17:00	89																																						
13.10.2022 17:00	90																																						
18.11.2022 17:00																																							
24.10.2022 17:00																																							
26.10.2022 17:00	93																																						
27.10.2022 17:00	94																																						
28.10.2022 17:00	95																																						
3.11.2022 17:00	96																																						
4.11.2022 17:00	97																																						
11.11.2022 17:00	98																																						
15.11.2022 17:00	99																																						
17.11.2022 17:00	100																																						
18.11.2022 17:00	101																																						

[illegible]

[illegible]



		Meno	Trvanie	Začiatok
103		VDZ : retroreflexné 601 - Pozdžna súvislá iara - s	1 de?	18.11.2022 8:00
104		VDZ : retroreflexné 602 - Pozdžna prerušovaná i	1 de?	18.11.2022 8:00
105		VDZ : predznaenie	1 de?	18.11.2022 8:00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

