

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo č. POO-SNN-STA-0001 na predmet projektu

„Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.“**(„Dodatok č. 1“)****ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ:**

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Sídlo: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 36 597 350
DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1349/V
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4904 2951
Konajúci: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva

(„Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Adifex, a. s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 6864/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK12 1111 0000 0011 8207 4004
Konajúci: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva,
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva

(„Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej označení jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

1. PREAMBULA

- 1.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa 28. 6. 2024 Zmluvu o dielo č. POO-SNN-STA-0001 („Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi stavbu zákazky „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.“, a to v súlade s Projektovou dokumentáciou, Výkazom výmer, Povoleniami, Časovým harmonogramom, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami a ustanoveniami Zmluvy o dielo a všetkých jej príloh („Dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovené Dielo Cenu Diela.
- 1.2** Po uzatvorení Zmluvy o dielo došlo k zmene a aj k vzniku nových okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti pri uzatvorení Zmluvy o dielo predvídať, a z

ktorých vyplynula potreba (i) vykonania najviac, resp. menej prác; ako aj potreba (ii) zmeny kontaktných osôb, tak ako sú tieto zmeny špecifikované nižšie v tomto Dodatku č. 1. Zmluvné strany vykonali zmeny Diela v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo a to formou zmenových listov č. 01/2024, 02/2024, 03/2024, 05/2024, 13/2024, 14/2024, 19/2024 a 20/2024 („Zmenové listy“), ktoré tvoria Prílohy č. 1 až č. 8 tohto Dodatku č. 1.

- 1.3 Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 01/2024, 05/2024, 13/2024, 14/2024, 19/2024 a 20/24 majú zároveň dopad na Cenu Diela, a to v rozsahu špecifikovanom v bode 2.1 tohto Dodatku č. 1. Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 02/2024 a 03/2024 nemajú žiadny dopad na Cenu Diela.
- 1.4 Zmena Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 01/2024 a č. 14/2024 majú povahu zmeny zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o verejnom obstarávaní“), nakoľko došlo k takej zmene okolností, ktoré Zmluvné strany nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti objektívne predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 02/2024 a č. 03/2024 majú povahu zmeny zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu týchto zmien. Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 05/2024 a č. 13/2024 majú povahu zmenu zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní (tzv. „*de minimis*“), z dôvodu nemožnosti dodania pôvodného riešenia navrhnutého projektantom Projektu (tzv. chyba Projektu). Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 19/2024 a 20/2024 majú povahu zmeny Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že ide o nevyhnutné doplňujúce stavebné práce. Bližšie vymedzenie dôvodov pre potrebu vykonania zmien podľa Zmenových listov, vrátane odôvodnenia povahy týchto zmien z hľadiska Zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené v jednotlivých Zmenových listoch.
- 1.5 V súvislosti s potrebou zmeny obsahu Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1, prostredníctvom ktorého v súlade s bodom 22.1 Zmluvy o dielo menia niektoré zmluvné ustanovenia.

2. PREDMET DODATKU Č. 1

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela podľa čl. 7., bodu 7.1 Zmluvy o dielo sa od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1 mení v rozsahu Zmenových listov č. 01/2024, 05/2024, 13/2024, 14/2024, 19/2024 a 20/2024 a to tak, že sa navyšuje o sumu **74 967,51 EUR bez DPH**. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 7.1 (čl. 7.) Zmluvy o Dielo sa preto ruší a nahrádza nasledujúcim novým znením:

„7.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a úplné vykonanie a Odovzdanie Diela vrátane odstránenia akýchkoľvek väd Diela a splnenia ďalších povinností podľa tejto Zmluvy odmenu, ktorá je dohodnutá vo výške 27 474 600,18 EUR bez DPH („Cena Diela“). K Cene Diela sa bude v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi aplikovať príslušná DPH, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.“

- 2.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že znenie bodu 26.1 (čl. 26.) Zmluvy o Dielo sa ruší a nahrádza nasledujúcim novým znením:

„26.1 Všetky písomné oznámenia, iné písomnosti a ostatná písomná komunikácia Zmluvných strán alebo ich poverených zástupcov podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa bude doručovať osobne s písomným potvrdením doručenia, alebo poštou s písomným potvrdením doručenia (doručenka), alebo kuriérom s písomným potvrdením doručenia alebo prostredníctvom elektronickej pošty

ak pre Objednávateľa:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s

Ul. Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves

Slovenská republika

Referencia pre poštovú komunikáciu: „Spišská Nova Nemocnica“

a) Zmluvné a obchodné záležitosti

kontaktné osoby:

- Ing. Lukáš Dinda
- Ing. Marek Klimko

emailový a telefonický kontakt:

- lukas.dinda@pentahospitals.sk; +421 902 470 000
- marek.klimko@pentahospitals.sk; +421 905 544 691

emailový kontakt na odoslanie kópie komunikácie: dostavbasnv@pentahospitals.sk

b) Technické a projekčné záležitosti

kontaktné osoby:

- Ing. Viktor Korba
- Ing. Ján Capek

emailový a telefonický kontakt:

- korba@pentarealestate.com; +421 904 944 564
- capek@pentarealestate.com; +421 911 537 932

emailový kontakt na odoslanie kópie komunikácie: dostavbasnv@pentahospitals.sk

c) Zmenové konanie

kontaktné osoby:

- Ing. Marek Klimko
- Ing. Viktor Korba

emailový a telefonický kontakt:

- marek.klimko@pentahospitals.sk; +421 905 544 691
- korba@pentarealestate.com; +421 904 944 564

emailový kontakt na odoslanie kópie komunikácie: dostavbasnv@pentahospitals.sk

d) Subdodávateľia

kontaktné osoby:

- Ing. Pavol Mikuláš
- Ing. Lukáš Dinda

emailový a telefonický kontakt:

- mikulas@pentarealestate.com; +421 903 282 643
- lukas.dinda@pentahospitals.sk; +421 902 470 000

emailový kontakt na odoslanie kópie komunikácie: dostavbasnv@pentahospitals.sk

e) Breeam

kontaktné osoby:

- Ing. Pavol Mikuláš
- Ing. Ján Capek

emailový a telefonický kontakt:

- mikulas@pentarealestate.com; +421 903 282 643
- capek@pentarealestate.com; +421 911 537 932

emailový kontakt na odoslanie kópie komunikácie: dostavbasnv@pentahospitals.sk

ak pre Zhotoviteľa:

Adifex, a. s.

korešpondenčná adresa: Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina

a) Zmluvné a obchodné záležitosti

kontaktná osoba: Ing. Martin Laurinčík

emailový a telefonický kontakt: laurincik@adifex.sk; +421 917 744 258

emailový kontakt na odoslanie kópie komunikácie: kopaskova@adifex.sk a nemocnicasnv@adifex.sk

b) Technické a projekčné záležitosti

kontaktná osoba: Pavol Bera

emailový a telefonický kontakt: bera@adifex.sk; +421 918 941 928

emailový kontakt na odoslanie kópie komunikácie: nemocnicasnv@adifex.sk

c) Zmenové konanie

kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Liška

emailový a telefonický kontakt: liska@adifex.sk; +421 948 874 664

emailový kontakt na odoslanie kópie komunikácie: nemocnicasnv@adifex.sk

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade akýchkoľvek personálnych zmien na strane kontaktných osôb (napr. ich výmena, doplnenie, nahradenie a pod.), ktoré sú poverené vedením osobitných záležitostí podľa zoznamu vyššie, môže o takýchto zmenách Zmluvná strana písomne informovať druhú Zmluvnú stranu a to prostredníctvom zodpovednej kontaktnej osoby, ktorá zodpovedá za zmluvné a obchodné záležitosti.“

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1** Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený a podpísaný v šiestich (6) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a štyri (4) obdrží Objednávateľ.
- 3.2** Tento Dodatok č. 1 mení a dopĺňa Zmluvu o dielo vo vyššie uvedenom rozsahu. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú výslovne definované v tomto Dodatku č. 1, majú význam uvedený v Zmluve o dielo.
- 3.3** V prípade, že tento Dodatok č. 1 stanovuje iné práva a povinnosti alebo je v rozpore so znením Zmluvy o dielo alebo jej prílohami, má prednosť Dodatok č. 1.
- 3.4** Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5** Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú podpismi oprávnených a na to poverených osôb.

3.6 Nasledujúce prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1:

- Príloha č. 1 –** Zmenový list č. 1 zo dňa 15. 8. 2024 (*tlačená príloha*)
- Príloha č. 2 –** Zmenový list č. 2 zo dňa 20. 8. 2024 (*tlačená príloha*)
- Príloha č. 3 –** Zmenový list č. 3 zo dňa 13. 8. 2024 (*tlačená príloha*)
- Príloha č. 4 –** Zmenový list č. 5 zo dňa 5. 9. 2024 (*tlačená príloha*)
- Príloha č. 5 –** Zmenový list č. 13 zo dňa 15. 10. 2024 (*tlačená príloha*)
- Príloha č. 6 –** Zmenový list č. 14 zo dňa 15. 10. 2024 (*tlačená príloha*)
- Príloha č. 7 –** Zmenový list č. 19 zo dňa 21. 10. 2024 (*tlačená príloha*)
- Príloha č. 8 –** Zmenový list č. 20 zo dňa 31. 10. 2024 (*tlačená príloha*)


Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Adifex, a. s.

Miesto: v Bratislave
Dátum: 28.11.2024

Miesto: v Bratislave
Dátum: 28.11.2024




IC DPH: SK7020000669
Meno: MUDr. Radoslav Čuľa, MBA, MPH
Funkcia: Predseda predstavenstva



Meno: Ing. Martin Laurinčík
Funkcia: Predseda predstavenstva



IC DPH: SK7020000669
Meno: Ing. Tomáš Valášek, MBA, MPH
Funkcia: Podpredseda predstavenstva



Meno: Ing. Ján Gusko
Funkcia: Člen predstavenstva

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	01/2024
Dátum zahájenia konania:	15-08-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☐ NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA

☒ ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Prípravné práce
ČASŤ STAVBY:	SO 01.2.2 HTU – Búracie práce
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)
 Pri prácach na SO 01.2 HTU bola odhalená skrytá netriedená skládka stavebného odpadu z predchádzajúcich stavebných rekonštrukcií nemocnice. Nakoľko skládka bola skrytá, nebola identifikovaná počas prác na PD a nedostala sa do zmluvného rozpočtu t.j. nie je zahrnutá v ZoD. Skládka bráni postupu stavebných prác na realizácii diela preto je nutné ju odstrániť. **Skládka neobsahuje nebezpečný odpad.** Skládka bude mechanizmami naložená na nákladné autá a odvezená na certifikovanú skládku stavebného odpadu. Práce obsahujú nakladanie odpadu, odvoz odpadu na skládku, uloženie odpadu na skládku. **Práce na likvidácii skládky znamenajú navyše práce.**

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Likvidácia skládky netriedeného odpadu nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Likvidácia skládky nemá vplyv na PD

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	35 018,98 €
Z toho navyše práce:	35 018,98 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 15-08-2024

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	01/2024
Dátum zahájenia konania:	15-08-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Prípravné práce
ČASŤ STAVBY:	SO 01.2.2 HTU – Búracie práce
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa 

Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s.
ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce) Pri prácach na SO 01.2 HTU bola odhalená skrytá netriedená skládka stavebného odpadu z predchádzajúcich stavebných rekonštrukcií nemocnice. Nakoľko skládka bola skrytá, nebola identifikovaná počas prác na PD a nedostala sa do zmluvného rozpočtu t.j. nie je zahrnutá v ZoD. Skládka bráni postupu stavebných prác na realizácii diela preto je nutné ju odstrániť. **Skládka neobsahuje nebezpečný odpad.** Skládka bude mechanizmami naložená na nákladné autá a odvezená na certifikovanú skládku stavebného odpadu. Práce obsahujú nakladanie odpadu, odvoz odpadu na skládku, uloženie odpadu na skládku. **Práce na likvidácii skládky znamenajú navyše práce.**

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Likvidácia skládky netriedeného odpadu nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Likvidácia skládky nemá vplyv na PD

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	35 018,98 €
Z toho navyše práce:	35 018,98 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Likvidácia odhalenej skládky netriedeného odpadu bráni postupu stavebných prác a je nevyhnutná z hľadiska realizácie navrhovaného diela.

Táto zmena je nevyhnutná a v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum vyjadrenia: 15-08-2024

Podpis oprávnenej osoby:

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Likvidácia odhalenej skládky netriedeného odpadu bráni postupu stavebných prác a je nevyhnutná z hľadiska realizácie navrhovaného diela.

Dátum vyjadrenia:

15-08-2024

Podpis oprávnenej osoby:

VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer, advokát a konateľ

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☒ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Predmetná potreba nemohla byť známa v čase obstarávania. Likvidácia odhalenej skládky netriedeného odpadu bráni postupu stavebných prác a je nevyhnutná z hľadiska realizácie navrhovaného diela.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce	35 018,98 €	
- z toho menej práce		0,128 %
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		

- z toho navyac práce		
- z toho menej práce		


S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Dátum vyjadrenia: 15-08-2024

Podpis oprávnenej osoby:



ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA

☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ

☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	ING. LUKÁŠ DINDA
Pracovná funkcia zástupcu:	ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA
Dátum:	15-08-2024
Podpis:	



Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	15-08-2024
Podpis:	



Rozpočet, ZL č.01/2024 - Likvidácia skládky odpadu

Stavba : Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi

Objekt : SO 01 Prípravné práce

Časť : SO 01.2.2 HTÚ -Búracie práce



Objednávateľ : NsP, Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ : Adifex a.s. Mostová 2 Bratislava

Miesto : NsP Spišská nová Ves

Vypracoval : Ing. Jaroslav Líška

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 018,98
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	393,030		
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 467,570		
7	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	393,030		
500	9790898612.S R	Poplatok za skládku - ine odpady zo stavieb a demolácií - ostatné (17 09 04)	t	393,030		
		Celkom				35 018,98



Denné záznamy stavby: SÚV-137

List č.:

1753752

Dátum

staveniska, A⁰

POČASIE: JASNO, POLOJASNO 15°C - 26°C

7.8.2024

PRACOVNÁ DOBA: 7:00 - 17:00

STREDA

POČET PRACOVNÍKOV: 5xTHP, NN 6AV 12x, ARES 1x

STROJE: 1x UHC, 1x BULDOZER, AUTO S RUKOU
VÝKONNÁ PÁČA

- MONTÁŽ OPLOTENIA STAVENISLA

- SKRYTKA ORNICE

- MONTÁŽ ZARIADENIA STAVENISLA - POKLAD

VNIMOSVNE

- MONTÁŽ DDZ

POČASIE: JASNO 18°C -

8.8.2024

PRACOVNÁ DOBA: 7:00

STURDA

POČET PRACOVNÍKOV: 5xTHP, 1x ARES

12x NN 6AV

STROJE: 1x UHC, 1x BULDOZER, AUTO S RUKOU

VÝKONNÁ PÁČA

- MONTÁŽ OPLOTENIA STAVENISLA

- SKRYTKA ORNICE

- MONTÁŽ ZS - MONTÁŽ VNIMOSVNE

PRÍLOHA 2

1. PO ODSTRANENÍ ORNICE SA NA STAVENISLU
ZISTILI LOKÁLNE PLOCHY NA KTERÝCH BÝLO
KE POD VÝKONNÝ ORNICE SKRYTÉ ODPAKY
VÝKONNÝCH PÁČ A ZHIBNÝCH ODPAK

2. V ČISTI SEVERNE OD JEDN. HÚTOV
SA POD ORNICOVÝMI PLOCHAMI ZISTIL
PANELOV

3. V ZHIBE LG SP PLOCHA ZO ZEMIN PO ODSTRANENÍ
ORNICE VYKÁVKA, VŠO Z TIA NA PRÍRODNÉ
VÝKONNÝ MATERIÁL V ZHIBE BUDICE
KONSTRUKČNÝ PLÁN.

PRÍLOHA 3 O OTTADRENIE L KODU 1 A 2.

Hlavného, A

K BODU 0.2: TDO ŽIADÁ SHODU VÝŠŤ O UZIE - 09.08.2025
 OVFIKOVANE OBYEHO IMEŠAKO SALES ODMU
 A KOMUNIT. ODMU PRI VYTVORENÍ BUDOVY
 SALESIAŤ OBYEHO, PRAVU BODUADU TIE
 HANUO ŠTOJE S HANUO, JOMUO A UŠKA -
 JAKY PREDMET. SIA SIE A PREDLOŽENIE
 KALKULACE OBYEHO DO 14.08.2025
 U RMISIE ŽIADUJANIE JEDNOTL. CIEH 2 VÝMUDU DO
 VÝŠŤ PRAVU BOD.

POČASIE: JASNO 18°C 28°C

10.8.2025

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

SOBOTA

PRACOVNÍCI: 1x ADIFEX THP, 7x NNBAU, 2x LESY MSK
 4x RADSTAV, 1x ANES

STROJE: 3x BAGER, 1x VHC, 2x NAKL. AUTO, 1x. M. OBYEHO

VYKONANÁ PRÁCA:

- VYRUB ŠTROPOV A KRIKOV 1x VÝŠŤ BUDUJANIE
- BILANIE KOMUNIKÁCIE - RYBA PRAVU BODU 25
- VÝŠŤ RYBA PRAVU BODU 25
- VÝŠŤ ŠACHTY PRAVU BODU 25
- KOSENIE TRÁVY
- NAKLADANIE A PRAVU BODU NA SCLADU PRÁCE

POČASIE: JASNO 18°C 28°C

11.8.2025

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰

NEDELA

PRACOVNÍCI: 1x ADIFEX THP, 4x RADSTAV, 1x ANES

STROJE: 2x BAGER, 2x NAKL. AUTO

VYKONANÁ PRÁCA:

- NAKLADANIE A PRAVU BODU NA SCLADU PRÁCE
- V ZHŤSIE 2.0. BODU VYKONANÉ OBYEHO
- STROJENSKA

ŽIADUJANIE VÝŠŤ VÝŠŤ

12.08.2025

VÝŠŤ VÝŠŤ VÝŠŤ VÝŠŤ VÝŠŤ

REKONŠTRUKČIE BODU, PRAVU BODU, PRAVU BODU

DO A SCLADU BODU BODU PRAVU BODU

BODU A BODU BODU BODU BODU

BODU BODU BODU BODU BODU

BODU BODU BODU BODU BODU

BODU BODU BODU BODU BODU

stavby: A⁰POČASIE: ži.c, slnečné svetlo
KLIMATICKÁ ZONA: 7 - H.P.

PRÁCA:

7 KAMION, 5 KAMION, 3 KAMION, 6 KAMION, 1 KAMION

PRÁCA + PRÁCA:

1 KAMION, 2 KAMION, 3 KAMION, 1 KAMION, 1 KAMION
2 KAMION, 1 KAMION. PRÁCA / 3 KAMION, 1 KAMION

PRÁCA:

- 1x PRÁCA PRÁCA DO 16,30 HOD.

- 1x PRÁCA PRÁCA

- PRÁCA PRÁCA

- PRÁCA PRÁCA A PRÁCA

- PRÁCA PRÁCA NA PRÁCA

- PRÁCA PRÁCA PRÁCA

- 1x PRÁCA PRÁCA

2A. ZÁKAM STAVBY

24

1) KU ÚTVORU STAVEBNEJ ZMLUVNEJ SÚTĚ A DREV-
NEJ HNOT (GULATINA A ŠTĚTKA) ŽIADAME
ZKONOTITEĽA O ZODANIE VÁŽNOSTI LÍSTKOV AHO AJ
ZODANIE O ZKONOTITEĽ: BEZ ZHESKOVANIA
UTVRANOSTI ODTAJOV A CENOU VTRASK Z
DREVNEJ HNOT (GULATINA, ŠTĚTKA...)

2) ŽIADAME ZKONOTITEĽA O TRVALÉ A ZBEREČENÉ DODRŽAVANIE
K KONTROLU BEZPEČNOSTI TREDISKU NA STAVEB-
S40 - NOSENIE ODP, ZABEREČENÉ JAH ARTH
NA PRÍSTUPNOST A OCHRANU PRED PADOM ODSB,
PRÁVIDELNÉ UDRŽIAVANIE, ČI STENIE PRÍSTUPNOSTI
A TRVALOSTI KONOTITEĽU KU STAVEBISLU.

ZÁPIS STAVEBNEHO DOKONČENIA

2. PRÁCA DO PRÁCA S PRÁCAVÝM KAMIONOM
NA ZMLUVI I PRÁCA PRÁCA 2024 ČÍSLO ZMLUVY.
KAMION 01/2024.

ZÁPIS STAVEBNEHO DOKONČENIA

2. PRÁCA DO PRÁCA S PRÁCAVÝM KAMIONOM
NA ZMLUVI I PRÁCA PRÁCA 2024 ČÍSLO ZMLUVY.
KAMION 08/2024.



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	02/2024
Dátum zahájenia konania:	20.08.2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☐ NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA

☒ ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Prípravné práce
ČASŤ STAVBY:	SO 01.1.1 Preložka NN káblových rozvodov
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)
 V PD a rozpočte (pol.č.13) je na SO 01.1.1 Preložka NN káblových rozvodov navrhnutý typ kábla CHKE-V 3x240 e90 B2cas1d1a1 o dĺžke 227m. Vzhľadom na dlhú dodaciu dobu navrhovaného kábla 8-10 týždňov, čo má vplyv na termín ukončenia preložky v zmysle HMG - 21.9.2024, navrhujeme zámenu typu kábla na 3x(2x(CXKH-V 06/1kV 1x120)+1x(1xCXKH-V 1x120) B2ca-s1d0,a1. Výmena prierezu kábla nebude mať vplyv na úbytky napätia a bude spĺňať požiadavky STN 34 1610. Ďalšou zmenou bude zmena trasy kábla. Pôvodná trasa kábla vychádza z trafostanice a kábel je vedený pod spevnenou plochou v ryhe 1m od trafostanice. V trase kábla sa nachádzajú kanalizačné šachty. Navrhujeme aby sa presunula trasa kábla 6,5m od trafostanice mimo kanalizačné šachty, viedla pôvodným smerom k objektu kuchyne. Pred objektom kuchyne vedie pôvodná trasa kábla pod asfaltovou cestou 7,8m od kuchyne. Navrhujeme posunúť trasu kábla 0,65m od rampy objektu kuchyne a uložiť kábel pôvodným smerom.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
 Zmena prierezu kábla a zmena trasy uloženia kábla NN nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšete vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Nová trasa prípojky NN bude zakreslená v PD skutočného vyhotovenia stavby

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☒ Bez dopadu na cenu Diela
- ☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	34 612,96 €
Z toho menej práce:	-34 612,96 €

Prílohy k návrhu zhotoviteľa o vykonanie zmeny (časť B):

- Technický list 1-CXKH-V (v českom a anglickom jazyku)
- Prehlásenie o zhode 1-CXKH-V (TP 08-11) - EU Prohlášení o shodě
- Schematický náčrt úpravy trasovania NN vodiča

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 20 -08- 2024



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	02/2024
Dátum zahájenia konania:	2.8.08.2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Prípravné práce
ČASŤ STAVBY:	SO 01.1.1 Preložka NN káblových rozvodov
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s.
ul. Jánského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)
V PD a rozpočte (pol.č.13) je na SO 01.1.1 Preložka NN káblových rozvodov navrhnutý typ kábla CHKE-V 3x240 e90 B2cas1d1a1 o dĺžke 227m. Vzhľadom na dlhú dodáciu dobu navrhovaného kábla 8-10 týždňov, čo má vplyv na termín ukončenia preložky v zmysle HMG - 21.9.2024, navrhujeme zmenu typu kábla na 3x(2x(CXKH-V 06/1kV 1x120)+1x(1xCXKH-V 1x120) B2ca-s1d0,a1. Výmena prierezu kábla nebude mať vplyv na úbytky napätia a bude spĺňať požiadavky STN 34 1610. Ďalšou zmenou bude zmena trasy kábla. Pôvodná trasa kábla vychádza z trafostanice a kábel je vedený pod spevnenou plochou v ryhe 1m od trafostanice. V trase kábla sa nachádzajú kanalizačné šachty. Navrhujeme aby sa presunula trasa kábla 6,5m od trafostanice mimo kanalizačné šachty, viedla pôvodným smerom k objektu kuchyne. Pred objektom kuchyne vedie pôvodná trasa kábla pod asfaltovou cestou 7,8m od kuchyne. Navrhujeme posunúť trasu kábla 0,65m od rampy objektu kuchyne a uložiť kábel pôvodným smerom.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Zmena prierezu kábla a zmena trasy uloženia kábla NN nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Zhotoviteľ (Adifex, a.s.) zabezpečí riadne zadokumentovanie zmeny – fotografie z realizácie, geodetické zameranie, úprava dokumentácie v projekte skutočného vyhotovenia, zápis v SD, vyplnenie Kontrolného a skúšobného plánu, dodanie platných dokumentov (certifikáty, oprávnenia, výsledky skúšok a meraní,...) a iné v zmysle platnej ZoD

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☒ Bez dopadu na cenu Diela

☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	34 612,96 €
Z toho menej práce:	-34 612,96 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

GP z technického hľadiska súhlasí s navrhovanou zámennou kábla CHKE-V 1x240 e90 B2cas1d1a1 za kábel 3x(2x(CXKH-V 06/1kV 1x120)+1x(1xCXKH-V 1x120) B2ca-s1d0,a1, keďže navrhované riešenie bude spĺňať požadovanú prúdovú zaťažiteľnosť, ktorá bola podľa pôvodného projektového riešenia pre kábel typu 1x240 na úrovni 774A a pre navrhované riešenie 2x1x120 na úrovni 970A vid' príloha č.4 Odpoveď Projektanta k zámene typu kábla v maille zo dňa 13.8.2024

GP súhlasí s predloženou navrhovanou úpravou trasovania preložky NN vedenia (SO 01.1.1), zároveň však upozorňujeme zhotoviteľa, že posun trasy nie je možné realizovať bezprostredne pri fasáde objektu kuchyne, ale až za hranou zásobovacej rampy vid' príloha č.5 Odpoveď Projektanta k úprave trasy kábla v maille zo dňa 13.8.2024.

Táto zmena je nevyhnutná a v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum vyjadrenia: 20-08-2024

Podpis oprávnenej osoby:



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Súhlasí s predloženou navrhovanou úpravou trasovania preložky NN vedenia (SO 01.1.1) za podmienky dodržania HMG a bez zmeny ceny diela

Dátum vyjadrenia: 20-08-2024

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☒ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Jedná sa o nepodstatnú zmenu materiálu (výmena typu kábla) a jeho trasovania bez dopadu na vykonávanie diela, časový harmonogram a cenu diela.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)	0,00 €	0,00 %
- z toho naviac práce	34 612,96 €	
- z toho menej práce	-34 612,96 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Dátum vyjadrenia: 20-08-2024

Podpis oprávnenej osoby:

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
ČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

Prílohy k rozhodnutí o návrhu (časť C):

1. Technický list 1-CXKH-V (v českom a anglickom jazyku)
2. Prehlásenie o zhode 1-CXKH-V (TP 08-11) - EU Prohlášení o shodě
3. Schematický nákres úpravy trasovania NN vodiča
4. Mailová odpoveď Projektanta k zámene typu kábla zo dňa 13.8.2024
5. Mailová odpoveď Projektanta k úprave trasy kábla zo dňa 15.8.2024

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**
- ☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**
- ☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	ING. LUKÁŠ DINDA
Pracovná funkcia zástupcu:	ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA
Dátum:	20-08-2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	20-08-2024
Podpis:	

Rozpočet, ZL č.02/2024 - Preložka NN káblov

Stavba : Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi

Objekt : SO 01 Prípravné práce

Časť : SO 01.1.1 Preložka NN káblových rozvodov

Objednávateľ : NsP, Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ : Adifex a.s. Mostová 2 Bratislava

Miesto : NsP Spišská nová Ves

Vypracoval : Ing. Jaroslav Liška

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 0,00

21-M Elektromontáže 0,00

10	210821047.S	Vodič medený silový uložený voľne 3,6/6 kV 1x240	m	-681,000	
13	210950203.SS	Kábel zemný medený CHKE-V 1x240 e90 B2cas1d1a1	m	-681,000	
42	210881165.S	Vodič medený silový uložený voľne 3,6/6 kV 1x120	m	-227,000	
51	341610019900.S	Kábel zemný medený CHKE-V 1x120 e90 B2cas1d1a1	m	-227,000	
500	210821102.S-R	Kábel medený silový uložený pevne	m	1 589,000	
501	341130003100.S-R	Kábel zemný medený CXKH-V 1x120 Bca-s1d0,a1	m	1 589,000	

Celkom 0,00

25249M TDI

405, 406
street

УВАЖЕНОМ ТД К МЛУ ЛАНТУРЕА 20
30.03.2024.

- 1) NA ZÁKLADĚ OHLÍDÁNÍ - VIZUÁLNÍM PŘEBĚHEM
OVALOVANÉ PLOCHY NA SV STRANĚ STAVENISKA
MIMO DOBŘÍŠŤSKÝ PLOCH, KDE SE UŠKODNĚNÝ
STAV PŘESAHUJE OD PÁDU A SKLONU VYBĚHÁVACÍ
BĚŽKOU 2 PANELOVÝCH PLOCH A ZATRAVŇÍ TĚŽKÉ
RŮSTLINY DO HTV - ODŘEZT ORNICE.

КАРМЕР ТИМ СЛУЖИМЕ С РЕАЛИЗОВА
НАШТОУ НА ПРЕДМЕТНОЈ ПЛАНИ, ОКРЕТ СПОЛНА-
НОМ ДОКАЗНОМ ДОПУНИ.

- 2) ОЗУЧЕН У БОГАНУОУ БЕТОУ ПЛОД 70 ОДРЕКТИ
ОРИСЕ (ПАМЕЛОУ РОДМ, БЕТОУ, ТУРКЕ А 2 ОДРЕ)
КТОРЕ СЕ НАД НАМЕР У, ЛИДАНЕ ЛОКНАТО-
УАТ МАТЕРИЈАТИ ОЕ ОДЕТА - ПРОТОКОЛ А 70 ОДРЕКТИ-
БЕНТ СПОРОДУ НОУДАЧЕ ПРЕДНОТ. НОУДИТА
А УТЛОЗУ БЕТОУ ОДРАДУ, БУНДРЕ НОУДИТА
ЛИДАНЕ РОКЛАТОУТ УРЗУДН, Н СТРАНИ А ОСТАТ
7-КЛАДНИ О ОДРАДУОУ НОУДИТАТЕ СТЕ У ОУСИЕ ЗОД.
ПРЕДНЕТИЕ НАВНЕ ТРАЧЕ ПРИДАНЕ ПРЕДНОТ УННЕ ЗОД (21)

3. KU DEKORACI OŠJETLIVOSTI MATERIJAL (SOO3)
 1. IZDAM. POKLADNOSTI UTJECAJE - UTJECAJE OŠJETLIVOSTI
 KO I. B. KONSTRUKCI, TEHNIČ. - UŠETLIVOSTI
 OŠJETLIVOSTI UTJECAJE, STAV. MATERIJAL (PUN
 PAKETI, IZDAM. MATERIJAL, SVE POKLADNOSTI
 STAV.) BU DE AKO MIŠLJAM STAV. UŠETLIVOSTI
 KOZ OŠJETLIVOSTI MATERIJAL

21

21-01-17 TD

20.18.2014

K. KATILU PHOTOGRAPH TO 2ND RO OF LOU4
 2143057 @ TOLU4 TRAC) KATILU HH (SO OF 1.1)
 FREE LOU4 HH (AT 360000 TO 2143057) CAPTURED

- 1) S OPRÁVU ČASU TRAS? NA JEDEHNA SCHVÁTKE
NA PŘEDTOKOVNÝ JE AKČNA NEBUDE MAF VTRIV
HA RYCHLÝ CEH) DIELA ANI PŘESNÝ HARMONOGRAM
PŘEKLADU DIELA.

POKROČ. 20 STR. 1753765!

2. TERMIŇ REALIZÁCIE PRÁC - 2. MEHU TRASOVANIA 20. 08. 2024
JE POTREBNÉ S PREDSTAVOU INFORMOVAŤ TDI (EYD).

A DODRŽAŤ ĎALŠIE PODMIENKY:

a) ODSTUPOVÉ UDRŽANIE KOSTI / OCHRANNE PÁSMA KEDY

b) 2. MEHU TRASY RIADNE ZADOKUMENTOVAŤ:

- FOTOGRAFIE, GEODETICKÉ ZAKLADNÉ ÚPRAVY
DOKUMENTÁCIE - PRŮJEKT SÚVROČ. UPOKOJENIA,
ZÁPIS VSD...) A PRI POKLADKE NA KAŽDÝSPRÁVIT VŠETKY TECHNICKÉ A TECHNOLOG. PODLA-
ŽKY V ZMLUVNE PD.

ZÁPOVEŇ ZIAŽADIE O UPRACOVANIE A SA TDI.

VÝKONNÉ VÝKONNÉ CP V ZMLUVNE ZAD (ZK).

PODNE: 11.5.27°C

PRAC. DŇA: 7 - 17.00.

PRACOVNÍCI: 7 HL, 2 PRACOVNÍK, 5 UČENÍ, 4 LIDOVÉ PR

STRUČNÉ: 1 KOLDOČEK, 2 KÁBER, 4 KOTO, 1 KOLDOČEK, 1 UNČ
N. A. PEVNÁ PLOCHA

POSTUP PRÁC: - DOKUMENTÁCIE MERADIEL VODY

- OVOZ BETONOVÝ FÚTE 14X

- REALIZÁCIA OLYPOU + 2500⁰ HTU 01.02- REALIZÁCIA OLYPOU + 7600⁰ HTU 02.02- KURČIE PRÁCE SO 01⁰ 1. PP. HAKUČIA

- OVOZ SÚVROČ. TIE ZATLAKANIE POTRUBA RYBU

ZAKLADNÉ TDI

21. 08. 2024

O ZMLUVNE POKROČ. ZAD. ČL. 4.10. ZIAŽADIE

ZAKLADNÉ O VÝKONNÉ ODSTRÁNENIE BETONOVÝCH

SÚVROČ. PO UPRACOVANÍ 2. PREDMETNÝCH TIDOV

PRÁCE A PŘEBEŽNÉ DOKLADOVANIE VÝKONNÝCH

HISTORU Z VÝKONNÝCH, VÝKONNÝCH + VÝKONNÝCH

DOKUMENTOVANÝCH SÚVROČ. HOD. PŘEBEŽNÝCH

MATERIÁLOV V ZMLUVNE POKROČ. TIDOV


A ZÁKONOV O OBYVATELŇSKÝCH KOSTROVATELSTVE -

TERMIŇ SÚVROČ.

TDI:

ROZVOJNÝ SYSTÉM:
3NF-50Hz 400V/7N-C
OCHRANNE OPATRENIA:
SAMODIŠNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DVOJITOU ALEBO ZOSILNENOU IZOLOACIOU
VONKAŠIE VPLYVY:
PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ
VONKAŠÍCH VPLYVOV

1 0,000 = 485,50 m.k.m. BPV

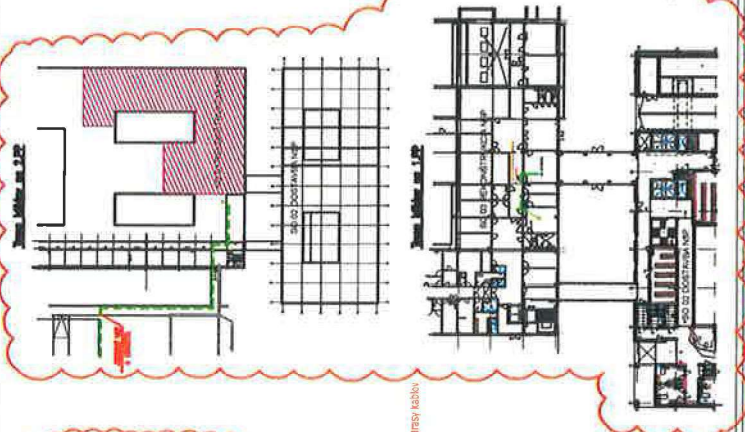

Dodanie reční viacom

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4

Príloha 5

Príloha 6

Príloha 7

Príloha 8

Príloha 9

Príloha 10

Príloha 11

Príloha 12

Príloha 13

Príloha 14

Príloha 15

Príloha 16

Príloha 17

Príloha 18

Príloha 19

Príloha 20

Príloha 21

Príloha 22

Príloha 23

Príloha 24

Príloha 25

Príloha 26

Príloha 27

Príloha 28

Príloha 29

Príloha 30

Príloha 31

Príloha 32

Príloha 33

Príloha 34

Príloha 35

Príloha 36

Príloha 37

Príloha 38

Príloha 39

Príloha 40

Príloha 41

Príloha 42

Príloha 43

Príloha 44

Príloha 45

Príloha 46

Príloha 47

Príloha 48

Príloha 49

Príloha 50

Príloha 51

Príloha 52

Príloha 53

Príloha 54

Príloha 55

Príloha 56

Príloha 57

Príloha 58

Príloha 59

Príloha 60

Príloha 61

Príloha 62

Príloha 63

Príloha 64

Príloha 65

Príloha 66

Príloha 67

Príloha 68

Príloha 69

Príloha 70

Príloha 71

Príloha 72

Príloha 73

Príloha 74

Príloha 75

Príloha 76

Príloha 77

Príloha 78

Príloha 79

Príloha 80

Príloha 81

Príloha 82

Príloha 83

Príloha 84

Príloha 85

Príloha 86

Príloha 87

Príloha 88

Príloha 89

Príloha 90

Príloha 91

Príloha 92

Príloha 93

Príloha 94

Príloha 95

Príloha 96

Príloha 97

Príloha 98

Príloha 99

Príloha 100

Príloha 101

Príloha 102

Príloha 103

Príloha 104

Príloha 105

Príloha 106

Príloha 107

Príloha 108

Príloha 109

Príloha 110

Príloha 111

Príloha 112

Príloha 113

Príloha 114

Príloha 115

Príloha 116

Príloha 117

Príloha 118

Príloha 119

Príloha 120

Príloha 121

Príloha 122

Príloha 123

Príloha 124

Príloha 125

Príloha 126

Príloha 127

Príloha 128

Príloha 129

Príloha 130

Príloha 131

Príloha 132

Príloha 133

Príloha 134

Príloha 135

Príloha 136

Príloha 137

Príloha 138

Príloha 139

Príloha 140

Príloha 141

Príloha 142

Príloha 143

Príloha 144

Príloha 145

Príloha 146

Príloha 147

Príloha 148

Príloha 149

Príloha 150

Príloha 151

Príloha 152

Príloha 153

Príloha 154

Príloha 155

Príloha 156

Príloha 157

Príloha 158

Príloha 159

Príloha 160

Príloha 161

Príloha 162

Príloha 163

Príloha 164

Príloha 165

Príloha 166

Príloha 167

Príloha 168

Príloha 169

Príloha 170

Príloha 171

Príloha 172

Príloha 173

Príloha 174

Príloha 175

Príloha 176

Príloha 177

Príloha 178

Príloha 179

Príloha 180

Príloha 181

Príloha 182

Príloha 183

Príloha 184

Príloha 185

Príloha 186

Príloha 187

Príloha 188

Príloha 189

Príloha 190

Príloha 191

Príloha 192

Príloha 193

Príloha 194

Príloha 195

Príloha 196

Príloha 197

Príloha 198

Príloha 199

Príloha 200

Príloha 201

Príloha 202

Príloha 203

Príloha 204

Príloha 205

Príloha 206

Príloha 207

Príloha 208

Príloha 209

Príloha 210

Príloha 211

Príloha 212

Príloha 213

Príloha 214

Príloha 215

Príloha 216

Príloha 217

Príloha 218

Príloha 219

Príloha 220

Príloha 221

Príloha 222

Príloha 223

Príloha 224

Príloha 225

Príloha 226

Príloha 227

Príloha 228

Príloha 229

Príloha 230

Príloha 231

Príloha 232

Príloha 233

Príloha 234

Príloha 235

Príloha 236

Príloha 237

Príloha 238

Príloha 239

Príloha 240

Príloha 241

Príloha 242

Príloha 243

Príloha 244

Príloha 245

Príloha 246

Príloha 247

Príloha 248

Príloha 249

Príloha 250

Príloha 251

Príloha 252

Príloha 253

Príloha 254

Príloha 255

Príloha 256

Príloha 257

Príloha 258

Príloha 259

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	03/2024
Dátum zahájenia konania:	13-08-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☐ NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY K ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA

☒ ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 Hlavný stavebný objekt – dostavba NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1 Stavebná časť
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)
V PD sú navrhnuté dva vežové žeriavy. Jeden je navrhnutý v mieste budúceho objektu SO-05 Energoblok, druhý v mieste budúceho kruhového objazdu SO-06 Komunikácie a spevnené plochy a tvorí prekážku prístupu na stavenisko.
Navrhujeme zmenu umiestnenia vežových žeriavov nasledovne:

- Prvý žeriav umiestniť vedľa SO-05 Energoblok na budúcu komunikáciu, tak aby nebránil postupu výstavby objektov SO-02 a SO-05
- Druhý žeriav umiestniť do priestoru vedľa objektu SO-02 z severovýchodnej strany v osi átria objektu SO-02

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Zmena umiestnenia žeriavov nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Nová umiestnenie žeriavov bude zakreslená v PD skutočného vyhotovenia stavby.

Vplyv zmeny na CENU DIELA


- ☒ Bez dopadu na cenu Diela
- ☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	0,00 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 13-08-2024



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenovéhó konania:	03/2024
Dátum zahájenia konania:	15-08-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 Hlavný stavebný objekt – dostavba NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1 Stavebná časť
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa 

Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s.
ul. Jánskoho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)
V PD sú navrhnuté dva vežové žeriavy. Jeden je navrhnutý v mieste budúceho objektu SO-05 Energoblok, druhý v mieste budúceho kruhového objazdu SO-06 Komunikácie a spevnené plochy a tvorí prekážku prístupu na stavenisko.
Navrhujeme zmenu umiestnenia vežových žeriavov nasledovne:

- Prvý žeriav umiestniť vedľa SO-05 Energoblok na budúcu komunikáciu, tak aby nebránil postupu výstavby objektov SO-02 a SO-05
- Druhý žeriav umiestniť do priestoru vedľa objektu SO-02 z severovýchodnej strany v osi átria objektu SO-02

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Zmena umiestnenia žeriavov nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Nová umiestnenie žeriavov bude zakreslená v PD skutočného vyhotovenia stavby. Navrhovateľ zabezpečí statické posúdenie predmetnej zmeny a všetky požadované protokoly, dokumenty.

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☒ Bez dopadu na cenu Diela

☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	0,00 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

GP súhlasí so zmenou umiestnenia vežových žeriavov. Upozorňujeme zhotoviteľa, že úpravu pozície vežových žeriavov je potrebné zohľadniť aj pri realizácii základových konštrukcií pod predmetné žeriavy.

Táto zmena je nevyhnutná a v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum vyjadrenia: 15-08-2024

Podpis oprávnenej osoby:

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d'alej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Stavebný dozor súhlasí za podmienok dodržania všetkých platných noriem a predpisov.

Dátum vyjadrenia: 15 -08- 2024

Podpis oprávnenej osoby:

VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer, advokát a konateľ

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☒ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Jedná sa o nepodstatnú zmenu spočívajúcu v umiestnení žeriavov na stavenisku bez dopadu na vykonávanie diela, časový harmonogram a cenu diela.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		0,00 %
- z toho navyše práce	0,00 €	
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Dátum vyjadrenia: 15-08-2024

Podpis oprávnenej osoby:

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA
☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ
☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	ING. LUKÁŠ BANDA
Pracovná funkcia zástupcu:	ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA
Dátum:	15-08-2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	15-08-2024
Podpis:	

staviebisko „A“

POČASIE: ž.č., JAVNÉ PRÁVY

15.8.2024

KONTAKT: 7 - H₂P.

PRÁVY:

7 K₂H₂O, 3 K₂H₂O, 3 K₂H₂O, 6 K₂H₂O, 1 K₂H₂O

PRÁVY + PRÁVY:

1 K₂H₂O, 2 N. H₂O, 3 K₂H₂O, 1 K₂H₂O, 1 K₂H₂O
2 K₂H₂O, 1 H₂O. K₂H₂O, 3 K₂H₂O, 1 K₂H₂O

PRÁVY:

- 4x TIEKLA DÚŽ DO 16,20 HOD.

- 2x DÚŽ DÚŽ

- ODPRÁVITE PRÁVY

- 2x K₂H₂O + TIEKLA

- ODPRÁVITE NA PRÁVY

- 1x DÚŽ DÚŽ DO 14

- 1x DÚŽ DÚŽ

2A. HOD. STAV. PRÁVY:

15.08.2024

1. KU VÝVOJOM STAVEBNEJ ZMIEŠANEJ SÚTE A DREVNEJ HNOTY (GOLATINY + STIEKLA) ŽIADAME ZHODNOTITEĽA O ZODANIE VÁŽNOSTI HISTÓRIU AHO AJ ZODANIE O ZHODNOTENÍ; BEZP. ZHESKOVANIE VÝVOJOM OZÁDOK A CENOU VÝVOJOM Z DREVNEJ HNOTY (GOLATINY, STIEKLA...)

2. ŽIADAME ZHODNOTITEĽA O TRIKLE MIEŠTEČNÉ DOKRÁVANE A KONTROLU BEZPEČNOSTI TIEDTISOU NA STAVENISOU - SHU - NOSENE DÚPP, ZA BEZPEČENIE JAH ARTH NA PRIESTUPNOSTE A OCHRANU PRED PRÁDOK OŠB, TRAVIDELENS UDRŽIAVANIE, ČI STEHIE PRIESTUPNOSTI A TRIKLENSOU KOMUNIKACIOM KU STAVENISOU.

ZÁPIS STAVEBNEHO PRÁVY

15.08

2. POLICIE TOI SÚKLASNE S PRÁVYMI VÝVOJOM

TDO:

NA ZHODN. I. ZODANIE PRÁVY 2024 ČIKLO ZHODN.

KONTAKT 10/1/2024.


ZÁPIS STAVEBNEHO PRÁVY

2. POLICIE TOI SÚKLASNE S PRÁVYMI VÝVOJOM

VÝVOJOM NA ZHODN. I. ZODANIE PRÁVY

ZHODN. ČIKLO VÝVOJOM KONTAKT 08/2024



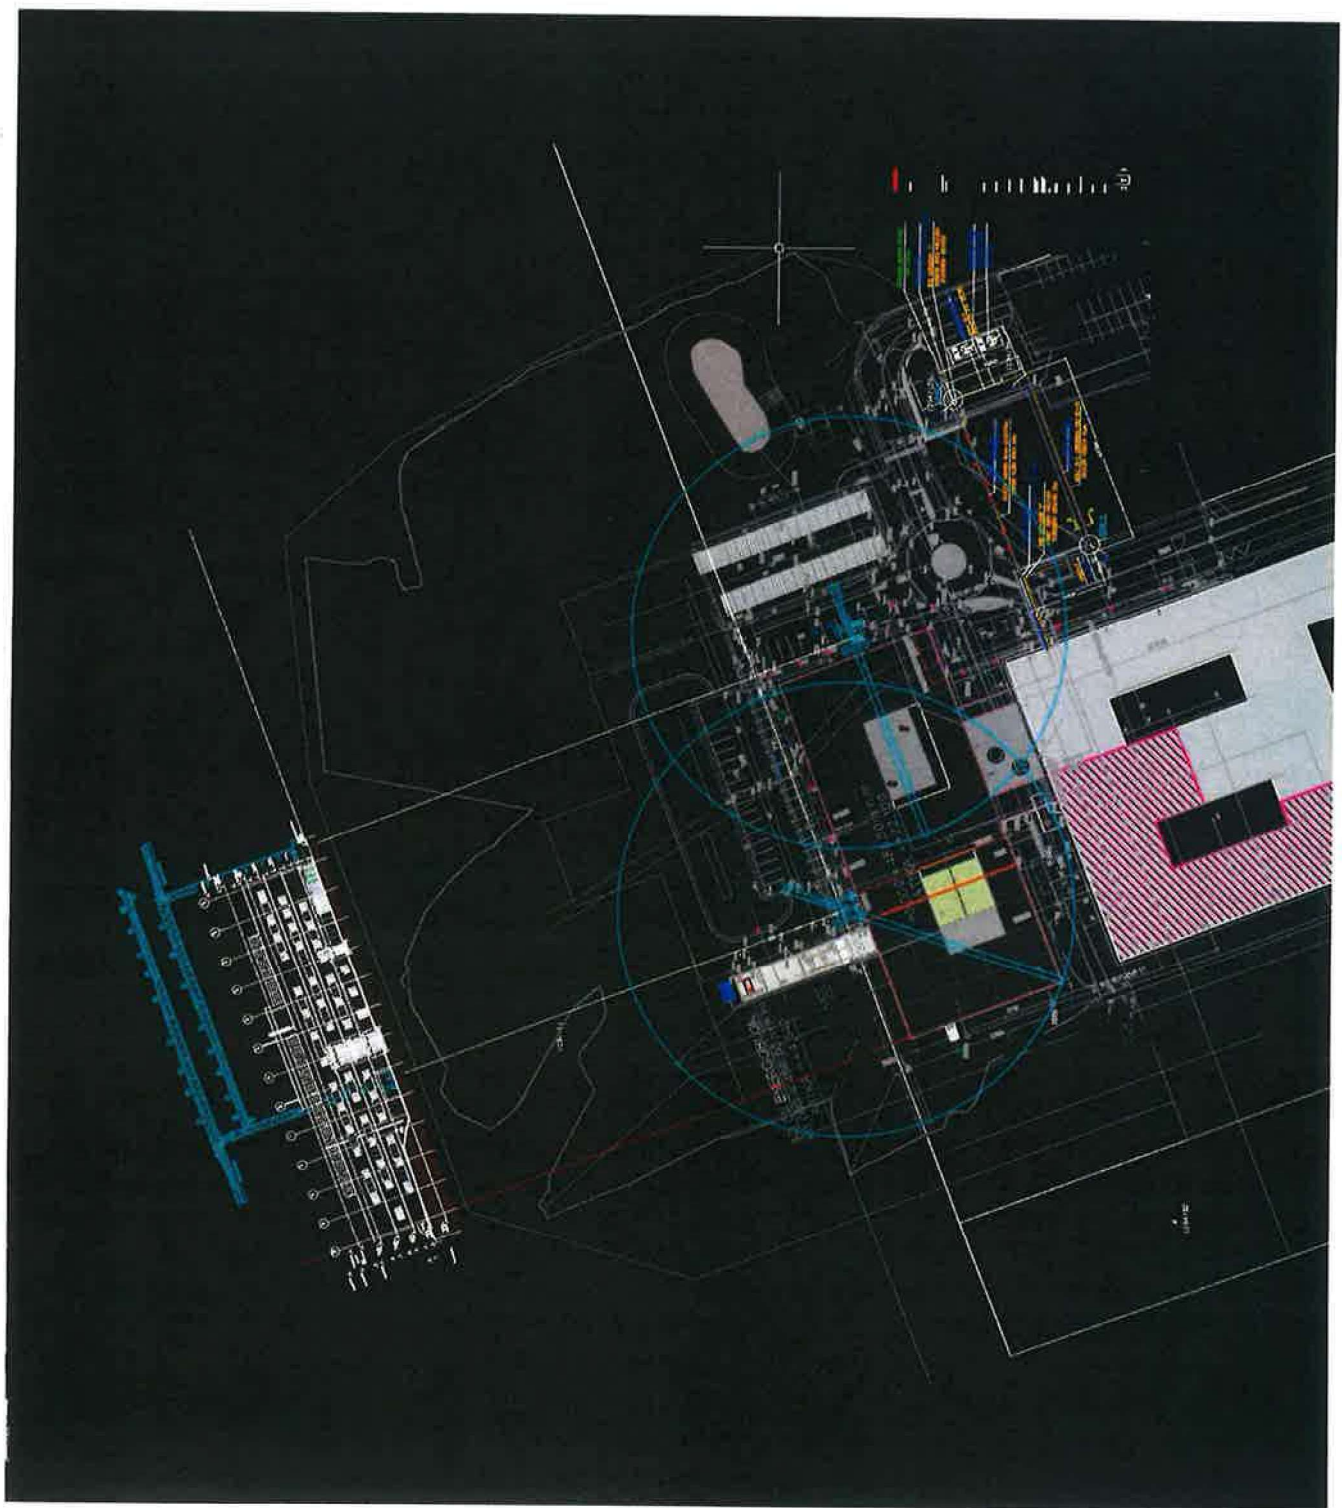

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	05/2024
Dátum zahájenia konania:	23-08-2024


Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☐ POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA

☒ ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 06 Komunikácie a spevnené plochy	
ČASŤ STAVBY:	Figuračný plán (časť 1)	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

REVIZIA TRASOVANIA ODVODNOVACEJ PRIEKOPY VRATANE DOPLNENIA VYSKOVEHO VEDENIA

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

BEZ DOPADU NA HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)


Celková cena zmeny bez DPH:	-3 889,58 €
Z toho navyše práce:	337,02 €
Z toho menej práce:	-4 226,60 €

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 17.3.-08-2024



edifex, a. s.
Kostová 2
11 02 Bratislava
IČ: SK2023532115
ex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	05/2024
Dátum zahájenia konania:	05 -09- 2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 06 Komunikácie a spevnené plochy
ČASŤ STAVBY:	Figuračný plán (časť 1)
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

REVIZIA TRASOVANIA ODVODNOVACEJ PRIEKOPY VRATANE DOPLNENIA VYSKOVEHO VEDENIA

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ **Bez dopadu na zmluvný HMG**

☐ **Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu**

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Bez dopadu na harmonogram stavebných prác

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Došlo k úprave trasovania odvodňovacej priekopy, čo sa prejavilo vo výkresovej dokumentácii
SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, výkres: Figuračný plán (časť 1)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-3 889,58 €
Z toho navyše práce:	337,02 €
Z toho menej práce:	-4 226,60 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum:

05-09-2024

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	05/2024
Dátum zahájenia konania:	05-09-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 06 Komunikácie a spevnené plochy
ČASŤ STAVBY:	Figuračný plán (časť 1)
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa 

Nemocnica
Spišská Nová Ves
ul. Jánského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

REVIZIA TRASOVANIA ODVODNOVACEJ PRIEKOPY VRATANE DOPLNENIA VYSKOVEHO VEDENIA

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

BEZ DOPADU NA ZMLUVNÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Došlo k úprave trasovania odvodňovacej priekopy, čo sa prejavilo vo výkresovej dokumentácii SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, výkres: Figuračný plán (časť 1)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-3 889,58 €
Z toho navyše práce:	337,02 €
Z toho menej práce:	-4 226,60 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Z dôvodu optimalizácie odvodňovacích pomerov vo vzťahu k výškovému členeniu terénu došlo k návrhu úpravy trasovania odvodňovacej priekopy vrátane upresnenia výškového vedenia. Predmetné úpravy sú zohľadnené v projektovej dokumentácii v časti SO 06 Komunikácie a spevnené plochy vo výkrese K-14 – Figuračný plán (časť 1).

Táto zmena je nevyhnutná a v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

05-09-2024

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Súhlasí Z dôvodu optimalizácie odvodňovacích pomerov vo vzťahu k výškovému členeniu terénu a plynulosti výstavby

Dátum vyjadrenia: 05-09-2024

Podpis oprávnenej osoby:

VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer, advokát a konateľ

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

áno

x nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	-3 889,58 €	0,014 %
- z toho naviac práce	337,02 €	
- z toho menej práce	-4 226,60 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Dátum vyjadrenia: 05-09-2024

Podpis oprávnenej osoby:

Prílohy k rozhodnutí o návrhu (časť C): Figuračný plán

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA
☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ
☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	ING. LUKÁŠ DINDA
Pracovná funkcia zástupcu:	ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA
Dátum:	05-09-2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	05-09-2024
Podpis:	

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - prypočtový/odpočtový rozpočet 07

Objekt: SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy - Zmenový list č.5

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 16. 8. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Mostová 2 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -3 889,58

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemné práce				
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	-47,093		
12	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	-9,419		
17	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - priekopa	m3	-26,850		
18	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	-13,425		
21	K	162301161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m - z výkopov na medziskládku	m3	-36,269		
23	K	167102102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 - z výkopov pre medziskládku	m3	-36,269		
27	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	-36,269		
33	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	-47,093		
D	4		Vodorovné konštrukcie				
36	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm - priekopa	m3	-4,485		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
121	K	916362111	Osadenie obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	19,100		
128	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv cca 1000x50x200 mm, sivá	ks	20,000		
129	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,108		
132	K	935111111.S	Osadenie rigolového žľabu z betónových tvárníč šírky do 500 mm	m	-34,500		
133	M	592270002100	Odvodňovací žľab, lxšxv cca 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	-138,000		
134	K	935112311.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárníč šírky 800- 1200 mm do betónu C 12/15	m	-29,900		
135	M	592270000400.S	Tvárnica priekopová, rozmer cca 1125x350 mm	ks	-99,667		
D	99		Presun hmôt HSV				
139	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-28,173		

Denné záznamy stavby:

List č.:

1753778

Dátum

SO KSTWNI POEROVANHI PLOUNI
OTE DOORZIVALI PRISIE A ZOSPONKLE
KSTWY PISAPID7 A GU OTU, BOZP
A POLIMANKY NAP SUV.

ZAPIS STAVEBNÉHO DOPRAN
Z POLICIE DO BUKUSINE IS REZULOVANHI
LAVKON NA ZMENI DOSSAM PLVENIA
ZMUT O VIELO VOS. CITO ZMLOVERO
KODNIA 03/2014.

POKRIE: 27°C

PRICNA DOTA: 7-15°C

REKOVICI: 8 KOSTIKU ZEMNIA A 11

PRITE A DOKTAT: 16
2 VIBE, TNC, 4 KSTW

PRIMP MTC - DIMP HTU SO 1.1.2, 3Dⁿ
- KOSTE FANTY NA KSTW
- KSTW, KSTWOTIE, ZHUTNERIE, NIVELIACIA
- PRIDATOK
- DIMP SUND KA OTL PLYNE PRJ, SO 03'

TDI BERIE NA VEDOME

ZAZNAM ZHOTOVITEĽ

1, V PRITE SO TO JE KOSTA SACHA RIVER
1 ZHOSKEL DO KSTW. KAN. POTRUMIA.
O VPRKE PRKY ZESTUUTICEZ SA V PD KSTWOTIE.
ZADAM ODPOVED O TO PRATI.

2, V PRITE SO OT HTU JE UVAZOVARE D OZIVAVOU
1 VPRKOU PRKTY NA KONCI BYVATEJ ODODKOVACEJ
PRIEKOPY.

ZHOTOVITEĽ KSTWOTIE INVA800 VPRKOU PRKTY
V SO TO K V SO OT. PRKTY V SO OT. PRKTY
NA ODODKOVACEJ VPRK. SACH NA ODODKOVACEJ
HOD PRKTY PRKTYVU DN 400, TELEKOTKOV SO.

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	13/2024
Dátum zahájenia konania:	08-10-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO02 Hlavný objekt; SO05 Energoblok	
ČASŤ STAVBY:	E1.2 Statika	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

V rámci zmeny projektu boli v projekte statiky vyvolané úpravy v niektorých železobetónových nosných prvkoch objektov SO 02 Hlavný objekt a SO 05 Energoblok. Úprava výkresov bola vyvolaná koordináciou ostatných profesií – hlavne TZB, čo malo za následok aktualizáciu resp. doplnenie prestupov cez nosné železobetónové steny.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Predmetná zmena nemá dopad do harmonogramu

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

V projekte statiky sa zmena týka výkresov tvaru stropných na všetkých podlažiach, pretože v nich sú pôdorysne zakreslené prieryzy v železobetónových stenách. Vzhľadom na to, že v železobetónových stenách je výstuž, ktorá sa na vytvorených prierozoch musí prerušiť, zmena sa týka aj príslušných výkresov výstuže železobetónových nosných stien. Zoznam dotknutých výkresov tvorí prílohu tohto ZL

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)


Celková cena zmeny bez DPH:	156,28 €
Z toho navyše práce:	156,28 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 08-10-2024



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	13/2024
Dátum zahájenia konania:	15 -10- 2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-02 Hlavný objekt, SO-05 Energoblok	
ČASŤ STAVBY:	E1.2 Statika	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

V rámci zmeny projektu boli v projekte statiky vyvolané úpravy v niektorých železobetónových nosných prvkoch objektov SO 02 Hlavný objekt a SO 05 Energoblok. Úprava výkresov bola vyvolaná koordináciou ostatných profesií – hlavne TZB, čo malo za následok aktualizáciu resp. doplnenie prestupov cez nosné železobetónové steny.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Predmetná zmena nemá dopad do harmonogramu

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

V projekte statiky sa zmena týka výkresov tvaru stropných na všetkých podlažiach, pretože v nich sú pôdorysne zakreslené prierazy v železobetónových stenách. Vzhľadom na to, že v železobetónových stenách je výstuž, ktorá sa na vytvorených prierozoch musí prerušiť, zmena sa týka aj príslušných výkresov výstuže železobetónových nosných stien. Zoznam dotknutých výkresov tvorí prílohu tohto ZL.

Vplyv zmeny na CENU DIELA


- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	156,28 €
Z toho navyše práce:	156,28 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice


Dátum: 15-10-2024



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	13/2024
Dátum zahájenia konania:	15-10-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-02 Hlavný objekt, SO-05 Energoblok
ČASŤ STAVBY:	E1.2 Statika
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa  

Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s.
ul. Jánského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

V rámci zmeny projektu boli v projekte statiky vyvolané úpravy v niektorých železobetónových nosných prvkoch objektov SO 02 Hlavný objekt a SO 05 Energoblok. Úprava spočíva v úprave prierezov v železobetónových stenách pre technologické rozvody a s tým spojenou úprave výkresov tvaru a výstuže.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá dopad na zmenu harmonogramu prác.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Uvedenou zmenou boli dotknuté revidované výkresy vid'. zoznam v prílohe.

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	156,28 €
Z toho navyše práce:	156,28 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
- ☐ Nesúhlasím

Navrhovaná zmena je nevyhnutná k riadnemu realizovaniu diela.

Dátum vyjadrenia: 15.10.2024

Podpis oprávnenej osoby

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynuli z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Súhlasíme z dôvodu plynulej postupnosti výstavby

Dátum vyjadrenia: **15 -10- 2024**

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce	156,28 €	0,00057 %
- z toho menej práce	0,00 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia:

15.10.2024

Podpis oprávnenej osoby:

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Zitkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA

☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ

☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	15-10-2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	15-10-2024
Podpis:	

Zoznam príloh:

ZÁZNAM TDI

08.10.2024

1. UPOKOŘUJE SE TÍMTO ZKOTUVATEL NA MÍSTĚ - ÚTOČNĚ
ČENÍ A POSLEDNÍ OCHRANU EXISTUJÍCÍCH REVÍZÍ
SČET AREFLOVÝ JEDNOTLIVÝ KANALIZAČNÍ PŘI REALI-
ZACI STAVBY. PRÁČE NA VOZE. OČIŠTĚNÍ A HTU, KANALIZAČNÍ
AKTIVNĚ NA SEVER. STRANĚ SO 03 (REV. SČET -
R516, R58, R59, R510 + R511).

PO DNEŠNÍM MONITORINGU PŘEDMET. ÚSTY VOZE.
STAVBOVÝ KANALIZAČNÍ, STAVBA O PŘECHÝSTNĚ RE-
VÍZÍ SČET, ZAKLADY EXIST. KNEŽ TOČKY KANALIZAČNÍ
POKROUPLI A OCHRANU PŘED ZAKLADY PRACOVNÍM POSUPNÍ,
PILOTÁŽNĚ TRÁCE, PŘECHÝSTNĚ ÚSTAVY A T. D.

2. PŘI REALIZACI KANALIZAČNÍ TÍMTO ZÁDAJE ZKOTUVATEL
PŘI O ZÁKLADE OČIŠTĚNÍ ODZEM VLOŽEK 2 CEMENTOVÝ
INŽENÝRŮ ZMESI PŘE DOKLADOVANÉ VÝSLEDKOU 2
KOCN. PŘEVODIT. NA LAČNĚK TO 28 DŮCH.
LABORATORNĚ KPOČNĚ SKUTNÝ CEMENTOVÝ INŽENÝR. KNEŽ
PRACOVNÍ V FÁZĚ S STU E4 445.

TÍMTO K OSTATNĚ SKUTNÝ REALIZOVAT V KNEŽ
TP A KSP OČIŠTĚNÍ PŘED ZAKLADY TRÁCE
NA KANALIZAČNÍ.

ZL 13

3. NA ZÁKLADĚ POŘÍZDANÝ OBYEDNÁVATEL 20. DŮH 07.10.2024
(MAILOVÁ KOMUNIKÁČIA) VÁS TÍMTO ZÁDAJE O TŘEDLOŽENÍ
ČASTI 3 ZL 13: REVÍZIA STATIKU SO 02, SO 05
V RMYSKĚ ZASLAHÝCH PODKLADOV - OČENÍ PŘEDMETNÝ
ZMEN V RMYSKĚ ZASLAHÝCH PODKLADOV VV.

POČASÍ: 16°C

PŘECHÝSTNĚ: 7-10°C

PŘECHÝSTNĚ: 1. PŘECHÝSTNĚ, 6. KANALIZAČNÍ, 4. KANALIZAČNÍ, 1. KANALIZAČNÍ

PŘECHÝSTNĚ: 1. KANALIZAČNÍ, 2. KANALIZAČNÍ, 3. KANALIZAČNÍ, 4. KANALIZAČNÍ

PŘECHÝSTNĚ:

- REALIZOVAT, MP NA OČI, D. S. PŘECHÝSTNĚ
BEIDETON

- DETTO 01 6"

- OČIŠTĚNÍ HTU SO 01 SČET SO 05 / SO 06

- SKUTNÝ KANALIZAČNÍ PŘECHÝSTNĚ

ZÁZNAM TDI

08.10.2024

ZL 17

- NA ZÁKLADĚ POŘÍZDANÝ OBYEDNÁVATEL 20. DŮH 07.10.2024
(MAILOVÁ KOMUNIKÁČIA) VÁS TÍMTO ZKOTUVATEL ZÁDAJE O TŘEDLOŽENÍ
ČASTI 3 ZL 17: REVÍZIA AREFLOVÝ KANALIZAČNÍ
LIABIE SO 10 - OČENÍ PŘEDMETNÝ ZMEN V RMYSKĚ
PŘECHÝSTNĚ ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝNER.

STAVBA:

**DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ
ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI**

**SO 02 HLAVNÝ OBJEKT – PRÍSTAVBA K NsP
SO 05 ENERGOBLOK**

Dôvodová správa zmeny Z1

INVESTOR	: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s. Jána Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
AUTOR PROJEKTU	: BAUER projekčná kancelária s.r.o. Bencúrova 14, 040 01 Košice
VYPRACOVAL	: Ing. Viktor BAUER
DÁTUM	: 07. 2024
DIEL PROJEKTU	: statika
STUPEŇ PD	: realizačný projekt

SADA :

Dôvodová správa

V rámci zmeny Z1 projektu NNG SNV boli v projekte statiky vyvolané úpravy v niektorých železobetónových nosných prvkoch objektov SO 02 Hlavný objekt a SO 05 Energoblok. Úprava výkresov bola vyvolaná koordináciou ostatných profesií – hlavne TZB, čo malo za následok aktualizáciu resp. doplnenie prestupov cez nosné železobetónové steny.

V projekte statiky sa zmena týka výkresov tvaru stropných na všetkých podlažiach, pretože v nich sú pôdorysne zakreslené prierazy v železobetónových stenách. Vzhľadom na to, že v železobetónových stenách je výstuž, ktorá sa na vytvorených prieroch musí prerušiť, zmena sa týka aj príslušných výkresov výstuže železobetónových nosných stien.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZMENA Z-01 - Zmenový list č. 13/2024

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - pripočtový/odpočtový rozpočet

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

156,28

187,54

SO 02 Hlavný stavebná objekt - dostavba NsP
E.1 Stavebná časť
SO 05 Energoblok
E.1 Stavebná časť

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK20235394
www.adifex.sk

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi -
prípočtový/odpočtový rozpočet

Objekt:

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Časť:

E.1 - Stavebná časť - Zmenový list č. 13/2024

Miesto:

parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Dátum:

17. 7. 2024

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant:

d.g.A. design graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

145,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

145,99

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

48	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,142		
----	---	-------------	-------------------------------------	---	-------	--	--

D 99

Presun hmôt HSV

161	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,144		
-----	---	-------------	--	---	-------	--	--

Adifex
Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK20495321
www.adifex.sk

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi -
prípočtový/odpočtový rozpočet

Objekt:

SO 05 - Energoblok

Časť:

E.1 - Stavebná časť - Zmenový list č. 13/2024

Miesto:

parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Dátum:

17. 7. 2024

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant:

d.g.A. design graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

10,29

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

10,20

32	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,010		
51	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,010		

Adifex Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	14/2024
Dátum zahájenia konania:	14-08-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☐ NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA

☒ ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Prípravné práce
ČASŤ STAVBY:	SO 01.2.2 HTU – Búracie práce
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa 

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

Pri prácach na SO 01.2 HTÚ boli odhalené skryté betónové plochy cestné panely a betónové žľaby. Nakoľko uvedené plochy neboli identifikované počas prác na PD a nedostali sa do zmluvného rozpočtu t.j. nie sú zahrnuté v ZoD. Betónové plochy musia byť odstránené nakoľko bránia postupu stavebných prác na realizácii diela. Betónové plochy sú čisté a **neobsahujú nebezpečný odpad**. Betónové plochy budú odstránené mechanizmami naložené na nákladné autá a odvezené na recykláciu stavebného odpadu. Práce obsahujú odstránenie, nakladanie odpadu, odvoz odpadu na recykláciu.

Práce na odstránení znamenajú navyše práce.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Odstránenie betónových plôch nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Odstránenie betónových plôch nebude mať vplyv na projektovú dokumentáciu.

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)


Príloha :Rozpočet podľa skutočných výmer

Celková cena zmeny bez DPH:	10 582,12 €
Z toho navyše práce:	10 582,12 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 14-08-2024



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	14/2024
Dátum zahájenia konania:	15 -10- 2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Prípravné práce
ČASŤ STAVBY:	SO 01.2.2 HTU – Búracie práce
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa  Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36597350, DIČ: 2022064781

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

Pri prácach na SO 01.2 HTU boli odhalené skryté betónové plochy cestné panely a betónové stĺby. Nakoľko uvedené plochy neboli identifikované počas prác na PD a nedostali sa do zmluvného rozpočtu t.j. nie sú zahrnuté v ZoD. Betónové plochy musia byť odstránené nakoľko bránia postupu stavebných prác na realizácii diela. Betónové plochy sú čisté a **neobsahujú nebezpečný odpad**. Betónové plochy budú odstránené mechanizmami naložená na nákladné autá a odvezená na recykláciu stavebného odpadu. Práce obsahujú odstránenie, nakladanie odpadu, odvoz odpadu na recykláciu.
Práce na odstránení znamenajú navyše práce.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Odstránenie betónových plôch nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Odstránenie betónových plôch nebude mať vplyv na projektovú dokumentáciu.

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Zmenového listu)

Celková cena zmeny bez DPH:	10 582,12 €
Z toho navyše práce:	10 582,12 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. sídlo: Jiráskova 38, 080 05, Prešov ateliér: Popradská 80, 040 01, Košice
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Odstránenie betónových plôch je nevyhnutné z hľadiska realizácie diela, nakoľko bráni práci pri postupe stavebných prác.

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

15-10-2024

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynuli z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r.o. Košice
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	Ing. Miroslav STANKO

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Likvidácia odhalenej skládky netriedeného odpadu bráni postupu stavebných prác a je nevyhnutná z hľadiska realizácie navrhovaného diela.

Dátum vyjadrenia: 15-10-2024

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Oprávnenie / pracovná pozícia	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce	10 582,12 €	0,039 %
- z toho menej práce	0,00 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

*PREDMETNÁ POTREBA NEMOHLA BYŤ ZNÁMA V ČASE OBSTARÁVANIA.
ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH SKRYTÝCH BETONOVÝCH PLŮCH JE NEVYHNUTNÉ
K HLADISKA REALIZÁCIE NAVRHOVANÉHO DíLA.*

Dátum vyjadrenia: 15-10-2024

Podpis oprávnenej osoby

HAVEL & PARTNERS s.r.o.

advokátska kancelária

Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900

IČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817

(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	15-10-2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	15-10-2024
Podpis:	

POČASIE: 10°C

13.10.2024

PRACOVNÁ SMENA: 7 - 17:00

PRACOVNÍCI: 1 ADIFEX, 1 THEHARD, 1 ARES, 1 DANKOV

STROJE: 1 BEZ PUMPA, 1 PIL. SUPRAK

VÝPRAVA: 1 SÚRODOKHESKOV

POSTUP:

- REALIZÁCIA VIBROPILOT - VE

POČASIE: 14°C

14.10.2024

PRACOVNÁ SMENA: 7 - 17:00

PRACOVNÍCI: 2 ADIFEX, 5+2 THEHARD, 1 ARES, 1 DANKOV

5 KADSKU

STROJE A VÝPRAVA: 3 KUPA, 3 KAGER, 1 KUC, 1 VAREC

- ODOBRATIE HŤU TČI DO 05

- BUKANIE KÉIONU O MIESTE (BEHTY MED. PLYN

VIX PRACA - ODSŤRANENIE ZVÝŠKOV BEZ KOLEKTO.

PO BYVÁLE) (JEST.) PRIPOMKE MED. PLYNOV

- PRACA PIL. SUPRAKOT - VIBROPILOTY JA NEKOR.

ZÁKLAM TSI

14.10.2024

- 1) TDI BERIE NA VEDOMIE POSLUŠNÍKOV DO DIA 12. A 13.10.2024. ŽIADAME PREDLOŽIŤ PROTOKOL-VÝSLEDKY ČINNOSTI REALIZOVANÝCH VIBROPILOT THE STATICKÉ POSUDENIE V KŤE TDI.

- 2) KU BÚRACÍM PRÁCAM - ODSŤRANENIE DŮVŠKOV PŮLOD. BETŮM. KU VEKTOREM A PODKLAD BETŮM PRE REALIZACIU LICOVY BETŮM. ŠACHŤI DIA 1000 (EL. HIZAMATEJ) ŽIADAME ZMOTOVITEĽA O HÁVŤI A VÝPRAVOVANIE ZL V KŤE ŽOD (HÁVŤI PRACE). POLOHU ŠACHŤI REALIZOVATŤ MOŽI UŽ REALIZOVANÝ POKRÝV OBYVŤOV V KŤE ODSŤRANENÝCH PORŤOV Č. 002 A ODS VŤRANÝCH EP TDI.

- 3) OPAŤOVNE ŽIADAME ZMOTOVITEĽA O OPRÁVU A ŽASŤANIE TDI: CENOVY POKUL) ZL 19 - ODSŤRANENIE SKETŤCH BETŮM. PLOCH, ČESTŤCH TAMELOV A BET. ŽIADŮV NA ŽAKŤE GEODETIC. ŽAKŤANŤI A SKŤOČNE REALIZOVANÝ PRAC - NALOŽENIE, ODOBR BET. ODPADU NA RECYKLACIU.

ZÁZNAM TDI

20. 08. 2024
UTOROKUŠTADNENIE TDI K ZATISLU ZMOTIVITEĽA ZO
Dňa 19. 08. 2024:

- 1) NA ZÁKLADĽE OZHLADU - VIZUÁLNEJ PREBERATE
DUALIZOVANE PLÁNU NA SV STRANE STAVENISKA
MIMO DOČASNÝCH PLOCH, KDE JE USKLADNENÝ
STAV. ZMIEŠANÝ ODPAD A SKLADKA UŽ VYBRANÝCH
BETÓNOK A PANELOVÝCH PLOCH A ZATRAVŇ. TĚRAC
RISHTENICA ZO HTV - ODKRÝT ORHICE.

ZAPRACOVANÍM SCHVATIME S REALIZACIJOU
UŠTADNENIA NA PREDMETNEJ PLÁNI, OKREDO SPONTAN-
NÝCH DOČASNÝCH DEPOZIT.

ZL 14

- 2) OBJEM VYBRANÝCH BETÓN. PLOCH ZO ODKRÝT
ORHICE (PANELOVÉ PLOCH, BETÓN. TĚRACICE A ZLOZ)
KTORE SU HODNÁ NEČES VU, ZIADAME DOUKLADO-
VAT PARAMETROM GEODETA - PROTOKOL A ZO ODSTRA-
SENI SPOLNOU LICUVAČOJE PREDMET. MNOŽSTVOM
A UÝLOZU BETÓN. ODPAVU, BRUNČNE MNOŽSTVOM
ZIADAME DOUKLADOVAT UÝZYMÍ H STRANI A OSTAT.
ZOKLADOMI O ODPAVLOVÝ KOSPOZATISTVET UÝZICE ZOD.
PREDMETNE NÁVAC TRÁCE PRITADNE PREDODIT UÝZICE ZOD (XL).

- 3) KU DEMOLACI, OBJEMU BÝVANEJ HÁČHICE (SO 03)
ZIADAM DOUKLADOVAT UÝZICAVE - UÝVEČEJE OBJEM
ZO Z. B. KONSTRUKCI, TĚHAL. - UÝZICE H STRAN.
OSTATNÝ UÝBERANÝ STAV. MATERIÁL (POV
PANELU, IČOČ. MATERIÁL, SOK PRISA TĚRAC
STĚM) BUDE AKO ZMIEŠANÝ STAV. ODPAV RĚSEČ
ČEZ OBJEDNÁVATEĽA STAVBY

TDI

ZÁZNAM TDI

20. 08. 2024

K ZATISLU ZMOTIVITEĽA ZO Dňa 20. 08. 2024.
ZAPRACOVANÍM O ZATISLU TRAC) KATIA H4 (SO 01.1.)
PRELOŽIA H4 (UÝZLOVÝCH ZO ZODOV.) ODKRÝT


- 1) S ÚPRAVU ČASTI TRAC) KĚ JEDEHIA SCHVATIME
ZA PREDTOKLADU, ŽE ZMĚNA NEBUDE HAF UÝZV
NA ZMĚNU ČEHÍ DIELA ANI DOČAS HARMONOGRAFU
NEKĚ HAFČIE DIELA.

Rozpočet, ZL č.14/2024 - Odstránenie podkladu

Stavba : Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi
Objekt : SO 01 Prípravné práce
Časť : SO 01.2.2 HTÚ -Búracie práce
Objednávateľ : NsP, Spišská Nová Ves
Zhotoviteľ . Adifex a.s. Mostová 2 Bratislava
Miesto : NsP Spišská nová Ves
Vypracoval . Ing. Jaroslav Líška

P.č.	Kód položky	Popis položky	m.j.	Množstvo	jed.cena	Spolu
HSV		Práce a dodávky HSV				10 582,12
1		Zemné práce				1 660,80
1	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	519,000		
žľaby 99+7+30+27+17=180m2 panelová cesta 204+135=339m2 Spolu : 519m2						
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 921,32
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	256,360		
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 870,840		
7	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	256,360		
8	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	256,360		
Celkom						10 582,12

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

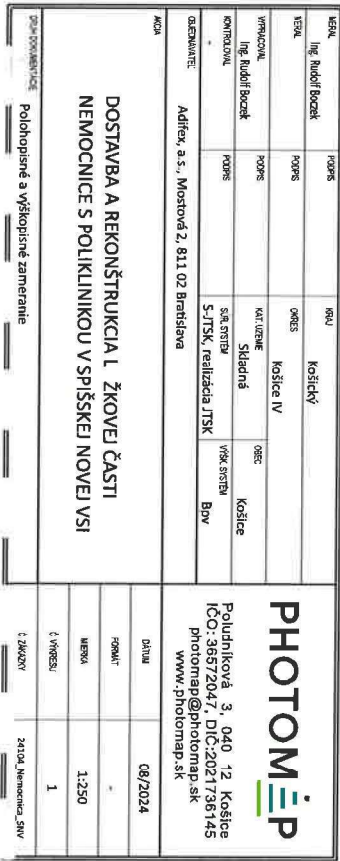

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	19/2024
Dátum zahájenia konania:	08 -10- 2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA

☐ ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP	
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra, E.2 Statika, E.3 Zdravotechnika	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

S ohľadom na trasu splaškovej kanalizácie, ktorá bola nájdená počas výkopových prác, prechádzajúcu priehlbňou výtahovej šachty a skutočnosť, že pri výkopových prácach sa objavila spodná voda, bolo nevyhnutné prijať nasledovné úpravy v PD.

1. Vzhľadom na objavenú spodnú vodu vo výkope nebude odstránená existujúca prímurovka steny existujúcej výtahovej šachty v osi „2“ tak, aby nedošlo pri búracích prácach k porušeniu celistvosti existujúceho hydroizolačného systému a prípadným poruchám pri pôsobení tlakovej vody. Výkopové práce a základové konštrukcie pre priehlbňu výtahu budú realizované s posunutím o hrúbku prímurovky t.j. s posunom o 150mm smerom od osi „2“, v dôsledku čoho bude následne posunutá oceľová podporná konštrukcia a oceľová nosná konštrukcia výtahu vid'. Príloha 1.

2. V rámci búracích prác budú realizované búracie práce pre realizáciu preložky splaškovej kanalizácie mimo pôdorys budúcej výtahovej šachty vrátane osadenia drenáže pre odvod spodnej vody. Realizácia preložky splaškovej kanalizácie v zmysle návrhu vid'. Príloha 2, bude z hľadiska realizácie rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape bude realizovaná preložka splaškovej kanalizácie v rámci interiéru s napojením do existujúceho potrubia za priehlbňou navrhovanej výtahovej šachty, vrátane odbočky pre napojenie drenáže, osadenia drenáže DN 160 s geotextíliou v štrkovom lôžku. V druhej etape bude realizovaná exteriérová časť preložky vrátane interiérovej časti po bod napojenia prvej etapy, realizácia druhej etapy bude v súbehu stavebných prác na objekte sanácie spojovacieho krčka (SO 04).

3. Vzhľadom na objavenú spodnú vodu pri výkopových prácach je potrebné novonavrhované základové konštrukcie priehlbne výtahu realizovať systémom bielej vane, v dôsledku čoho je potrebné ošetrenie pracovných škár plechom a poistnými hadičkami v zmysle detailov pri objekte SO 02 vid'. Príloha 3.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 7, ktorý obsahuje 3 výkresové prílohy

- PnS.007-P1_ASR – úprava rozsahu búracích prác pre priehlbeň výťahu (SO03)
- PnS.007-P2_ZTI – preložky splaškovej kanalizácie
- PnS.007-P3_STA – úprava ošetrenia pracovných škár

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	9 455,16 €
Z toho navyše práce:	9 455,16 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 08 -10- 2024

x, a. s.
v Bratislave
2023532115

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	19/2024
Dátum zahájenia konania:	21-10-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA

☐ ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu...)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra, E.2 Statika, E.3 Zdravotechnika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

S ohľadom na trasu splaškovej kanalizácie, ktorá bola nájdená počas výkopových prác, prechádzajúcu priehlbňou výtahovej šachty a skutočnosť, že pri výkopových prácach sa objavila spodná voda, bolo nevyhnutné prijať nasledovné úpravy v PD.

1. Vzhľadom na objavenú spodnú vodu vo výkope nebude odstránená existujúca prímurovka steny existujúcej výtahovej šachty v osi „2“ tak, aby nedošlo pri búracích prácach k porušeniu celistvosti existujúceho hydroizolačného systému a prípadným poruchám pri pôsobení tlakovej vody. Výkopové práce a základové konštrukcie pre priehlbňu výtahu budú realizované s posunutím o hrúbku prímurovky t.j. s posunom o 150mm smerom od osi „2“, v dôsledku čoho bude následne posunutá oceľová podporná konštrukcia a oceľová nosná konštrukcia výtahu vid'. Príloha 1.

2. V rámci búracích prác budú realizované búracie práce pre realizáciu preložky splaškovej kanalizácie mimo pôdorys budúcej výtahovej šachty vrátane osadenia drenáže pre odvod spodnej vody. Realizácia preložky splaškovej kanalizácie v zmysle návrhu vid'. Príloha 2, bude z hľadiska realizácie rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape bude realizovaná preložka splaškovej kanalizácie v rámci interiéru s napojením do existujúceho potrubia za priehlbňou navrhovanej výtahovej šachty, vrátane odbočky pre napojenie drenáže, osadenia drenáže DN 160 s geotextíliou v štrkovom lôžku. V druhej etape bude realizovaná exteriérová časť preložky vrátane interiérovej časti po bod napojenia prvej etapy, realizácia druhej etapy bude v súbehu stavebných prác na objekte sanácie spojovacieho krčka (SO 04).

3. Vzhľadom na objavenú spodnú vodu pri výkopových prácach je potrebné novonavrhované základové konštrukcie priehlbne výtahu realizovať systémom bielej vane, v dôsledku čoho je potrebné ošetrovanie pracovných škár plechom a poistnými hadičkami v zmysle detailov pri objekte SO 02 vid'. Príloha 3.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 7, ktorý obsahuje 3 výkresové prílohy

- PnS.007-P1_ASR – úprava rozsahu búracích prác pre priehlbeň výťahu (SO03)
- PnS.007-P2_ZTI – preložky splaškovej kanalizácie
- PnS.007-P3_STA – úprava ošetrovania pracovných škár

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	9 455,16 €
Z toho navyše práce:	9 455,16 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 21-10-2024

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	19/2024
Dátum zahájenia konania:	21 -10- 2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1 Architektúra, E.2 Statika, E.3 Zdravotechnika</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>



**Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s.**
ul. Jánskoho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

S ohľadom na trasu splaškovej kanalizácie, ktorá bola nájdená počas výkopových prác, prechádzajúcu priehlbňou výtahovej šachty a skutočnosť, že pri výkopových prácach sa objavila spodná voda, bolo nevyhnutné prijať nasledovné úpravy v PD.

1. Vzhľadom na objavenú spodnú vodu vo výkope nebude odstránená existujúca primurovka steny existujúcej výtahovej šachty v osi „2“ tak, aby nedošlo pri búracích prácach k porušeniu celistvosti existujúceho hydroizolačného systému a prípadným poruchám pri pôsobení tlakovej vody. Výkopové práce a základové konštrukcie pre priehlbňu výtahu budú realizované s posunutím o hrúbku primurovky t.j. s posunom o 150mm smerom od osi „2“, v dôsledku čoho bude následne posunutá oceľová podporná konštrukcia a oceľová nosná konštrukcia výtahu vid'. Príloha 1.

2. V rámci búracích prác budú realizované búracie práce pre realizáciu preložky splaškovej kanalizácie mimo pôdorys budúcej výtahovej šachty vrátane osadenia drenáže pre odvod spodnej vody. Realizácia preložky splaškovej kanalizácie v zmysle návrhu vid'. Príloha 2, bude z hľadiska realizácie rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape bude realizovaná preložka splaškovej kanalizácie v rámci interiéru s napojením de existujúceho potrubia za priehlbňou navrhovanej výtahovej šachty, vrátane odbočky pre napojenie drenáže, osadenia drenáže DN 160 s geotextíliou v štrkovom lôžku. V druhej etape bude realizovaná exteriérová časť preložky vrátane interiérovej časti po bod napojenia prvej etapy, realizácia druhej etapy bude v súbehu stavebných prác na objekte sanácie spojovacieho krčka (SO 04).

3. Vzhľadom na objavenú spodnú vodu pri výkopových prácach je potrebné novonavrhované základové konštrukcie priehlbne výtahu realizovať systémom bielej vane, v dôsledku čoho je potrebné ošetrenie pracovných škár plechom a poistnými hadičkami v zmysle detailov pri objekte SO 02 vid'. Príloha 3.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 7, ktorý obsahuje 3 výkresové prílohy

- PnS.007-P1_ASR – úprava rozsahu búracích prác pre priehľadáčik výťahu (SO03)
- PnS.007-P2_ZT1 – preložky splaškovej kanalizácie
- PnS.007-P3_STA – úprava ošetrovania pracovných škár

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe

Celková cena zmeny bez DPH:	9 455,16 €
Z toho navyše práce:	9 455,16 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Z dôvodu objavenia ustálenej hladiny podzemnej vody a nájdenia pôvodnej kanalizácie v kolíznej polohe s uvedenou zmenou súhlasím

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d'alej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozoru:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


- ☒ Súhlasím
☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Súhlasím z dôvodu plynulosti priebehu výstavby.

Dátum vyjadrenia: **12.1.2024**

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Navrhovaná zmena nemôže mať vplyv na poradie ponúk vo verejnom obstarávaní, keďže sa jedná o neočakávané naviac práce, ktorých potreba nebola známa v čase obstarávania a ktoré by bolo nevyhnutné vykonať v každom prípade, t.j. pôsobila by voči akémukoľvek zhotoviteľovi rovnako.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce	9 455,16 €	0,034 %
- z toho menej práce	0,00 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Predmetná potreba nemohla byť známa v čase obstarávania a jej potreba vyplynula z okolností, ktoré obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Potreba týchto prác vyplynula až po realizácii výkopových prác. Realizácia týchto prác v dôsledku odstránenia spodnej vody je pritom nevyhnutná pre riadne pokračovanie a dokončenie navrhovaného diela

Dátum vyjadrenia: 21-10-2024

Podpis oprávnenej osoby:

[Redacted signature]

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	21-10-2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	21-10-2024
Podpis:	

Zoznam príloh:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód:	Pokyn/007 - ZL 19/2024		
Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi		
Miesto:	parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18	Dátum:	14. 10. 2024
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves	Projektant:	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

9 455,1611 346,19

SO 03	REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NsP
E.1	ASR - Búracie práce
E.3	Zdravotechnika - DOPLNENIE preložky splaškovej kanalizácie v mieste dostavby výťahu v objekte SO 03



ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt:

SO 03 - REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NsP

Časť:

E.1 - ASR - Búracie práce - Zmenový list č. 19/2024

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 168,27

D HSV Práce a dodávky HSV 3 856,42

D 1 Zemné práce 1 554,30

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	15,629		
	VV		(7,039*0,5)"výkop ryhy pre kanalizáciu a drenáž		3,520		
	VV		1,66*2"výkop zeminy od -3,600 do -5,600		3,320		
	VV		4,05*3,1*0,7"výkop od -4,900 do -5,600		8,789		
	VV		Medzisúččet		15,629		
	VV		Súččet		15,629		
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3, B14, B20	m3	7,815		
	VV		15,629/2		7,815		
	VV		Medzisúččet		7,815		
	VV		Súččet		7,815		
3	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky, B14, B20	m3	15,629		
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m, B14, B20	m3	15,629		
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m, B14, B20	m3	15,629		
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3, B14, B20	m3	15,629		
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených, B14, B20	m3	15,629		
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,024		
	VV		3,7-1,296-0,38		2,024		
	VV		Medzisúččet		2,024		
	VV		Súččet		2,024		
10	M	583410004400.S R	Štrkodrva frakcia 16-63 mm	t	3,643		
	VV		3,7-1,296-0,38		2,024		
	VV		Medzisúččet		2,024		
	VV		Súččet		2,024		
	VV		2,024*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva		3,643		

D 2 Zakladanie 315,21

25	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5, DR	m2	16,079		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*9,6)"obalenie rúr		4,559		
	VV		9,6*1,2"obalenie lôžka		11,520		
	VV		Medzisúččet		16,079		
	VV		Súččet		16,079		
26	M	693110004500.S R	Geotextília polypropylénová netkaná, DR	m2	16,401		
	VV		16,079*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		16,401		
27	K	212532111.S	Lôžko pre travivod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm, DR	m3	1,296		
	VV		9,6*0,45*0,3		1,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet DR		1,296		
	VV		Súččet		1,296		
9	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160, DR	m	9,500		
	VV		9,5		9,500		
	VV		Medzisúččet		9,500		
	VV		Súččet		9,500		
18	K	273313611.SR	Betón základových dosiek, prostý tr. C12/15 X0, PD	m3	1,478		
	VV		7,39*0,2		1,478		
	VV		Medzisúččet		1,478		
	VV		Súččet		1,478		
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							225,68
39	K	311301003.SR	Montáž injektážnych hadičiek	m	25,500		
	VV		11,5+14		25,500		
	VV		Medzisúččet		25,500		
	VV		Súččet		25,500		
40	M	207201001	Injektážna hadička k utesneniu pracovných škár v betóne vid'. PD	m	28,050		
	VV		25,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		28,050		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 686,83
140	K	939941112.SR	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom	m	11,500		
	VV		11,5		11,500		
	VV		Medzisúččet		11,500		
	VV		Súččet		11,500		
141	M	261113	Stierková izolácia - tesniaci plech do pracovných špár	m	12,650		
	P		Poznámka k položke:				
	VV		minerálne a kryštalické tesniace hmoty				
	VV		11,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		12,650		
12	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,733		
	VV		(7,39+1,66)*0,2" búranie podkladového bet. hr. 200mm		1,810		
	VV		(3,1*0,3*0,6+4,05*0,15*0,6)" vybúranie základu		0,923		
	VV		Medzisúččet		2,733		
	VV		Súččet		2,733		
31	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,559		
32	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	26,236		
	VV		6,559*4 'Prepočítané koeficientom množstva		26,236		
153	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	6,559		
154	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	39,354		
	VV		6,559*6 'Prepočítané koeficientom množstva		39,354		
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,559		
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	131,180		
	VV		6,559*20 'Prepočítané koeficientom množstva		131,180		
35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,559		
36	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	131,180		
	VV		6,559*20 'Prepočítané koeficientom množstva		131,180		
37	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,559		
D 99 Presun hmôt HSV							74,40
161	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	9,300		
D PSV Práce a dodávky PSV							1 311,85
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 311,85
801	K	711411411.SR	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná, systémové riešenie, vrátane penetračnej vrstvy a vyspravenia podkladu a vid'. PD - dufart	m2	45,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		52,2-7,13		45,070		
	VV		Medzisúččet dufart		45,070		
	VV		Súččet		45,070		
168	K	711411421.SR	Izolácia proti tlakovej vode, dvojzložková stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá, systémové riešenie, vrátane penetračnej vrstvy a vyspravenia podkladu a vid'. PD OP0, OP1, OP1*, OP9*	m2	3,080		
	VV		29,9*0,1		2,990		
	VV		Medzisúččet		2,990		
	VV		Súččet		2,990		
	VV		2,99*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		3,080		
169	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,270		


Adiflex, a. s.
 Mastová 2
 811 02 Bratislava
 IČO: 46715894 IČ DPH: SK202353215
 www.adiflex.sk

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt:

SO 03 - REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NsP - Zmenový list č. 19/2024

Časť:

E.3 - Zdravotechnika - DOPLNENIE preložky splaškovej kanalizácie v mieste dostavby výťahu v objekte SO 03

Miesto:

parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Dátum:

14. 10. 2024

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant:

d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 286,89

D D1 Práce HSV 3 016,46

D 1 ZEMNÉ PRÁCE 2 093,03


1	K	132201102	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3 ručný výkop	m3	50,213		
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	25,107		
	VV		50,213/2		25,107		
	VV		Medzisúččet		25,107		
	VV		Súččet		25,107		
3	K	174101103	Zásyp sypaninou so zhutnením zárezov okolo objektov zriadených v týchto zárezoch	m3	50,213		
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,112		
5	M	583311370	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I	t	8,435		
6	K	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	t	5,112		
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	50,213		
125	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,818		
126	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,818		
127	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	6,818		

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 874,04



19	M	271 pc10	Prestenec vyrovnávací betónovýAR-V 625x100	ks	1,000		
21	M	271 pc071	Šachtový betónový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600	ks	1,000		
22	M	271 pc08	Dno šachtové pre kanalizačné šachty betónové DN1000	ks	1,000		
25	M	286508440	Prechodka šachtová kanal. D200 mm - prvky komplet. z nem.PVC pre rúrky odpad	ks	3,000		
29	M	271 pc002.1	Skruž šachtová SR-M 100x500 s kapsovou stúpačkou	ks	1,000		
30	M	271 pc003	Skruž šachtová betónová SR-M 1001000 s kapsovou stúpačkou	ks	2,000		
31	K	817364111	Úprava existujúcich kanalizačných šácht betónových vysekaním otvorov na betónovom dne resp. doplnenie šachtových prvkov	kus	1,000		
32	K	894411121	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300 a osadením šachtových prechodiek	kus	1,000		
35	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	1,000		
36	M	271 pc05	Poklop liatinový v betonovom rame B12,5t DN600	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							49,39
9	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,706		
10	M	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	t	2,848		
D D2 Práce PSV							1 180,43
D 721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							1 180,43
33	M	721171208	Potrubie z PVC SN8 rúr odpadové D 200 dodávka a montáž (odbočky , spojky,)	m	11,500		
32	M	721171111.1	Potrubie z PVC SN8 rúr odpadové D 160 dodávka a montáž (odbočky , spojky,)	M	10,500		
34	K	721pc 02	Montáž kanalizačných potrubí plastových netlakových	m	22,000		
39	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	22,000		
40	K	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	ks	2,000		
85	M	721HL09.1	Čistiaca tvarovka DN100 k zabudovaniu do podlahy tesná s krytkou z nerezovej ocele 150x150mm s odbočnou tvarovkou s uhlom 45 st. s DN100 a odbočkou 45 stupňovou (O200/110, resp . 160/110)-dodávka	ks	2,000		
50	K	721pc 01	Demotáž vnútornej kanalizácie	hod	1,000		
51	M	721pc 04.2	Kanalizačné záslepky	kus	1,000		
53	K	721140925	Opravy odpadového potrubia liatinového krátenie rúr	ks	1,000		
54	K	721140913	Zaslepenie odstránených kanalizačných potrubí. Dimenzie podľa odstránených potrubí.	ks	1,000		
55	K	721140915	Opravy odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia	ks	1,000		
D D3 OSTATNÉ							90,00
D 985 OSTATNÉ							90,00
121	K	111111113	Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte (.doc, .xls, .dwg a pod.)	vyhotovení	5,000		

Pokyn na stavbu 007 - Príloha č.1 | ASR - úprava rozsahu búracích prác

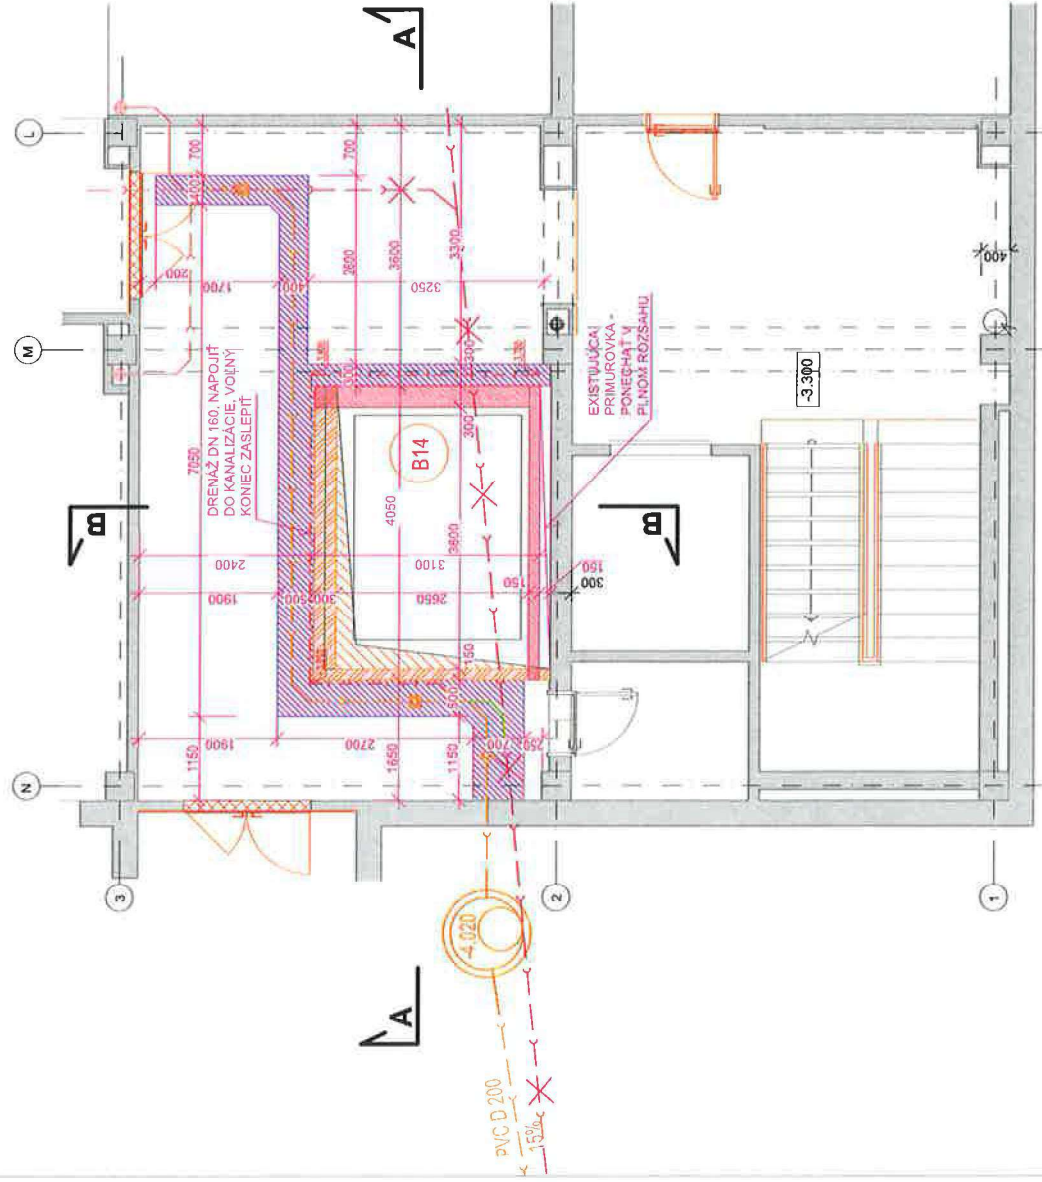

REZ A-A

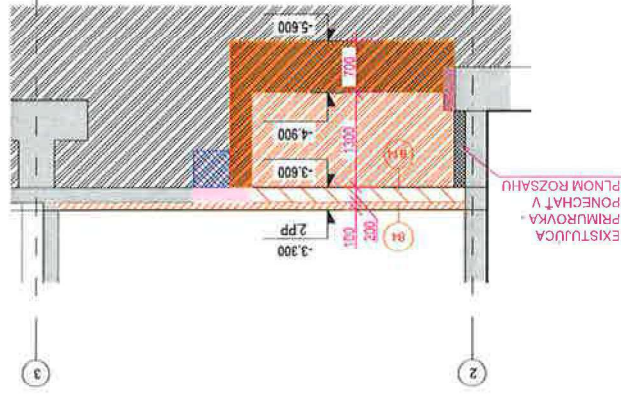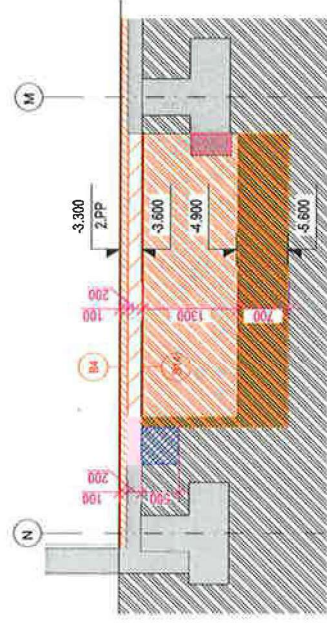

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

- VYBÚRANIE PODKLADOVÉHO BETÓNU hr 200mm:
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁČ: $(7,39m^2 \times 165mm) \times 0,2m = 1,81m^3$
- VÝKOP ZEŤNÝ - RÝHY PRE OSAZENIE KANALIZÁCIE A DREŇAŽE OD ÚROVNE -3,600 DO ÚROVNE -4,100;
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁČ: $7,39m^2 \times 0,5m = 3,70m^3$
- VÝKOP ZEŤNÝ OD ÚROVNE -3,600 DO ÚROVNE -5,600: CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁČ: $1,66m^2 \times 2,0m = 3,32m^3$
- VÝKOP ZEŤNÝ OD ÚROVNE -4,900 DO ÚROVNE -5,600: CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁČ: $4,05m^2 \times 3,1m \times 0,7m = 9,79m^3$
- VYBÚRANIE ZÁKLADU:
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁČ: $3,1 \times 0,3 \times 0,5 + 4,05 \times 0,15 \times 0,8 = 0,99m^3$


LEGENDA ROZVODOV ZTI:


- EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA
- PŮVODNÁ TRASA KANALIZÁCIE - ZRUŠENÁ
- TRASA NAVRHOVANEJ PRELOŽKY
- LETÁKA - DOČASNE PREPOJENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
- ČISTIACA TVAROVKA V SACHTE
(reazr. HL 95 SML alebo ekvivalent)

Pokyn na stavbu 007 - Príloha č.2 | ZTI - úprava preložky splaskovej kanalizácie

SCHÉMA

A	H		I	J	F	E	
						D	
	B		C				

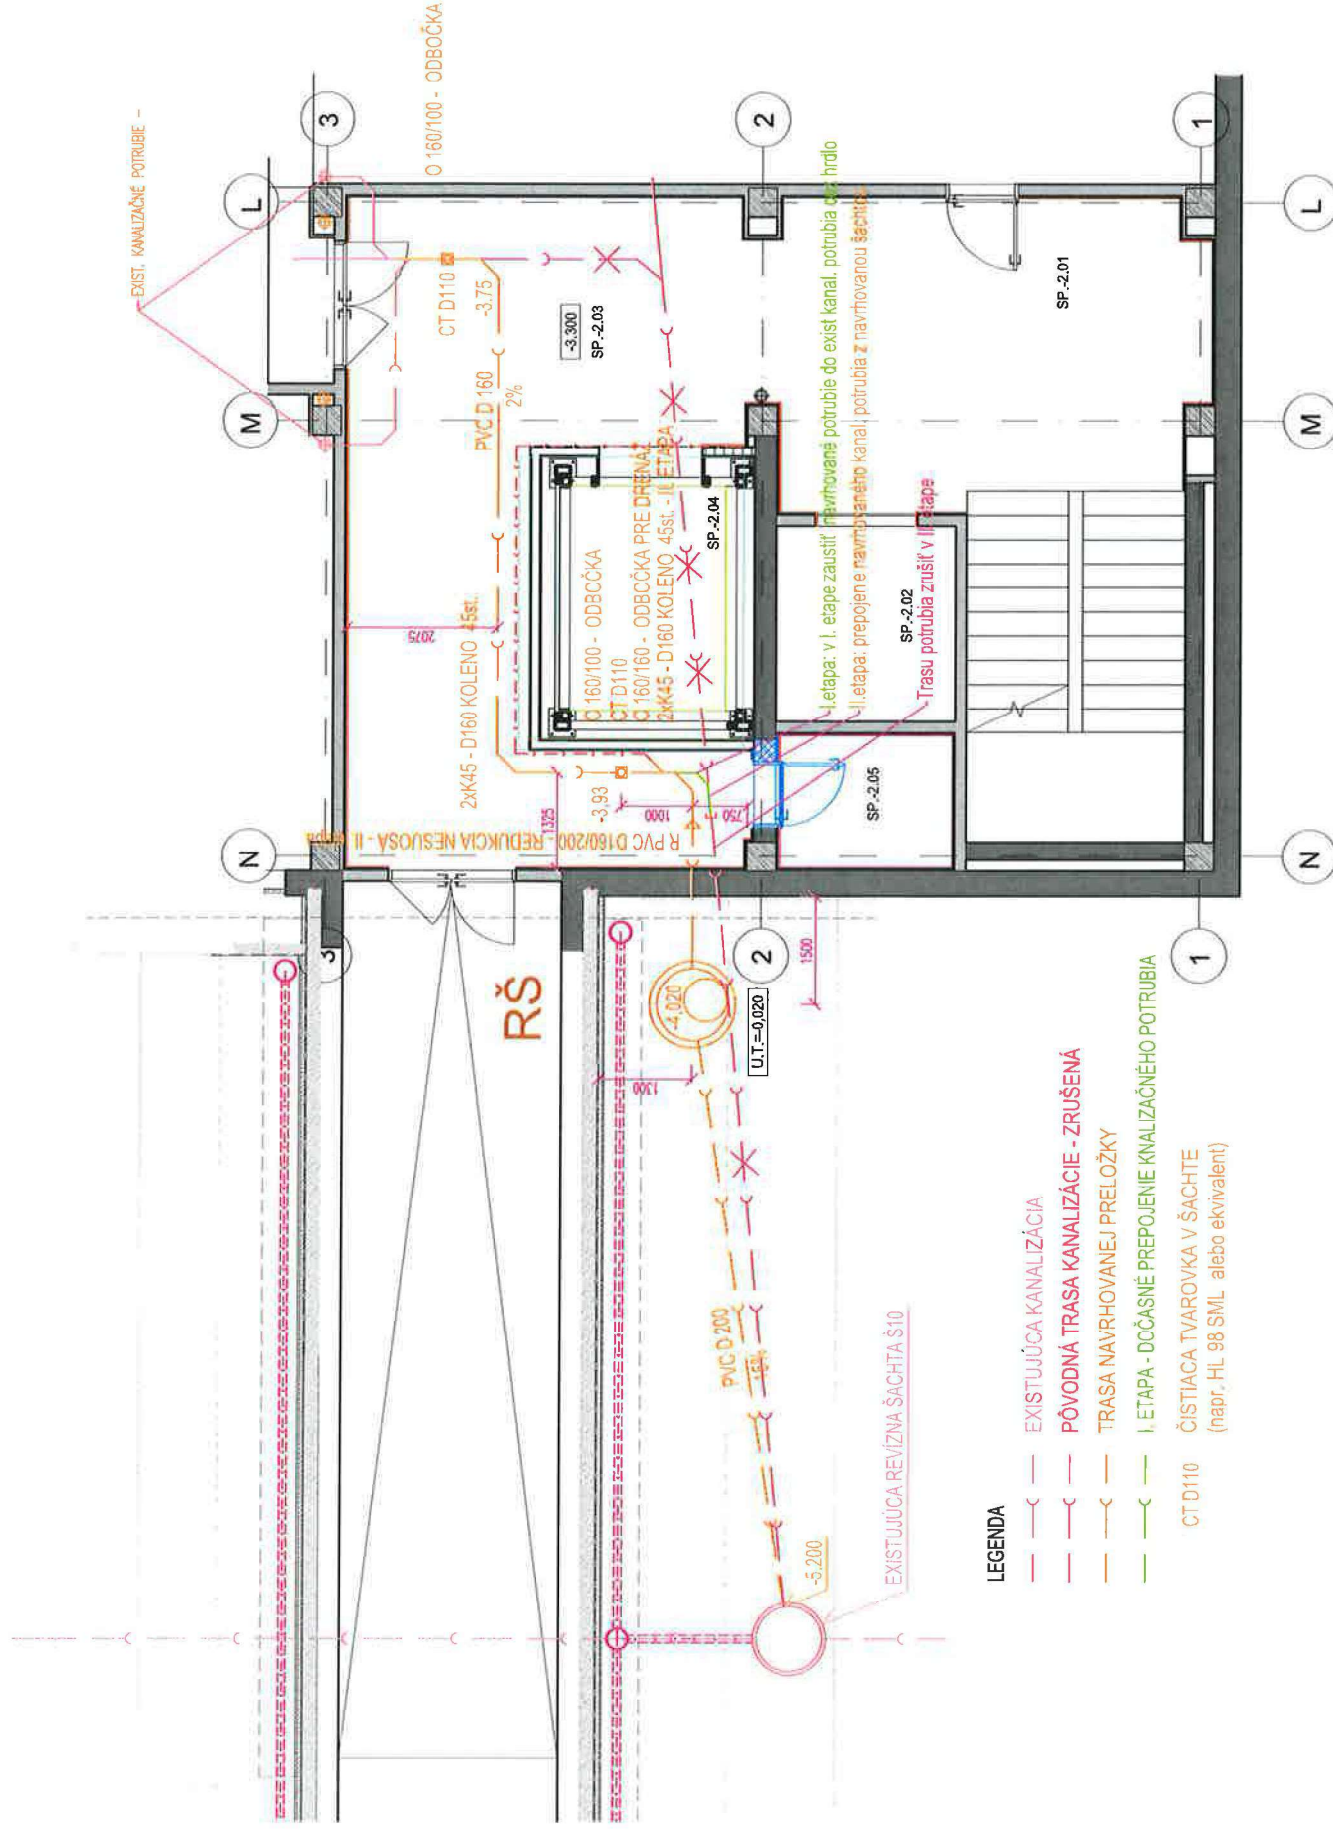

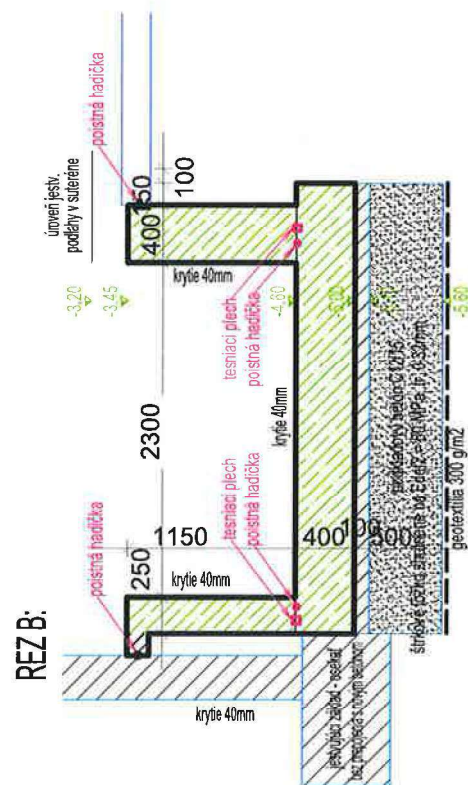


ZÁPIS SO.

#10.2.27

- ZÁBRAT Z KOTOUČEJ STAVBY, O VYKONANIE ZMEROVU 110 LISTU A19 ZAKLADU TOKYNU 0.005 OD PROJEKTA STAVBY 1. J. GOROSTA A 1. J. KUSHIRICA NA PREVOZU SPRAŠKOVY KANALIZACIE V MIESTE ~~0.005~~ ZOSTAVBY VÝTAHU V OBJEKTE SO 03 (1. PP).



- POČASIE: POVOVANSKO +16°C
 PRAC. DOBA: 7^h - 18^h
 POČET PRAC: 1 THP, POLIFEX ZÚPACIE PRÁCE 10,
 INŠTALATER STUČ. VEŽIK 4, NÚŽAU 6
 MECHANIZÁCIA: MAZÁ MECHANIZÁCIA, ŽAGER, AUTO SCLAPAC
 POPIS PRÁČ:
 - ZÚPACIE PRÁČE NA 1. NP / 3. NP
 PRESUN MATERIÁLU
 QW02 NA ZÁDEHU SKLADU
 - MONTÁŽ ROZVODOV LEŽATEJ KANALIZÁCIE
 0.1. PP - KOLEKTOR
 VIZUÁLNA KONTROLA PRÁČ PODLA PD

9.10.2024
STREDA

- POČASIE: OBLAČNO +16°C
 PRAC. DOBA: 7^h - 18^h
 POČET PRAC: 1 THP, POLIFEX ZÚPACIE PRÁČE 10,
 NÚŽAU 6, POLIFEX KURENARI 3
 MECHANIZÁCIA: AUTO KONTAINER, MAZÁ MECHA-
 NIZÁCIA
 POPIS PRÁČ:
 - ZÚPACIE PRÁČE NA 1. NP

10.10.2024
STURTOR

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	20/2024
Dátum zahájenia konania:	27-10-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

- ☒ POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA
- ☐ ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP	
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra,	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

UPRESNENIE spôsobu vyrovnania nerovností podláh na 1.NP (SO 03) Po realizácii búracích prác podlahových konštrukcií na 1.NP boli zistené značné nerovnosti podkladových vrstiev podlahy na existujúcich stropných doskách ako aj na podkladných betónoch, ktoré nebolo možné v čase spracovania projektovej dokumentácie overiť sondami najmä z prevádzkového hľadiska, nakoľko predmetné priestory boli v plnej miere využívané až do odovzdania priestoru zhotoviteľovi pred začiatkom búracích prác. Po zmapovaní nerovnosti na základe geodetického zamerania boli zistené odchýlky skutočného stavu voči projektovej dokumentácii, ktorá na základe dostupných projektových podkladov uvažovala s hrúbkou podláh na stropných doskách 100mm do úrovne zálievky stropných panelov, ktorá sa po realizácii búracích prác nachádza v rozmedzí od 80 do 180mm. Obdobne aj hrúbka skladby podlahy na podkladnom betóne uvažovaná v zmysle PD v hrúbke 150mm sa po realizácii búracích prác a geodetickým zameraním pohybuje v rozsahu od 180 do 290mm. Predmetné nerovnosti sú spôsobené nerovnosťami v podkladných vrstvách, ako aj statickými poruchami ako napríklad prepadnutým podkladným betónom v mieste rozhraní dilatčných úsekov, ku ktorému došlo nedostatočným zhutnením spätných zásypov po realizácii podpivničených častí objektu, ktorý s postupným uľahnutím násypu spôsobil prepadnutie časti podkladového betónu v časti násypu. Predmetné prepadnutie (sadnutie) spôsobilo trhliny v podkladnom betóne, ktoré sa premietli do poruchy pôvodnej hydroizolačnej vrstvy, ktorá bola v týchto miestach porušená. Predmetné prepadnuté časti podkladových betónov je nutné v týchto častiach vybrať v plnom rozsahu a nahradiť ich novým vyrovnávacím podkladným betónom do úrovne ostatných „neprepadnutých“ častí. Následne bude v miestach na teréne zhotovená na podkladové betóny penetrácia a nová hydroizolačná vrstva z asfaltových pásov s napojením na pôvodný hydroizolačný systém pod obvodovými stenami. Pôvodné záklopy energokolektorov z prefabrikovaných železobetónových panelov budú v rámci búracích prác odstránené v plnom rozsahu, nakoľko kopírujú nerovnosti podkladových vrstiev a zasahujú do hrúbky budúcej konštrukcie podlahy tak, že v týchto miestach nie je možné korektné realizovať všetky vrstvy podláh vrátane kročajovej izolácie, čo je z akustického hľadiska nepripustné. Po realizácii hydroizolačného systému bude zhotovený nový základ energokanálov v podlahe, ktorý bude zhotovený z pozinkovaného trapézového plechu T85 hr.1,0mm, uložený na oceľových nosníkoch L50/50/4mm, kotvených mechanickými kotvami do prefabrikovaných stien energokolektora tak, aby horná hrana vlny trapézového plechu bola zapustená voči homej hrane steny kolektora o cca.20mm tak, že predmetný plech bude tvoriť stratené debnenie a bude prebetónovaný v rámci realizácie vyrovnávacích poterov. Oceľové L nosníky budú pred inštaláciou opatrené základným epoxidovým náterom hr.40 µm a krycím polyuretánovým náterom hr. 60µm. Cementový poter v časti plechodosky je potrebné vystužiť sieťou z drôtu hr.6mm s okami 150x150mm. Následne budú v ploche na teréne zhotovené vyrovnávacie cementové potery pevnostnej triedy C30 (s pevnosťou v tlaku min. 30MPa)
--

v hrúbke 30-110mm a betónové potery z betónu triedy C12/15 v hrúbke 70-140mm do úrovne zrovnávacej roviny na kóte 489,63m.n.m., od ktorej budú následne realizované navrhované skladby podláh na teréne v hrúbke 150mm v zmysle PD. Obdobným spôsobom budú vyrovnané nerovnosti podlahy v časti na stropnej doske, ktoré budú zhotovené vyrovnávacím cementovým poterom pevnostnej triedy C30 (s pevnosťou v tlaku min. 30MPa) v hrúbke od 30-80mm, na ktorý budú následne realizované navrhované skladby podlahových konštrukcií na stropnej doske v hrúbke 100mm v zmysle PD. Pred realizáciou cementového poteru je potrebná príprava podkladu penetračným náterom resp. spojovacím mostíkom!

Vzhľadom na výškové rozdiely v miestach napojenia rekonštruovanej časti na existujúce časti nemocnice bola upravená niveleta čistej podlahy v riešenej časti na kótu **489,78m.n.m.** tak, aby boli minimalizované výškové rozdiely v miestach napojenia, ktoré sú v rozmedzí 6-54mm. Predmetné výškové rozdiely budú eliminované nábehovými rampami v zmysle návrhu v prílohe.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 11, ktorý obsahuje 1 výkresovú prílohu
- PnS.011-P1_ASR – schéma vyrovnania nerovností podláh

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	23 644,55€
Z toho navyše práce:	23 644,55€
Z toho menej práce:	0,00€

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Jaroslav Liška

Ad
IČO: 4

Dátum: 27-10-2024

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	20/2024
Dátum zahájenia konania:	31-10-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA

☐ ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

UPRESNENIE spôsobu vyrovnania nerovností podláh na 1.NP (SO 03) Po realizácii búracích prác podlahových konštrukcií na 1.NP boli zistené značné nerovnosti podkladových vrstiev podlahy na existujúcich stropných doskách ako aj na podkladných betónoch, ktoré nebolo možné v čase spracovania projektovej dokumentácie overiť sondami najmä z prevádzkového hľadiska, nakoľko predmetné priestory boli v plnej miere využívané až do odovzdania priestoru zhotoviteľovi pred začiatkom búracích prác. Po zmapovaní nerovnosti na základe geodetického zamerania boli zistené odchýlky skutočného stavu voči projektovej dokumentácii, ktorá na základe dostupných projektových podkladov uvažovala s hrúbkou podláh na stropných doskách 100mm do úrovne zálievky stropných panelov, ktorá sa po realizácii búracích prác nachádza v rozmedzí od 80 do 180mm. Obdobne aj hrúbka skladby podlahy na podkladnom betóne uvažovaná v zmysle PD v hrúbke 150mm sa po realizácii búracích prác a geodetickým zameraním pohybuje v rozsahu od 180 do 290mm. Predmetné nerovnosti sú spôsobené nerovnosťami v podkladných vrstvách, ako aj statickými poruchami ako napríklad prepadnutým podkladným betónom v mieste rozhraní dilatčných úsekov, ku ktorému došlo nedostatočným zhutnením spätných zásypov po realizácii podpivničených častí objektu, ktorý s postupným uľahnutím násypu spôsobil prepadnutie časti podkladového betónu v časti násypu. Predmetné prepadnutie (sadnutie) spôsobilo trhliny v podkladnom betóne, ktoré sa premietli do poruchy pôvodnej hydroizolačnej vrstvy, ktorá bola v týchto miestach porušená. Predmetné prepadnuté časti podkladových betónov je nutné v týchto častiach vybrať v plnom rozsahu a nahradiť ich novým vyrovnávacím podkladným betónom do úrovne ostatných „neprepadnutých“ častí. Následne bude v miestach na teréne zhotovená na podkladové betóny penetrácia a nová hydroizolačná vrstva z asfaltových pásov s napojením na pôvodný hydroizolačný systém pod obvodovými stenami. Pôvodné záklopy energokolektorov z prefabrikovaných železobetónových panelov budú v rámci búracích prác odstránené v plnom rozsahu, nakoľko kopírujú nerovnosti podkladových vrstiev a zasahujú do hrúbky budúcej konštrukcie podlahy tak, že v týchto miestach nie je možné korektné realizovať všetky vrstvy podláh vrátane kročajovej izolácie, čo je z akustického hľadiska neprípustné. Po realizácii hydroizolačného systému bude zhotovený nový záklop energokanálov v podlahe, ktorý bude zhotovený z pozinkovaného trapézového plechu T85 hr.1,0mm, uložený na ocelových nosníkoch L50/50/4mm, kotvených mechanickými kotvami do prefabrikovaných stien energokolektora tak, aby horná hrana vlny trapézového plechu bola zapustená voči homej hrane steny kolektora o cca.20mm tak, že predmetný plech bude tvoriť stratené debnenie a bude prebetónovaný v rámci realizácie vyrovnávacích poterov. Ocelové L nosníky budú pred inštaláciou opatrené základným epoxidovým náterom hr.40 µm a krycím polyuretánovým náterom hr. 60µm. Cementový poter v
--

časti plechodosky je potrebné vystužiť sieťou z drôtu hr.6mm s okami 150x150mm. Následne budú v ploche na teréne zhotovené vyrovnávacie cementové potery pevnostnej triedy C30 (s pevnosťou v tlaku min. 30MPa) v hrúbke 30-110mm a betónové potery z betónu triedy C12/15 v hrúbke 70-140mm do úrovne zrovnávacej roviny na kóte 489,63m.n.m., od ktorej budú následne realizované navrhované skladby podláh na teréne v hrúbke 150mm v zmysle PD. Obdobným spôsobom budú vyrovnané nerovnosti podlahy v časti na stropnej doske, ktoré budú zhotovené vyrovnávajúcim cementovým poterom pevnostnej triedy C30 (s pevnosťou v tlaku min. 30MPa) v hrúbke od 30-80mm, na ktorý budú následne realizované navrhované skladby podlahových konštrukcií na stropnej doske v hrúbke 100mm v zmysle PD. Pred realizáciou cementového poteru je potrebná príprava podkladu penetračným náterom resp. spojovacím mostíkom!

Vzhľadom na výškové rozdiely v miestach napojenia rekonštruovanej časti na existujúce časti nemocnice bola upravená niveleta čistej podlahy v riešenej časti na kótu **489,78m.n.m.** tak, aby boli minimalizované výškové rozdiely v miestach napojenia, ktoré sú v rozmedzí 6-54mm. Predmetné výškové rozdiely budú eliminované nábehovými rampami v zmysle návrhu v prílohe

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 11, ktorý obsahuje 1 výkresovú prílohu

- PnS.011-P1_ASR – schéma vyrovnania nerovností podláh
-

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	23 644,55€
Z toho navyše práce:	23 644,55€
Z toho menej práce:	0,00€

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 13.1.2024

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	20/2024
Dátum zahájenia konania:	31-10-2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa  Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s.
ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

UPRESNENIE spôsobu vyrovnania nerovností podláh na 1.NP (SO 03) Po realizácii búracích prác podlahových konštrukcií na 1.NP boli zistené značné nerovnosti podkladových vrstiev podlahy na existujúcich stropných doskách ako aj na podkladných betónoch, ktoré nebolo možné v čase spracovania projektovej dokumentácie overiť sondami najmä z prevádzkového hľadiska, nakoľko predmetné priestory boli v plnej miere využívané až do odovzdania priestoru zhotoviteľovi pred začiatkom búracích prác. Po zmapovaní nerovností na základe geodetického zamerania boli zistené odchýlky skutočného stavu voči projektovej dokumentácii, ktorá na základe dostupných projektových podkladov uvažovala s hrúbkou podláh na stropných doskách 100mm do úrovne zálievky stropných panelov, ktorá sa po realizácii búracích prác nachádza v rozmedzí od 80 do 180mm. Obdobne aj hrúbka skladby podlahy na podkladnom betóne uvažovaná v zmysle PD v hrúbke 150mm sa po realizácii búracích prác a geodetickým zameraním pohybuje v rozsahu od 180 do 290mm. Predmetné nerovnosti sú spôsobené nerovnosťami v podkladných vrstvách, ako aj statickými poruchami ako napríklad prepadnutým podkladným betónom v mieste rozhraní dilatčných úsekov, ku ktorému došlo nedostatočným zhutnením spätných zásypov po realizácii podpivničných častí objektu, ktorý s postupným uľahnutím násypu spôsobil prepadnutie časti podkladového betónu v časti násypu. Predmetné prepadnutie (sadnutie) spôsobilo trhliny v podkladnom betóne, ktoré sa premietli do poruchy pôvodnej hydroizolačnej vrstvy, ktorá bola v týchto miestach porušená. Predmetné prepadnuté časti podkladových betónov je nutné v týchto častiach vybúrať v plnom rozsahu a nahradiť ich novým vyrovnávacím podkladným betónom do úrovne ostatných „neprepadnutých“ častí. Následne bude v miestach na teréne zhotovená na podkladové betóny penetrácia a nová hydroizolačná vrstva z asfaltových pásov s napojením na pôvodný hydroizolačný systém pod obvodovými stenami. Pôvodné záklopy energokolektorov z prefabrikovaných železobetónových panelov budú v rámci búracích prác odstránené v plnom rozsahu, nakoľko kopírujú nerovnosti podkladových vrstiev a zasahujú do hrúbky budúcej konštrukcie podlahy tak, že v týchto miestach nie je možné korektné realizovať všetky vrstvy podláh vrátane kročajovej izolácie, čo je z akustického hľadiska nepripustné. Po realizácii hydroizolačného systému bude zhotovený nový záklop energokanálov v podlahe, ktorý bude zhotovený z pozinkovaného trapézového plechu T85 hr.1,0mm, uložený na ocelových nosníkoch L50/50/4mm, kotvených mechanickými kotvami do prefabrikovaných stien energokolektora tak, aby horná hrana vlny trapézového plechu bola zapustená voči hornej hrane steny kolektora o cca.20mm tak, že predmetný plech bude tvoriť stratené debnenie a bude prebetónovaný v rámci realizácie vyrovnávacích poterov. Ocelové L nosníky budú pred inštaláciou opatrené základným epoxidovým náterom hr.40 µm a krycím polyuretánovým náterom hr. 60µm. Cementový poter v časti plechodosky je potrebné vystužiť sieťou z drôtu hr.6mm s okami 150x150mm. Následne budú v ploche na teréne zhotovené vyrovnávacie cementové potery pevnostnej triedy C30 (s pevnosťou v tlaku min. 30MPa) v hrúbke 30-110mm a betónové potery z betónu triedy C12/15 v hrúbke 70-140mm do úrovne zrovnávacej roviny na kóte 489,63m.n.m., od ktorej budú následne realizované navrhované skladby podláh na teréne v hrúbke 150mm v zmysle PD. Obdobným spôsobom budú vyrovnané nerovnosti podlahy v časti na stropnej doske, ktoré budú zhotovené vyrovnávacím cementovým poterom pevnostnej triedy C30 (s pevnosťou v tlaku min. 30MPa) v hrúbke od 30-80mm, na ktorý budú následne realizované navrhované skladby podlahových konštrukcií na stropnej doske v hrúbke 100mm v zmysle PD. Pred realizáciou cementového
--

*poteru je potrebná príprava podkladu penetračným náterom resp. spojovacím mostíkom!
Vzhľadom na výškové rozdiely v miestach napojenia rekonštruovanej časti na existujúce časti nemocnice bola upravená niveleta čistej podlahy v riešenej časti na kótu **489,78m.n.m.** tak, aby boli minimalizované výškové rozdiely v miestach napojenia, ktoré sú v rozmedzí 6-54mm. Predmetné výškové rozdiely budú eliminované nábehovými rampami v zmysle návrhu v prílohe.*

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

*Vydanie pokynu na stavbu č. 11, ktorý obsahuje 1 výkresovú prílohu
- PnS.011-P1_ASR – schéma vyrovnaní nerovností podláh*

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	23 644,55€
Z toho navyše práce:	23 644,55€
Z toho menej práce:	0,00€

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

V čase spracovania PD nebolo možné počas prevádzky oddelenia realizovať sondy skladby podláh v takom rozsahu, aby sa odhalila potreba vyrovnania nerovností podkladových vrstiev.

Táto zmena je nevyhnutná pre zhotovenie diela, v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum vyjadrenia: 31-10-2024

Podpis oprávnenej osoby:

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozoru:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Na základe skutkového stavu, urýchlania postupu prác z dôvodu dodržania HMG súhlasíme s navrhovanými zmenami.

Dátum vyjadrenia: **31-10-2024**

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Navrhovaná zmena nemôže mať vplyv na poradie ponúk vo verejnom obstarávaní, keďže sa jedná o neočakávané naviac práce, ktorých potreba nebola známa v čase obstarávania a ktoré by bolo nevyhnutné vykonať v každom prípade, t.j. pôsobila by voči akémukoľvek zhotoviteľovi rovnako.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce	23 644,55€	0,086 %
- z toho menej práce	0,00 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Predmetná potreba nemohla byť známa v čase obstarávania a jej potreba vyplynula z okolností, ktoré obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Potreba týchto prác vyplynula až na základe realizácie búracích prác podlahových konštrukcií na 1.NP a po prevedení zmapovania nerovnosti na základe geodetického zamerania. Potrebu týchto prác nebolo možné v čase spracovania projektovej dokumentácie overiť sondami najmä z prevádzkového hľadiska, nakoľko predmetné priestory boli v plnej miere využívané až do odovzdania priestoru zhotoviteľovi pred začiatkom búracích prác. Realizácia týchto prác je pritom nevyhnutná pre riadne pokračovanie a dokončenie navrhovaného diela.

Dátum vyjadrenia: 31-10-2024

Podpis oprávnenej osoby:

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
IČO 36 856 584, IČ DPH: SK2022551817
Tel.: +421 232 113 900
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	31-10-2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	31-10-2024
Podpis:	

Zoznam príloh:

Denné záznamy stavby: N/P-SN, A⁴

List č.: 1081062

Dátum

POČASIE: 16°C

25.10.2024

PRACOVNÍ DOKA: 7 - A⁴ HOD.

PRACOVNÍCI: 3 AMAZON, 5 MERARD, 4 RUDOLPH, 2 ROBERT, 1 MR. KOU

PRÁCE A DOPRAVA: 2 RUDOLPH, 2 ROBERT, 1 MERARD, 1 KARLADAC,
2 UTRAT RUDOLPH, 1 PLOTHNA, 1 DOMESTHAC

POPIS PRÁCE:

- PRÁCE NA ZEMĚDĚLSTVÍ POD OPA 13, ODLOŽ OTRATU NA ZEMĚDĚLSTVÍ
- REALIZACE GEOTERMALNÍCH VRTŮ
- ČEHL VIKTORIJEKŮ PO OC - BÝHAY
- ODLOŽ VÝKUTU Z PLOTH NA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZÁKAZNÍK TDI

25.10.2024

TDI ODSCHVÁSKUJE POSTUP PRÁCE DO JAKA
25.10.24

POČASIE: POČASNOST 1148

26.10.2024

PRACOVNÍ DOKA: 7 - A⁴ HOD.

SEBOITA

POČET PRÁCE: 3 AMAZON, 5 MERARD

REALIZACE: VETNA SUPRATA, KARLADAC

POPIS PRÁCE:

- REALIZACE GEOTERMALNÍCH VRTŮ
- VETNA PLANE TO REAL. VIKTORIJEKŮ

ZÁKAZNÍK TDI

26.10.2024

PR. REALIZACI GEOTERMALNÍCH VRTŮ ZÁKAZNÍK ZKOTO -
VITELÁ O PRÍEBEŽNÉ DOPLNENÍ DĀTO NOV. REALIZACI -
KÝCH VRTŮV, TŽ. DĀTOU7 INJEKCE STOKU VRTŮV.

ZISTIS SÍKRENEHO VÝRODU

27.10.2024

NA ZEMĚDĚLSTVÍ POKYU OBŽEDNATEL NA PRÁCE VETNA
KAS ZÁKAZNÍK O DĀTOU7 INJEKCE STOKU VRTŮV.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
214	K	767995102.SR	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	507,960		
215	M	134810000600.SR	Oceľ, vid' statika	t	0,559		
216	K	767995335.SR	Výroba doplnku stavebného atypického, vid' PD	kg	507,960		
217	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	27,342		

D 783

Nátery

489,37

268	K	783172510.SR	Nástrek oceľ.konštr. polyuretánové, vrchný - 60µm	m2	33,200		
269	K	783251017.SR	Nástrek kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové, základný-40µm	m2	33,200		
271	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	33,200		

