

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na zhotovenie diela s názvom:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fil'akovo – hr. okresu LC/RS

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón:

Email:

(ďalej len „objedávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
37828100

048/4325111, 048/4325523

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, Košice 040 17

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

akciová spoločnosť

31 651 518

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098

Email: ponuky-bb@eurovia.sk, milos.farkas@eurovia.sk

Oprávnení konateľ

vo veciach zmluvy: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098,
milos.farkas@eurovia.sk

Preambula

1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filľakovo – hr. okresu LC/RS**“, ktoré bolo vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 45/2021 dňa 11.2.2021 pod značkou oznámenia 12722 - WYP (ďalej len „**verejné obstarávanie**“) ako nadlimitná verejná súťaž v zmysle § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 5.5.2021 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ NFP“), a objednávatelom a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP - PO1 - SC11 - 2020 - 60.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest a všetkých mostov, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú

mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác - „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS**“ (ďalej ako „dielo“). Špecifikácia diela v členení na jednotlivé stavebné objekty je vymedzená v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.
2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS**“ vyhotovenou projektantom MARETTA projekt s.r.o., Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51719975 (ďalej len „dokumentácia“).
3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:
 - 3.1. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav vydané Okresným úradom Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-LC-OCDPK-2020/00991-2 zo dňa 17.09.2020
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí, MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KKL 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Teplota asfaltovej zmesi pri pokládke musí spĺňať minimálne požadované hodnoty podľa príslušných noriem (STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121). Recyklácia podkladových vrstiev musí byť realizovaná v súlade s TP 07/2011 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na

mieste.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v bode 3 tohto článku v spojení s vecným a časovým harmonogramom prác (ďalej len „harmonogram prác“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na uzávierky, určenie dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
 - 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
 - 1.2. dokončenie realizácie: najneskôr **do 24 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 1.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 1.2. tohto článku, resp. v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu

Čl. V.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 2 124 397,59 Eur
DPH vo výške 20%: 424 879,52 Eur
Cena s DPH: 2 549 277,11 Eur
(slovom: dvamiliónypäťstoštyridsaťdeväťtisícvestosedemdesiatšesť EUR a jedenásť eurocentov s DPH)
3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v štyroch fakturačných celkoch, pričom cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci štvrtého fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 10 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávatelovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávatelä na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávatelä.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávatel si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávatelä s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávatelovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.
11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávatel bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávatelovi.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“) uzavretej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
14. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávatelä. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávatel nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.
15. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávatelä, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

16. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávatel'ovi. Zápočet pohľadávok môže objednávatel' uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
17. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávatel'ovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávatel'a.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávatel'om vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu eva.fizelova@eurovia.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - hlavné body pre vytýčenie objektov stavby prostredníctvom autorského dozoru (AD)
 - dokumentáciu (DSP s DRS)
 - stavebné povolenia a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávatel' uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávatel'a s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávatel'a s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávatel'ovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávatel'ovi zoznam oprávnených pracovníkov realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).
7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bodom 29. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10.Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11.Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác na diele (príloha č. 2 tejto Zmluvy).

12.Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.

13.Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

- 13.1.** certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;
- 13.2.** harmonogram prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy);
- 13.3.** kontrolný skúšobný plán.

14.Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávateľovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

15.Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

16.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.

17.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

18. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - autorský dozor. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.
19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov.
20. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.
21. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Eva Fízeľová
- Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho pre mosty: Ing. Ján Sasák.
22. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať:
23. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
24. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
25. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
26. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

- 27.** Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.
- 28.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
- 29.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.
- 30.** Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na toto dielo, a to:
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela;
 - poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu Zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
2. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. IX.

Odobzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. bod 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).
4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej pätnásť (15) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzдание a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 5.1. tri kópie stavebných denníkov,
 - 5.2. tri vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v troch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach). DSRS predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,
 - 5.3. dokumentáciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v origináli), t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného

- plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,
- 5.4. mostné zošity a výkony hlavných prehliadok mostov pred ich spustením do dopravy v troch vyhotoveniach,
 - 5.5. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
 - 5.6. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy)

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.6. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je

zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.

3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

12. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1.** v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. bod 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2.** v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. bod 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. bod 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 15 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,25% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. bod 28, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. bod 19 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 23 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. bod 30 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.13. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.14. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. bod 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.15. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.16. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.17. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok

- voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov
- 1.18.** v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.19.** v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.20.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaní o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XII.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. ak nenadobudne účinnosť v súlade s článkom XVI. bod 1. tejto Zmluvy ani do 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,

1.2. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.3. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

1.4.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.4.2. zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

1.4.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.4.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,

1.4.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejme, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),

1.4.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.4.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,

- 1.4.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
- 1.4.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.4.10. objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
- 1.4.11. zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.4.12. zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
- 1.4.13. zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.4.14. zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
- 1.4.15. voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.4.16. ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.

1.5. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 60 dní, okrem prípadu uvedeného v čl. VI. bod 14 tejto Zmluvy.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XIII.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).
2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Čl. XIV.

Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

3. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. XV.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objedávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2) alebo v článku IV. Zmluvy.

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

1.1 dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;

1.2 uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filákov** – hr. okresu LC/RS“;

1.3 doručenie schválenia procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, zhotoviteľovi, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filákov** – hr. okresu LC/RS“ vyžaduje,

1.4 predloženie bankovej záruky podľa čl. XIII. bod 1 tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva má **21 strán** a je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dňa: : 6. 08. 2021

V Košiciach dňa: 12. 07. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



22



Ing. Ján Lunter

predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja



Ing. Daniel Hanko

člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.



Ing. Juraj Dančišín

člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.

Identifikačná	Názov úlohy	Trvanie	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	
70	0.2 - 2	101-001 - ÚSEK 2 - 2 ETAPA práce v protismere smerovania v km 0,000 00-0,257 45	7 dni																									
71	0.2 - 2	101-001 - 0.2-2 búvanie práce	1 deň																									
72	0.2 - 2	101-001 - 0.2-2 začiatok	1 deň																									
73	0.2 - 2	101-001 - 0.2-2 začiatok	1 deň																									
74	0.2 - 2	101-001 - 0.2-2 realizácia geometrie	1 deň																									
75	0.2 - 2	101-001 - 0.2-2 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň																									
76	0.2 - 2	101-001 - 0.2-2 spojovací posťrek	1 deň																									
77	0.2 - 2	101-001 - 0.2-2 pokládka AC 11 O	1 deň																									
78	101-002	101-002 - Časť II/571, extrahovať	687 dni																									
79	0.1	101-002 - ÚSEK 1 v km 0,000 00-0,257 45	17 dni																									
80	0.1 - 1	101-002 - ÚSEK 1 - 1 ETAPA práce v smere smerovania v km 1,550 00-1,914 02	9 dni																									
81	0.1 - 1	101-002 - 0.1-1 realizácia hrbových častí I/71 a II/571 - 1.etapa	1 deň																									
82	0.1 - 1	101-002 - 0.1-1 búvanie práce	1 deň																									
83	0.1 - 1	101-002 - 0.1-1 začiatok	1 deň																									
84	0.1 - 1	101-002 - 0.1-1 realizácia geometrie	1 deň																									
85	0.1 - 1	101-002 - 0.1-1 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň																									
86	0.1 - 1	101-002 - 0.1-1 spojovací posťrek	1 deň																									
87	0.1 - 1	101-002 - 0.1-1 pokládka AC 11 O	1 deň																									
88	0.1 - 1	101-002 - 0.1-1 pokládka AC 11 O	1 deň																									
89	0.1 - 2	101-002 - ÚSEK 1 - 2 ETAPA práce v protismere smerovania v km 0,000 00-0,257 45	8 dni																									
90	0.1 - 2	101-002 - 0.1-2 realizácia hrbových častí I/71 a II/571 - 2.etapa	9 dni																									
91	0.1 - 2	101-002 - 0.1-2 búvanie práce	1 deň																									
92	0.1 - 2	101-002 - 0.1-2 začiatok	1 deň																									
93	0.1 - 2	101-002 - 0.1-2 realizácia geometrie	1 deň																									
94	0.1 - 2	101-002 - 0.1-2 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň																									
95	0.1 - 2	101-002 - 0.1-2 spojovací posťrek	1 deň																									
96	0.1 - 2	101-002 - 0.1-2 pokládka AC 11 O	1 deň																									
97	0.1 - 2	101-002 - 0.1-2 pokládka AC 11 O	1 deň																									
98	0.3	101-002 - ÚSEK 3 v km 1,914 02-2,008 00	685 dni																									
99	0.3 - 1	101-002 - ÚSEK 3 - 1 ETAPA práce na krížovke časti II/571 a III/570 - etapa A (ETAPA I)	35 dni																									
100	0.3 - 1	101-002 - 0.3-1 búvanie práce	5 dni																									
101	0.3 - 1	101-002 - 0.3-1 začiatok	1 deň																									
102	0.3 - 1	101-002 - 0.3-1 realizácia geometrie	1 deň																									
103	0.3 - 1	101-002 - 0.3-1 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň																									
104	0.3 - 1	101-002 - 0.3-1 spojovací posťrek	1 deň																									
105	0.3 - 1	101-002 - 0.3-1 pokládka AC 11 O	1 deň																									
106	0.3 - 1	101-002 - 0.3-1 pokládka AC 11 O	1 deň																									
107	0.3 - 2	101-002 - ÚSEK 3 - 2 ETAPA práce na krížovke časti II/571 a III/570 - etapa B (ETAPA II) v km 1,914 02-2,008 00	35 dni																									
108	0.3 - 2	101-002 - 0.3-2 búvanie práce	5 dni																									
109	0.3 - 2	101-002 - 0.3-2 začiatok	1 deň																									
110	0.3 - 2	101-002 - 0.3-2 realizácia geometrie	1 deň																									
111	0.3 - 2	101-002 - 0.3-2 spojovací posťrek	1 deň																									
112	0.3 - 2	101-002 - 0.3-2 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň																									
113	0.3 - 2	101-002 - 0.3-2 spojovací posťrek	1 deň																									
114	0.3 - 2	101-002 - 0.3-2 pokládka AC 11 O	1 deň																									
115	0.3 - 3	101-002 - ÚSEK 3 - 3 ETAPA práce na krížovke časti II/571 a III/570 - etapa C (ETAPA III) v km 2,008 00-2,200 00	7 dni																									
116	0.3 - 3	101-002 - 0.3-3 búvanie práce	1 deň																									
117	0.3 - 3	101-002 - 0.3-3 začiatok	1 deň																									
118	0.3 - 3	101-002 - 0.3-3 realizácia geometrie	1 deň																									
119	0.3 - 3	101-002 - 0.3-3 spojovací posťrek	1 deň																									
120	0.3 - 3	101-002 - 0.3-3 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň																									
121	0.3 - 3	101-002 - 0.3-3 spojovací posťrek	1 deň																									
122	0.3 - 3	101-002 - 0.3-3 pokládka AC 11 O	1 deň																									
123	0.3 - 4	101-002 - ÚSEK 3 - 4 ETAPA práce v smere smerovania v km 2,008 00-2,536 00	10 dni																									
124	0.3 - 4	101-002 - 0.3-4 búvanie práce	2 dni																									
125	0.3 - 4	101-002 - 0.3-4 začiatok	1 deň																									
126	0.3 - 4	101-002 - 0.3-4 realizácia geometrie	1 deň																									
127	0.3 - 4	101-002 - 0.3-4 spojovací posťrek	1 deň																									
128	0.3 - 4	101-002 - 0.3-4 pokládka AC 22 L, AC 22 P	2 dni																									
129	0.3 - 4	101-002 - 0.3-4 spojovací posťrek	1 deň																									
130	0.3 - 4	101-002 - 0.3-4 pokládka AC 11 O	1 deň																									
131	0.3 - 4	101-002 - 0.3-4 spojovací posťrek	1 deň																									
132	0.3 - 5	101-002 - ÚSEK 3 - 5 ETAPA práce v protismere smerovania v km 2,008 00-2,536 00	2 dni																									
133	0.3 - 5	101-002 - 0.3-5 búvanie práce	1 deň																									
134	0.3 - 5	101-002 - 0.3-5 začiatok	1 deň																									
135	0.3 - 5	101-002 - 0.3-5 realizácia geometrie	1 deň																									
136	0.3 - 5	101-002 - 0.3-5 spojovací posťrek	1 deň																									
137	0.3 - 5	101-002 - 0.3-5 pokládka AC 22 L, AC 22 P	2 dni																									
138	0.3 - 5	101-002 - 0.3-5 spojovací posťrek	1 deň																									
139	0.3 - 5	101-002 - 0.3-5 pokládka AC 11 O	1 deň																									

2 / 7

Slovní projekt

Uloha

Kritická úloha

125


Minik - seřazený

Charakterizace projektu

Nekritická úloha

Nekritický mezitek

Přeloh

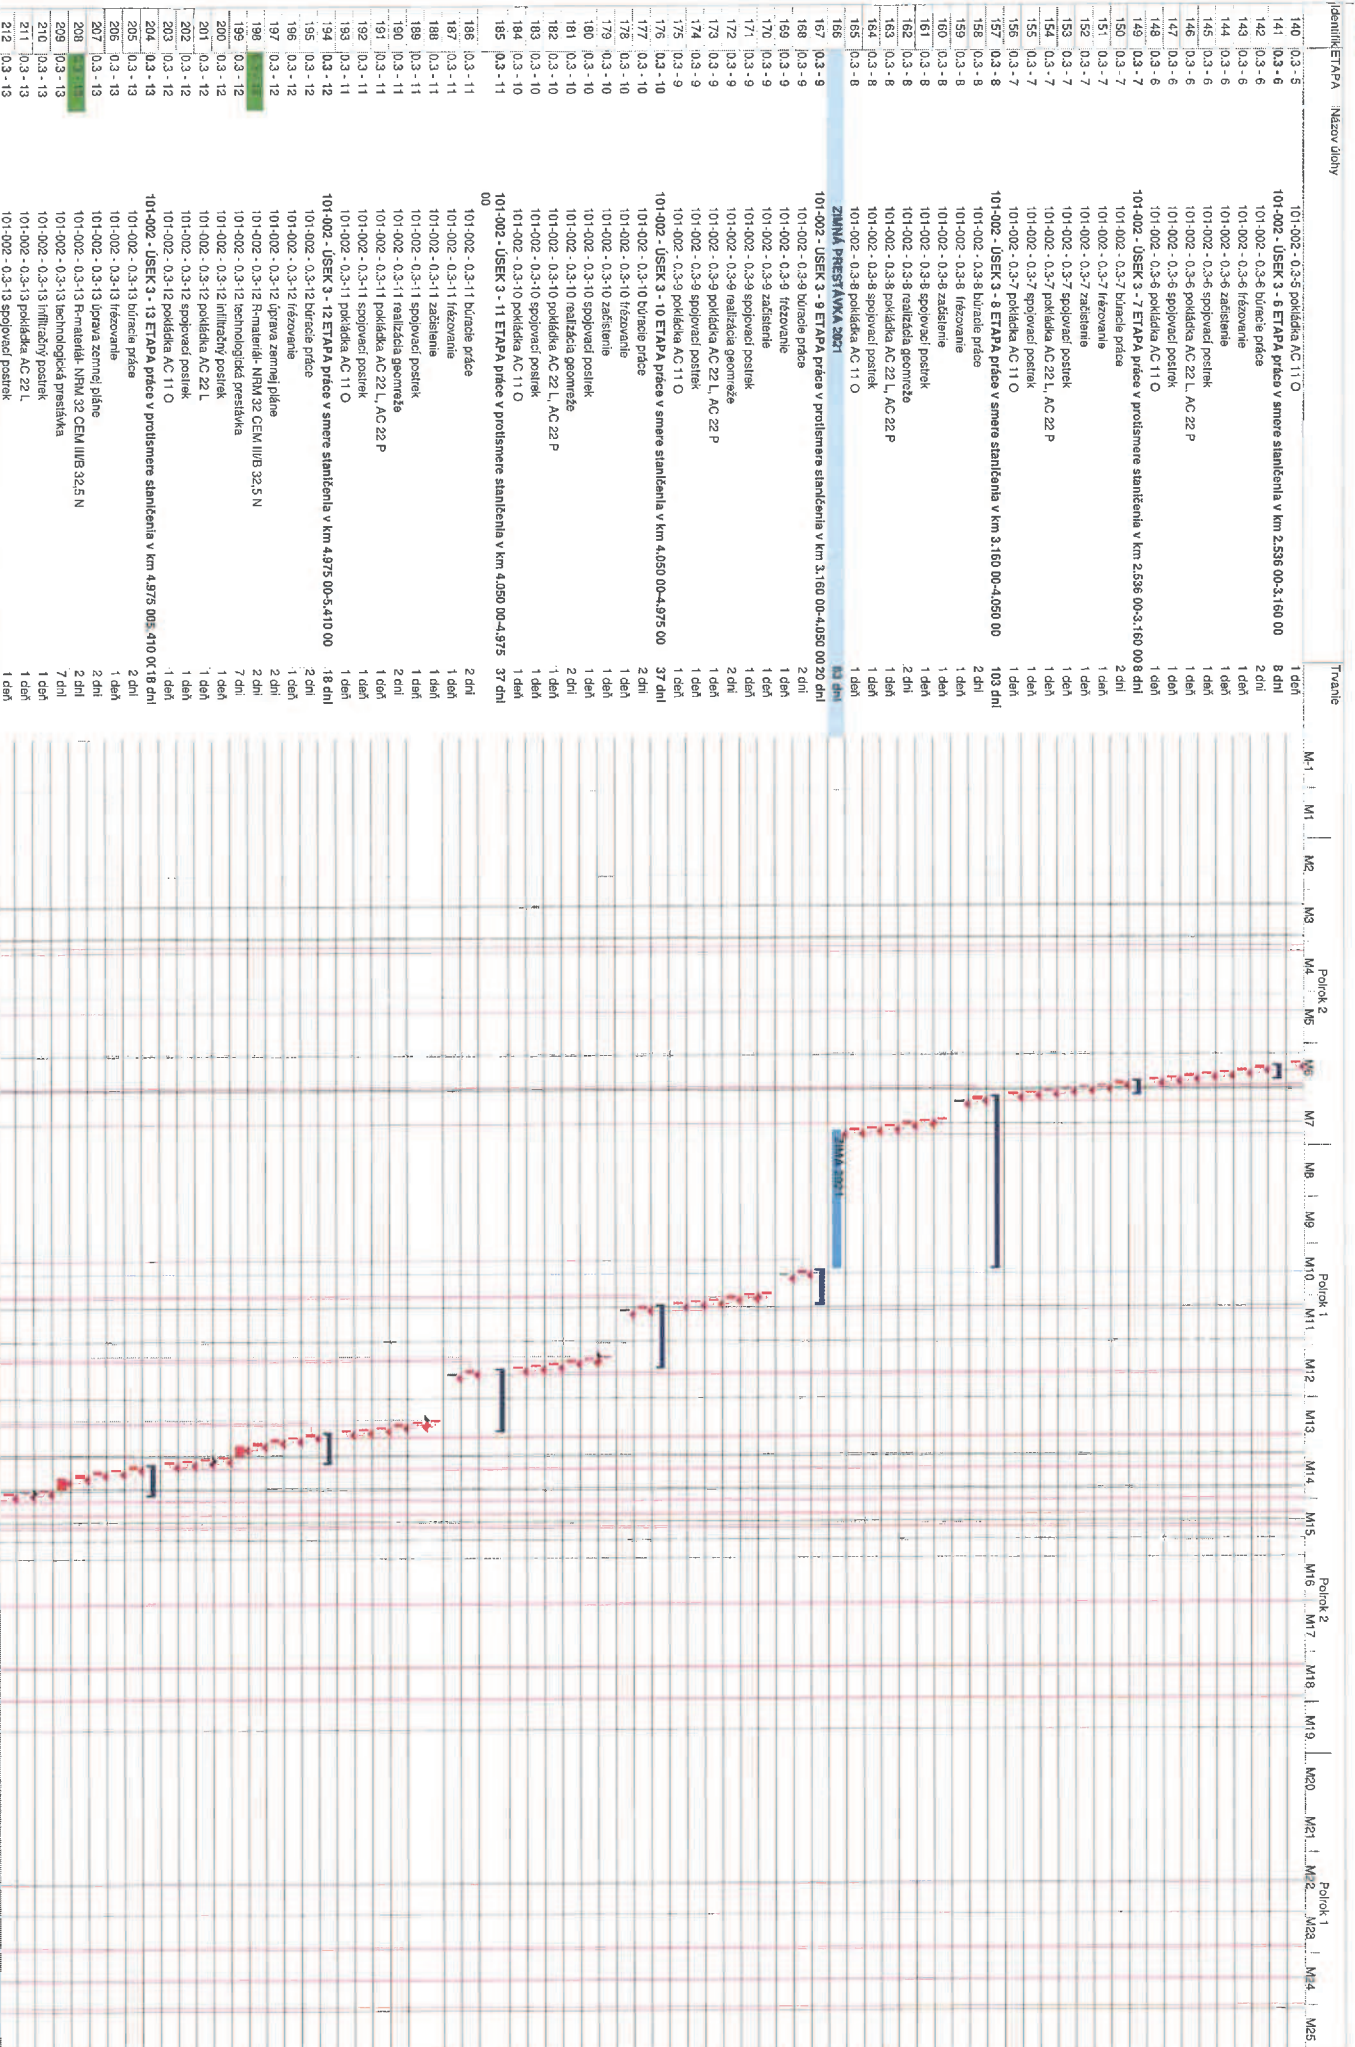

3/7

Súhrn projektu

Učesa

Kritická úloha

Milník

Milník - spĺňavý


Ovzdušné objekty

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Práček

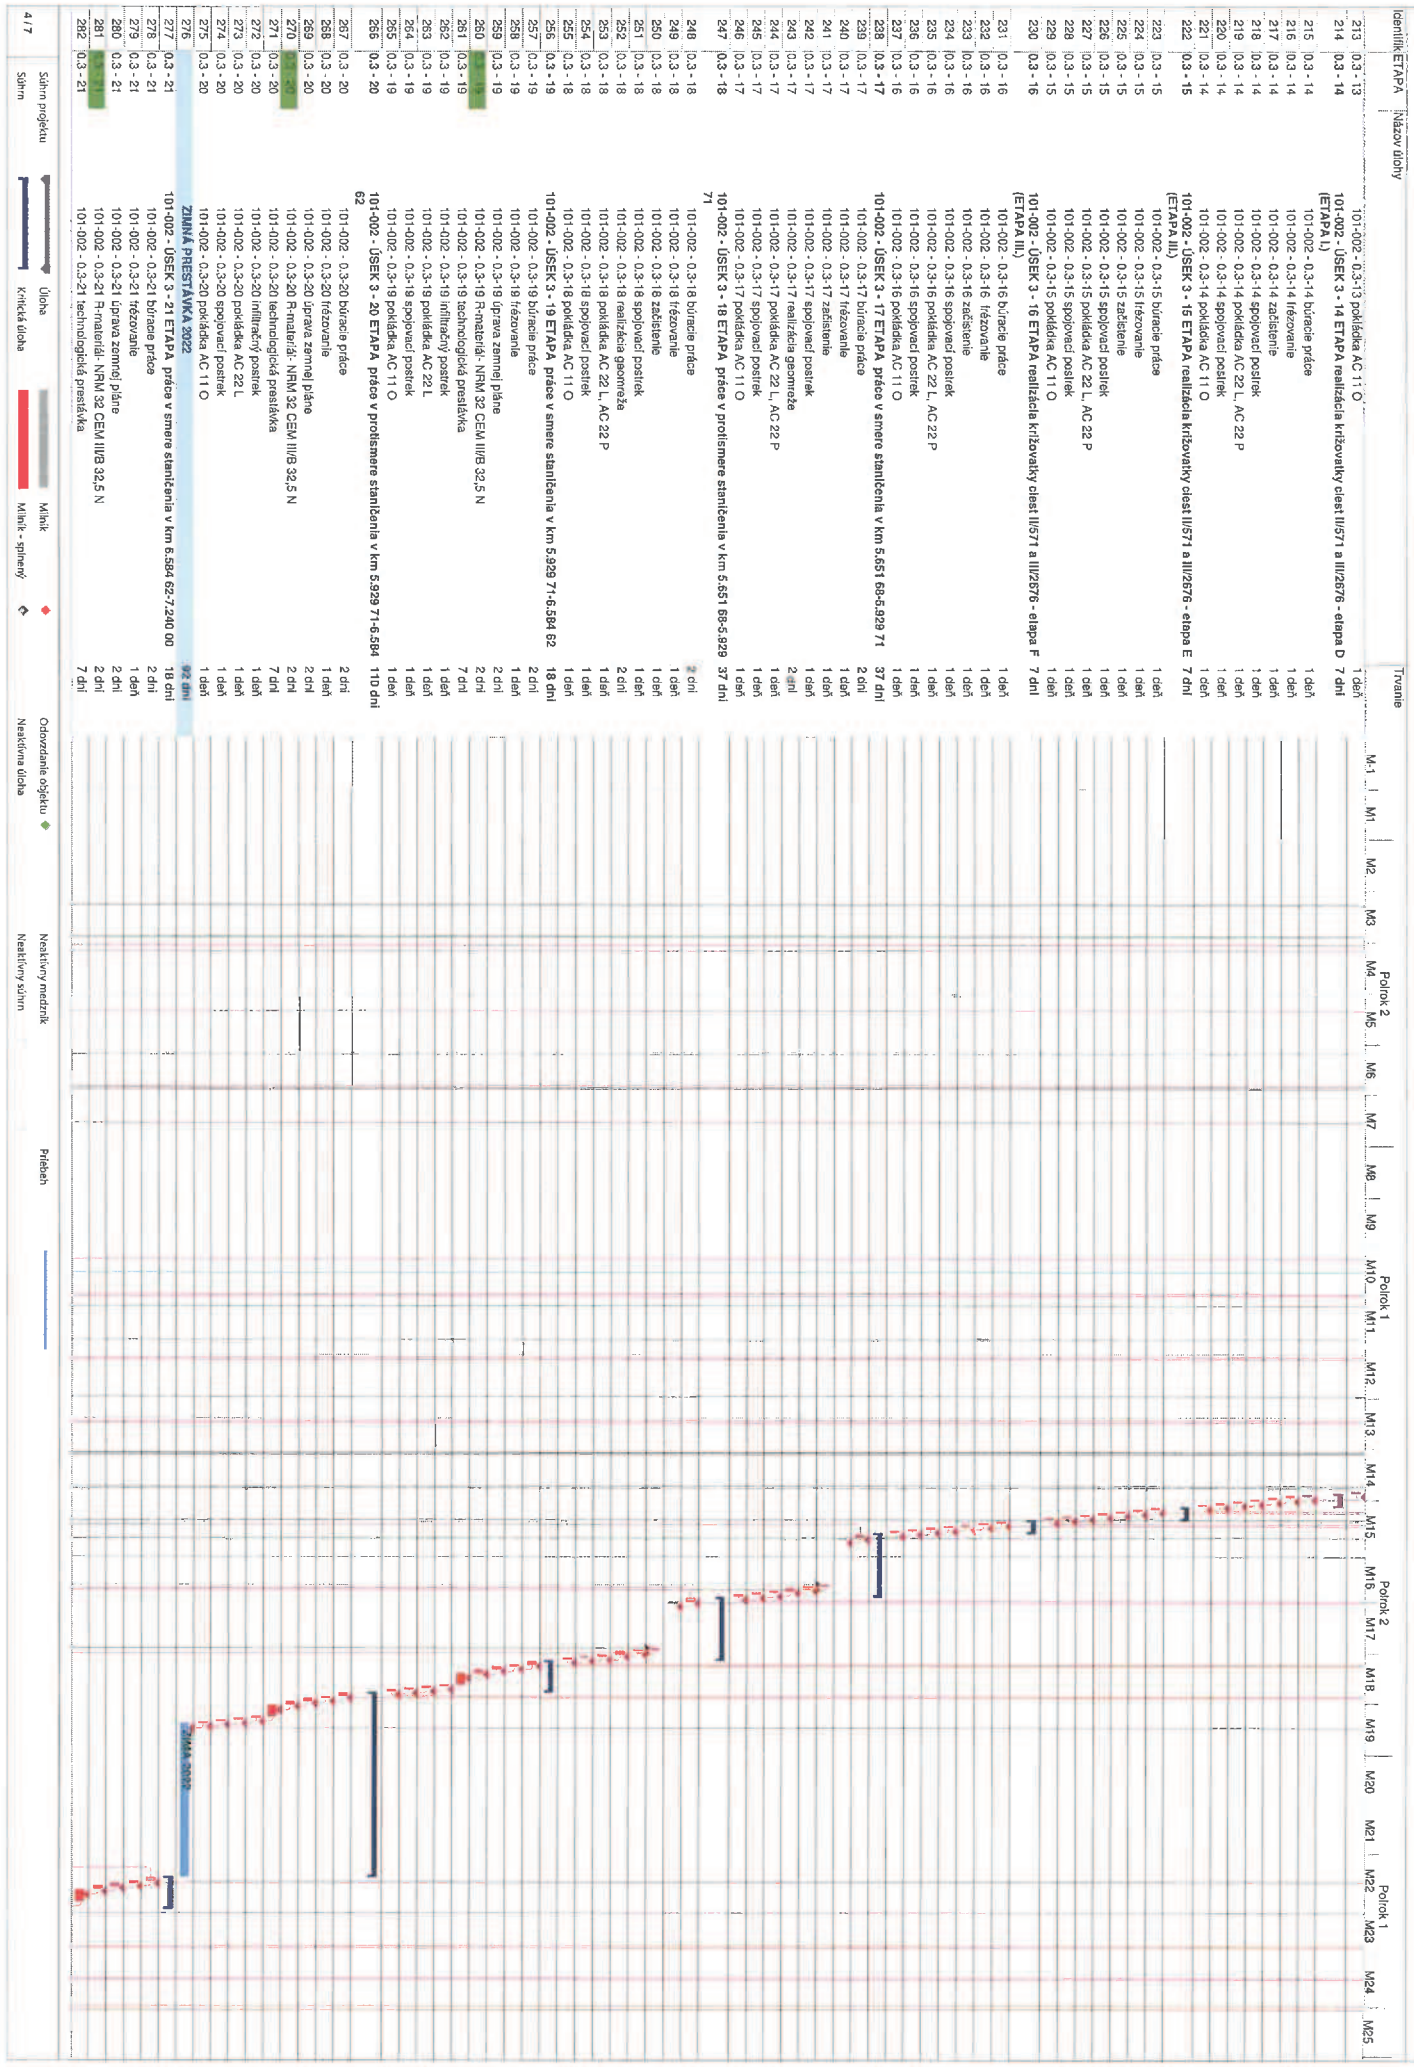

Identifik. ETAPA	Názov dĺžky	Trvanie
213 0,3 - 13	101-002 - 0,3-13 pokládka AC 11 O	1 deň
214 0,3 - 14	101-002 - ÚSEK 3 - 14 ETAPA realizácia krízovky cesty II/571 a III/2576 - etapa D (ETAPA I)	7 dní
215 0,3 - 14	101-002 - 0,3-14 búracie práce	1 deň
216 0,3 - 14	101-002 - 0,3-14 riešovanie	1 deň
217 0,3 - 14	101-002 - 0,3-14 začatie	1 deň
218 0,3 - 14	101-002 - 0,3-14 spojovací posťah	1 deň
219 0,3 - 14	101-002 - 0,3-14 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň
220 0,3 - 14	101-002 - 0,3-14 spojovací posťah	1 deň
221 0,3 - 14	101-002 - 0,3-14 pokládka AC 11 O	1 deň
222 0,3 - 15	101-002 - ÚSEK 3 - 15 ETAPA realizácia krízovky cesty II/571 a III/2576 - etapa E (ETAPA III)	7 dní
223 0,3 - 15	101-002 - 0,3-15 búracie práce	1 deň
224 0,3 - 15	101-002 - 0,3-15 riešovanie	1 deň
225 0,3 - 15	101-002 - 0,3-15 začatie	1 deň
226 0,3 - 15	101-002 - 0,3-15 spojovací posťah	1 deň
227 0,3 - 15	101-002 - 0,3-15 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň
228 0,3 - 15	101-002 - 0,3-15 spojovací posťah	1 deň
229 0,3 - 15	101-002 - 0,3-15 pokládka AC 11 O	1 deň
230 0,3 - 16	101-002 - ÚSEK 3 - 16 ETAPA realizácia krízovky cesty II/571 a III/2576 - etapa F (ETAPA III)	7 dní
231 0,3 - 16	101-002 - 0,3-16 búracie práce	1 deň
232 0,3 - 16	101-002 - 0,3-16 riešovanie	1 deň
233 0,3 - 16	101-002 - 0,3-16 začatie	1 deň
234 0,3 - 16	101-002 - 0,3-16 spojovací posťah	1 deň
235 0,3 - 16	101-002 - 0,3-16 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň
236 0,3 - 16	101-002 - 0,3-16 spojovací posťah	1 deň
237 0,3 - 16	101-002 - 0,3-16 pokládka AC 11 O	1 deň
238 0,3 - 17	101-002 - ÚSEK 3 - 17 ETAPA práce v smere staničenia v km 5,551-69,5-929 71	37 dní
239 0,3 - 17	101-002 - 0,3-17 búracie práce	2 dni
240 0,3 - 17	101-002 - 0,3-17 riešovanie	1 deň
241 0,3 - 17	101-002 - 0,3-17 začatie	1 deň
242 0,3 - 17	101-002 - 0,3-17 spojovací posťah	1 deň
243 0,3 - 17	101-002 - 0,3-17 realizácia geomáže	2 dni
244 0,3 - 17	101-002 - 0,3-17 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň
245 0,3 - 17	101-002 - 0,3-17 spojovací posťah	1 deň
246 0,3 - 17	101-002 - 0,3-17 pokládka AC 11 O	1 deň
247 0,3 - 18	101-002 - ÚSEK 3 - 18 ETAPA práce v protismere staničenia v km 5,551-69,5-929 37 dní	37 dní
248 0,3 - 18	101-002 - 0,3-18 búracie práce	2 dni
249 0,3 - 18	101-002 - 0,3-18 riešovanie	1 deň
250 0,3 - 18	101-002 - 0,3-18 začatie	1 deň
251 0,3 - 18	101-002 - 0,3-18 spojovací posťah	1 deň
252 0,3 - 18	101-002 - 0,3-18 realizácia geomáže	2 dni
253 0,3 - 18	101-002 - 0,3-18 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 deň
254 0,3 - 18	101-002 - 0,3-18 spojovací posťah	1 deň
255 0,3 - 18	101-002 - 0,3-18 pokládka AC 11 O	1 deň
256 0,3 - 18	101-002 - ÚSEK 3 - 19 ETAPA práce v smere staničenia v km 5,929 71-6,594 62	18 dní
257 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 búracie práce	2 dni
258 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 riešovanie	1 deň
259 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 uprava zemnej pláče	2 dni
260 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 R-materiál - NRM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
261 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 technologickej presláčka	7 dní
262 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 infiltračný posťah	1 deň
263 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 pokládka AC 22 L	1 deň
264 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 spojovací posťah	1 deň
265 0,3 - 19	101-002 - 0,3-19 pokládka AC 11 O	1 deň
266 0,3 - 20	101-002 - ÚSEK 3 - 20 ETAPA práce v protismere staničenia v km 5,929 71-6,594 62	110 dní
267 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 búracie práce	2 dni
268 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 riešovanie	1 deň
269 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 uprava zemnej pláče	2 dni
270 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 R-materiál - NRM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
271 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 technologickej presláčka	7 dní
272 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 infiltračný posťah	1 deň
273 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 pokládka AC 22 L	1 deň
274 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 spojovací posťah	1 deň
275 0,3 - 20	101-002 - 0,3-20 pokládka AC 11 O	1 deň
276	ZMENA PRESTÁVKA 2022	92 dní
277 0,3 - 21	101-002 - ÚSEK 3 - 21 ETAPA práce v smere staničenia v km 6,594 62-7,240 00	18 dní
278 0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 búracie práce	2 dni
279 0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 riešovanie	1 deň
280 0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 uprava zemnej pláče	2 dni
281 0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 R-materiál - NRM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
282 0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 technologickej presláčka	7 dní

4/7

Súborný profil

Kritická dĺžka

Mikro - spiny

Časovanie odfuku


Nekritický súhrn

Přibeh

Identifikácia ETAPA Názov úseku


Tramie



283	0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 infiltratívny posťtek	1 den
284	0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 pokládka AC 22 L	1 den
285	0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 spojovací posťtek	1 den
286	0,3 - 21	101-002 - 0,3-21 pokládka AC 11 O	1 den
287	0,3 - 22	101-002 - USEK 3 - 22 ETAPA, práce v priemere stančienka v km 6,594 62-7,240 00	18 dni
288	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 burače práce	2 dni
289	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 frézovanie	1 den
290	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 úprava zemnej pláne	3 dni
291	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 R-matériál: NfM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
292	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 technogigadá presávka	7 dni
293	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 infiltratívny posťtek	1 den
294	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 pokládka AC 22 L	1 den
295	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 spojovací posťtek	1 den
296	0,3 - 22	101-002 - 0,3-22 pokládka AC 11 O	1 den
297	0,3 - 23	101-002 - USEK 3 - 23 ETAPA, práce v smere stančienka v km 7,240 00-7,580 00	18 dni
298	0,3 - 23	101-002 - 0,3-23 burače práce	1 den
299	0,3 - 23	101-002 - 0,3-23 frézovanie	1 den
300	0,3 - 23	101-002 - 0,3-23 začistenie	1 den
301	0,3 - 23	101-002 - 0,3-23 spojovací posťtek	1 den
302	0,3 - 23	101-002 - 0,3-23 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 den
303	0,3 - 23	101-002 - 0,3-23 spojovací posťtek	1 den
304	0,3 - 23	101-002 - 0,3-23 pokládka AC 11 O	1 den
305	0,3 - 24	101-002 - USEK 3 - 24 ETAPA, práce v priemere stančienka v km 7,240 00-7,580 00	18 dni
306	0,3 - 24	101-002 - 0,3-24 burače práce	1 den
307	0,3 - 24	101-002 - 0,3-24 frézovanie	1 den
308	0,3 - 24	101-002 - 0,3-24 začistenie	1 den
309	0,3 - 24	101-002 - 0,3-24 spojovací posťtek	1 den
310	0,3 - 24	101-002 - 0,3-24 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 den
311	0,3 - 24	101-002 - 0,3-24 spojovací posťtek	1 den
312	0,3 - 24	101-002 - 0,3-24 pokládka AC 11 O	1 den
313	0,4	101-002 - USEK 4 v km 8,420 00-12,025 55	409 dni
314	0,4 - 1	101-002 - USEK 4 - 1 ETAPA, práce v smere stančienka v km 8,420 00-8,518 00	18 dni
315	0,4 - 1	101-002 - 0,4-1 frézovanie	1 den
316	0,4 - 1	101-002 - 0,4-1 začistenie	1 den
317	0,4 - 1	101-002 - 0,4-1 spojovací posťtek	1 den
318	0,4 - 1	101-002 - 0,4-1 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 den
319	0,4 - 1	101-002 - 0,4-1 spojovací posťtek	1 den
320	0,4 - 1	101-002 - 0,4-1 pokládka AC 11 O	1 den
321	0,4 - 1	101-002 - 0,4-1 pokládka AC 11 O	1 den
322	0,4 - 2	101-002 - USEK 4 - 2 ETAPA, práce v priemere stančienka v km 8,518 00-8,518 00	18 dni
323	0,4 - 2	101-002 - 0,4-2 burače práce	1 den
324	0,4 - 2	101-002 - 0,4-2 frézovanie	1 den
325	0,4 - 2	101-002 - 0,4-2 začistenie	1 den
326	0,4 - 2	101-002 - 0,4-2 spojovací posťtek	1 den
327	0,4 - 2	101-002 - 0,4-2 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 den
328	0,4 - 2	101-002 - 0,4-2 spojovací posťtek	1 den
329	0,4 - 2	101-002 - 0,4-2 pokládka AC 11 O	1 den
330	0,4 - 3	101-002 - USEK 4 - 3 ETAPA, práce v smere stančienka v km 8,518 00-9,361 00	34 dni
331	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 burače práce	3 dni
332	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 frézovanie	1 den
333	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 úprava zemnej pláne	3 dni
334	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 R-matériál: NfM 32 CEM III/B 32,5 N	3 dni
335	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 technogigadá presávka	7 dni
336	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 infiltratívny posťtek	1 den
337	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 pokládka AC 22 L	1 den
338	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 spojovací posťtek	1 den
339	0,4 - 3	101-002 - 0,4-3 pokládka AC 11 O	1 den
340	0,4 - 4	101-002 - USEK 4 - 4 ETAPA, práce v priemere stančienka v km 8,518 00-9,361 00	34 dni
341	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 burače práce	2 dni
342	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 frézovanie	1 den
343	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 úprava zemnej pláne	2 dni
344	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 R-matériál: NfM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
345	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 technogigadá presávka	7 dni
346	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 infiltratívny posťtek	2 dni
347	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 pokládka AC 22 L	1 den
348	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 spojovací posťtek	1 den
349	0,4 - 4	101-002 - 0,4-4 pokládka AC 11 O	1 den
350	0,4 - 5	101-002 - 0,4-4 pokládka AC 11 O	1 den
351	0,4 - 5	101-002 - USEK 4 - 5 ETAPA, práce v smere stančienka v km 9,361 00-10,005 30	20 dni
352	0,4 - 5	101-002 - 0,4-5 burače práce	2 dni
353	0,4 - 5	101-002 - 0,4-5 frézovanie	1 den
354	0,4 - 5	101-002 - 0,4-5 začistenie	1 den

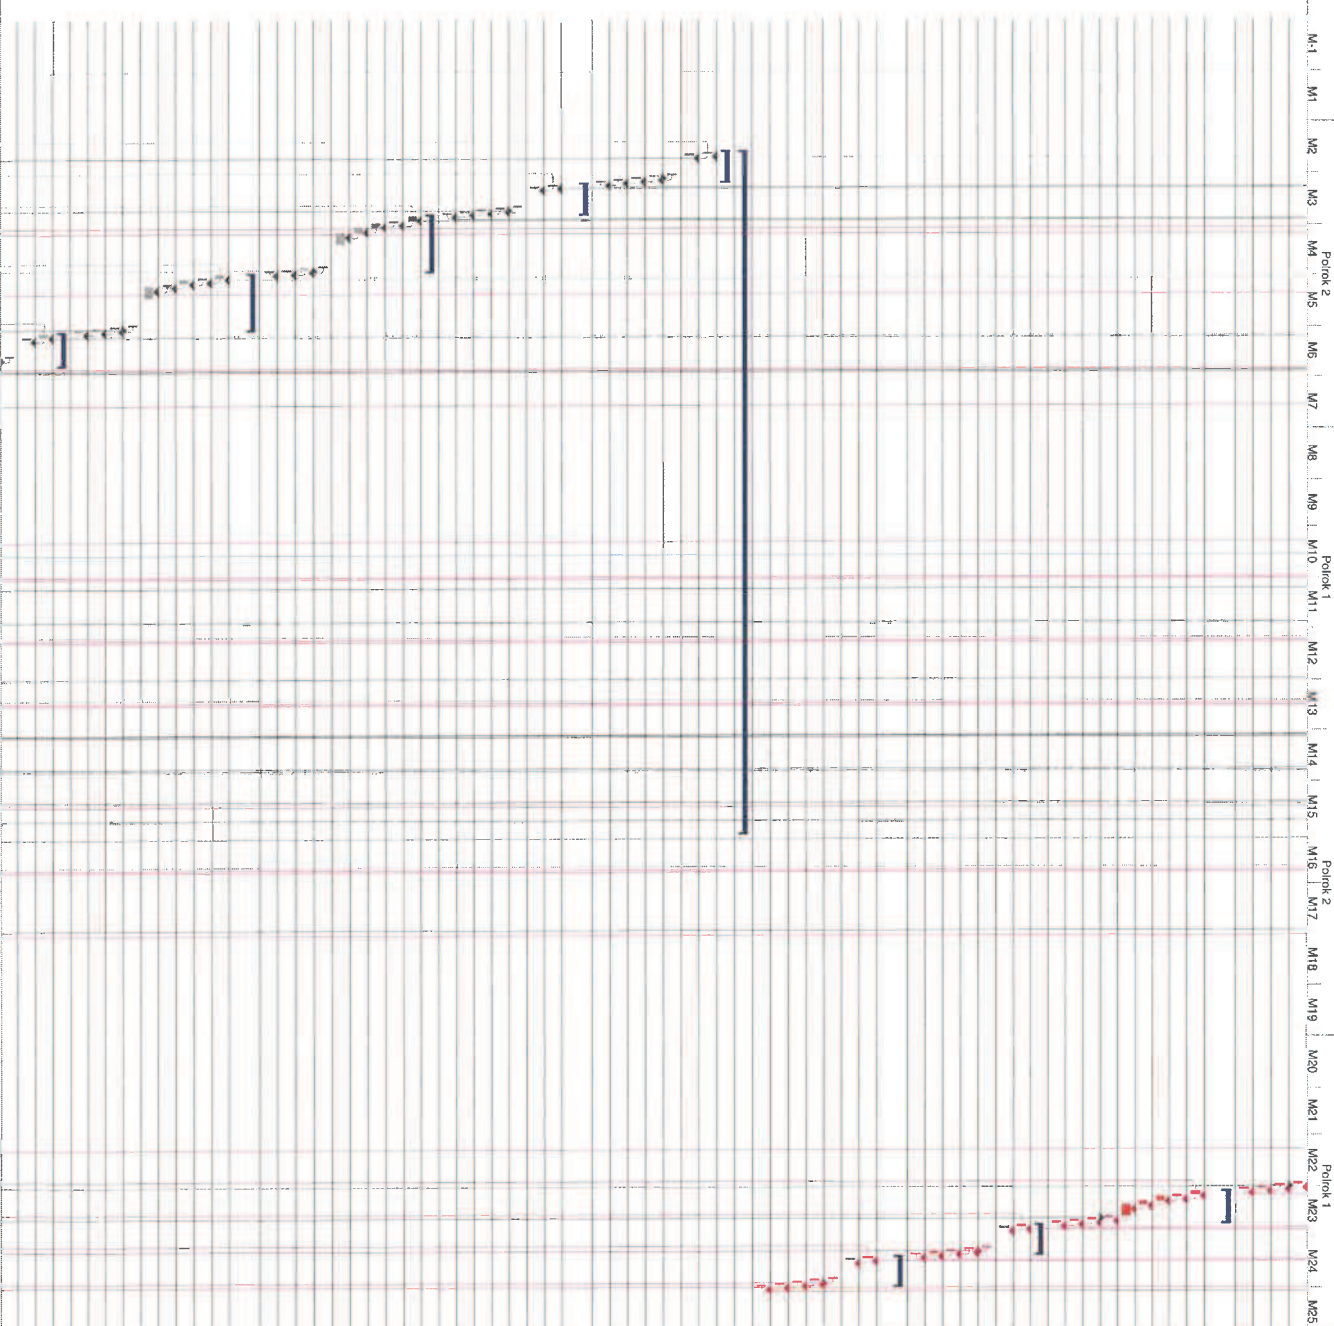

Sféra projektu Údela Kritická údela Misk Misk - splaný Ochranný objekt Neaktívna údela Neaktívny medník Neaktívny údela Práček

354	0,4 - 5	101-002 - 0,4-9 spojovací postrek	1 den
355	0,4 - 5	101-002 - 0,4-9 realizace geometrie	2 dni
356	0,4 - 5	101-002 - 0,4-9 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 den
357	0,4 - 5	101-002 - 0,4-9 spojovací postrek	1 den
358	0,4 - 5	101-002 - 0,4-9 pokládka AC 11 O	1 den
359	0,4 - 6	101-002 - ÚSEK 4 - 6 ETAPA práce v protisměru staničení v km 8,261 00-10,005 110 dni	110 dni
360	0,4 - 6	101-002 - 0,4-6 btracné práce	2 dni
361	0,4 - 6	101-002 - 0,4-6 řezování	1 den
362	0,4 - 6	101-002 - 0,4-6 zádění	1 den
363	0,4 - 6	101-002 - 0,4-6 spojovací postrek	2 dni
364	0,4 - 6	101-002 - 0,4-6 realizace geometrie	1 den
365	0,4 - 6	101-002 - 0,4-6 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 den
366	0,4 - 6	101-002 - 0,4-6 spojovací postrek	1 den
367	0,4 - 6	101-002 - 0,4-6 pokládka AC 11 O	1 den
368	0,4 - 6	ZJMNA PŘESTÁVKA 2021	60 dni
369	0,4 - 7	101-002 - ÚSEK 4 - 7 ETAPA práce v směru staničení v km 10,005 30-10,698 00	19 dni
370	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 btracné práce	2 dni
371	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 řezování	1 den
372	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 úprava zemní pláně	3 dni
373	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 Realizaci NRM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
374	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 infiltrační postrek	7 dni
375	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 infiltrační postrek	1 den
376	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 pokládka AC 22 L	1 den
377	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 spojovací postrek	1 den
378	0,4 - 7	101-002 - 0,4-7 pokládka AC 11 O	1 den
379	0,4 - 8	101-002 - ÚSEK 4 - 8 ETAPA práce v protisměru staničení v km 10,005 30-10,698 00	19 dni
380	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 btracné práce	2 dni
381	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 řezování	1 den
382	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 úprava zemní pláně	3 dni
383	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 Realizaci NRM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
384	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 technologická přestávka	7 dni
385	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 infiltrační postrek	1 den
386	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 pokládka AC 22 L	1 den
387	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 spojovací postrek	1 den
388	0,4 - 8	101-002 - 0,4-8 pokládka AC 11 O	1 den
389	0,4 - 9	101-002 - ÚSEK 4 - 9 ETAPA práce v směru staničení v km 10,698 00-11,160 00	33 dni
390	0,4 - 9	101-002 - 0,4-9 btracné práce	2 dni
391	0,4 - 9	101-002 - 0,4-9 řezování	1 den
392	0,4 - 9	101-002 - 0,4-9 zádění	1 den
393	0,4 - 9	101-002 - 0,4-9 spojovací postrek	1 den
394	0,4 - 9	101-002 - 0,4-9 realizace geometrie	2 dni
395	0,4 - 9	101-002 - 0,4-9 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 den
396	0,4 - 9	101-002 - 0,4-9 spojovací postrek	1 den
397	0,4 - 9	101-002 - 0,4-9 pokládka AC 11 O	1 den
398	0,4 - 10	101-002 - ÚSEK 4 - 10 ETAPA práce v protisměru staničení v km 10,698 00-11,160 00	33 dni
399	0,4 - 10	101-002 - 0,4-10 btracné práce	2 dni
400	0,4 - 10	101-002 - 0,4-10 řezování	1 den
401	0,4 - 10	101-002 - 0,4-10 zádění	1 den
402	0,4 - 10	101-002 - 0,4-10 spojovací postrek	2 dni
403	0,4 - 10	101-002 - 0,4-10 realizace geometrie	1 den
404	0,4 - 10	101-002 - 0,4-10 pokládka AC 22 L, AC 22 P	1 den
405	0,4 - 10	101-002 - 0,4-10 spojovací postrek	1 den
406	0,4 - 10	101-002 - 0,4-10 pokládka AC 11 O	1 den
407	0,4 - 11	101-002 - ÚSEK 3 - 33 ETAPA práce v směru staničení v km 11,160 00-11,725 00 19 dni	2 dni
408	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 btracné práce	1 den
409	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 řezování	1 den
410	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 úprava zemní pláně	3 dni
411	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 Realizaci NRM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
412	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 technologická přestávka	7 dni
413	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 infiltrační postrek	1 den
414	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 infiltrační postrek	1 den
415	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 spojovací postrek	1 den
416	0,4 - 11	101-002 - 0,4-11 pokládka AC 22 L	1 den
417	0,4 - 12	101-002 - 0,4-11 pokládka AC 11 O	1 den
418	0,4 - 12	101-002 - ÚSEK 3 - 34 ETAPA práce v protisměru staničení v km 11,160 00-11,725 00	19 dni
419	0,4 - 12	101-002 - 0,4-12 btracné práce	2 dni
420	0,4 - 12	101-002 - 0,4-12 řezování	1 den
421	0,4 - 12	101-002 - 0,4-12 úprava zemní pláně	3 dni
422	0,4 - 12	101-002 - 0,4-12 Realizaci NRM 32 CEM III/B 32,5 N	2 dni
423	0,4 - 12	101-002 - 0,4-12 technologická přestávka	7 dni
424	0,4 - 12	101-002 - 0,4-12 infiltrační postrek	1 den

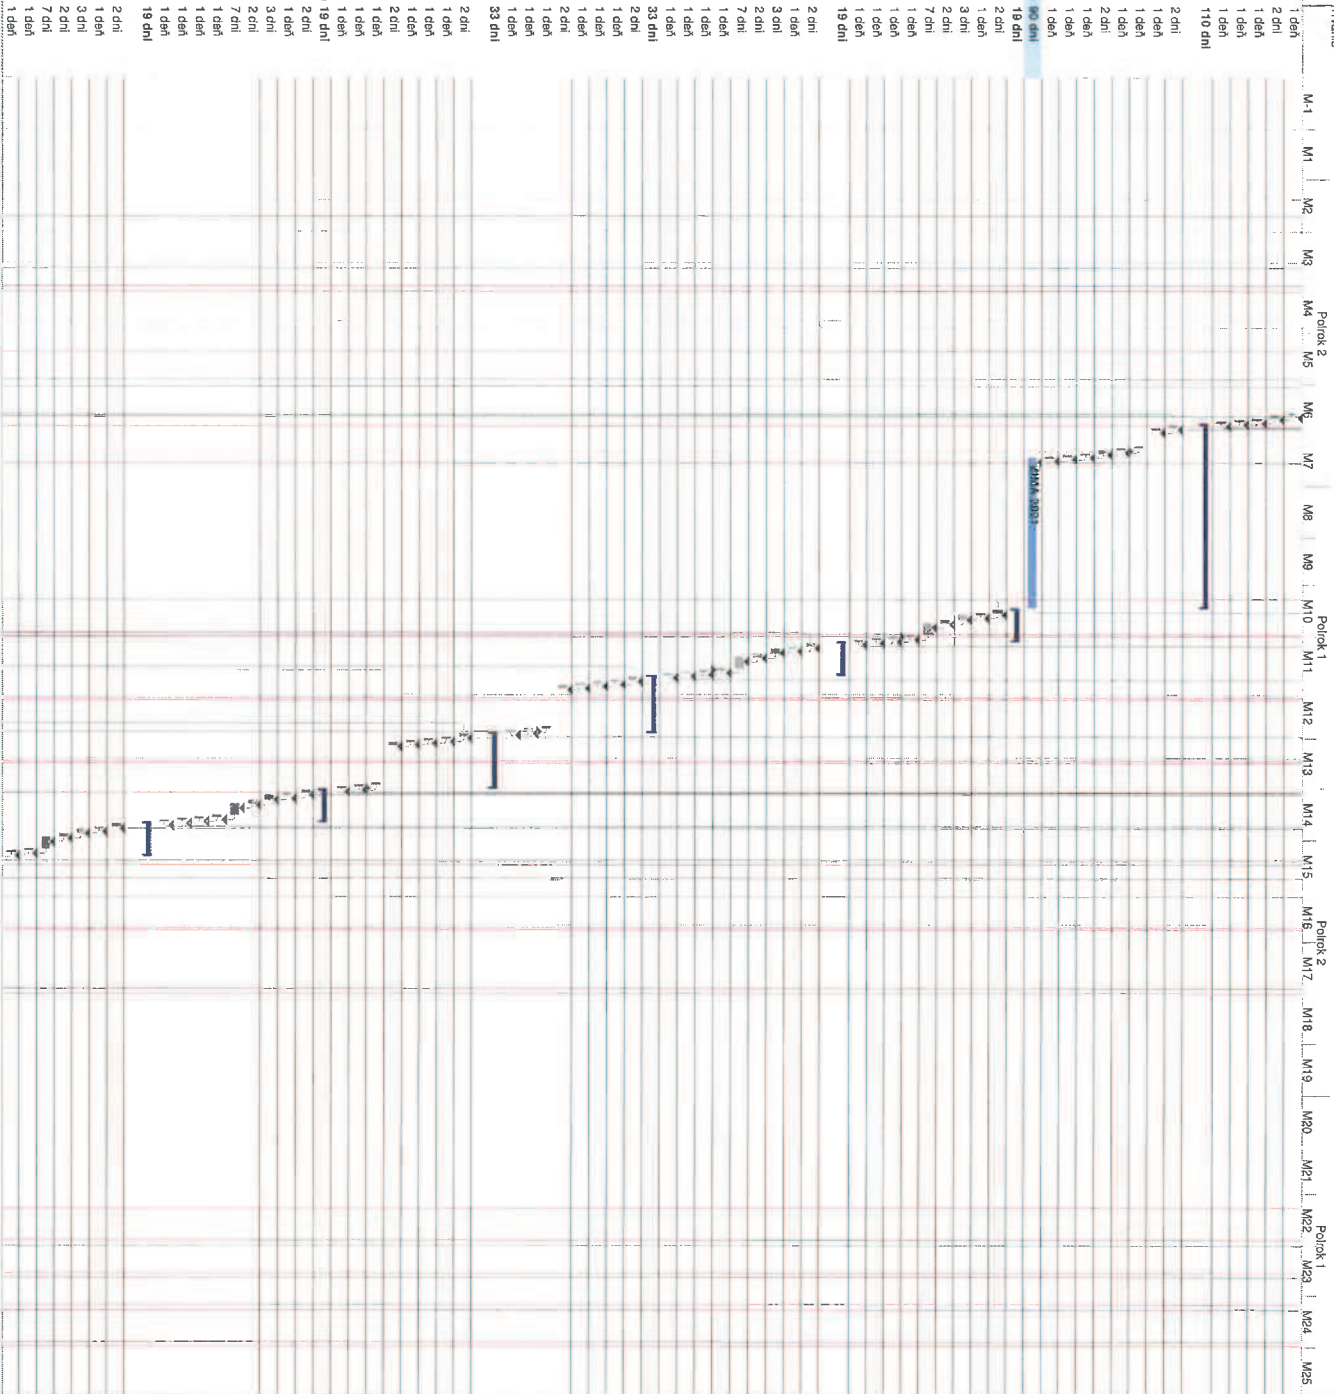

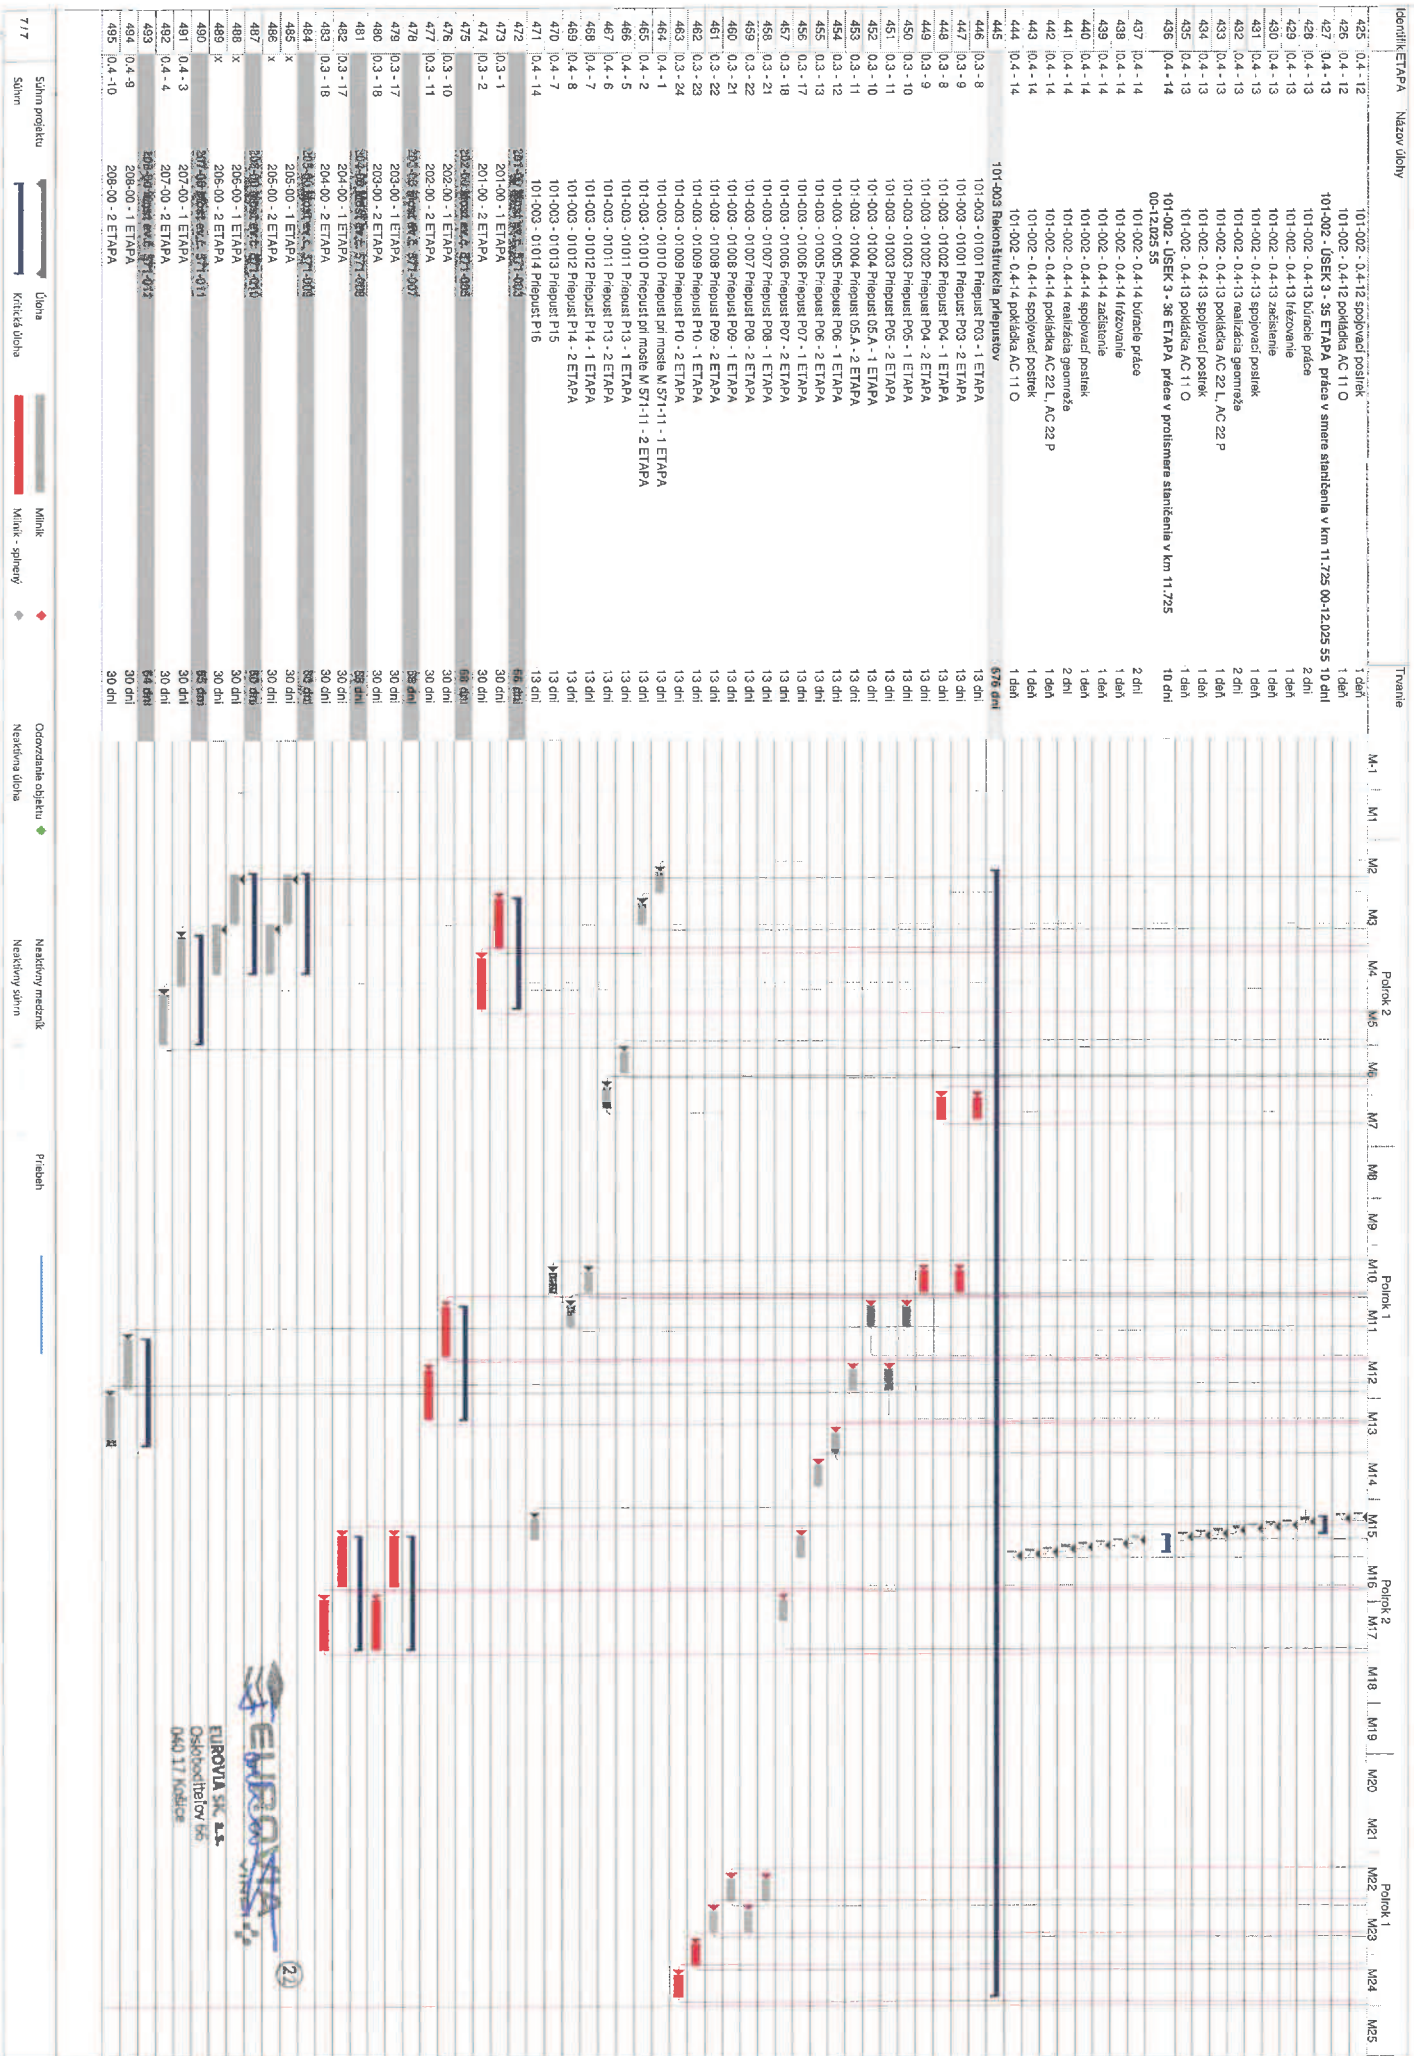



Zoznam subdodávateľov

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS.“

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

týmto vyhlasuje, že na predmet zmluvy: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS**“ nebude využívať subdodávateľov a plnenie zmluvy v celom rozsahu vykonáme vlastnými kapacitami.

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb
	X	X



HDI

Praha 2

07

Potvrzení o pojištění odpovědnosti



HDI




1




1




FDI



HDI










S pozdravom.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258
obchodne.financovanie@slsp.sk





Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Sporiteľ 0850 111 888
info@siso.sk

ROZPOČET

7

