

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu
Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
Predmet zákazky: „Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou“
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Obchodné meno uchádzača: VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača: 50 228 455
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 317 657,15 EUR

DPH v EUR: 63 531,43

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH

(návrh na plnenie kritéria):

381 188,58 EUR

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.

** V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH za určený počet.*

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ za určený počet.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ za určený počet (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Vo Zvolene, dňa 22.09.2021

Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Prepojenie ciest III.triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

14. 9. 2021

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	22 842,92
2		Montáž	294 814,23
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		317 657,15
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	317 657,15
24	DPH 20,00 % z 317 657,15	63 531,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	381 188,58

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

14. 9. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
62	Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou	317 657,15	63 531,43	381 188,58	0,00	317 657,15	0,00	0,00	0,00
1	SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30-Šumiac	157 383,39	31 476,68	188 860,07	0,00	157 383,39	0,00	0,00	0,00
2	SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30-Telgart	160 273,76	32 054,75	192 328,51	0,00	160 273,76	0,00	0,00	0,00

Celkom

317 657,15 63 531,43 381 188,58 0,00 317 657,15 0,00 0,00 0,00



		Meno	Trvanie	Zaiatok
1		SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30-Šumiac	65 dní?	2.5.2022 8:00
2		ZEMNE PRÁCE	65 dní	2.5.2022 8:00
3		Odstránenie krovín a stromov s koremi do 1000 m2	5 dní	2.5.2022 8:00
4		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	20 dní	2.5.2022 8:00
5		Hbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	10 dní	16.5.2022 8:00
6		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	20 dní	2.5.2022 8:00
7		Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	8 dní	30.5.2022 8:00
8		Uloženie sypaniny na skládku	5 dní	30.5.2022 8:00
9		Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	10 dní	18.7.2022 8:00
10		Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000...	10 dní	18.7.2022 8:00
11		Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	6 dní	15.7.2022 8:00
12		Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 10 cm	18 dní	21.6.2022 8:00
13		Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	35 dní	30.5.2022 8:00
14		Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	15 dní	30.5.2022 8:00
15		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 dní	18.7.2022 8:00
16		Osadenie a dodávka zábradlia oceového do 100 kg/m	5 dní	18.7.2022 8:00
17		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15 dní	31.5.2022 8:00
18		Podkladná vrstva zo štrkopiesku do 200 mm	15 dní	31.5.2022 8:00
19		Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	14 dní	31.5.2022 8:00
20		KOMUNIKÁCIE	35 dní?	30.5.2022 8:00
21		Presypanie krytu výplovým drveným kamenivom fr 0-8mm 25-30kg/m2	1 de?	20.6.2022 8:00
22		Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	15 dní	30.5.2022 8:00
23		Podklad zo štrkodrtie 31,5(45)Gc hr. 20 cm	35 dní	30.5.2022 8:00
24		Podklad zo štrkodrtie 31,5(45)Gc hr. 25 cm	35 dní	30.5.2022 8:00
25		Podklad zo štrkodrtie 63Gb hr. 25 cm	35 dní	30.5.2022 8:00
26		Spevnenie krajníc alebo komunik. štrkodrou hr. 10 cm	6 dní	21.6.2022 8:00
27		Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	3 dní	21.6.2022 8:00
28		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35,375 dní	30.5.2022 8:00
29		Osadenie a dodávka cestnej oce. závery dl.5m so zabetónovaním	4 dní	8.7.2022 8:00
30		Vtoková nádržka z betónu B30/37 vyzt. sie.,strop oc. mreža,priepust do 80cm	10 dní	27.6.2022 8:00
31		elo priepustu z lomového kamea pre priepust z rúr do 50 cm	15 dní	27.6.2022 8:00
32		Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 400 mm	5 dní	30.5.2022 8:00
33		Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 600 mm	15 dní	6.6.2022 8:00
34		istenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,50 m3/m	10 dní	30.5.2022 8:00


Koniec	Predchodcovia	Mená zdrojov	20 sep 21							27 sep 21							4 okt 21							11 okt 21							18 okt 21							25		
			N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	
29.7.2022 17:00																																								
29.7.2022 17:00																																								
6.5.2022 17:00																																								
27.5.2022 17:00																																								
27.5.2022 17:00																																								
27.5.2022 17:00																																								
8.6.2022 17:00	6																																							
3.6.2022 17:00	6																																							
29.7.2022 17:00	31																																							
29.7.2022 17:00	31																																							
22.7.2022 17:00	12																																							
14.7.2022 17:00	21																																							
15.7.2022 17:00	4																																							
17.6.2022 17:00	4																																							
22.7.2022 17:00																																								
22.7.2022 17:00	31																																							
20.6.2022 17:00																																								
20.6.2022 17:00																																								
17.6.2022 17:00																																								
15.7.2022 17:00																																								
20.6.2022 17:00	22																																							
17.6.2022 17:00	6																																							
15.7.2022 17:00	6																																							
15.7.2022 17:00	6																																							
15.7.2022 17:00	6																																							
28.6.2022 17:00	21																																							
23.6.2022 17:00	21																																							
18.7.2022 11:00																																								
13.7.2022 17:00																																								
8.7.2022 17:00	33																																							
15.7.2022 17:00	33																																							
3.6.2022 17:00	5																																							
24.6.2022 17:00	32																																							
10.6.2022 17:00	4																																							

[illegible]

3 jan 22							10 jan 22							17 jan 22							24 jan 22							31 jan 22							7 feb 22							14 feb 22							21 feb 22							28 feb 22							7 mar 22						
N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š																

Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou - stránka4

[illegible]

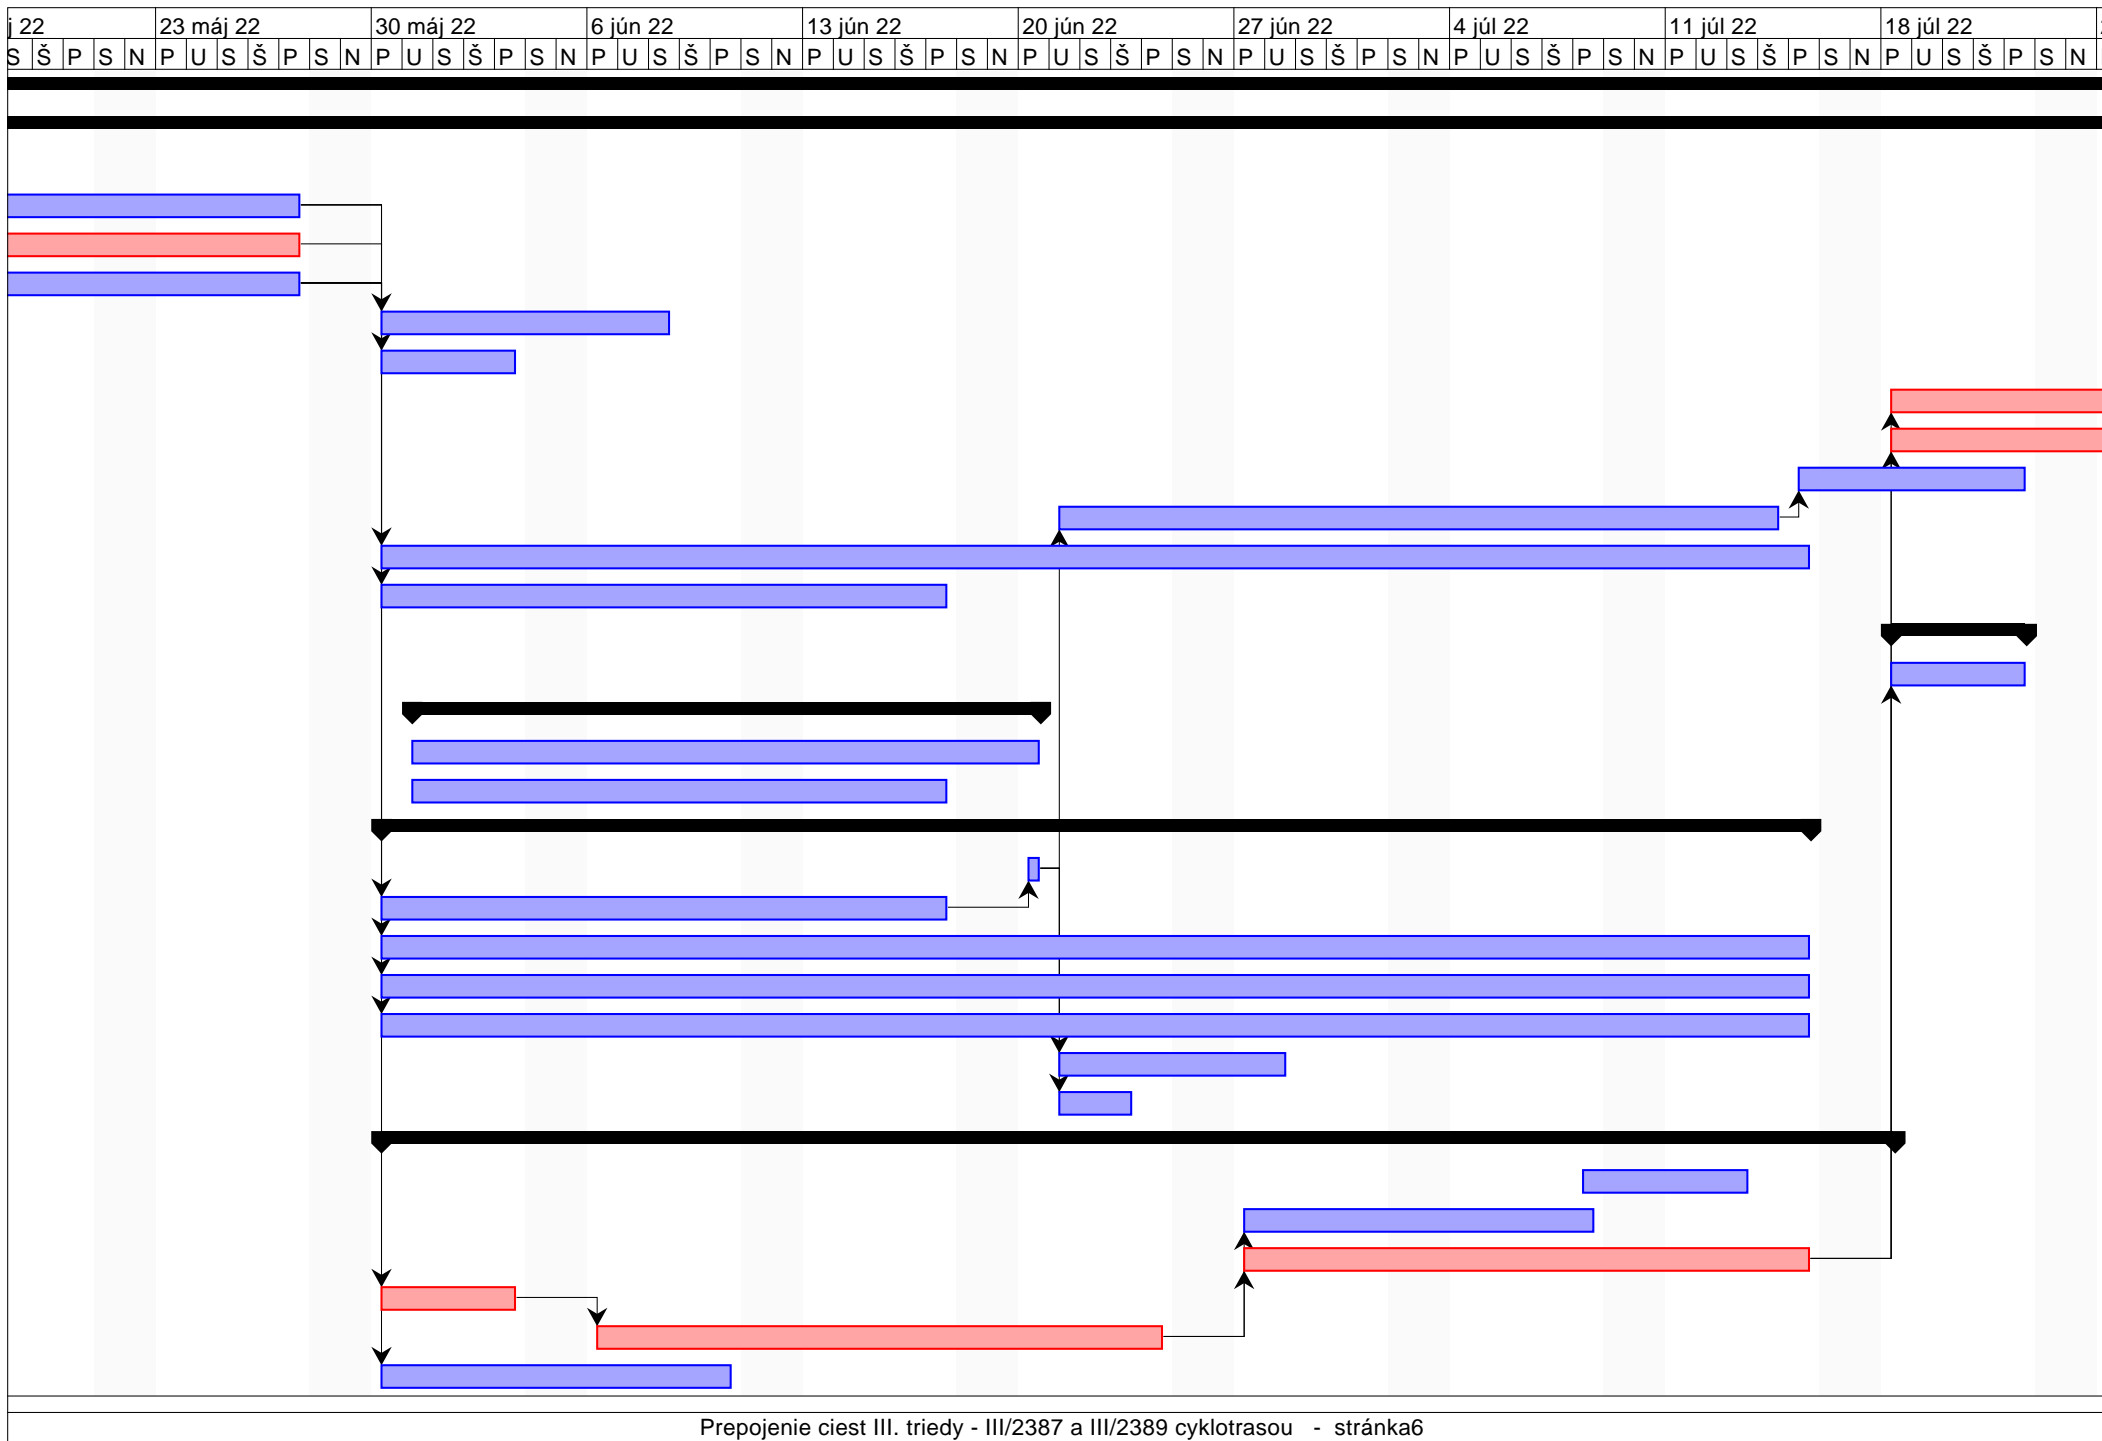

Koniec	Predchodcovia	Mená zdrojov	20 sep 21							27 sep 21							4 okt 21							11 okt 21							18 okt 21							25
			N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P						
18.7.2022 11:00																																						


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			14 mar 22				21 mar 22				28 mar 22				4 apr 22				11 apr 22				18 apr 22				25 apr 22				2 máj 22				9 máj 22				16 máj 22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S</


j 22	23 máj 22					30 máj 22					6 jún 22					13 jún 22					20 jún 22					27 jún 22					4 júl 22					11 júl 22					18 júl 22					:								
S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	:

25 júl 22						1 aug 22						8 aug 22						15 aug 22						22 aug 22										
P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N




Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou - stránka14

		Meno	Trvanie	Zaiatok
1		SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30-Telgart	65 dní	2.5.2022 8:00
2		ZEMNE PRÁCE	65 dní	2.5.2022 8:00
3		Odstránenie krovín a stromov s koremi do 1000 m2	3 dní	2.5.2022 8:00
4		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	12 dní	5.5.2022 8:00
5		Príplatok za lepivos horniny tr.3	12 dní	5.5.2022 8:00
6		Hbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6 dní	23.5.2022 8:00
7		Príplatok za lepivos horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10 dní	23.5.2022 8:00
8		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	10 dní	5.5.2022 8:00
9		Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	5 dní	19.5.2022 8:00
10		Uloženie sypaniny na skládku	5 dní	6.6.2022 8:00
11		Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000...	3 dní	14.6.2022 8:00
12		Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	2 dní	28.7.2022 8:00
13		Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 10 cm	5 dní	22.7.2022 8:00
14		Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	6 dní	22.7.2022 8:00
15		Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	10 dní	31.5.2022 8:00
16		ZÁKLADY	2 dní	31.5.2022 8:00
17		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom	2 dní	31.5.2022 8:00
18		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 dní	15.6.2022 8:00
19		Osadenie a dodávka zábradlia oceového do 100 kg/m	5 dní	15.6.2022 8:00
20		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 dní	29.6.2022 8:00
21		Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	5 dní	29.6.2022 8:00
22		Podkladná vrstva zo štrkopiesku do 200 mm	1 de	6.7.2022 8:00
23		Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	2 dní	7.7.2022 8:00
24		KOMUNIKÁCIE	32 dní	15.6.2022 8:00
25		Presypanie krytu výplovým drveným kamenivom fr 0-8mm 25-30kg/m2	4 dní	18.7.2022 8:00
26		Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	5 dní	11.7.2022 8:00
27		Podklad zo štrkodrtie 31,5(45)Gc hr. 20 cm	6 dní	1.7.2022 8:00
28		Podklad zo štrkodrtie 31,5(45)Gc hr. 25 cm	6 dní	15.6.2022 8:00
29		Podklad zo štrkodrtie 63Gb hr. 25 cm	6 dní	23.6.2022 8:00
30		Spevnenie krajníc alebo komunik. štrkodrou hr. 10 cm	5 dní	22.7.2022 8:00
31		Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	5 dní	22.7.2022 8:00
32		Rigol dlaždený z prefabrikátov TBM-Q 100-500 š.70cm do lôžka z betónu	4 dní	6.7.2022 8:00
33		RÚROVÉ VEDENIA	3 dní	2.6.2022 8:00
34		Drenážne šachty normálne z PE nádoby podzemnej	3 dní	2.6.2022 8:00

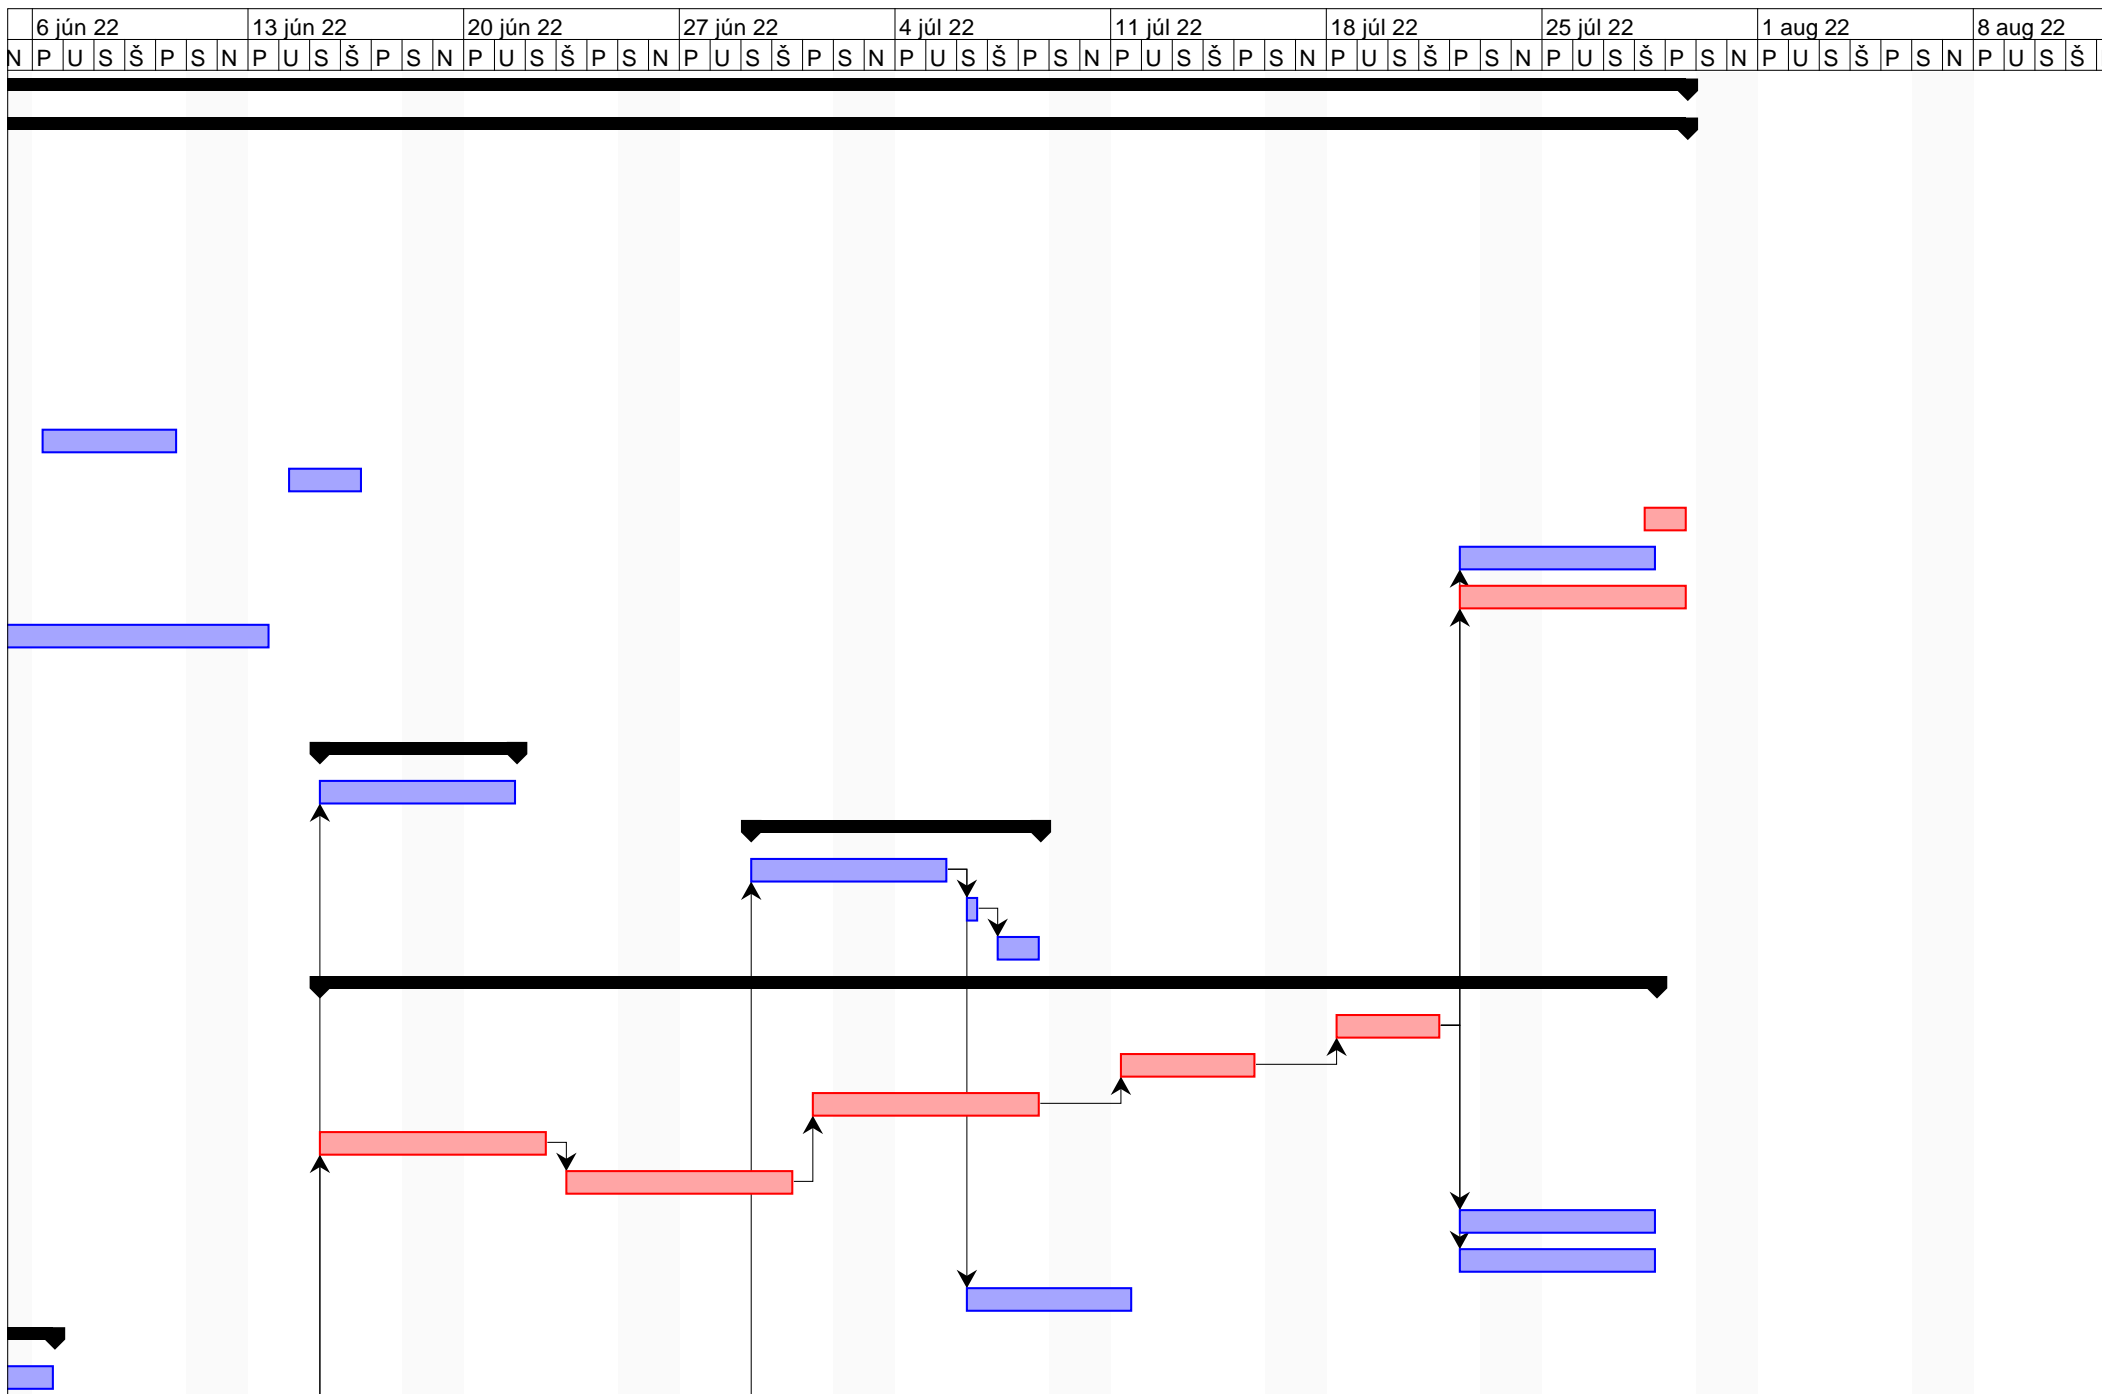
Koniec	Predchodcovia	Mená zdrojov	2 máj 22			9 máj 22			16 máj 22			23 máj 22			30 máj 22																	
			P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S
29.7.2022 17:00																																
29.7.2022 17:00																																
4.5.2022 17:00																																
20.5.2022 17:00	3																															
20.5.2022 17:00	3																															
30.5.2022 17:00	4																															
3.6.2022 17:00	4																															
18.5.2022 17:00	3																															
25.5.2022 17:00	8																															
10.6.2022 17:00																																
16.6.2022 17:00																																
29.7.2022 17:00																																
28.7.2022 17:00	25																															
29.7.2022 17:00	25																															
13.6.2022 17:00	6																															
1.6.2022 17:00																																
1.6.2022 17:00	6																															
21.6.2022 17:00																																
21.6.2022 17:00	40																															
8.7.2022 17:00																																
5.7.2022 17:00	38																															
6.7.2022 17:00	21																															
8.7.2022 17:00	22																															
28.7.2022 17:00																																
21.7.2022 17:00	26																															
15.7.2022 17:00	27																															
8.7.2022 17:00	29																															
22.6.2022 17:00	40																															
30.6.2022 17:00	28																															
28.7.2022 17:00	25																															
28.7.2022 17:00	25																															
11.7.2022 17:00	21																															
6.6.2022 17:00																																
6.6.2022 17:00	17																															




			15 aug 22					22 aug 22					29 aug 22						
P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S
Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotraso...																			

		Meno	Trvanie	Zaiatok
35		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	41,5 dní	31.5.2022 8:00
36		Osadenie a dodávka cestnej oce. závery dl.5m so zabetónovaním	2 dní	25.7.2022 12:00
37		Vtoková nádržka z betónu B30/37 vyzt. sie.,strop oc. mreža,priepust do 80cm	8 dní	15.6.2022 8:00
38		elo priepustu z lomového kamea pre priepust z rúr do 50 cm	10 dní	15.6.2022 8:00
39		Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 600 mm	6 dní	31.5.2022 8:00
40		Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 1000 mm	5 dní	8.6.2022 8:00
41		istenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,50 m3/m	8 dní	31.5.2022 8:00
42		Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	25 dní	21.6.2022 8:00

Koniec	Predchodcovia	Mená zdrojov				2 máj 22					9 máj 22					16 máj 22					23 máj 22					30 máj 22				
			P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š
27.7.2022 13:00																														
27.7.2022 13:00																														
24.6.2022 17:00	40																													
28.6.2022 17:00	40																													
7.6.2022 17:00	6																													
14.6.2022 17:00	39																													
9.6.2022 17:00	6																													
25.7.2022 17:00																														



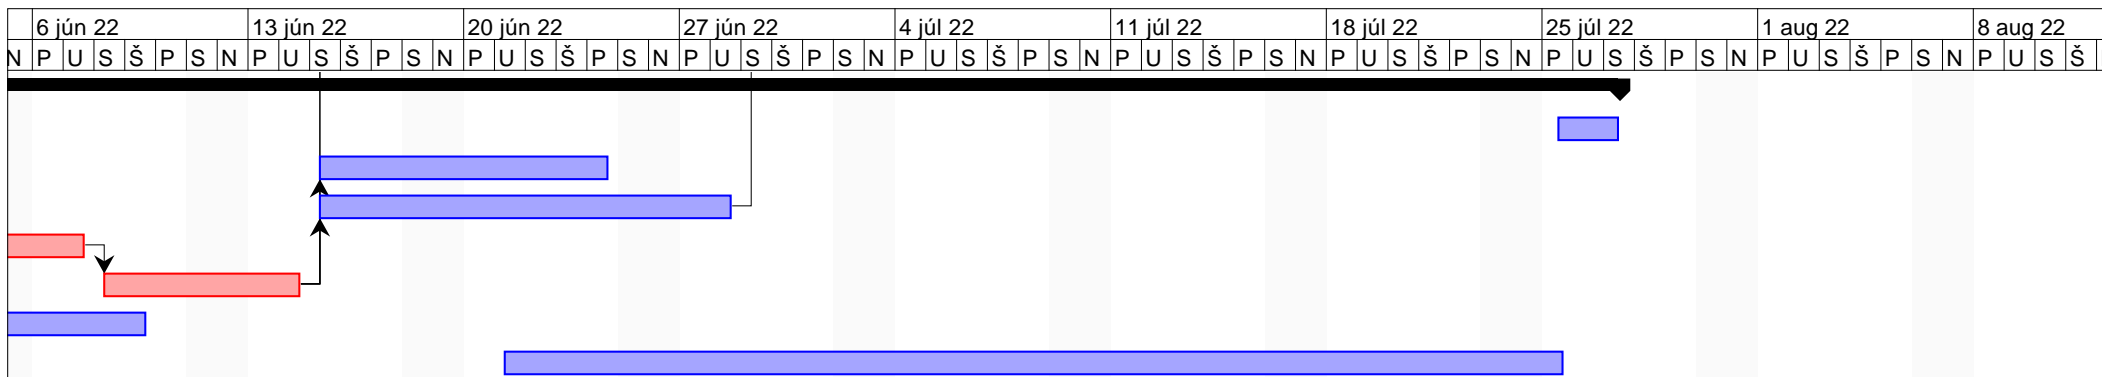

			15 aug 22					22 aug 22					29 aug 22						
P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S
Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotraso...																			
