

19.1.6.4 Príloha č. 3. Harmonogram prác – časť 3.1 Vecný harmonogram a časť 3.2 Míľniky

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁČ

Harmonogram prác tvoria tieto časti:

Časť 1: Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf- grafická časť, ktorá musí byť vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO).

Vecný harmonogram - bude dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných väzieb zobrazujúcich následnosti medzi jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty ako aj grafické znázornenie kritickej cesty, t.j. časovú postupnosť (nie len zoznam) zabezpečenia vyhotovenia požadovanej Dokumentácie Zhotoviteľa, podľa jednotlivých častí Diela vrátane jej predloženia na odsúhlasenie, Inžinierskej činnosti vrátane stavebného povolenia, majetkovoprávného vysporiadania, ak také vyplynie z technického riešenia Zhotoviteľa, zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, prác na jednotlivých častiach stavby a navrhovaný časový plán s technologickou a časovou nadväznosťou v súlade s požadovanou technológiou výstavby (resp. technológiou výstavby navrhovanou Zhotoviteľom stavby)

Vecný harmonogram bude obsahovať termíny a postup výroby a dodania hlavných Technologických zariadení, postup výstavby, skúšok, vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod., spúšťania do prevádzky, prebratia Diela podľa požiadaviek Objednávateľa.

Vecný harmonogram prác nie je súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávateľa. Uchádzač vyhotoví a predloží v ponuke vlastný dokument ako Prílohu č. 3.1 Zmluvných dojednaní (Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov).

Harmonogram prác predložený v ponuke je Zhotoviteľ povinný aktualizovať podľa podčlánku 8.3

Osobitné zmluvné podmienky (Časť 2.2 Zväzok 2 súťažných podkladov), v ktorom upraví časovú postupnosť výstavby jednotlivých stavebných objektov uvedených v pôvodnom Vecnom harmonograme prác vzhľadom na svoje technologické zariadenia, stroje a materiály atď., pričom je **povinný dodržať verejným obstarávateľom stanovenú Lehotu výstavby a lehoty ukončenia Míľnikov** uvedených v tabuľke v rámci tejto prílohy B2A. Tento Vecný harmonogram musí zohľadniť Dátum začatia prác oznámený verejným obstarávateľom podľa podčlánku 8.1 Osobitné zmluvné podmienky (Časť 2.2 Zväzok 1 súťažných podkladov).

Dátum Začiatku výstavby uvedený vo Vecnom harmonograme je totožný s Dátumom začatia prác.

Časť 2: Míľniky – verejným obstarávateľom určené stavebné objekty alebo časti objektov a lehoty ich ukončenia, ktoré sa Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač zaväzuje ukončiť v určených lehotách uvedených v tabuľke Míľniky.

Tabuľka Míľniky je súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávateľa (viď tabuľka nižšie) a slúži na jej predloženie v ponuke uchádzača ako Príloha č. 3.2 Zmluvných dojednaní (Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov).

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť identickú tabuľku Míľniky predloženú v ponuke aj v rámci aktualizácie harmonogramu prác podľa podčlánku 8.3 Osobitné zmluvné podmienky (Časť 2.2 Zväzok 2 súťažných podkladov).

Míľniky	Lehota ukončenia	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika
Míľnik č. 1	180 dní od účinnosti Zmluvy o dielo	Projekt na stavebné povolenie	Stavebnotechnickým dozom potvrdené prebratie schválenej projektovej dokumentácie so žiadosťou o stavebné povolenie na stavebný úrad.
Míľnik č. 2	90 dní od vyhodnotenia splnenia Míľnika č. 1	Právoplatné stavebné povolenie Zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2	Vydanie stavebného povolenia a nadobudnutie právoplatnosti, Zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2

Míľnik č. 3	450 dní od právoplatnosti stavebného povolenia - od vyhodnotenia splnenia Míľníka č. 2	Sprejazdnenie jedného z mostov križovatky pred demoláciou jestvujúceho mosta	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác V zmysle Podčlánku 10.2 Musí byť zabezpečená nepretržitá premávka na ceste II. triedy
Míľnik č. 4	670 dní od právoplatnosti stavebného povolenia - od vyhodnotenia splnenia Míľníka č. 2	Sprejazdnenie križovatky a jej vetiev	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác V zmysle Podčlánku 10.2
Míľnik č. 5	730 dní od právoplatnosti stavebného povolenia - od vyhodnotenia splnenia Míľníka č. 2	Kolaudácia objektov	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie/ia (Kolaudačné osvedčenie stavby) V zmysle Podčlánku 10.1

Časť 3: Fakturačný harmonogram - harmonogram, ktorý musí byť vyhotovený podľa Vecného harmonogramu a Míľnikov a musí byť vyhotovený v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby v elektronickej forme na CD/DVD/USB nosiči v zmysle dátového predpisu verejného obstarávateľa uvedeného na stránke <http://www.ndsas.sk/pomoc-a-podpora/datovy-predpis>, ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S-krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka).


Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Dieľa (v mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v EUR.

V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov (zoskupenie bez právnej subjektivity), je povinný predložiť aj harmonogram fakturácie v členení po jednotlivých členoch uvedeného zoskupenia.

Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvných dojednaní Zmluvy o Dielo spolu ako Príloha č. 3 Zmluvných dojednaní (Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov). Pre vylúčenie pochybností platí, že harmonogram fakturácie jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity (číselné vyjadrenie fakturačného plnenia aj S - krivky zobrazujúce plnenia jednotlivých členov zoskupenia) netvoria súčasť Fakturačného harmonogramu a majú informatívny charakter.

Fakturačný harmonogram ako aj prípadný harmonogram fakturácie jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity nepredkladá v ponuke uchádzač ako Prílohu č. 3.3 Zmluvných dojednaní (Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov) a Zhotoviteľ je povinný ho predložiť podľa podčlánku 8.3 Osobitné zmluvné podmienky (časť 2.2 Zväzok 2 súťažných podkladov).

V Poprade, 12.05.2025


 **EUROVIA**
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

®


IČO: 31651518. IČ DPH: SK2020490274

Podpis uchádzača: Ing. Zuzana Halásová, prevádzkovo-obchodný námestník EUROVIA SK, a.s.
(osoba oprávnená podpisovať na základe plnej moci)

D2 križovatka Rohožník - Harmonogram prác

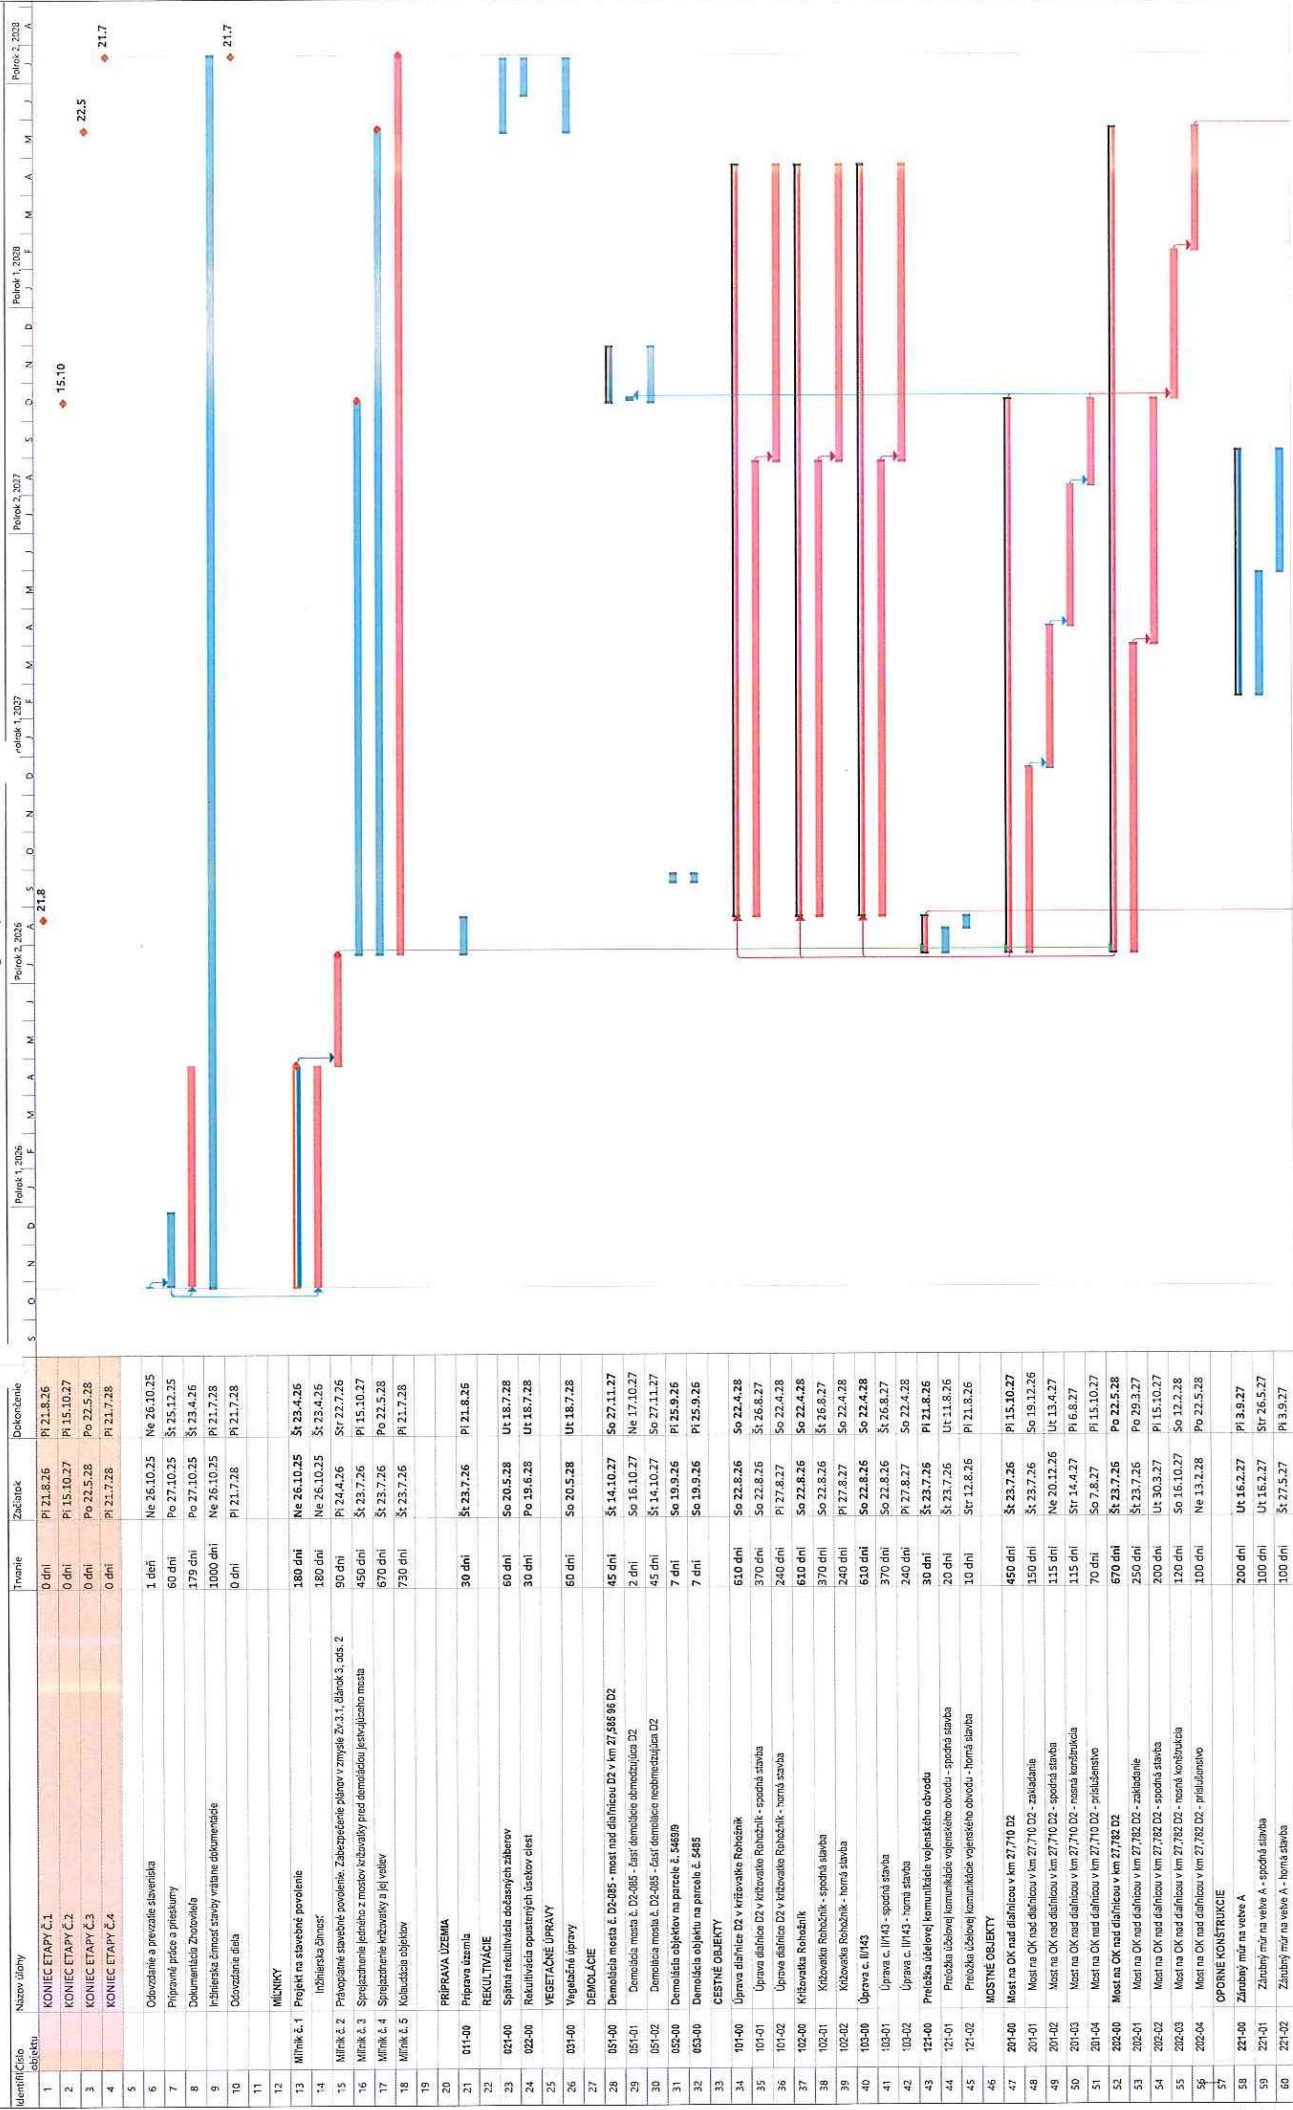

D2 križovatka Rohožník - Harmonogram prác

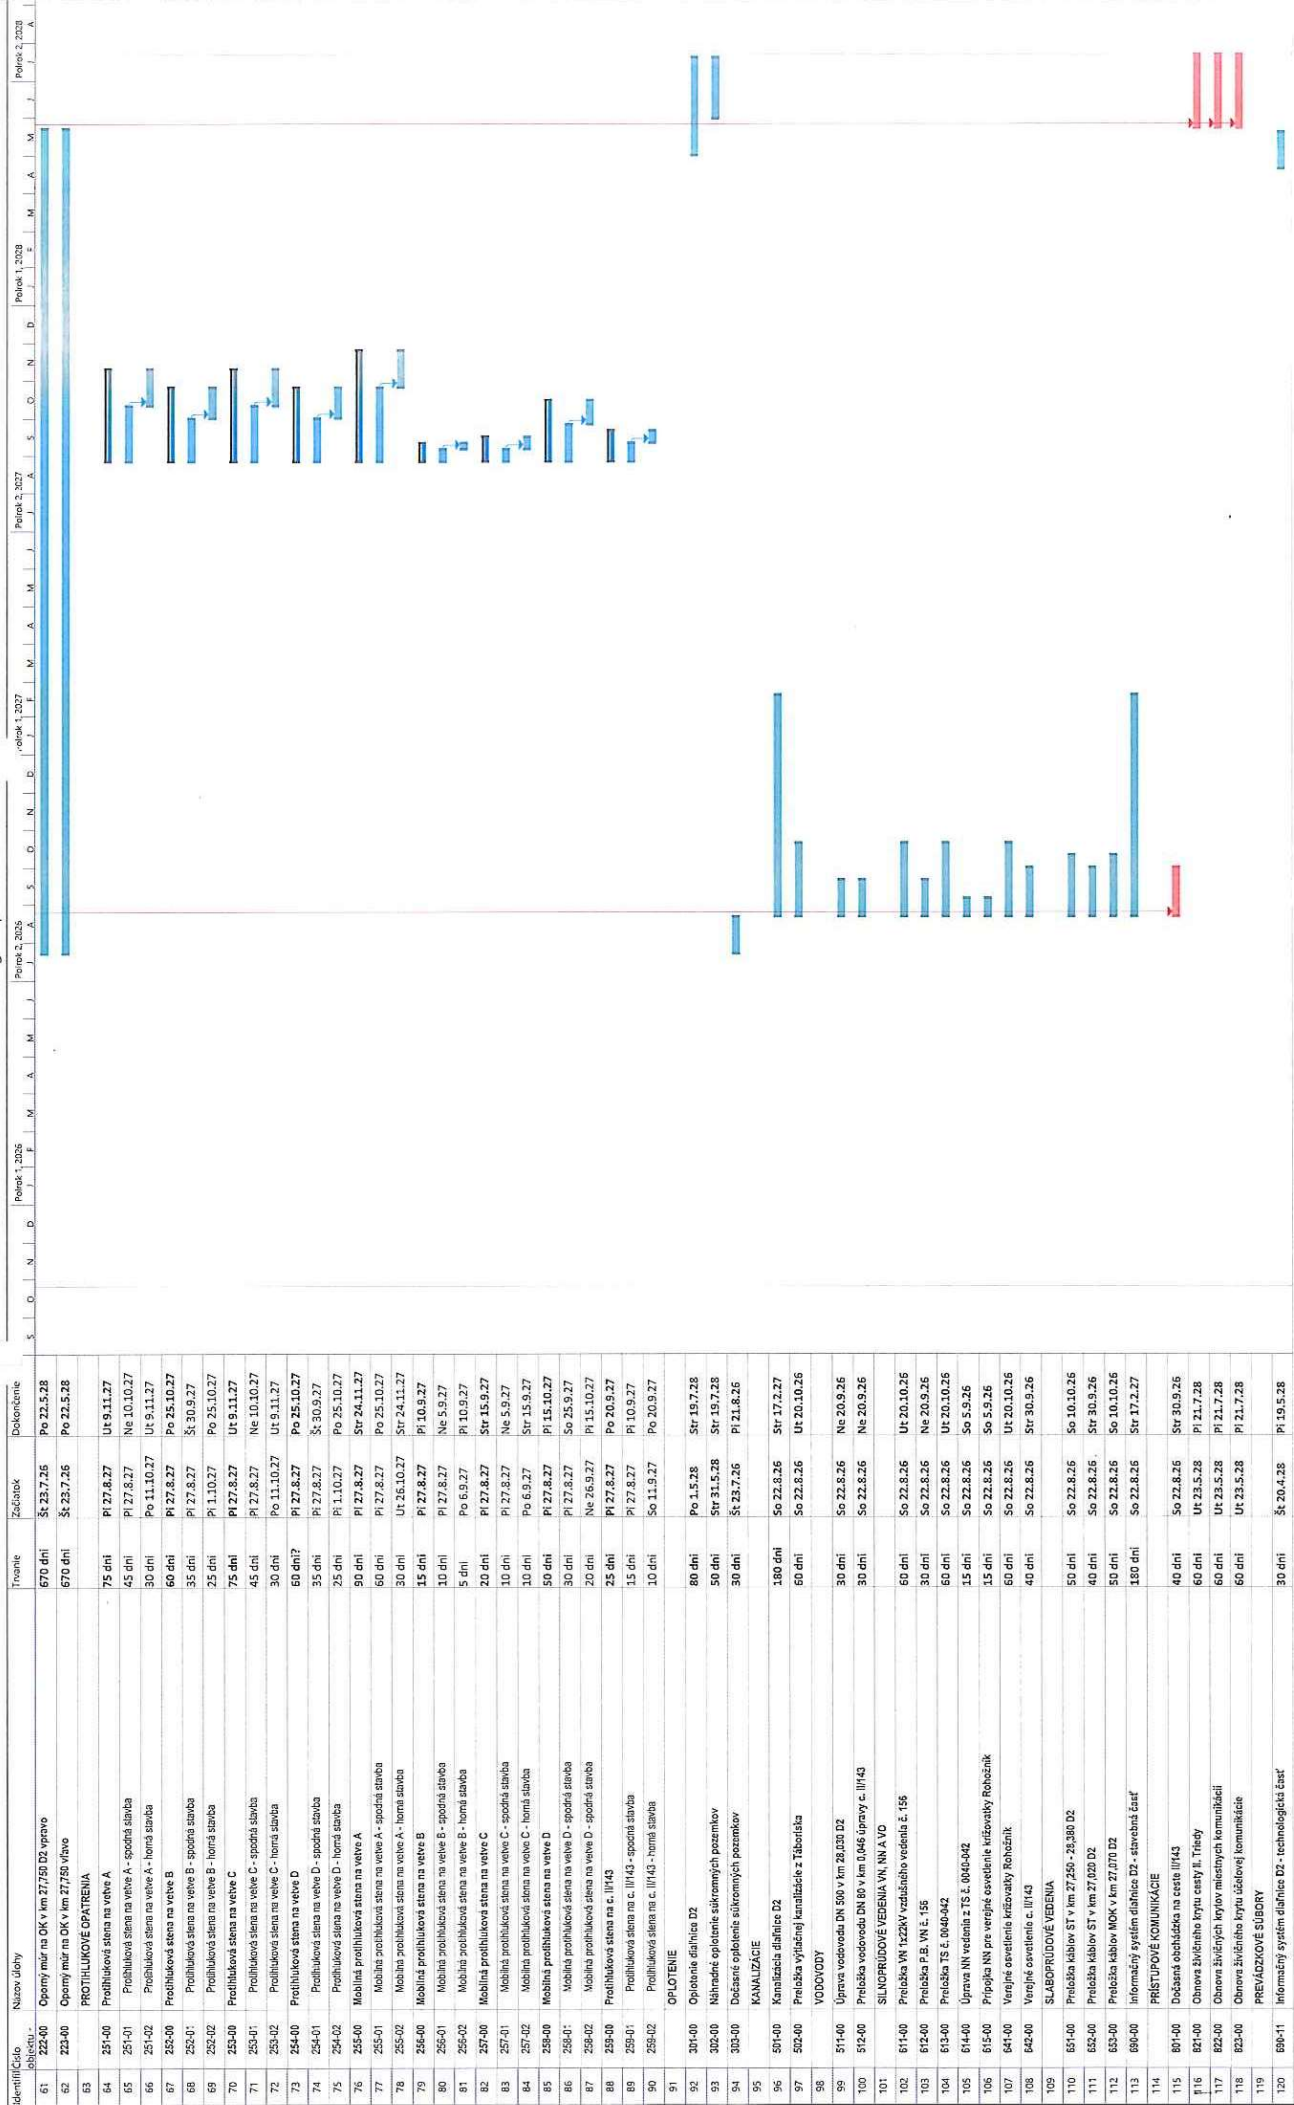

 Projekt: D2 križovatka Rohožník Dňa: 11.12.25	Úloha	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Rozsah	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Mazník	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Sum	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Strana 2														
