

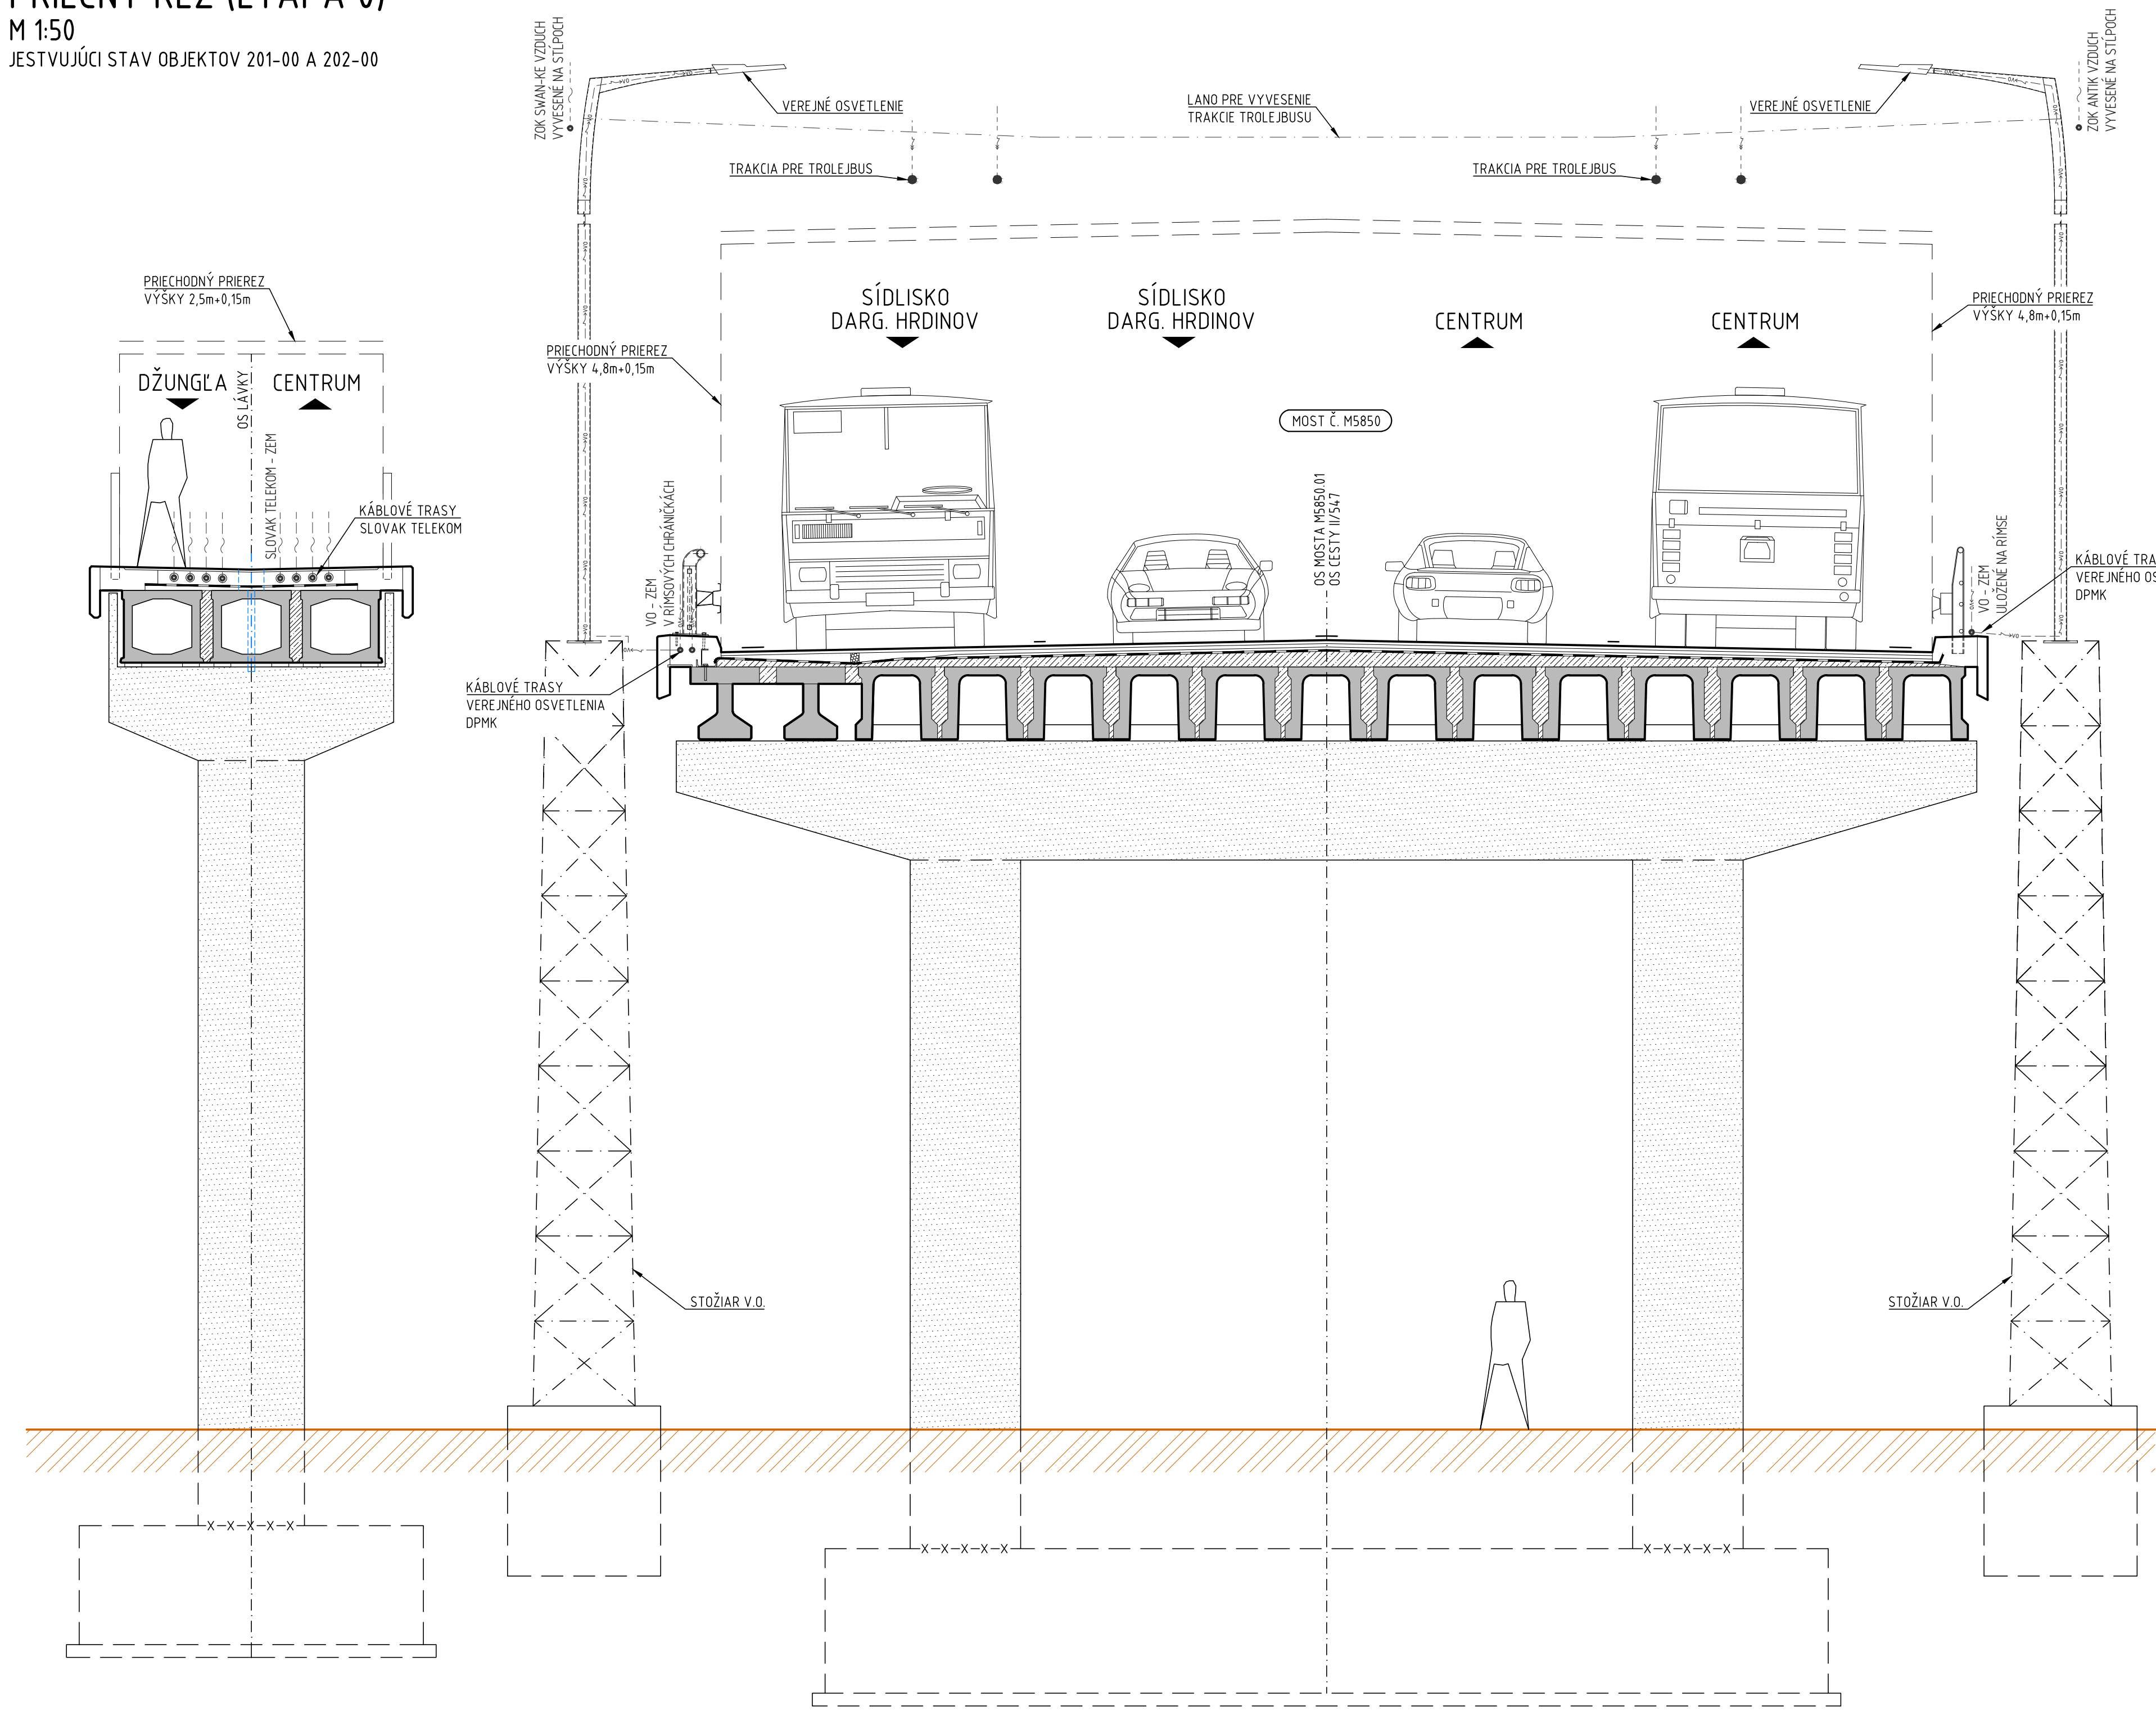


PRIEČNY REZ (ETAPA 0)
M 1:50
JEŠTVUJÚCI STAV OBJEKTOV 201-00 A 202-00

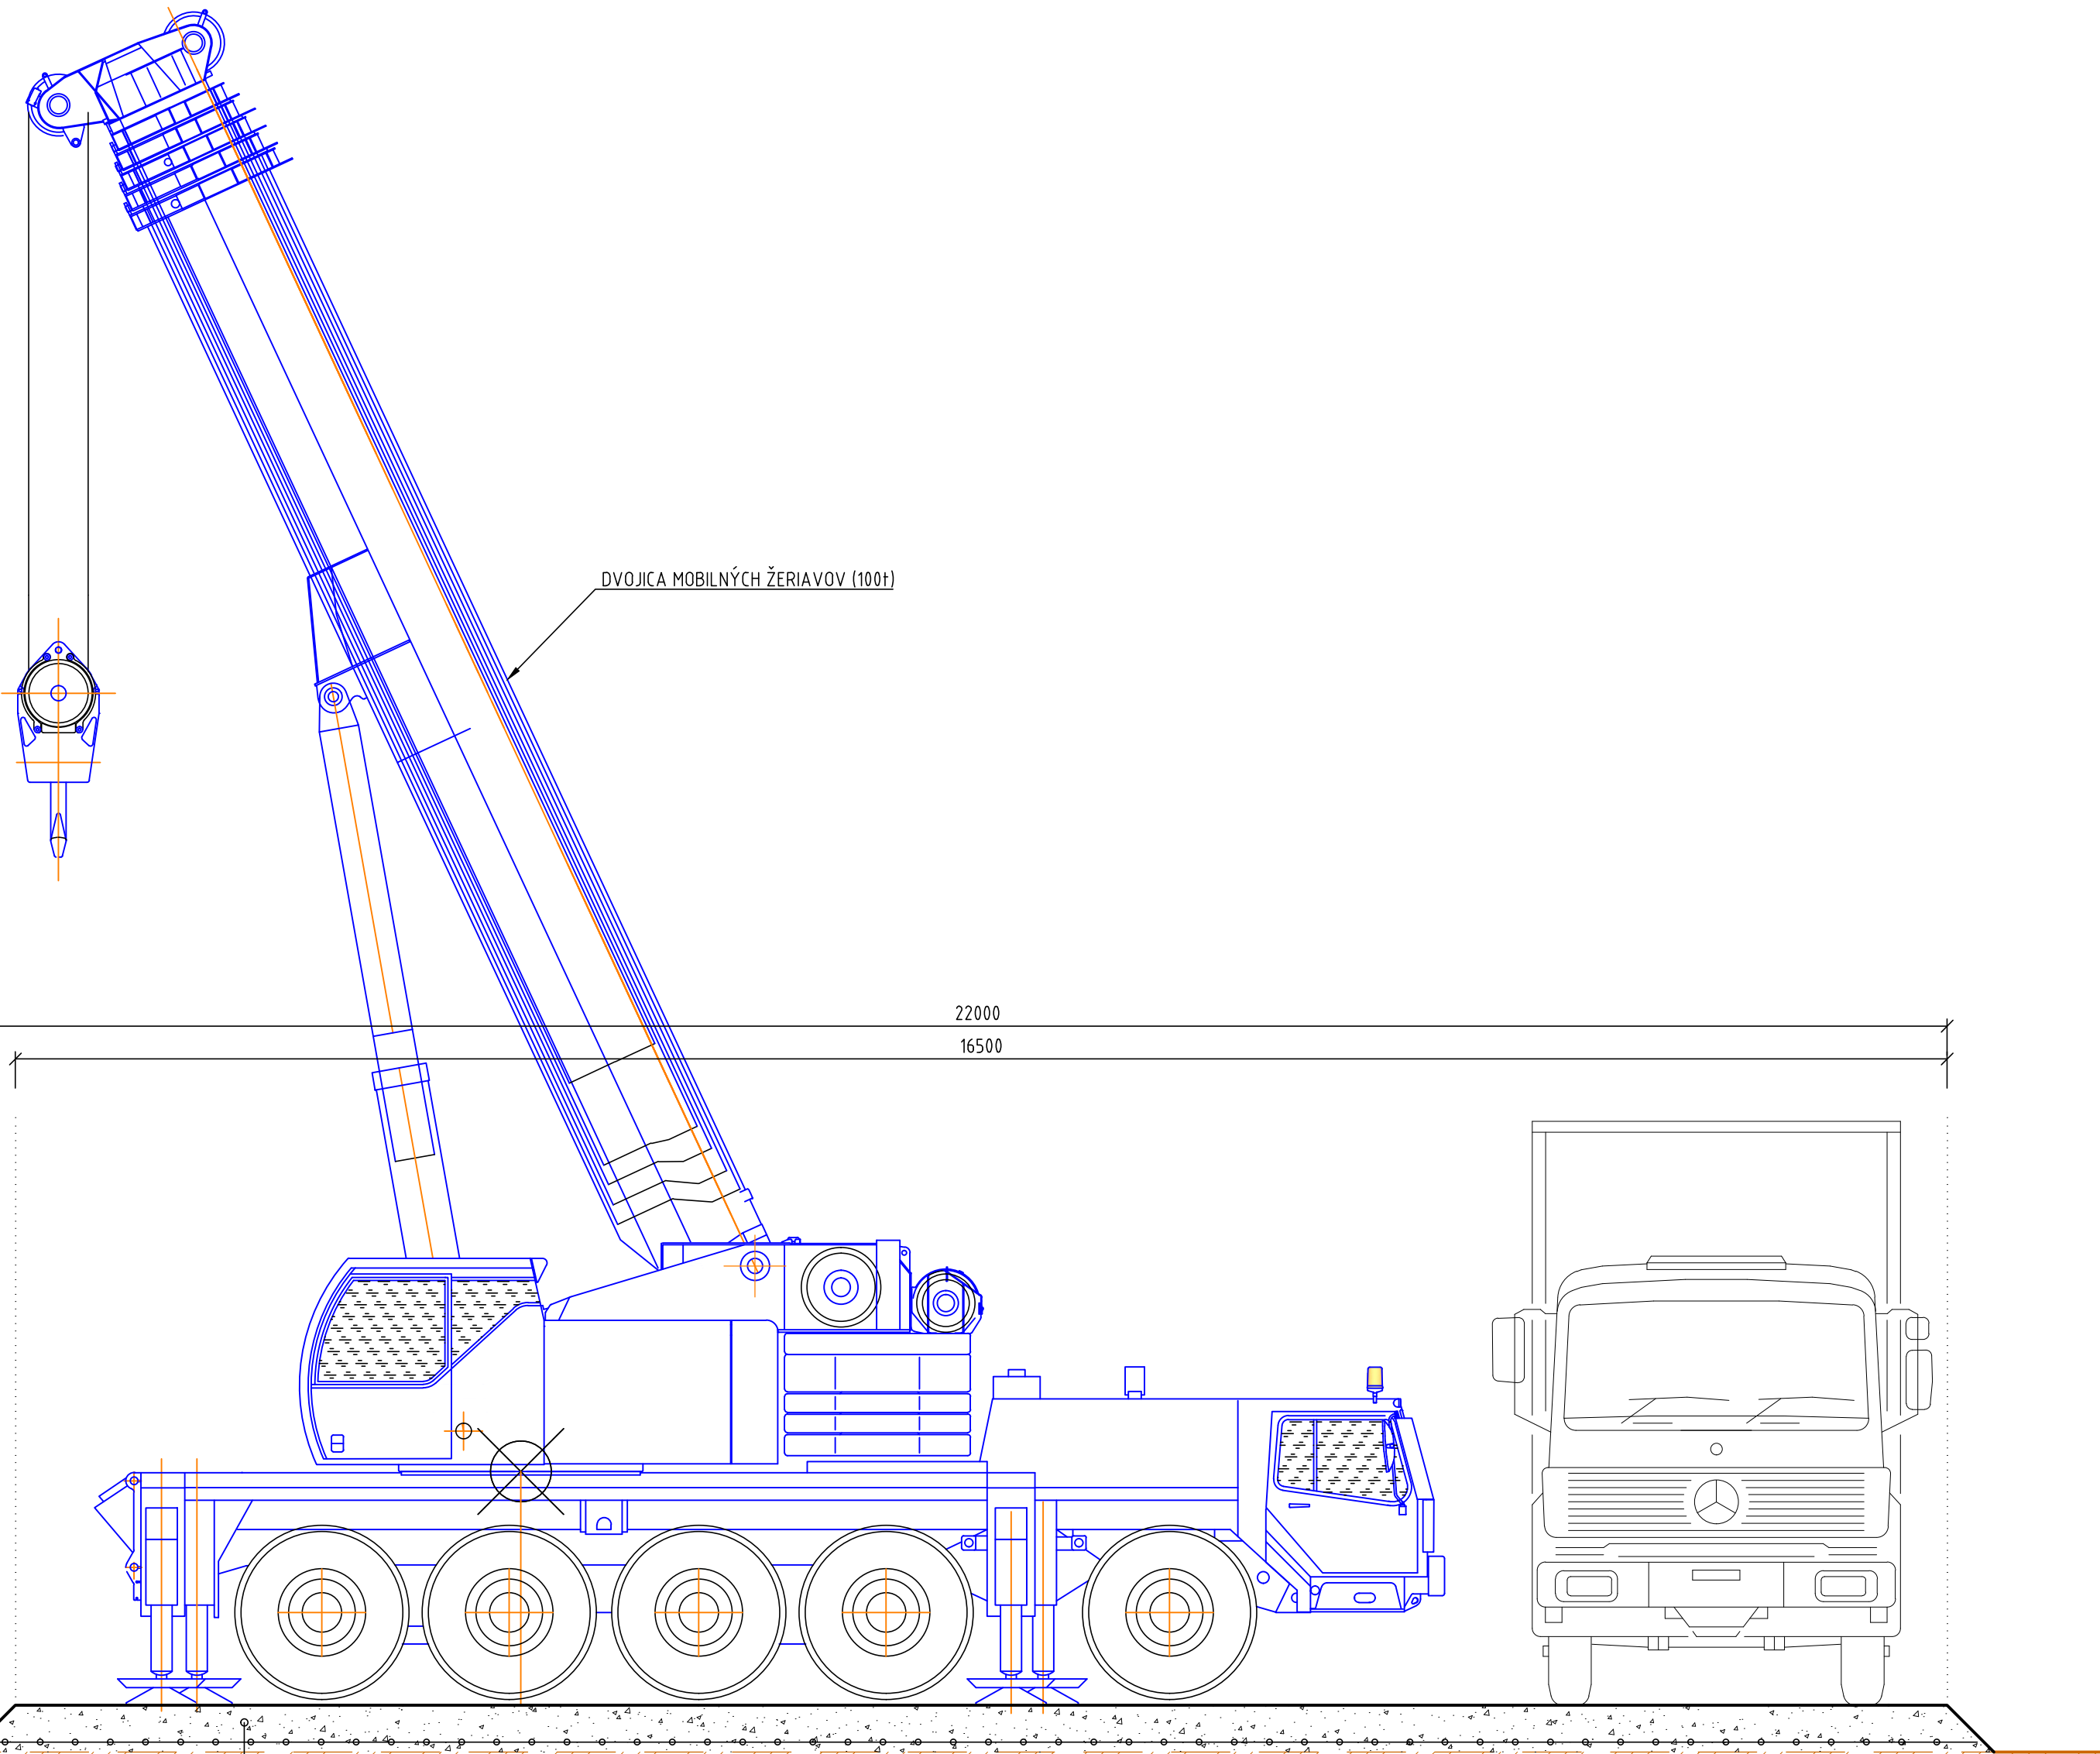


PRIEČNY REZ (ETAPA 2)
M 1:50
PRESMEROVANIE DOPRAVY NA JUŽNÚ STRANU MOSTA
A REKONŠTRUKCIA PRAVEJ (SEVERNEJ) ČASŤI MOSTA

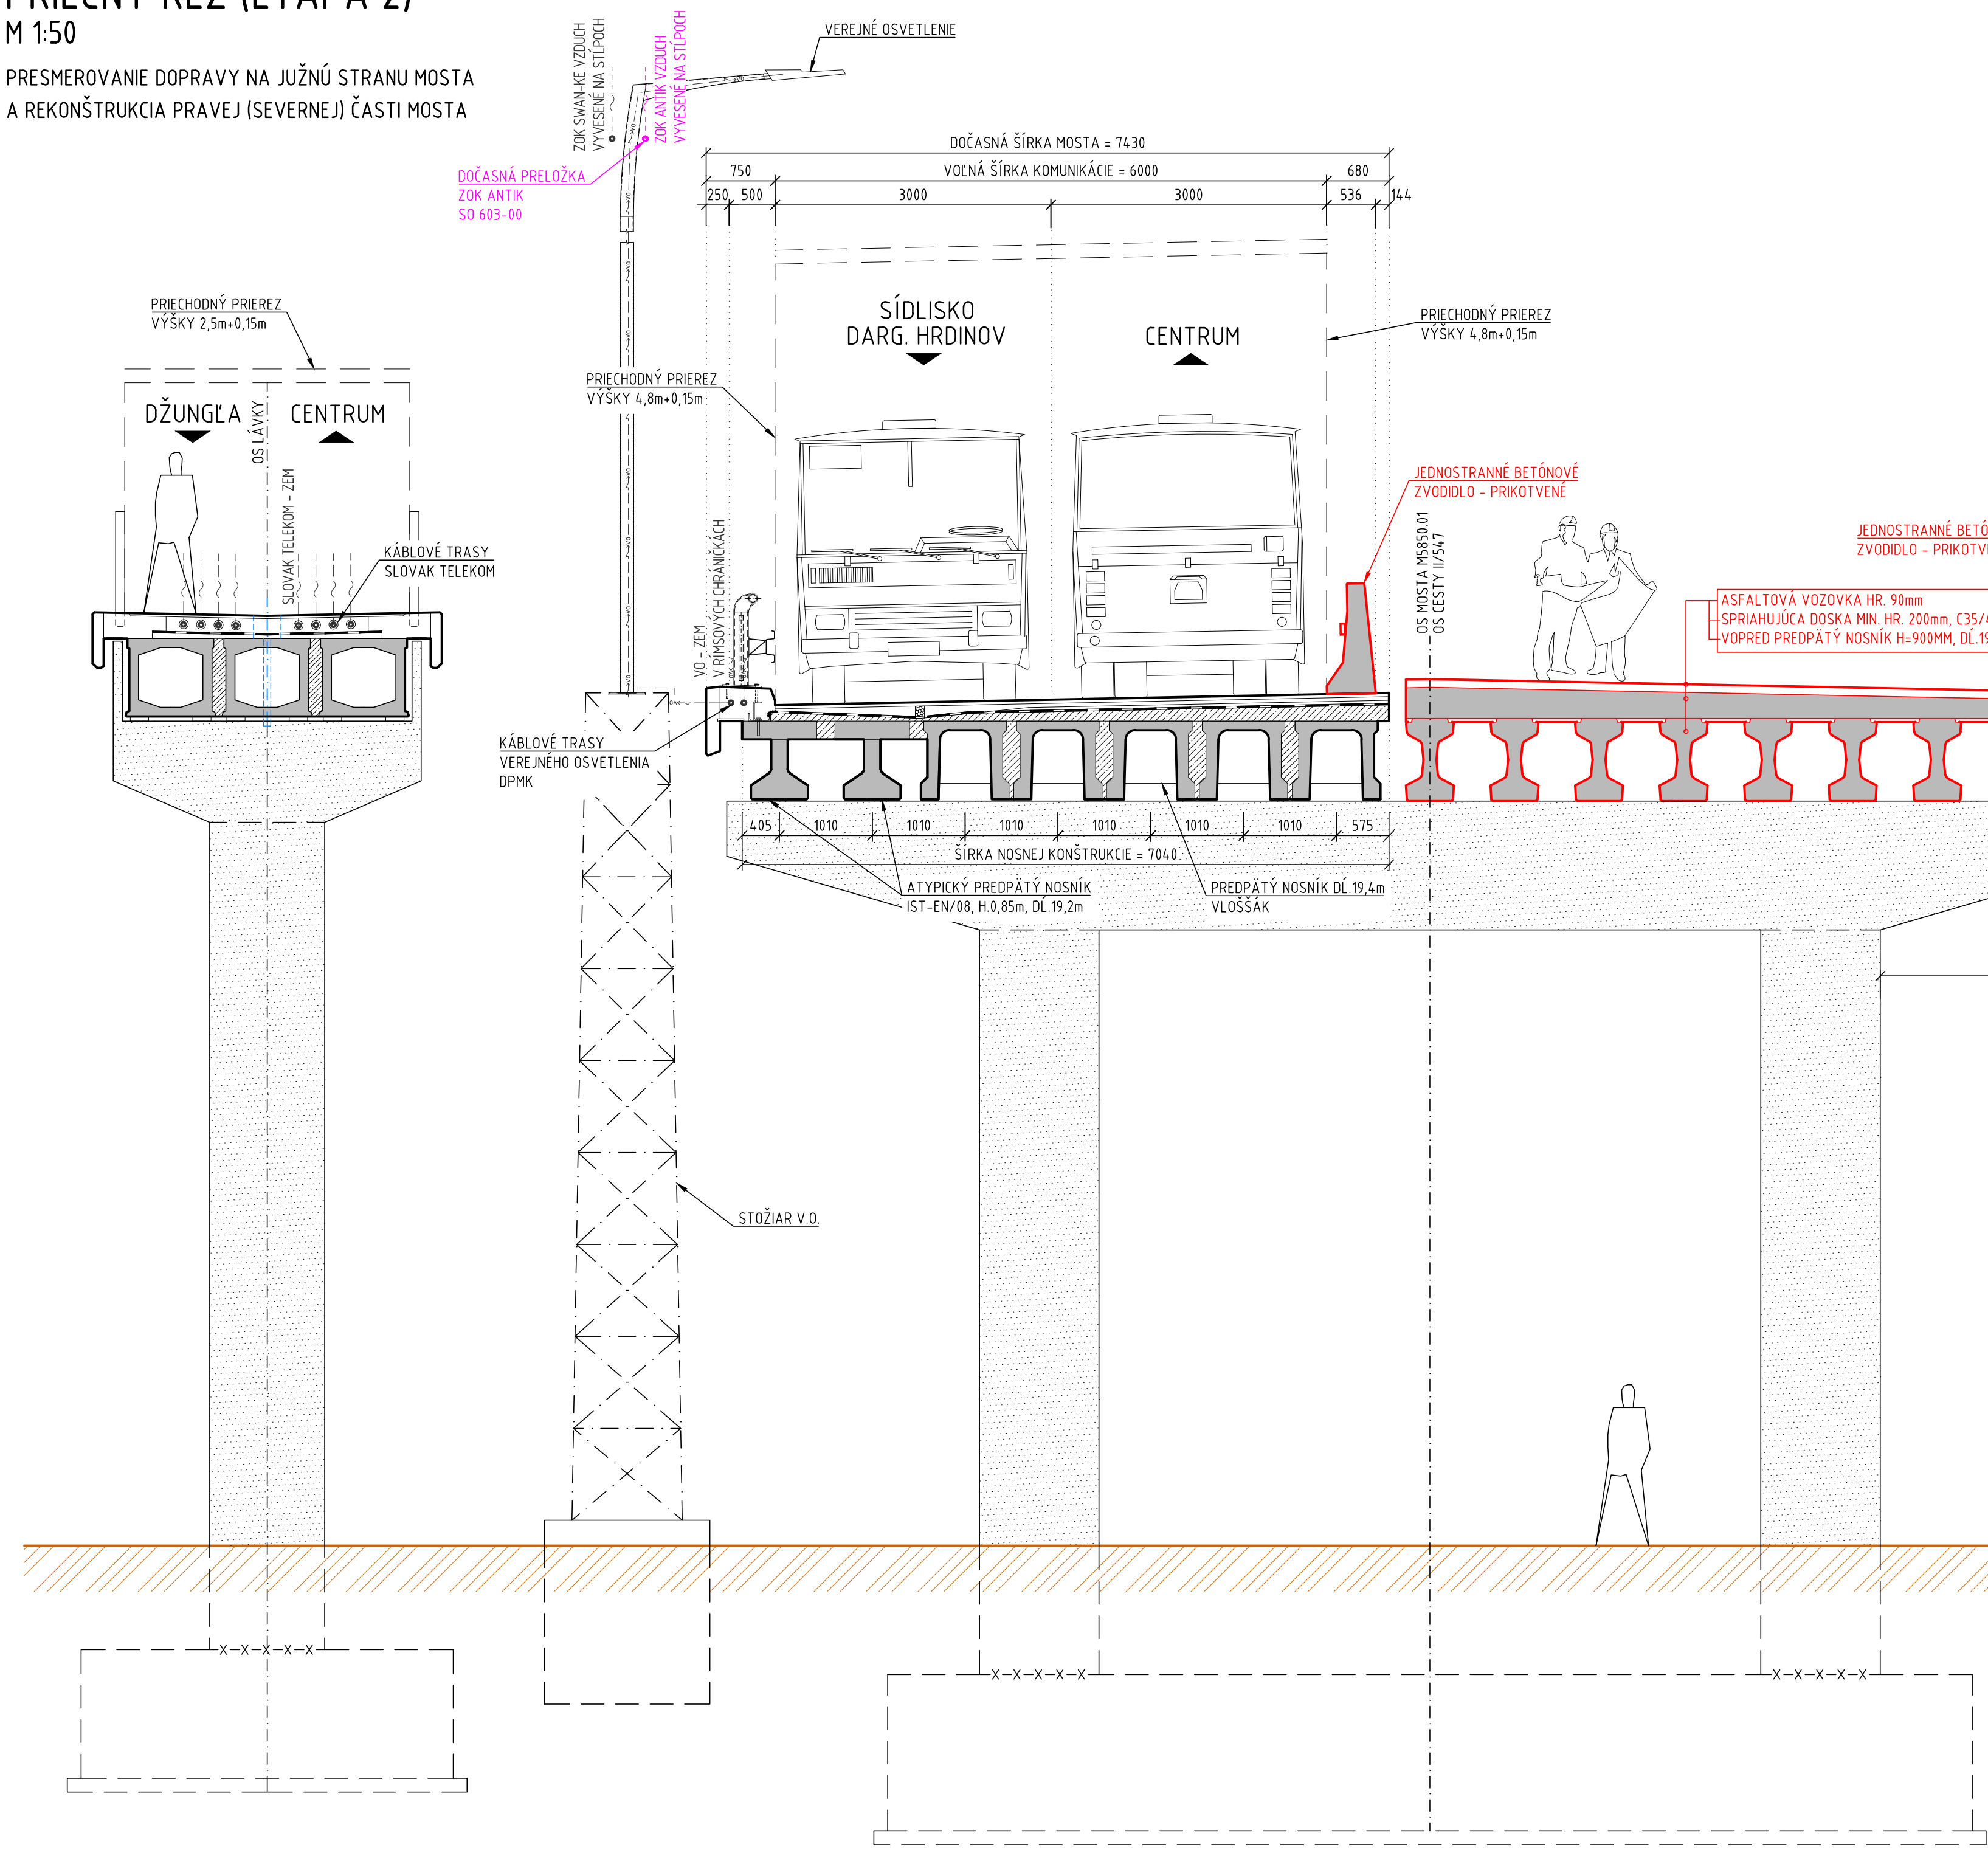


MONTÁŽNA PLOŠINA	
STROKOVNÁ HLTKENÁ	50 fr 8-63
SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA	mm 300x2
CELKOVÁ	400 mm

PRIEČNY REZ (ETAPA 1)
M 1:50
PRESMEROVANIE DOPRAVY NA STRED MOSTA
A REALIZÁCIA PRELOŽEK INŽINERSKÝCH SÍŤÍ
NA ĽAVÚ (JUŽNÚ) STRANU MOSTA

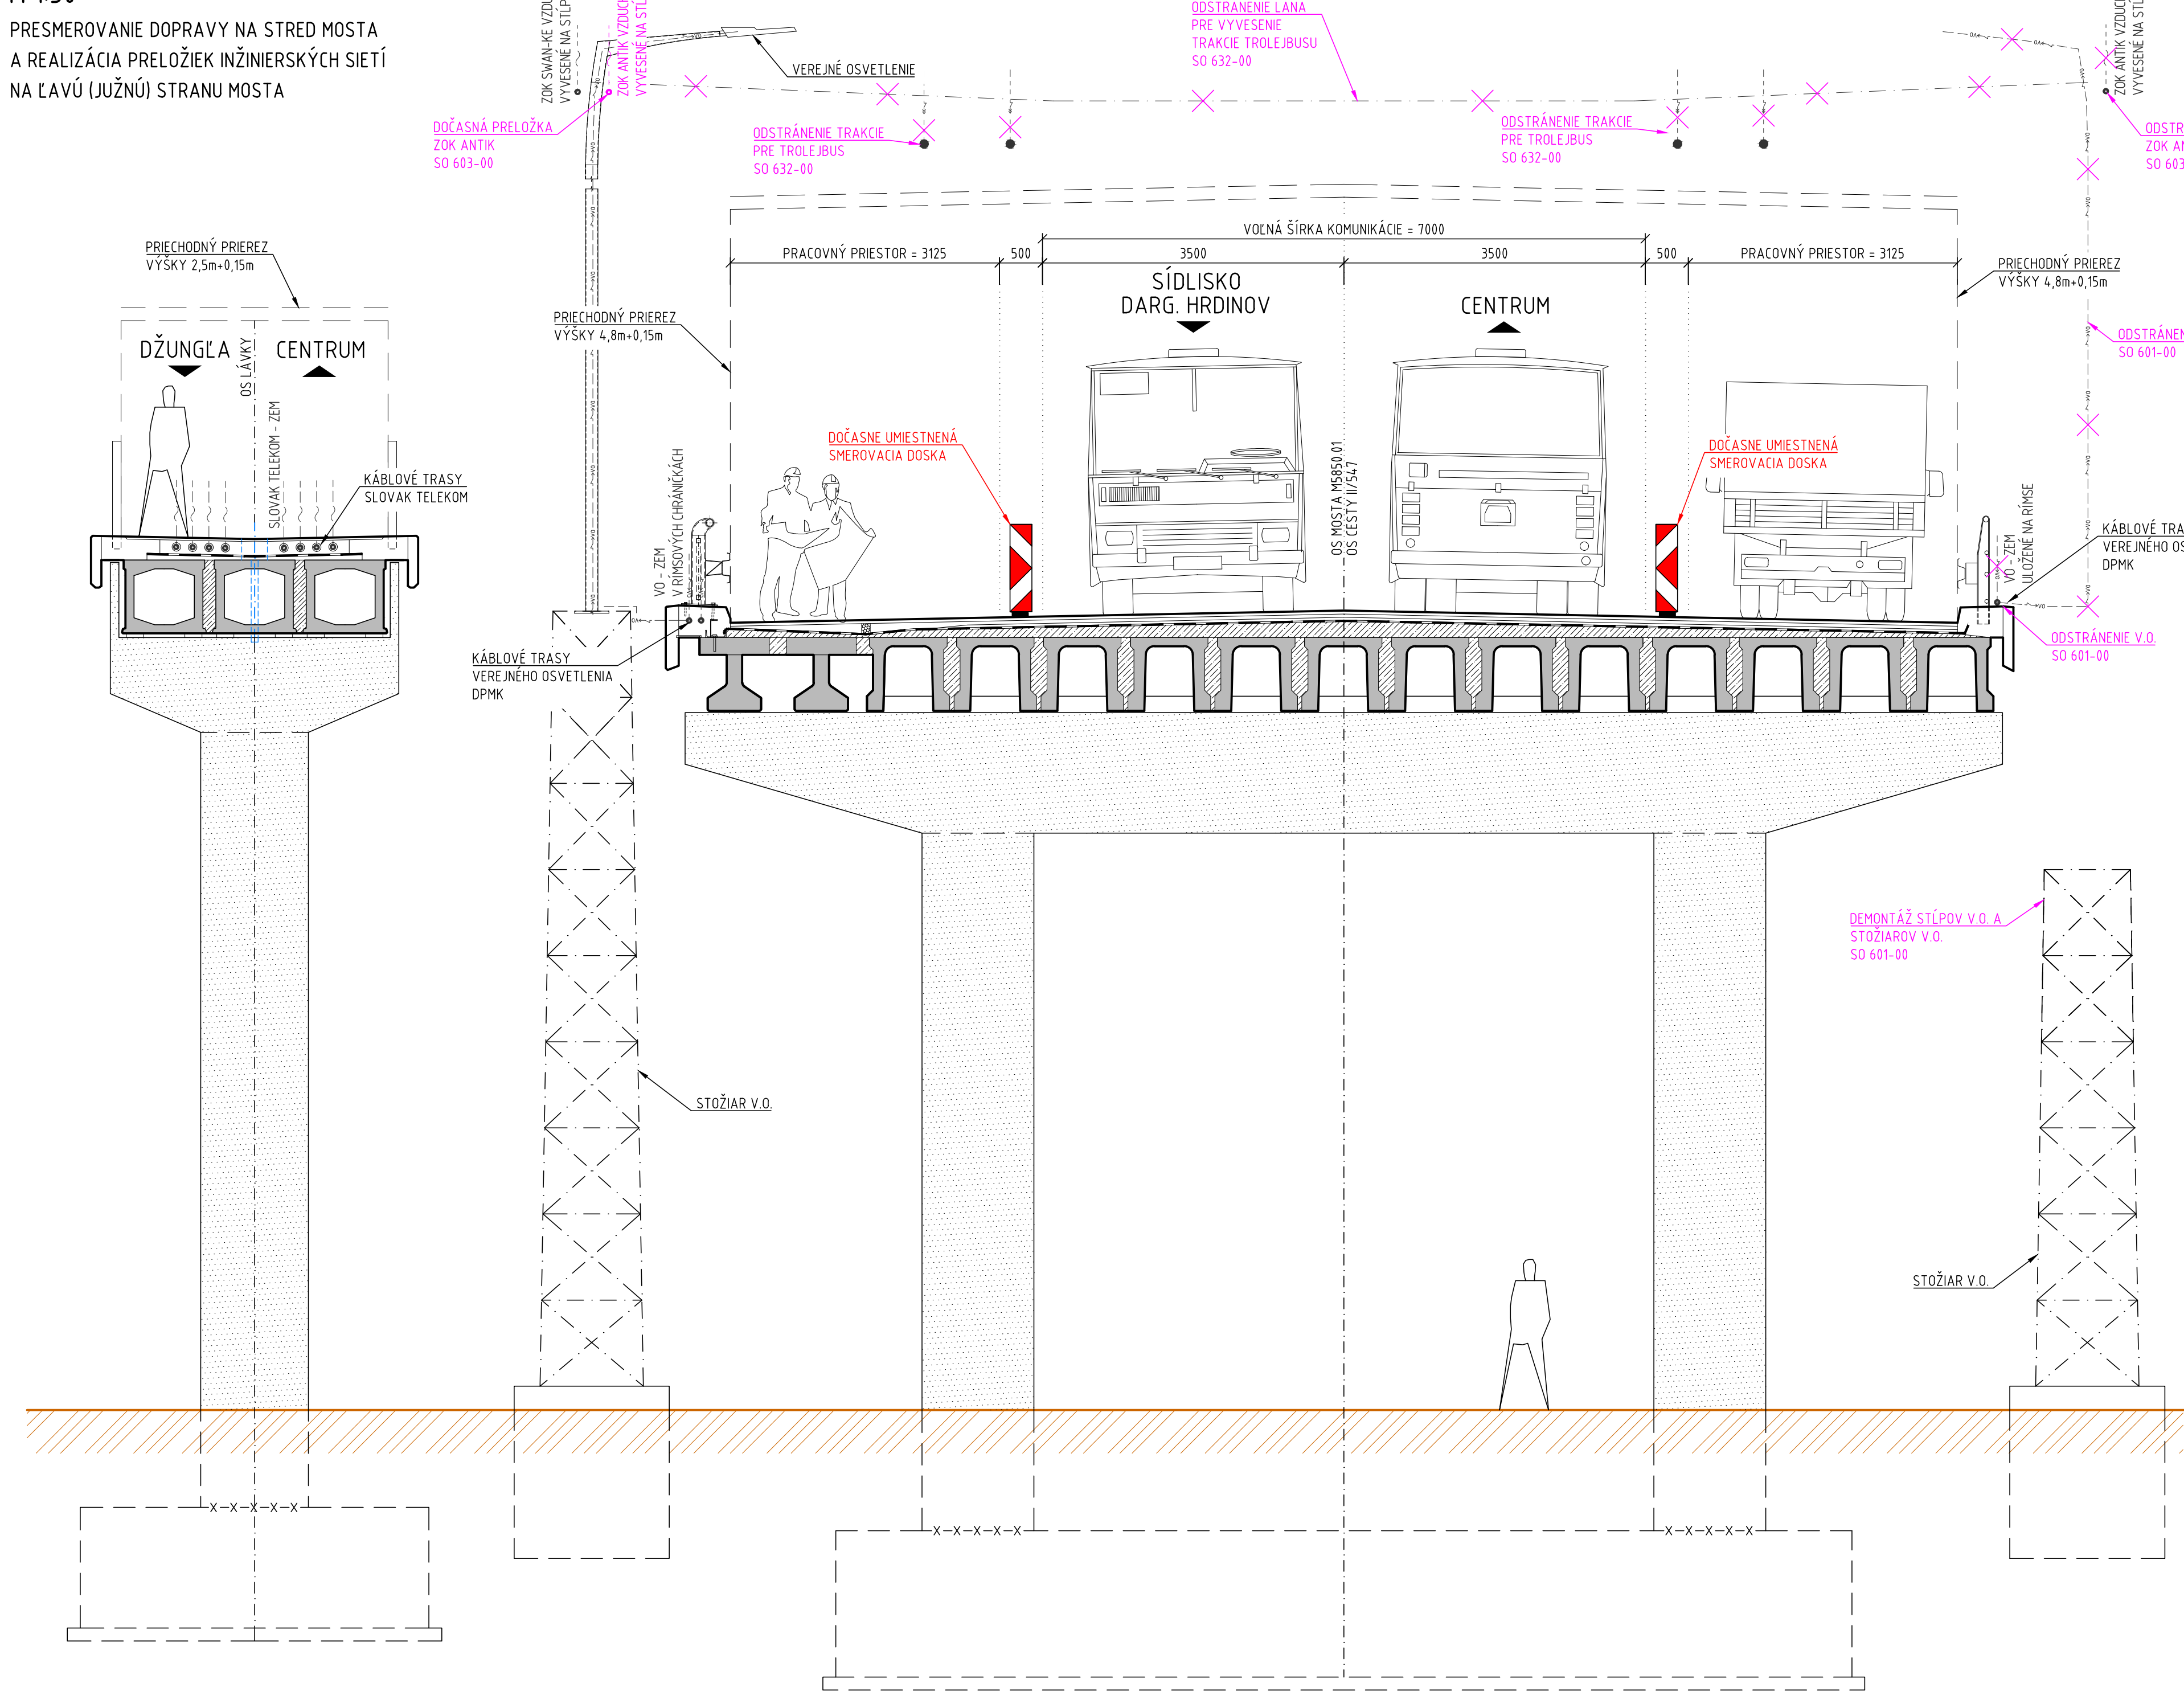

PRIEČNY REZ (ETAPA 3)
M 1:50
DOPRAVA STÁLE NA JUŽNEJ STRANE MOSTA
A REALIZÁCIA PRELOŽEK INŽINERSKÝCH SÍŤÍ
NA PRAVÚ (SEVERNÚ) ČASŤ MOSTA.
UZAVRETIE LÁVKY SO 202-00.
PRE CHODOV JE ZABEZPEČENÁ BEZPLATNÁ
MEDZICESTÁVKOVÁ PREPRAVA MHD

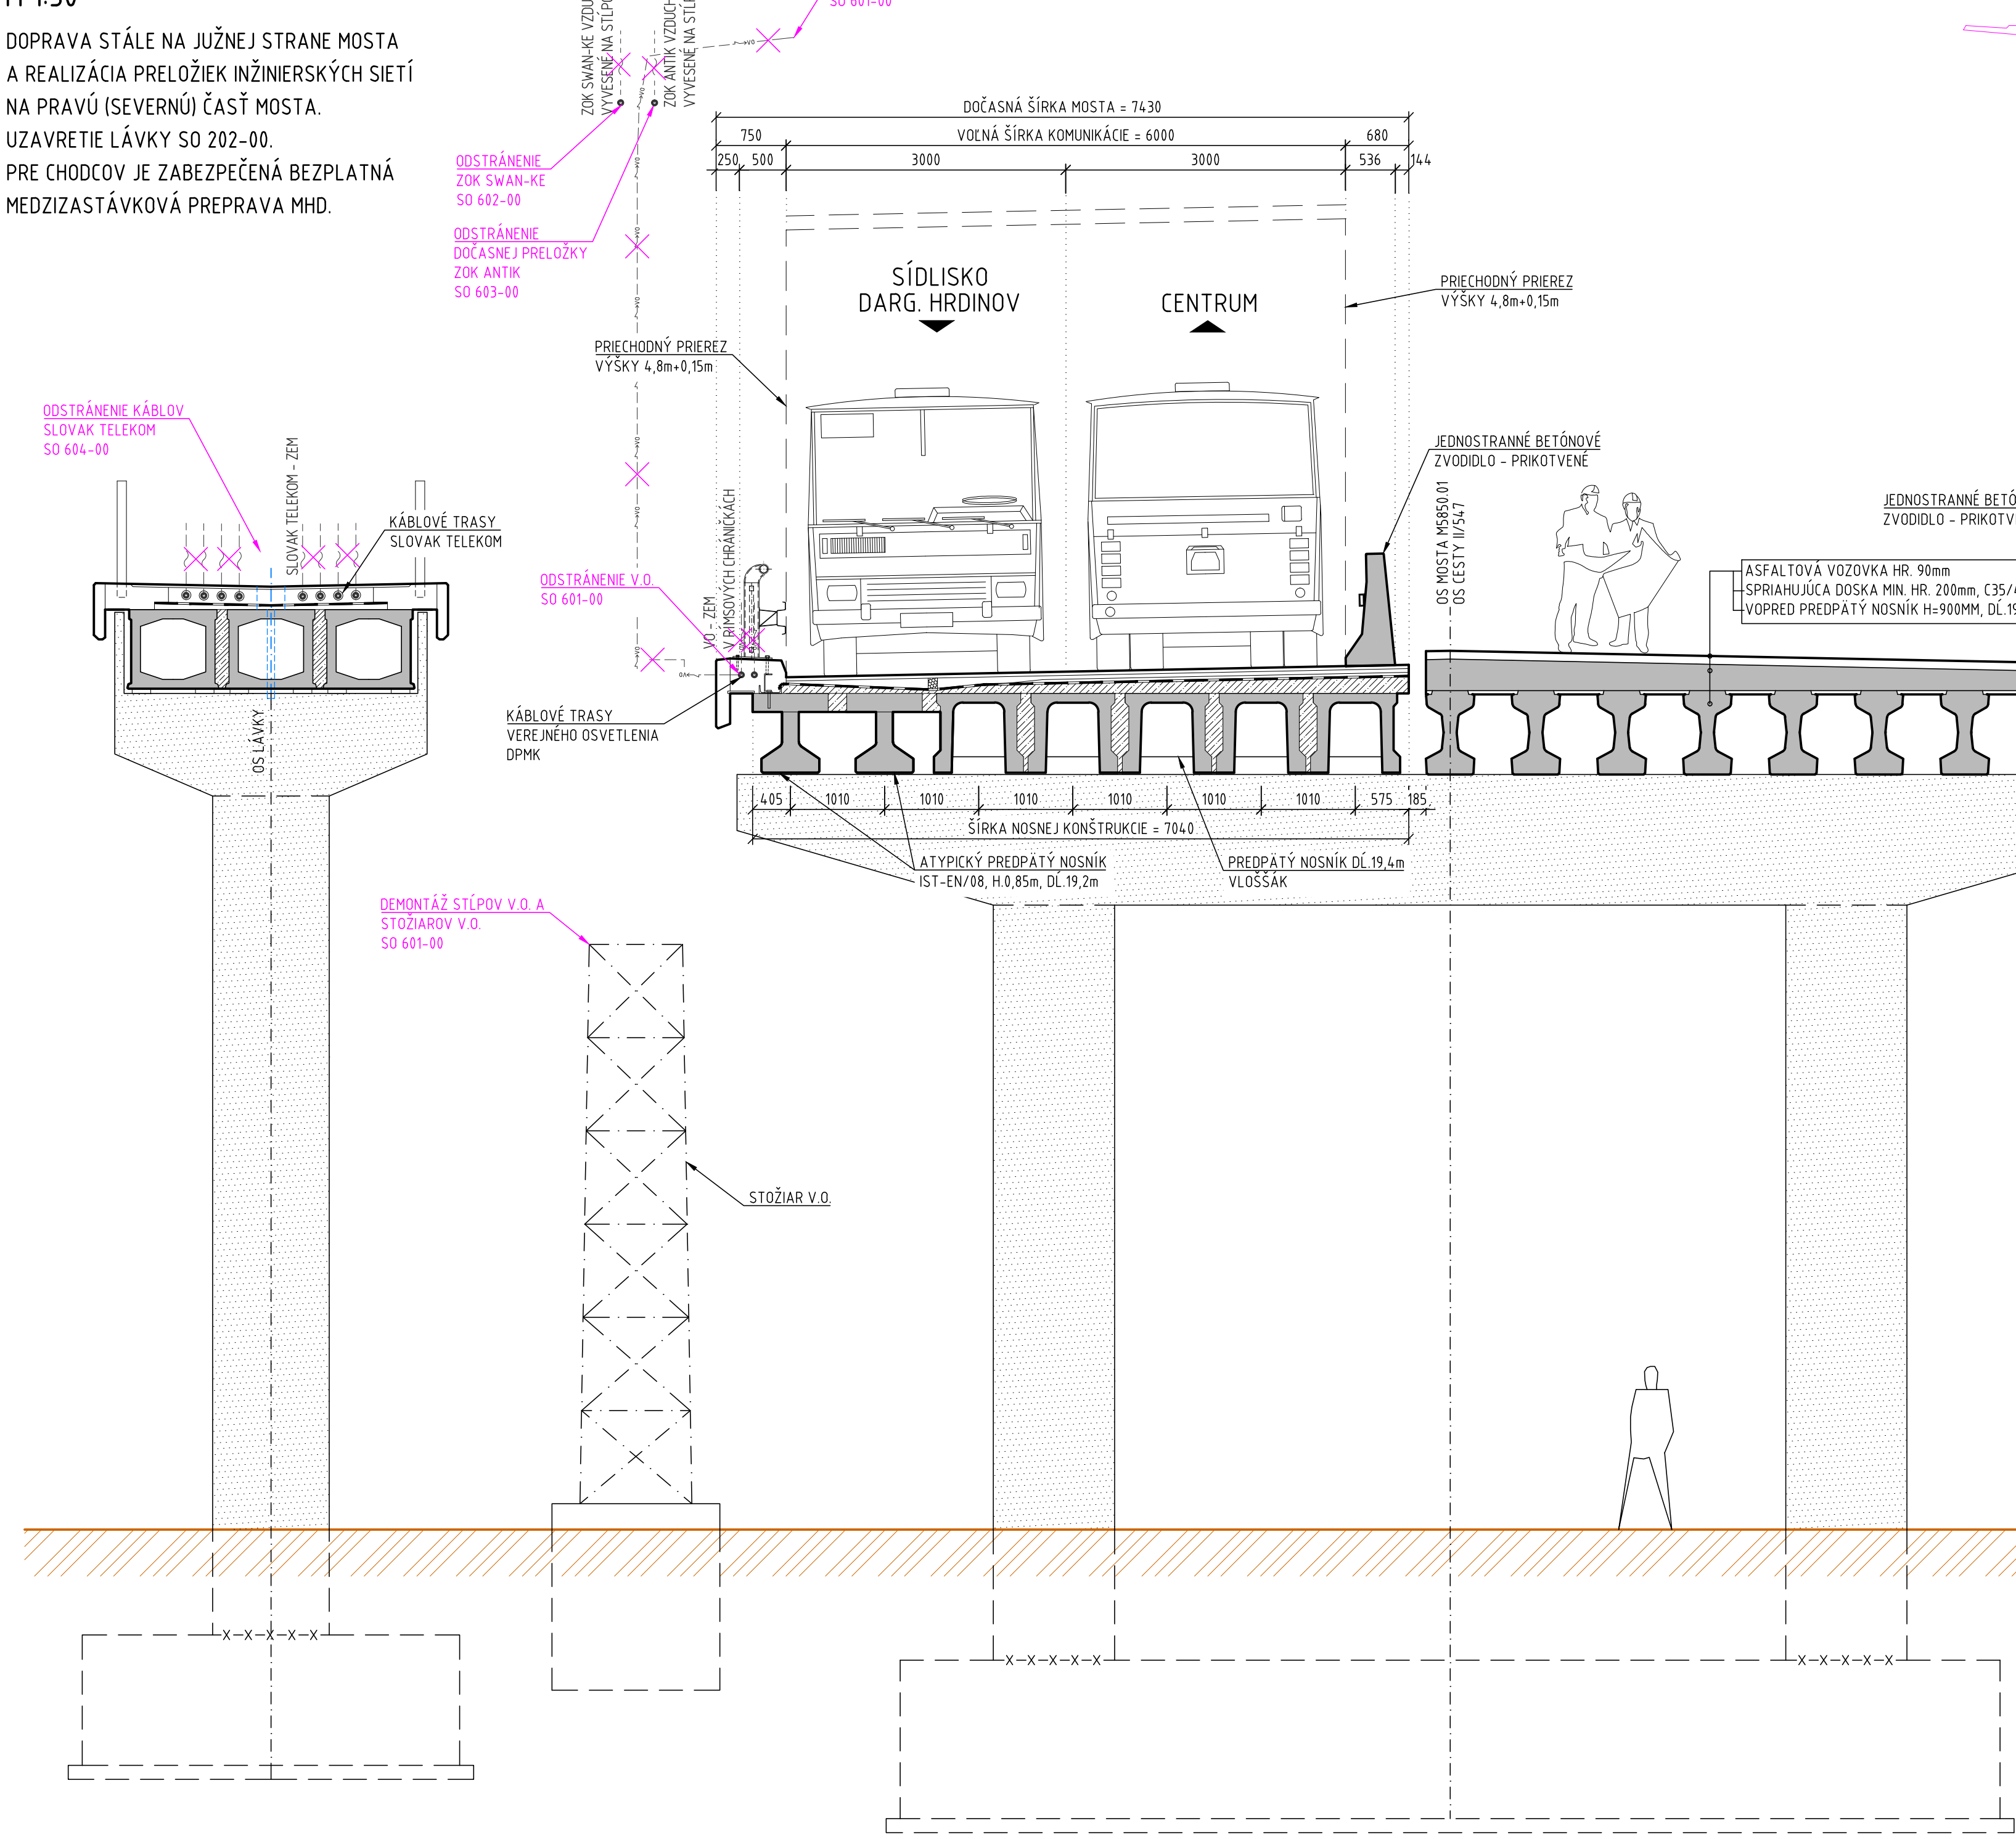

POSTUP VÝSTAVBY

ETAPA 0

- PREVÁŽATE STAVEBNIA A PRÍPRAVA STAVEBNIA
- VÝTVYBENIE HRANIE STAVEBNIA A PRÍLOH JEŠTVUJÚCH INŽINERSKÝCH SÍŤÍ
- ZRADEK STAVEBNIA
- VÝŠKA STŮPĚ A KŮBY V OBLASTI STAVEBNIA
- ZRADEK VÍAZOV Z MESTNÝCH KOMUNIKÁCI NA BUDÚCE MONTÁŽNE PLOŠINY IUL DOPRAVNÁ A UL PRI HATI
- ZRADEK VÝTVYBOVCE SÍŤE STAVBY

ETAPA 1

- PRESMEROVANIE CESTNEJ DOPRAVY DOZ NA STRED MOSTA
- CHODCI A CYKLISTI VÝŽIVAJÚ JEŠTVUJÚ LÁVKU
- REALIZÁCIA TORNEJNE MONIČNÉ PLOŠINY NA SEVERNEJ STRANE MOSTA A VYHOTOVENIE OCHRANY KÁBLOV V MESTACH PODZEMNÝCH VEDENÍ ŽSR (201-00)
- OČIŠŤENIE CESTNEJ DOPRAVY A PRACOVNÉHO PRIESTORU NA SEVERNEJ STRANE MOSTA PRÍKRYTÝM BETONOVÝM ZVODILOM
- OSTRANENIE JEŠTVUJÚCH ZVODIEL VÝBĚRANIE PRAVOSTRANNE ŽB RÔNY, ASFALTOVÝCH VÝSTVETV MOSTA, VÝSTVETV SPADOVÝCH BETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, MOSTNÝCH ODVOZOVACÍCH A MOSTNÝCH ZÁVEROV (201-00)
- OSTRANENIE ASFALTOVÝCH VÝSTVETV V BLÍZKOSTI MOSTNÉHO TELESÁ (201-00)
- VÝKOP V PŘECHODOVÝCH OBLASTI MOSTA A VÝBĚRANIE ZÁVEROVÝCH MŮSTKOV (201-00)
- POSTUPNÉ NABEZPĚČENIE PODZEMNÝCH KÁBLOV MEZI MOSTNÝMI TYPY VÝŠKAMI A NÁSLEDNÉ OSTRANENIE VŠETKÝCH JEŠTVUJÚCH MOSTNÝCH (201-00)
- ÚPRAVA ÚČETNÝCH PRÁVNIKY NA OPRÁCH A PŘESKOC (201-00)
- DOPRAVA VP MOSTNÝCH NA STAVEBNIA A POSTUPNÁ MONTÁŽ VP MOSTNÝCH DVOJKOU MOBILNÝCH ŽERÁKOV (201-00)
- VYHOTOVENIE STÁTNÉHO DEJENIA, ILOŽENIE BETONARSKÉ VÝSTVETV, BETONÁŽ OPRÁHUJÚCEJ DOSKY A MONIČNÝCH, ELEKTRODŮVÝCH ODVOZOVACÍCH ŽLÁB (201-00)
- REALIZÁCIA NOVÝCH ZÁVEROVÝCH MŮSTKOV A DOBĚTNÁVKA MOSTNÝCH KŮDEL (201-00)
- VYHOTOVENIE PŘECHODOVÝCH OBLASTI MOSTA (201-00)
- ZRADEK DOČASNÉ OCHRANY TRATE ŽSR ZREALIZOVANÉ J Z PODVESEJ, DŘEVENÉ KONŠTRUKCE UCHYTENÉJ UZEMNÝM ILOŽNÝM TYČAMI (201-00)
- OSTRANENIE MESTNÝCH ZÁVEROV (201-00)
- VYHOTOVENIE ILOŽNÉ MOSEJ KONŠTRUKCE (201-00)
- POBLAŽKA ASFALTOVÝCH MESTNÝCH KŮDEL (201-00)
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PŘÍSLUŠNÉHO ÚSEKU CESTY A POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VÝSTVETV VÝZKOVÝ (201-00)
- ILOŽENIE JEŠTVUJÚCH BETONOVÝCH ZVODIEL A ILOŽENIE STAVBY NA SEVERNEJ STRANE MOSTA (201-00)
- OSTRANENIE DOČASNÉ OCHRANY TRATE ŽSR (201-00)
- STATICKÁ KŮŠKA ZREKONŠTRUVANÉJ ČASŤI MOSTA (201-00)

ETAPA 2

- PRESMEROVANIE CESTNEJ DOPRAVY DOZ NA JUŽNÚ STRANU MOSTA
- CHODCI A CYKLISTI VÝŽIVAJÚ JEŠTVUJÚ LÁVKU
- REALIZÁCIA TORNEJNE MONIČNÉ PLOŠINY NA SEVERNEJ STRANE MOSTA A VYHOTOVENIE OCHRANY KÁBLOV V MESTACH PODZEMNÝCH VEDENÍ ŽSR (201-00)
- OČIŠŤENIE CESTNEJ DOPRAVY A PRACOVNÉHO PRIESTORU NA SEVERNEJ STRANE MOSTA PRÍKRYTÝM BETONOVÝM ZVODILOM
- OSTRANENIE JEŠTVUJÚCH ZVODIEL VÝBĚRANIE PRAVOSTRANNE ŽB RÔNY, ASFALTOVÝCH VÝSTVETV MOSTA, VÝSTVETV SPADOVÝCH BETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, MOSTNÝCH ODVOZOVACÍCH A MOSTNÝCH ZÁVEROV (201-00)
- OSTRANENIE ASFALTOVÝCH VÝSTVETV V BLÍZKOSTI MOSTNÉHO TELESÁ (201-00)
- VÝKOP V PŘECHODOVÝCH OBLASTI MOSTA A VÝBĚRANIE ZÁVEROVÝCH MŮSTKOV (201-00)
- POSTUPNÉ NABEZPĚČENIE PODZEMNÝCH KÁBLOV MEZI MOSTNÝMI TYPY VÝŠKAMI A NÁSLEDNÉ OSTRANENIE VŠETKÝCH JEŠTVUJÚCH MOSTNÝCH (201-00)
- ÚPRAVA ÚČETNÝCH PRÁVNIKY NA OPRÁCH A PŘESKOC (201-00)
- DOPRAVA VP MOSTNÝCH NA STAVEBNIA A POSTUPNÁ MONTÁŽ VP MOSTNÝCH DVOJKOU MOBILNÝCH ŽERÁKOV (201-00)
- VYHOTOVENIE STÁTNÉHO DEJENIA, ILOŽENIE BETONARSKÉ VÝSTVETV, BETONÁŽ OPRÁHUJÚCEJ DOSKY A MONIČNÝCH, ELEKTRODŮVÝCH ODVOZOVACÍCH ŽLÁB (201-00)
- REALIZÁCIA NOVÝCH ZÁVEROVÝCH MŮSTKOV A DOBĚTNÁVKA MOSTNÝCH KŮDEL (201-00)
- VYHOTOVENIE PŘECHODOVÝCH OBLASTI MOSTA (201-00)
- ZRADEK DOČASNÉ OCHRANY TRATE ŽSR ZREALIZOVANÉ J Z PODVESEJ, DŘEVENÉ KONŠTRUKCE UCHYTENÉJ UZEMNÝM ILOŽNÝM TYČAMI (201-00)
- OSTRANENIE MESTNÝCH ZÁVEROV (201-00)
- VYHOTOVENIE ILOŽNÉ MOSEJ KONŠTRUKCE (201-00)
- POBLAŽKA ASFALTOVÝCH MESTNÝCH KŮDEL (201-00)
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PŘÍSLUŠNÉHO ÚSEKU CESTY A POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VÝSTVETV VÝZKOVÝ (201-00)
- ILOŽENIE JEŠTVUJÚCH BETONOVÝCH ZVODIEL A ILOŽENIE STAVBY NA SEVERNEJ STRANE MOSTA (201-00)
- OSTRANENIE DOČASNÉ OCHRANY TRATE ŽSR (201-00)
- STATICKÁ KŮŠKA ZREKONŠTRUVANÉJ ČASŤI MOSTA (201-00)

ETAPA 3

- CESTNÁ DOPRAVA OŠŤAVA PRESMEROVANÁ DOZ NA JUŽNÚ STRANU MOSTA
- JEŠTVUJÚ LÁVKA SA UŽIŤA (202-00)
- PRE CHODOV JE ZABEZPEČENÁ BEZPLATNÁ MEDZICESTÁVKOVÁ PREPRAVA MHD
- BEZPLATNÁ DOPRAVA BUDE ZABEZPEČENÁ MEDZICESTÁVKAMI TESCO, OŽUNGIA, PRI HATI
- OSTRANENIE NOVÝCH STŮPĚ A STŮPĚV NA SEVERNEJ STRANE MOSTA (201-00)
- REALIZÁCIA KÁBLOVÝCH PŘELOŽKY V.O. DO KÁBLOVÝCH OHRANČEK ŽUMOV NA SEVERNEJ STRANE MOSTA (201-00)
- OSTRANENIE DOČASNÉ PŘELOŽKY ŽOK ANTIK Z JUŽNEJ STRANY MOSTA A REALIZÁCIA KÁBLOVÝCH PŘELOŽKY ŽOK ANTIK DO KÁBLOVÝCH OHRANČEK ŽUMOV NA SEVERNEJ STRANE MOSTA (201-00)
- REALIZÁCIA PŘELOŽKY ŽOK SWANK-KE DO KÁBLOVÝCH OHRANČEK ŽUMOV NA SEVERNEJ STRANE MOSTA (202-00)
- ZRADEK DOČASNÉ PŘELOŽKY KÁBLOVÝCH SLOVAK TELEKOM Ž LÁVKY NA SEVERNEJ STRANE MOSTA (201-00)
- OSTRANENIE STŮPĚV A STŮPĚV V.O. NA JUŽNEJ STRANE MOSTA (201-00)
- OSTRANENIE TĚSNÉJ MONTÁŽNÉ PLOŠINY ŽO SEVERNEJ STRANY MOSTA (201-00)
- REALIZÁCIA TORNEJNE MONIČNÉ PLOŠINY NA JUŽNEJ STRANE MOSTA A VYHOTOVENIE OCHRANY KÁBLOV V MESTACH PODZEMNÝCH VEDENÍ ŽSR (201-00)

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

- SO 010-00 PRÍPRAVA ÚZEMIA
- SO 020-00 NÁHRADNÁ VÝŠKA
- SO 101-00 ÚPRAVA CESTY II/547, HLINKOVA ULICA
- SO 102-00 ÚPRAVA CHODNÍKOV
- SO 201-00 MOST Č. M5850 NA CESTE II/547, HLINKOVA ULICA
- SO 202-00 LÁVKA PRE PEŠIEH VEDLA MOSTA M5850
- SO 601-00 PŘELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
- SO 602-00 PŘELOŽKA ZÁVESNÉHO OK SWANK-KE
- SO 603-00 PŘELOŽKA ZÁVESNÉHO OK ANTIK
- SO 604-00 PŘELOŽKA KÁBLA SLOVAK TELEKOM
- SO 605-00 PŘELOŽKA ZÁVESNÉHO OK ŽSR
- SO 631-00 DOČASNÉ PŘERUŠENIE TV, UL. DOPRAVNÁ
- SO 632-00 DOČASNÉ PŘERUŠENIE TV, UL. HLINKOVA
- SO 651-00 ÚPRAVA TRAKČNÉHO VEDENIA ŽSR
- SO 661-00 UKOLANENIE MOSTA Č. M5850
- SO 662-00 UKOLANENIE LÁVKY

202-00

VÝKONKOVÁ ING. M. JUHÁŠ	INŽ. NĚ PROJEKT ING. K. KUNDRÁT, CSc.	ODKRYVÁJ ING. M. JUHÁŠ	TECH. KONTROLA ING. K. KUNDRÁT, CSc.	ODKRYVÁJ ING. M. JUHÁŠ	TECH. KONTROLA ING. K. KUNDRÁT, CSc.
DOKUMENTACE Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 840 11	DOKUMENTACE Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 840 11	DOKUMENTACE Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 840 11	DOKUMENTACE Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 840 11	DOKUMENTACE Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 840 11	DOKUMENTACE Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 840 11
STAVBA MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE	STAVBA MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE	STAVBA MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE	STAVBA MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE	STAVBA MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE	STAVBA MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE
ČASŤ STAVBY 202-00 LÁVKA PRE PEŠIEH VEDLA MOSTA M5850	ČASŤ STAVBY 202-00 LÁVKA PRE PEŠIEH VEDLA MOSTA M5850	ČASŤ STAVBY 202-00 LÁVKA PRE PEŠIEH VEDLA MOSTA M5850	ČASŤ STAVBY 202-00 LÁVKA PRE PEŠIEH VEDLA MOSTA M5850	ČASŤ STAVBY 202-00 LÁVKA PRE PEŠIEH VEDLA MOSTA M5850	ČASŤ STAVBY 202-00 LÁVKA PRE PEŠIEH VEDLA MOSTA M5850
PRÍLOHA POSTUP VÝSTAVBY - ČASŤ 1	PRÍLOHA POSTUP VÝSTAVBY - ČASŤ 1	PRÍLOHA POSTUP VÝSTAVBY - ČASŤ 1	PRÍLOHA POSTUP VÝSTAVBY - ČASŤ 1	PRÍLOHA POSTUP VÝSTAVBY - ČASŤ 1	PRÍLOHA POSTUP VÝSTAVBY - ČASŤ 1

D
