
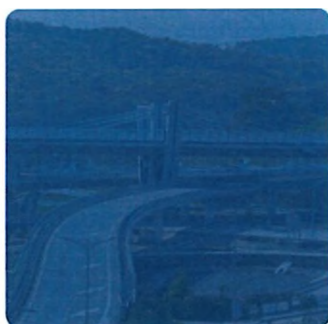
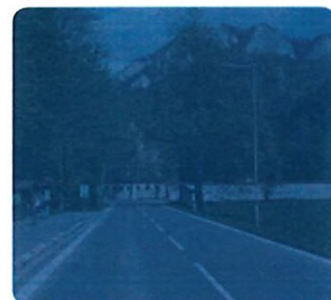
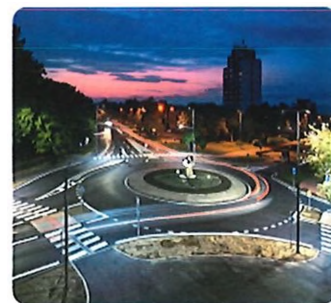


PONUKA

„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“.

Uchádzač:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice



Obsah ponuky

„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

1. Titulný list ponuky.
2. Obsah ponuky.
3. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 1
4. Čestné vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže – príloha č. 2
5. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača a o nezávislom stanovení ponuky – príloha č. 3
6. Banková záruka pdf.
7. Plnomocenstvo pre Ing. Miloša Farkaša
8. Výkaz výmer – príloha č. 6.
9. Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov.
10. Návrh zmluvy o dielo - príloha č. 8
11. Harmonogram prác pdf.
12. Zoznam stavebných prác uchádzača.
13. Referencia.
14. Banková záruka – e-forma.
15. Výkaz výmer – xls.
16. Harmonogram xls.

V Banskej Bystrici, dňa

- 9 -11- 2023



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 1 k Súťažným podkladom

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: EUROVIA SK, a.s

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31 651 518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274


Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať v mene
spoločnosti:

Názov zákazky: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

1) Kritérium č. 1: Cena za dodanie predmetu zákazky

	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH (20%)	Celková cena v EUR s DPH
Celková cena za celý predmet zákazky	1 398 058,64	279 611,73	1 677 670,37

V Banskej Bystrici, dňa - 9 - 11 - 2023


EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518 DIČ: 2020490274



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 2 Súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti:

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

týmto čestne vyhlasujem, že

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
- akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom zmluvy na predmet zákazky, vrátane všetkých jej príloh
- všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné
- predkladám len jednu ponuku:
¹ ktorú som vypracoval sám
¹ pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 ZVO:

² Meno a priezvisko osoby:

Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu alebo miesto podnikania:
IČO, ak bolo pridelené:

- na realizácii zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **áno / nie**³




LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 ZVO.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
BRB výroba, s.r.o., Bytčianska 497/126, Žilina	50928295	zvodidlá	113 600
SPOLU			

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií, alebo zamlčaných závažným spôsobom.

V Banskej Bystrici. dňa9...11- 2023


EUROVIA SK, a.s.
Cuteňová 13, 049 17 Baňka
IČO: 46042001, IČ DPH: SK2020409274

¹ uchádzač zaškrtnie políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná

² uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje

³ nehodiace sa prečiarkne



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 3 Súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača a o nezávislom stanovení ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31 651 518

Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať v mene
spoločnosti:

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom:
„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

týmto čestne vyhlasujem, že

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:
 - nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania;
 - neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;
 - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkol'vek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky v tom, že:
 - ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica


- i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní
ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti,
- 2.2 že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nespřístupnil iným konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
- 2.3 že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurenti, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespříňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
- 2.4 že ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 2.1 až 2.3 a ani sa nepokúšim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolíziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
- 2.5 že ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky uvádzam v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie¹ týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3:

.....
...XXX.....
.....

3. Ďalej vyhlasujem, že

- 3.1 všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, nekreslené a úplné
3.2 som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia
3.3 som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

V Banskej Bystrici, dňa-9-11- 2023


EUROVIA s.r.o.
Culbáčkova 69, 040 17 Matice
IČO: 47090018, DIČ: SK202045274

¹ pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
IČO: 36 038 351

Bratislava
20.10.2023

Záruka č. 959/CC/16 – BG1161

podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

Spoločnosť EUROVIA SK, a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 248/V (ďalej „**Uchádzač**“) predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásil štátny podnik LESY Slovenskej republiky, š.p., so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351 (ďalej „**Verejný obstarávateľ**“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2023 zo dňa 09.10.2023 pod označením 33134 – MSP a v zmysle súťažných podkladov, ktorého predmetom je zákazka:

**„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Pol'ana“
(ďalej „**Verejné obstarávanie**“).**

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 45.000,00.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Uchádzača

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

45.000,00 EUR

slovom: štyridsaťpäťtisíc 00/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:

- (i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo
- (ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 10 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) (ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky:

- (i) v listinnej podobe na adresu:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Špecializované financovanie / tím Obchodné financovanie
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava; alebo
- (ii) ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 03.11.2024.

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“); alebo
- (iv) deň, kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Uchádzačom alebo tretou osobou preukázané, že:
 - a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo
 - b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo
 - c) Uchádzač bol ako neúspešný uchádzač vylúčený z Verejného obstarávania; alebo
 - d) Uchádzač bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným obstarávateľom prijatá.

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené Banke prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) predložené Banke v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich; spolu s originálom výpisu z obchodného registra Verejného obstarávateľa, nie starším ako 1 mesiac pred predložením Výzvy a Vyhlásenia Banke; alebo
- (iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný osobami oprávnenými konať za Verejného obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

podpísané elektronickým podpisom

Ing. Helena Karovičová
Špecialista obchodného financovania II
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie

podpísané elektronickým podpisom

Martina Kupčová
Špecialista obchodného financovania I
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie

PLNOMOCENSTVO

Dôverné

EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice

štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva

IČO: 31 651 518

zápis v Obchodnom registri: Mestský súd Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 248/V
(splnomociteľ)

týmto splnomocňuje

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 13b
Stavba: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

JKSO:
Miesto: Poľana

KS:
Dátum: 2. 11. 2023

Objednávateľ:
Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana

IČO: 36038351
IČ DPH: SK2020087982

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
VIA OPTIMA, spol. s r. o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 398 058,64

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 398 058,64	279 611,73

Cena s DPH v EUR 1 677 670,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 9 - 11 - 2023


EUROVIA SK, a.s.
Culášova ulica 6, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13b

Stavba: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

Miesto: Poľana

Dátum: 2. 11. 2023

Objednávateľ: Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana

Projektant: VIA OPTIMA, spol. s r. o.

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 398 058,64	1 677 670,37
Objekt5	Lesná cesta Poľana - rekonštrukcia	1 398 058,64	1 677 670,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

Objekt:

Objekt5 - Lesná cesta Poľana - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

2. 11. 2023

Objednávateľ:

Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana

IČO:

36038351

IČ DPH:

SK2020087982

Zhotoviteľ:

Eurovia SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

VIA OPTIMA, spol. s r. o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jana Mišányová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH


1 398 058,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 398 058,64	20,00%	279 611,73

Cena s DPH

v EUR

1 677 670,37


EUROVIA SK, a.s.
Culmánčova 17, 040 17 Moča
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

Projektant

Spracovateľ

- 9 -11- 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

Objekt:

Objekt5 - Lesná cesta Poľana - rekonštrukcia

Miesto:

Dátum: 2. 11. 2023

Objednávateľ:

Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana

Projektant:

VIA OPTIMA, spol. s r. o.

Zhotoviteľ:

Eurovia SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 398 058,64

D D1

Práce HSV

1 398 058,64

D 1

ZEMNÉ PRÁCE

149 453,09

1	K	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovin do 1000 m2	m2	635,000	3,93	2 495,55
2	K	112101101	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	1 322,000	3,80	5 023,60
3	K	112101102	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	275,000	6,51	1 790,25
4	K	112101103	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 700 mm	kus	130,000	9,11	1 184,30
5	K	112101104	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 900 mm	kus	50,000	9,11	455,50
6	K	112101105	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm motorovou pilou	kus	19,000	17,99	341,81
7	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	1 322,000	2,10	2 776,20
8	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	275,000	4,20	1 155,00
9	K	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	KUS	130,000	6,30	819,00
10	K	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	KUS	50,000	8,40	420,00
11	K	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	KUS	19,000	10,50	199,50
12	K	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	140,000	42,01	5 881,40
13	K	122301402	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	778,130	1,88	1 462,88
14	K	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	M3	389,065	0,11	42,80
15	K	132301102	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 nad 100 m3	m3	709,153	5,96	4 226,55
16	K	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 4	M3	354,577	0,11	39,00
17	K	132301203	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 1000 m3 do 10 000 m3	m3	1 491,105	3,78	5 636,38
18	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna Príplatok za lepiivosť horniny 4	M3	745,553	0,11	82,01
19	K	132401101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 5 pre ľubovoľné množstvo	m3	303,923	4,03	1 224,81
20	K	132401201	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 5	m3	639,045	4,03	2 575,35
21	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	778,130	4,62	3 594,96
22	K	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	0,53	700,66
23	K	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	1,58	434,50
24	K	162201403	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	2,63	341,90
25	K	162201404	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	4,20	210,00
26	K	162201409	Vodorovné premiestnenie konárov ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	5,78	109,82
27	K	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	1,58	2 088,76
28	K	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	3,68	1 012,00
29	K	162201413	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	4,97	646,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	162201414	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	5,25	262,50
31	K	162201419	Vodorovné premiestnenie kmeňa ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	6,04	114,76
32	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	371,320	3,20	1 188,22
33	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	8 471,356	1,07	9 064,35
34	K	171201202	Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku	m3	778,130	1,25	972,66
35	K	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	778,130	8,61	6 699,70
36	K	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	453,120	5,04	2 283,72
37	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	2 870,410	3,65	10 477,00
38	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	15 370,222	1,40	21 518,31
39	K	182101102	Svahovanie svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	6 587,238	1,41	9 288,01
40	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	8 153,890	1,10	8 969,28
41	K	122302201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 4	m3	28,700	3,23	92,70
42	K	122302203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 4	m3	4 646,730	3,23	15 008,94
43	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 4	M3	2 323,365	0,11	255,57
44	K	122402201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 5	m3	10,260	3,69	37,86
45	K	122402203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 5	m3	1 491,540	3,69	5 503,78
46	K	122602211	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	2,050	4,41	9,04
47	K	122602212	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 1000 m3 v hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	298,310	4,41	1 315,55
48	K	113151215	Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 60 mm šírky nad 750 mm s veľkosťou plochy do 500 m2 bez prekážok	m2	186,000	2,90	539,40
49	M	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z	T	792,960	11,20	8 881,15

D 2 ZÁKLADY 52 037,41

50	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	651,680	31,43	20 482,30
51	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	M2	4 979,300	1,51	7 518,74
52	K	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	30,899	102,76	3 175,18
53	K	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	121,550	19,95	2 424,92
54	K	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	121,550	2,44	296,58
55	K	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého triedy C16/20	m3	16,240	149,39	2 426,09
56	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	M	2 904,000	4,14	12 022,56
57	M	286161010133	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 500/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	KUS	15,000	63,53	952,95
58	M	286161131006	PIPELIFE Zátka 160 pre PVC flexo drenážne rúry	KUS	32,000	6,83	218,56
59	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	M2	5 477,230	0,46	2 519,53

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 44 125,41

60	K	32721101011	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných pletených košov, priemer drôtu 2,7 mm	M3	92,000	157,50	14 490,00
61	M	583069120102	Maccaferri Kamenivo do drôtokamenných košov	M3	93,384	178,50	16 669,04
62	M	313069030104	MACCAFERRI Drôtokamenné koše pletené, typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm s povrchovou ochranou Galmac (Zn+Al) a s prídavnou ochranou PVC	M3	93,384	138,85	12 966,37

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 98 075,00

63	K	452311131	Dosky podkladové a zabezpečovacie pod potrubie a drobné objekty z betónu triedy C12/15 v otvorenom výkope	m3	1,350	91,81	123,94
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	465921215	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60kg so zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm	M2	1 591,200	14,63	23 279,26
65	K	463212300	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3 s hmotnosťou jednotlivých kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu líca	m3	27,780	60,80	1 689,02
66	K	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	920,450	31,50	28 994,18
67	K	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	201,400	49,13	9 894,78
68	K	451571112	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky do 150 mm	m2	1 591,200	7,64	12 156,77
69	K	462512270	Záhadzka z lomového kameňa s hmotnosťou jednotlivo do 200 kg s preštrkovaním z terénu	m3	33,500	38,94	1 304,49
70	M	5922789700	<i>Tvárnica priekopová a melioračná betónová diaľničná TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6</i>	KUS	5 304,000	3,89	20 632,56

D 5 SPEVNENÉ PLOCHY 804 143,61

71	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 63 mm so zhutnením	m3	2 084,609	35,58	74 170,39
72	K	561261111	Zhotovenie podkladu z NRM stabilizovaného hydraulickým spojivom, systém Road Mix, hr. 200 mm	M2	33 896,750	4,20	142 366,35
73	K	561511125	Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frezou konštr. pôv. krytu účel. komunikácií pre stabilizáciu SIII	M2	35 467,750	0,21	7 448,23
74	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 50 mm	m2	180,000	2,05	369,00
75	K	564811112	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 60 mm	m2	93,000	2,08	193,44
76	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	27 701,400	2,16	59 835,02
77	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	5 939,250	2,23	13 244,53
78	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	3 440,950	2,80	9 634,66
79	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	1 332,600	2,90	3 864,54
80	K	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým pospom z cestného asfaltu v množstve 1,50 kg/m2	m2	34 034,150	0,53	18 038,10
81	K	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	30 499,630	0,47	14 334,83
82	K	577131211	Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 (ABJ) strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 40 mm	m2	29 757,230	7,26	216 037,49
83	K	577151223	Betón asfaltový akostnej triedy II. lôžkový (ABL) hrúbky 60 mm	m2	30 499,630	8,02	244 607,03

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 248 610,07

84	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	2 249,128	1,20	2 698,95
85	K	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	1 110,335	14,25	15 822,27
86	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,858	4,61	160,70
87	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	558,310	0,06	33,50
88	K	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,658	28,00	18,42
89	K	979089312	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /kovy - meď, bronz, mosadz/ kategórie "O" - ostatné"	t	13,090	9,63	126,06
90	K	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	329,500	47,40	15 618,30
91	K	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou v dvoch vrstvách hrúbky 30 mm	m2	36,000	96,24	3 464,64
92	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	36,000	18,64	671,04
93	K	911332111	Osadenie a montáž oceľového zvodidla s jednou pásnicou so zabaranením stĺpikov pri vzdialenosti 2 m	m	2 244,000	31,50	70 686,00
94	K	911339211	Príplatok k cene za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, resp. deliaceho pásu	kus	14,000	99,98	1 399,72
95	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr od DN 60 cm do DN 80 cm	kus	4,000	1 575,00	6 300,00
96	K	919413115	Vtoková nádržka z betónu prostého triedy C25/30 priepustu z rúr do DN 800 mm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
97	K	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	12,000	76,57	918,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	919541114	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600 mm	m	527,000	21,74	11 456,98
99	K	919541116	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800 mm	m	62,000	35,15	2 179,30
100	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68,000	3,20	217,60
101	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	1 650,000	3,07	5 065,50
102	K	966008112	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 500 mm	m	249,500	26,81	6 689,10
103	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	35,000	27,30	955,50
104	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	68,000	3,15	214,20
105	K	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu	m2	30 535,200	0,15	4 580,28
106	K	938909611	Odstránenie uľahnutých nánosov z krajnic hrúbky do 100 mm	m2	7 815,000	0,09	703,35
107	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	34,585	0,75	25,94
108	K	OD000102	Osadenie drevenej odrážky z reziva vrátane montáže, dodávky oceleový rozpier a spojovacieho materiálu, výkopu ryhy a odpratania výkopku	m	33,000	124,83	4 119,39
109	K	P0001001	Čistenie rúrového priepustu akéhokoľvek priemeru prúdnicou cisternovej automobilovej striekačky	m	30,000	23,60	708,00
110	K	GU000101	Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 mm, dl. 160 cm s vykpaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu	KS	276,000	25,60	7 065,60
111	M	ZO00101	Zvodnica AM, dl. 4250 mm, hr. plechu 2,8 mm	ks	561,000	47,25	26 507,25
112	M	ZO00102	Stĺpik "C" 150x75x25 mm, hr. plechu 3,5 mm, dl. 1525 mm	ks	1 101,000	12,60	13 872,60
113	M	ZO00202	Nábehová prechodka NH4 17,3 %	ks	14,000	40,95	573,30
114	M	ZO00204	Stĺpik U-140, dl. 1500 mm	ks	56,000	10,50	588,00
115	M	286161080106	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m	KUS	88,000	336,00	29 568,00
116	M	286161080107	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m	KUS	11,000	646,80	7 114,80
117	M	286161081906	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záťažkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA	KUS	43,000	48,30	2 076,90
118	M	286161081907	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záťažkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA	KUS	5,000	56,07	280,35
119	M	592187230101	PREFA SUČANY Rúra železobetónová priama TZP 60/200	KUS	6,000	249,90	1 499,40
120	M	605128450	Dosky a fošne SM/JD omietane ak. II, dl.400-650, hr.38-50, s.250-300	M3	0,495	351,27	173,88
121	M	605327350	Prírezy ihličnaté hranoľy SM/JD ak.II, dl.400-650, hr.100, š.120-140	M3	0,660	388,50	256,41

D 99 PRESUNY HMÔT 1 614,05

122	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	26 900,816	0,06	1 614,05
-----	---	-----------	--	---	------------	------	----------

D D1 Práce HSV 0,00


Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §34 ods. 1 písm. b/ ZVO - Zoznam stavebných prác EUROVIA SK, a.s. rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky:

číslo RL	Názov stavby	Charakteristika/popis stavby	Investor	cena diela bez DPH	cena diela bez DPH	Termín začatia a ukončenia výstavby
				podľa jednotlivých objednávok	za zmluvu spolu (podľa priložených RL)	
1.	Oprava cesty I// v úseku prietah Banská Bystrica	nová konštrukcia vozovky a podkladvaných vstiev v celkovej dĺžke komunikácie 4 040 m a ploche 67 133 m ²	Slovenská správa ciest Miletičova č.19, 826 19 Bratislava	Fakturované za celú stavbu spolu v rozhodnom období: 2 246 699,52 eur	2 246 699,52	9.5.2022 - 10.10.2022
2	Oprava cesty I/72 Hačava - Skalie - Tisovec	nová konštrukcia vozovky a podkladvaných vstiev v celkovej dĺžke komunikácie 7110 m a ploche 44 800 m ²	Slovenská správa ciest Miletičova č.19, 826 19 Bratislava	Fakturované za celú stavbu spolu v rozhodnom období: 1 439 302,8 eur	1 439 302,80 €	26.4.2021 - 30.5.2021
	Spolu				3 686 002,32 €	

- 9 -11- 2023

V Banskej Bystrici, dňa

konajúci na základe príjmej moci

 **EUROVIA** ©
 EUROVIA SK, a.s.
 Galvaničova č. 040 17 Košice
 IČO: 31551522, IČ DPH: SK2020451274

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Alžbeta Marečková

Telefón: +421 250255201

Email: alzbeta.mareckova@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: 364/6131/2022

Druh zmluvy: zmluva na základe rámcovej dohody

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.05.2022

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Oprava cesty I/66 v úseku priet'ah Banská Bystrica.

Celková plocha komunikácie 67 133 m².

Oprava cesty prebiehala nasledovne:

- odfrézovanie asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 110mm
- aplikácia modifikovaného asfaltového spojovacieho postreku v množstve 0,2-0,7 kg/m²
- asfaltová vrstva AC 22 L z modifikovaného asfaltu I.tr., hr. 60 mm
- aplikácia modifikovaného asfaltového spojovacieho postreku v množstve 0,2-0,7 kg/m²
- asfaltová vrstva AC 16 L z modifikovaného asfaltu I.tr., hr. 50 mm
- rozprestretie geomreže pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna 100/100 kN
- asfaltová vrstva SMA 11 O , hr. 50 mm
- tesnenie dilatačných špár zálievkou za tepla
- výšková úprava poklopov dažďovej kanalizácie.

Kapacity získané výstavbou:

Nová konštrukcia vozovky a podkladaných vrstiev v celkovej dĺžke komunikácie 4 040 m a ploche 67 133 m².

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 67 133 m²

Miesto dodania: Staničenie 88,480 - 92,520 km

Cena bez DPH: 2 246 699,52 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 62

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vykonané práce zodpovedajú platným STN EN, TP SSC a podmienkam uvedených v Rámcovej zmluve.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 41174-VST, číslo VVO 233/2020 z 03.11.2020

Dátum vyhotovenia referencie: 21.03.2023

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Alžbeta Marečková

Telefón: +421 250255201

Email: alzbeta.mareckova@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: 138/6131/2021

Druh zmluvy: zmluva na základe rámcovej dohody

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.02.2021

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Oprava cesty I/72 Hačava - Skalie - Tisovec

Oprava cesty prebiehala nasledovne:

- odfrézovanie asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 50-110mm
- aplikácia modifikovaného asfaltového spojovacieho postreku v množstve 0,2-0,7 kg/m²
- recyklácia za studena hr. 200 mm
- asfaltová vrstva AC 22 L z modifikovaného asfaltu I.tr., hr. 60 mm
- aplikácia modifikovaného asfaltového spojovacieho postreku v množstve 0,2-0,7 kg/m²
- rozprestretie geomreže pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna 100/100 kN
- asfaltová vrstva AC 11 O , hr. 40 mm
- tesnenie dilatačných špár zálievkou za tepla

Kapacity získané výstavbou:

Nová konštrukcia vozovky a podkladaných vrstiev v celkovej dĺžke komunikácie 7 110 m a ploche 44 800 m².

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 44 800 m²

Miesto dodania: Staničenie 26,700 - 33,000 km

Cena bez DPH: 1 439 302,80 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 65

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vykonané práce zodpovedajú platným STN EN, TP SSC a podmienkam uvedených v Rámcovej dohode.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 41174-VST, číslo VVO 233/2020 z 03.11.2020

Dátum vyhotovenia referencie: 21.03.2023

ZMLUVA O DIELO

č. xxxx/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Organizačná zložka OZ Poľana
so sídlom: Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Sokol - vedúci OZ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka
OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**
so sídlom: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518
Zapísaný v OR OS Košice I. Odd. Sa, vložka č. 248/V
IČ DPH: SK2020490274
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK74 0900 0000 0050 2528 4655
konajúci prostredníctvom:

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „*Zmluvné strany*“ a jednotlivito aj ako „*Zmluvná strana*“)

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka – položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 26.10.2023, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za **prílohu č. 1** tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Lesná cesta POĽANA – rekonštrukcia**
- 2.2.2 Názov projektu: **Projekt prístupnosti lesných porastov na OZ Poľana**
- 2.2.3 Miesto stavby: **k. ú. Hriňová**

- 2.2.4 Projektant: VIA OPTIMA, spol. s.r.o., Jedľová 1364/1, 960 01 Zvolen
- 2.2.5 Project manager objednávateľa: LSR, š. p. oz OZ Poľana – Ing. Štefan Sarvaš
+421 918 335 510, stefan.sarvas@lesy.sk
- 2.2.6 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana**“ podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval **Ing. Marián Böhmer, PhD.** (ďalej len „projekt“), v súlade s ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
 - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN a EN,
 - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
 - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
- 3.3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.5. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu môže dôjsť v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá objektívne vyvoláva a spôsobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác zahrnutých v rozpočte, a ktorá súčasne má vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pričom takúto potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo z pohľadu zabezpečenia kvality, funkčnosti a iných požiadaviek na Dielo požadovať jeho vykonanie v pôvodnej cene a/alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:

- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr **do 1.3.2024**, pričom objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od doručenia jeho výzvy Objednávateľovi. V prípade, že zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi výzvu na prevzatie staveniska najneskôr do 22.2.2024, tak, Objednávateľ je oprávnený upozorniť a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 1.3.2024.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:
Najneskôr do 30.04.2025.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž na obdobie od 1.3.2024 do 30.4.2025 a tvorí **prílohu č. 2** tejto Zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1., pričom pre posúdenie omeškania a plnenia harmonogramu sú rozhodujúce termíny v ňom vymedzené v časovom úseku od 1.3.2024 do 30.4.2025. Ak by Zhotoviteľ vykonal práce na Diele do 1.3.2024, tak tieto z časového pohľadu plnenia povinností sú výhodou a možnosťou poskytnutou Objednávateľom Zhotoviteľovi o možnom skoršom začatí prác na Diele, aby bol riadne dodržaný harmonogram a v ňom uvedené koncové termíny pre to ktoré plnenie, a najmä aby bol splnení konečný termín pre zhotovenie Diela, ktorým je deň 30.4.2025.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Harmonogram nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie Diela. Harmonogram bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň. Zmena harmonogramu je možná len formou dodatku k zmluve.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. Zmena cien materiálov a prác nie je udalosťou, pre ktorú je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, keďže samotná zmena týchto cien nemá vplyv na dohodnutú cenu Diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela - stavby obidvoma zmluvnými stranami bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela. V prípade, ak Dielo bude odovzdané s drobnými vadami, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu Diela, tak zmluvné strany sú povinné v preberacom protokole spísať zistené vady a určiť lehoty a spôsob ich odstránenia. Takto určený spôsob a lehoty sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 4.8 Objednávateľ nepreberie dielo, ak toto bude vykazovať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu Diela. Zhotoviteľ je v takom prípade v čase od uplynutia zmluvného termínu pre odovzdanie diela až do odstránenia väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela v omeškani s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok č. 5

CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy – Diela, v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **1 398 058,64€ bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: **Jeden milión tristošesťdesiatosem tisíc päťdesiatosem EUR a šesťdesiatštyri centov bez DPH.**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.5 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác vo výške určenej podľa CENEKON-u platných v čase účinnosti dodatku, ktorým sa zazmluvnia tieto práce, znížené o %-tá zodpovedajúce zľave vychádzajúcej z celkovej ceny Diela a predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade ak celková cena Diela je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, tak cena podľa CENEKON-u sa ponížovať a upravovať nebude.
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.5 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.
- 5.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 5.7 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).
- 5.8 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Celkovú cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané, pričom zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce maximálne raz mesačne.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov diela.
- označenie projektu EÚ: *Stavebné práce sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde*

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project managerom objednávateľa.

Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project managerom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola vystavená v súlade s odsekom 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, rozsah fakturovaných prác uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevrátenie faktúry k prepracovaniu nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je objednávateľ oprávnený domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce aj napriek schváleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sú fakturované a/alebo neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných prác. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení

dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.

- 6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. Toto ustanovenie nevyklučuje jednostranné započítanie pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z iných právnych úkonov alebo skutočností proti pohľadávkam zhotoviteľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

Článok č. 7 Zábezpeka

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy zábezpeku v celkovej výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 bez DPH, a to najneskôr do sedem (7) dní odo dňa odovzdania staveniska formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet objednávateľa č.: **IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053** bankovým prevodom. Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v zmysle zmluvy riadne a včas, pričom môže byť použitá na úhradu akýchkoľvek finančných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z titulu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom. V prípade, že dôjde v súlade s článkom č. 3, odsek 3.5 tejto zmluvy dodatkom k navýšeniu rozsahu prác a tým aj ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, tak je zhotoviteľ povinný najneskôr do sedem (7) dní odo dňa účinnosti tohto dodatku doplniť zloženú zábezpeku tak, aby aj po zvýšení ceny dosahovala výšku 10 % z celkovej ceny diela.
- 7.2 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy, nasledovne:
- (i.) v prípade prevzatia Diela bez väd a nedorobkov do 30 dní po podpísaní preberacieho protokolu
 - (ii.) v prípade prevzatia Diela s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela do 30 dní po podpísaní záznamu o odstránení týchto väd.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť, zložiť na bankový účet Objednávateľa zábezpeku podľa bodu 7.1 Zmluvy, splniť aj poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako zábezpeka podľa bodu 7.1 a 7.2, inak nebude Objednávateľom akceptovaná. Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne o 60 dní dlhšia ako je termín definitívneho ukončenia diela podľa odseku 4.1.2.

Článok č. 8 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 8.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 8.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

Článok č. 9

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo možno považovať až odovzdané dielo v zmysle článku č. 10 tejto zmluvy o dielo.
- 9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 9.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project manager objednávateľa.
- 9.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 9.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 9.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 9.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 9.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 9.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 9.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 9.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 9.13 Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať.
- 9.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

- 9.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 9.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 9.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Projekt manager objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v utorok v párnom týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 9.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 9.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať porealizačné zameranie stavby ak si to charakter stavby vyžaduje.
- 9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. V prípade predčasného

ukončenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne odovzdať do 7 pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia zmluvy.

- 9.25 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 9.26 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby.
- 9.27 Počas doby realizácie stavebných prác umožní Zhotoviteľ prejazd motorovými vozidlami po LC Poľana záchranným zložkám, vlastníkom a užívateľom nehnuteľností na dotknutom území.

Článok č. 10

ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 10.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10.1. a 10.2. tohto článku.
- 10.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady brániace riadnemu užívaniu Diela, lehoty a spôsoby ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškani s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13.
- 10.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 11

VÝROBNÉ PODKLADY

- 11.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 11.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 11.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 12

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.

- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 12.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) kalendárnych dní po zistení vady.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 12.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 12.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

Článok č. 13 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,1 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 13.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške **30 %** z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 13.3 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **5 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **10 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 12, odsek 12.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.6 Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.7 Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zložením finančnej zábezpeky podľa článku č. 7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.8 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním staveniska objednávateľovi podľa článku 9 ods. 9.24 tejto zmluvy, tak má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý deň aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.9 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 13.10 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 13.11 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.1 až 13.4 tohto článku sa nekumulujú
- 13.12 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.3 a 13.7 tohto článku sa nekumulujú

- 13.13 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 14

PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 14.1 Prevod / postúpenie práv a/alebo pohľadávok vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 14.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 14.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky. Zoznam subdodávateľov tvorí ncoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“). Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa súťažných podkladov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr pri podpise tejto zmluvy (rámcovej dohody) a/alebo pri nahlásení zmeny subdodávateľa bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi v rozsahu zmeny údajov o subdodávateľov a to v rozsahu zmeny obchodného mena, sídla, miesta podnikania, IČO, osôb oprávnených konať s uvedením mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliačim v Rusku,
 - spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliačimi v Rusku a
 - osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

Článok č. 15

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 15.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Ing. Miloš Farkaš – projekt manager zhotoviteľa, tel. č.: +421 908714098 a e-mail: milos.farkas@vinci-construction.com. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 9.19 Zmluvy.
- 15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16 **ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 10.

Článok č. 17 **RIEŠENIE SPOROV**

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 18 **ZMENY A DODATKY**

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 18.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchýliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 9, odsek 9.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať generálny riaditeľ (resp. riaditeľ OZ) a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením Diela budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 18.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále zodpovedala celkovej výške 10 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku zábezpeky v termíne do siedmych (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

Článok č. 19 **OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priet'ahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer)
 - príloha č. 2 (Harmonogram realizácie prác)
 - príloha č. 3 (Výpis z registra partnerov verejného sektora)
 - príloha č. 4 (Zoznam subdodávateľov).
- 20.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zmluvný vzťah nebude schválený zo strany Riadiaceho alebo Národného orgánu a teda výdavky z takejto zmluvy by neboli oprávnenými výdavkami.
- 20.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa a dôvodom pre odstúpenie, sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne najneskôr do 1.3.2024 ,
 - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - c. nedodržanie zmluvného termínu začatia výstavby,
 - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 14, ods. 14.3.


- g. nezloženie alebo nedoplnenie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 7 tejto zmluvy o dielo.
 - h. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 - i. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 20.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 13.
- 20.8 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručení aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 20.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V Kriváni dňa.....

V Banskej Bystrici, dňa 9.11. 2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Ing. Ján Sokol
vedúci OZ Poľana
LESY SR, š. p.

Predmet zmluvy:

„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“


uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	BRB výroba, s.r.o., Bytčianska 497/126, Žilina	8 %	zvodidlá	xxx	xxx	xxx
2.						
3.						
4.						
5.						

- 9 - 11 - 2023

V Banskej Bystrici, dňa.....



 EUROVIA SK, a.s.

 Obchodná spoločnosť, 040 17 Košice

 IČO: 33551518, IČ DPH: SK202049274

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.10.2023

Obchodné meno/Názov:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo/Miesto podnikania:	Osloboditeľov 66 Košice
IČO:	31651518
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/1-PO-B4054
Platnosť zápisu od:	10.01.2023
Platnosť zápisu do:	10.01.2026
Dátum zmeny:	11.01.2023
Zoznam osôb:	Ing. Róbert Šinály, člen štatutárneho orgánu Ing. Juraj Dančišín, člen štatutárneho orgánu Ing. Martin Borovka, člen štatutárneho orgánu Ing. Daniel Hanko, člen štatutárneho orgánu Patrick Jutier, člen dozorného orgánu Ing. Milan Lechman, člen dozorného orgánu Ludovic Demierre, člen dozorného orgánu Paul Scippa, člen štatutárneho orgánu
Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od:	06.11.2015

Predmet podnikania

- kovoobrábanie,
- zámočníctvo,
- opravy motorových vozidiel,
- tesárstvo,
- prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí,
- vykonávanie dopravných stavieb,
- budovanie inžinierskych a priemyselných stavieb,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb,
- veľkoobchod a maloobchod - priemyselný, elektrikársky tovar,
- veľkoobchod a maloobchod - stavebný materiál, betonárske výrobky, prefabrikáty, kamenivo, živicové a obalovacie zmesi,
- konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania,
- výroba kameniva v kameňolomoch a štrkovniach,
- vykonávanie trhacích prác,

- revízia elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov v objektoch tr. A, revízie nízkeho napätia a bleskozvodov triedy C podľa čl. 6 ČSN 343800 a skupiny C6,
- montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodných ochrán do objektov triedy A,
- výroba elektrických rozvádzačov,
- vykonávanie prekládok elektrických vedení - nízke a vysoké napätie,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy +++, v kempingoch triedy +++ a vo vyšších triedach,
- výroba transportného betónu,
- výroba malty,
- výroba produktov z betónu a cementu,
- prípravné práce pre stavbu,
- demolácia a zemné práce,
- prieskumné a podzemné práce,
- prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom,
- opravy spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom dopravných zariadení,
- inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru,
- vykonávanie pozemných stavieb,
- stavba komunikácií, letísk a športových areálov,
- vykonávanie dopravných stavieb vrátane električkových a železničných tratí,
- vykonávanie vodných stavieb (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií),
- montáž káblových rozvodov,
- výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
- geodetické a kartografické práce,
- laboratórna činnosť,
- fyzikálne a mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií,
- cestná nákladná doprava,
- zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m³ horniny,
- výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry,
- výroba cementového tovaru a umelého kameňa,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- spracovanie prírodného kameňa,
- vedenie účtovníctva,
- recyklácia stavebných materiálov a predaj recyklátov,
- drvenie a triedenie stavebných materiálov,
- recyklácia nekovového odpadu,
- výroba asfaltových emulzií, modifikovaných asfaltov a obaľovanej zmesi,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- čistiace a upratovacie služby,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- čistenie kanalizačných systémov,
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- vykonávanie odťahovej služby,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- skladovanie

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia **+**

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Milan Lechman)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	12.12.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Róbert Šinály)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	12.12.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Juraj Dančíšin)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	12.12.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Daniel Hanko)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	12.12.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	12.12.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	12.12.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	12.12.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	12.12.2022
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	12.12.2022
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	12.12.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	12.12.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	12.12.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	12.12.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	12.12.2022
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		05.12.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ludovic Demierre)	Register trestov Českej republiky	29.11.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Patrick Jutier)	Ministerstvo spravodlivosti, Správa pre trestné veci a udeľovanie milosti, Štátny register trestov	29.11.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Martin Borovka)	Register trestov Českej republiky	29.11.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Paul Scippa)	Register trestov Českej republiky	29.11.2022

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 26.10.2023

Číslo vložky: 10438

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EUROVIA SK, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Osloboditeľov

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 66

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04017

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31651518

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 27.02.2020

Obchodné meno : EUROVIA SK, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Osloboditeľov

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 66

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04017

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31651518

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 26.02.2020

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kálov

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 653/23-2

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 010 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47253096

Platnosť : od: 02.02.2022

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Juraj Dančišín

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Opatovská cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2394/24A

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Vyšné Opátske

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 14.08.1960

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 25.07.2017

Meno : Paul Scippa

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rue de Civry

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4

c) **Názov obce:** Paríž

d) **Psč:** 750 16

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : 01.05.1966

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.11.2020

Meno : Ing. Róbert Šinály

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Dr. Štohla

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6619/2A

c) **Názov obce:** Pezinok

d) **Psč:** 90201

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 27.02.1969

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 24.09.2022

Meno : Ing. Daniel Hanko

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Moyzesova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 11512/7A

c) **Názov obce:** Prešov

d) **Psč:** 08001

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 26.11.1978

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 24.09.2022

Meno : Ing. Martin Borovka

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Tychonova

b) Súpisné/Orientačné číslo: 268/6

c) Názov obce: Praha 6, Hradčany

d) Psč: 16000

e) Štát: Česká republika

Dátum narodenia : 24.02.1974

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 01.07.2023

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 02.07.2023

Dátum overenia : 30.06.2023

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 07.11.2023

Obchodné meno/Názov:	BRB výroba s. r. o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Bytčianska 497/126 Žilina
IČO:	50928295
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	Aktívny
Registračné číslo:	2022/10-PO-F1423
Platnosť zápisu od:	17.10.2022
Platnosť zápisu do:	17.10.2025
Zoznam osôb:	Branislav Beliančín , Konateľ Martina Beliančíňová , Konateľ Petra Beliančíňová , Konateľ Martina Beliančíňová , Konateľ Petra Beliančíňová , Konateľ

Predmet podnikania

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Reklamné a marketingové služby
- Prenájom hnutel'ných vecí
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Vedenie účtovníctva
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Administratívne služby
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- Výroba a hutnícke spracovanie kovov
- Čistiace a upratovacie služby
- Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
- Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
- Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného



Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Branislav Beliančín)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.08.2022
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Petra Beliančíňová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.08.2022
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Martina Beliančíňová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.08.2022
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	25.08.2022
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie		17.08.2022
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	25.08.2022
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina	10.08.2022
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina	10.08.2022
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina	10.08.2022
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	25.08.2022
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	25.08.2022
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	25.08.2022
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	25.08.2022
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	25.08.2022
