


SO 408-33-05.01 Žst. LIPTOVSKÝ HRÁDOK, ASANÁCIA CESTNÉHO NADJAZDU NA CESTE I/18 v nžkm 243,161 (sžkm 246,240)

ETAPA ASANÁCIE Č. 4
M 1:100

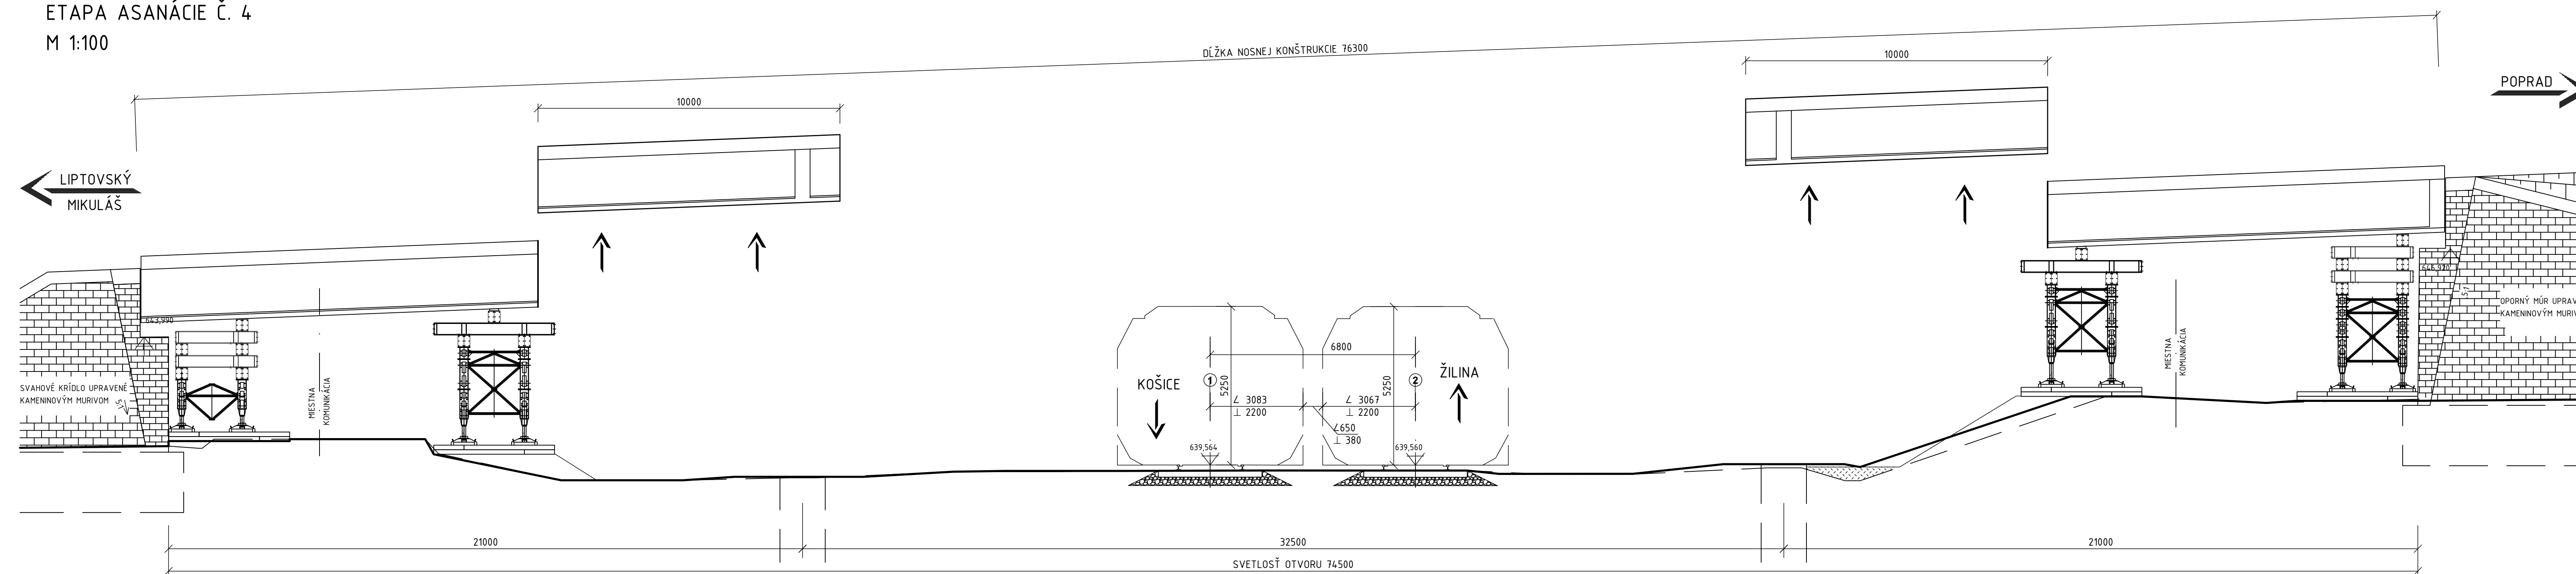

POSTUP ASANÁCIE OBJEKTU 408-33-05/01
ETAPA Ć 4


- PRIEĽNE DELENIE EXISTUJÚCEJ MOSTNEJ KONŠTRUKCIE V KRAJNÝCH POLIACH A PRESUN VYBŮRANÝCH DIELCOV MIMO OS MOSTNEJ KONŠTRUKCIE
- DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO PLECHU (PROPOKLADÁ SA KRÁTKA VÝLUKA PRE MOŽNOSŤ PADANIA SÚŤÍ)
- DEMONTÁŽ PODPERNÝCH CIELOVÝCH NOSNÍKOV
- DEMONTÁŽ DOČASŤNÝCH PODPERNÝCH VEŽÍ V KRAJNÝCH POLIACH, LÍNIOVEJ V STREDNOM POLI A PRI OPORÁCH







ETAPA 5

- ODKOP ZEMINY ZA OPOROU
- ZABARANENIE OCHRANNÝCH ŠTĚTOVNÍC LARSEN II-n ZA RUBOM OPORY NA STRANE CESTY DO POPRADU,
- VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH OPŮR A KŘÍDEL OPŮR

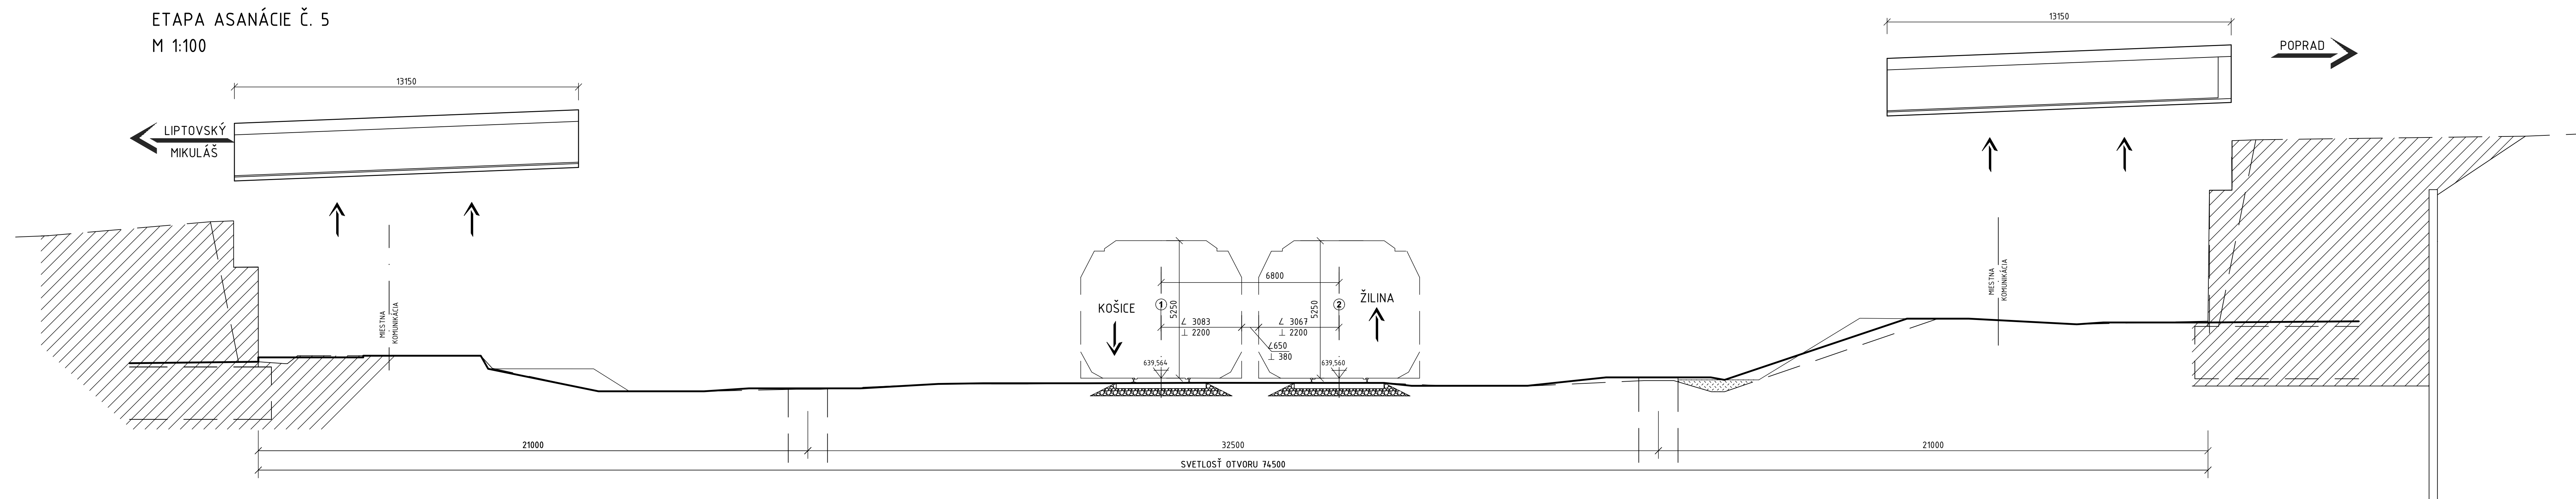Zhotoviteľ najmä s ohľadom na priestorovú zložitosť výstavby spracuje podrobný technologický postup demontáže a montáže konštrukcie vrátane výrobo-technologickej dokumentácie so zohľadnením skutočných postupov výstavby stavby vrátane koordinácie so súvisiacimi stavebnými a technologickými postupmi, a to hlavne výstavbu preložiek, trakčného vedenia vrátane, prehliadkových steín a iných. Postupy budú predložené na schválenie a kontrolu projektantovi a stavebnému dozoru v dostatočnom predstihu.

ETAPA ASANÁCIE Č. 5
M 1:100



ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE									
Zmena									
Index:	Datum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:						
Zodpovedný projektant stavby:			Ing. Ján Kulnár						
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY									
Zákazové číslo:						0608			
REMING CONSULT, s. r. o., Tomáškova 14365654A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto									
Zodpovedný projektant ÚČS:			Ing. Ján Kulnár						
Zodpovedný projektant objektu:			prof. Ing. Jozef Vládn, GSc.						
Vyrábateľ:			Ing. Richard Hinka, PhD.						
Kontrolník:			Ing. Peter Novák						
Kraj:	Zitavský	Oblasť:	Liptovský Hrádok						
Investor - stavebník:			Železnica Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 81 Bratislava, Slovenská republika						
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, <u>úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa</u> ÚČS 408 - ŽST Liptovský Hrádok								
Názov SO:	ŽST Liptovský Hrádok, rekonštrukcia cestného nadjazdu na ceste I/18 v nkm 243,161 (sžkm 246,240)								
Názov podobjektu:	ŽST Liptovský Hrádok, rekonštrukcia cestného nadjazdu na ceste I/18 v nkm 243,161 (sžkm 246,240) - asanácia								
Názov prílohy:	Pracovné postupy - Etapa 4								
Kódové označenie výkresu:						Číslo prílohy:			
0608 - DRS - E - 408 - 33 - 05 01 - 004 - 04						04.04			
Supel - úseľ: DRS Zákazové číslo: 0608 Archívne číslo: Dátum: 09/2024 Počet A4: 12x44 Mierka: 1:100						Časť: E Súprava: Číslo SO:			
408-33-05.1									
