




Predloženie ponuky

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor –
Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný
násyp pred obcou Horný
Tisovník, km 39,862

22.2.2021



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
Slovenská republika

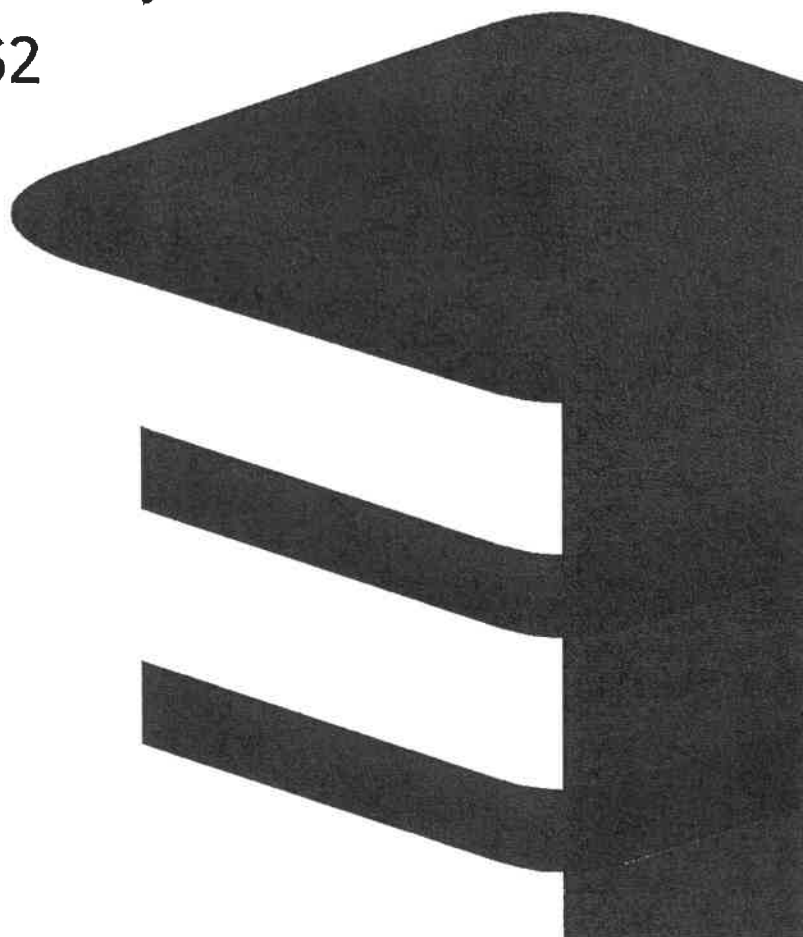

Harmonogram stavby "I. ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa"

Kód položky	Rok																	
	mesiac																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa																		
101-00																		
101-001																		
101-002																		
101-403																		
101-10																		
101-20																		
105-01																		
105-011																		
105-012																		
105-013																		
105-014																		
105-02																		
105-021																		
105-022																		
105-023																		
105-024																		
105-10 až 105-15																		
105-00																		
105-001																		
201-00																		
202-00																		
203-00																		
213-00																		
214-00																		
215-00																		
216-00																		
217-00																		
651-00																		
701-00																		



G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Osloboditeľov 66, Košice 040 17
IČO uchádzača:	31 651 518
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, k

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	3 372 759,02
DPH v EUR:	674 551,80
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	4 047 310,82

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

V Banskej Bystrici dňa 22.2.2021

.....
Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, poverený zastupovaním

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02AKT-FINAL
Stavba: I.ETAPA -Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

JKSO:
Miesto: okr.Detva- Klokoč - Horný Tisovník

KS:
Dátum: 18. 2. 2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s

IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 372 759,02
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	3 372 759,02	674 551,80
Cena s DPH v EUR			4 047 310,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02AKT-FINAL

Stavba: I.ETAPA -Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Miesto: okr.Detva- Klokoč - Horný Tisovník

Dátum: 18. 2. 2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 372 759,02	4 047 310,82
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	9 124,50	10 949,40
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698, okr. Lučenec	426 822,25	512 186,70
101-001	Komunikácia, úsek 1 - intravilán	139 741,05	167 689,26
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	244 173,49	293 008,19
101-003	Rekonštrukcia priepustov	42 907,71	51 489,25
01001	Priepust č.1 - P 19673	2 462,51	2 955,01
01002	Priepust č.2 - P56298	37 638,51	45 166,21
01003	Priepust č.3 - P 19674	2 806,69	3 368,03
101-10	101-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom	22 373,23	26 847,88
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	33 814,20	40 577,04
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	1 152 190,95	1 382 629,14
105-011	Komunikácia, úsek 1	172 534,39	207 041,27
105-012	Komunikácia, úsek 2	193 217,07	231 860,48
105-013	Komunikácia, úsek 3	695 636,11	834 763,33
105-014	Rekonštrukcia priepustov	90 803,38	108 964,06
05001	Priepust č.1 - P 21595	3 257,98	3 909,58
05002	Priepust č.2 - P 21598	6 869,72	8 243,86
05003	Priepust č.3 - P 21873	3 999,77	4 799,72
05004	Priepust č.4 - P 21891	3 376,51	4 051,81
05005	Priepust č.5 - P 21876	6 269,22	7 523,06
05006	Priepust č.6 - P 21877	3 648,78	4 378,54
05007	Priepust č.7 - P 21878	927,54	1 113,05
05008	Priepust č.8 - P 21879	5 831,82	6 998,18
05009	Priepust č.9 - P 21880	1 771,52	2 125,82
05010	Priepust č.10 - P 21881	4 275,69	5 130,83
05011	Priepust č.11 - P 21882	1 820,71	2 184,85
05012	Priepust č.12 - P 21883	3 215,13	3 858,16
05013	Priepust č.13 - P 21884	9 542,16	11 450,59
05014	Priepust č.14 - P 21885	3 436,17	4 123,40
05015	Priepust č.15 - P 21886	2 144,95	2 573,94
05016	Priepust č.16 - P 21887	3 759,67	4 511,60
05017	Priepust č.17 - P 21888	3 196,50	3 835,80
05018	Priepust č.18 - P 21889	3 634,75	4 361,70
05019	Priepust č.19 - P 21890	7 667,56	9 201,07
05020	Priepust č.20 - P 22109	3 332,00	3 998,40
05021	Priepust č.21 - P 22110	4 088,95	4 906,74
05022	Priepust č.22 - P 22111	3 023,46	3 628,15
05023	Priepust č.23 - P 22143	1 712,82	2 055,38
105-02	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	475 261,84	570 314,21
105-021	Komunikácia, úsek 4	223 595,68	268 314,82
105-022	Komunikácia, úsek 5	58 548,52	70 258,22
105-023	Komunikácia, úsek 6	130 442,03	156 530,44
105-024	Rekonštrukcia priepustov	62 675,61	75 210,73
05024	Priepust č.24 - P 22131	9 781,40	11 737,68
05025	Priepust č.25 - P 22132	5 688,19	6 825,83
05026	Priepust č.26 - P 22133	1 045,40	1 254,48
05027	Priepust č.27 - P 22134	3 384,74	4 061,69
05028	Priepust č.28 - P 22148	2 357,17	2 828,60

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
05029	Prlepust č.29 - P 22135	3 796,06	4 555,27
05030	Prlepust č.30 - P 22136	2 865,62	3 438,74
05031	Prlepust č.31 - P 22149	3 198,62	3 838,34
05032	Prlepust č.32 - P 22152	1 682,80	2 019,36
05033	Prlepust č.33 - P 22153	5 649,15	6 778,98
05034	Prlepust č.34 - P 22154	1 945,42	2 334,50
05036	Prlepust č.35 - P 22155	7 865,76	9 438,91
05036	Prlepust č.36 - P 22156	3 374,70	4 049,64
05037	Prlepust č.37 - P 22157	4 173,04	5 007,65
05038	Prlepust č.38 - P 22158	3 380,11	4 056,13
05039	Prlepust č.39 - P 22159	2 487,43	2 984,92
105-10	105-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Klokoč	66 396,75	79 676,10
105-101	Nástupišťa AZ Klokoč Paľúrovci	11 397,20	13 676,64
105-102	Nástupišťa AZ Klokoč, nad Klokočom	5 609,09	6 730,91
105-103	Nástupišťa AZ Stará Huta, Poľana	17 305,10	20 766,12
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	32 085,36	38 502,43
105-13	105-13 Nástupišťa AZ v k.ú. Stará Huta	8 523,97	10 228,76
105-131	Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta	2 852,95	3 423,54
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	5 671,02	6 805,22
105-14	105-14 Nástupišťa AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	13 439,73	16 127,68
105-141	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	2 485,93	2 983,12
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	10 953,80	13 144,56
105-15	105-15 Nástupišťa AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	33 519,25	40 223,10
105-151	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	22 565,45	27 078,54
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	10 953,80	13 144,56
106-00	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862	225 668,37	270 802,04
106-001	Komunikácia	223 830,48	268 596,58
106-002	Rekonštrukcia prlepustov	1 837,89	2 205,47
06023	Prlepust č.23 - P 22143	1 837,89	2 205,47
201-00	201-00 Most ev.č.585-007	126 992,68	152 391,22
202-00	202-00 Most ev.č.585-008	66 277,90	79 533,48
203-00	203-00 Most ev.č.585-009	70 144,92	84 173,90
213-00	213-00 Most ev.č.591-013	140 901,03	169 081,24
214-00	214-00 Most ev.č.591-014	100 023,33	120 028,00
215-00	215-00 Most ev.č.591-016	101 522,42	121 826,90
216-00	216-00 Most ev.č.591-017	126 374,74	151 649,69
217-00	217-00 Most ev.č.591-018	144 387,71	173 265,25
651-00	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom	4 270,90	5 125,08
701-00	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom	24 728,35	29 674,02

