




Predloženie ponuky

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor –
Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný
násyp pred obcou Horný
Tisovník, km 39,862

22.2.2021



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
Slovenská republika

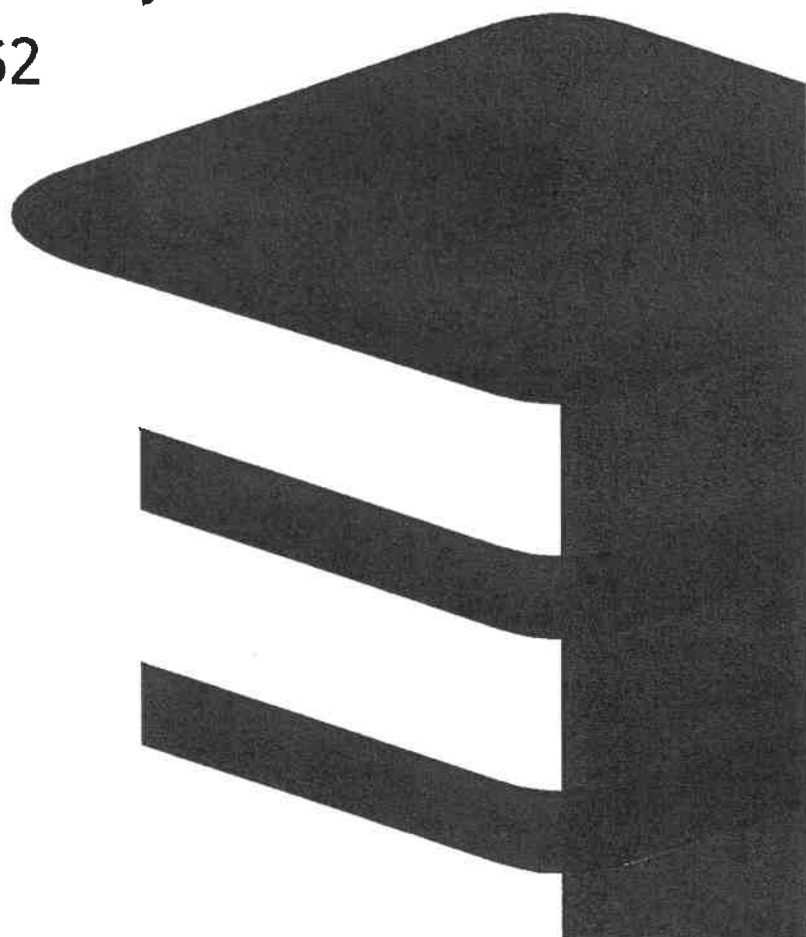

Harmonogram stavby "-III. ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - III. etapa"

Kód položky	Rok	1 rok a 10 mesiacov																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	III. ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor																						
102-01	102-01 Cesta II/585, km 17,177-24,300, okr. V. Krúň																						
102-011	Komunikácia, úsek 1, úsek 2																						
102-012	Rekonštrukcia priepustov																						
102-02	102-02 Cesta II/585, km 24,300-26,480, okr. V. Krúň																						
102-021	Komunikácia																						
102-022	Rekonštrukcia priepustov																						
102-03	102-03 Cesta II/585, km 26,480-29,099, okr. V. Krúň																						
102-031	Komunikácia																						
102-032	Rekonštrukcia priepustov																						
102-04	102-04 Cesta II/585, km 29,099-29,469, okr. V. Krúň																						
102-041	Komunikácia																						
102-042	Rekonštrukcia priepustov																						
102-10	102-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Muľa																						
102-11	102-11 Úprava príchodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec																						
102-12	102-12 Nástupišťa AZ v k.ú. Muľa																						
102-20	102-20 Osvetlenie príchodu pre chodcov v k.ú. Muľa																						
102-21	102-21 Osvetlenie príchodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec																						
102-22	102-22 Osvetlenie príchodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec																						
102-23	102-23 Osvetlenie príchodu pre chodcov v k.ú. Pôtor																						
204-00	204-00 Most ev.č.585-012																						
205-00	205-00 Most ev.č.585-013																						
206-00	206-00 Most ev.č.585-014																						
207-00	207-00 Most ev.č.585-015																						
208-00	208-00 Most ev.č.585-016																						
209-00	209-00 Most ev.č.585-017																						
210-00	210-00 Most ev.č.585-018																						
211-00	211-00 Most ev.č.585-019																						
212-00	212-00 Most ev.č.585-020																						

G3. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 3 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Osloboditeľov 66, Košice 040 17
IČO uchádzača:	31 651 518
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +i <u>bi</u>

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	3 969 296,34
DPH v EUR:	793 859,27
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	4 763 155,61

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici dňa 22.2.2021



.....
Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, poverený zastupovaním

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 04AKT3FINAL
Stavba: -III. ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - III. etapa

JKSO:
Miesto: VELKý Krtíš cesta III/585

KS:
Dátum: 19. 2. 2021

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s

IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274

Projektant:
ISprlm s.r.o

IČO: 31688098
IČ DPH: 20200485808

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 969 296,34

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	3 969 296,34	793 859,27

Cena s DPH v EUR 4 763 155,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 04AKT3FINAL

Stavba: -III. ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - III. etapa

Miesto: VELKÝ Krtíš cesta III/585

Dátum: 19. 2. 2021

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: ISprim s.r.o

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 969 296,34	4 763 155,61
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	14 234,00	17 080,80
102-01	102-01 Cesta II/585, km 17,177-24,300, okr. V. Krtíš	1 214 563,19	1 457 475,83
102-011	Komunikácia, úsek 1, úsek 2	1 085 536,18	1 302 643,42
102-012	Rekonštrukcia priepustov	129 027,01	154 832,41
02006	Priepust č.5 - P 21305	7 978,39	9 574,07
02006	Priepust č.6 - P 79228	7 698,12	9 237,74
02007	Priepust č.7 - P 76786	8 744,12	10 492,94
02008	Priepust č.8 - P 21306	5 687,44	6 824,93
02009	Priepust č.9 - P 21307	15 344,94	18 413,93
02010	Priepust č.10 - P 72294	8 597,83	10 317,40
02011	Priepust č.11 - P 21308	6 672,17	8 006,80
02012	Priepust č.12 - P 21309	6 732,86	8 079,43
02013	Priepust č.13 - P 21310	4 623,99	5 548,79
02014	Priepust č.14 - P 72295	8 881,08	10 657,30
02015	Priepust č.15 - P 72296	6 925,05	8 310,06
02016	Priepust č.16 - P 21311	7 605,30	9 126,36
02017	Priepust č.17 - P 21312	8 933,81	10 720,33
02018	Priepust č.18 - P 21313	2 853,02	3 423,62
02019	Priepust č.19 - P 21314	8 339,56	10 007,47
02020	Priepust č.20 - P 72297	8 012,90	9 615,48
02020.1	Priepust č.20.1 - km 20,720	5 396,63	6 475,96
102-02	102-02 Cesta II/585, km 24,300-26,450, okr. V. Krtíš	729 222,75	875 067,30
102-021	Komunikácia	716 883,12	860 259,74
102-022	Rekonštrukcia priepustov	12 339,63	14 807,56
02021	Priepust č.21 - P 21315	8 718,41	10 462,09
02022	Priepust č.22 - P 21316	3 621,22	4 345,46
102-03	102-03 Cesta II/585, km 26,450-29,099, okr. V. Krtíš	986 169,77	1 183 403,72
102-031	Komunikácia	940 020,66	1 128 035,59
102-032	Rekonštrukcia priepustov	46 140,11	55 368,13
02023	Priepust č.23 - P 21317	12 655,18	15 186,22
02024	Priepust č.24 - P 21318	11 712,90	14 055,48
02026	Priepust č.25 - P 21316	10 862,83	13 035,40
02026	Priepust č.26 - P 21320	10 909,20	13 091,04
102-04	102-04 Cesta II/585, km 29,099-29,469, okr. V. Krtíš	75 285,36	90 342,43
102-041	Komunikácia	68 607,62	82 320,14
102-042	Rekonštrukcia priepustov	6 677,74	8 013,29
02027	Priepust č.27 - P 21321	6 677,74	8 013,29
102-10	102-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Muľa	35 698,33	42 838,00
102-11	102-11 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	4 535,99	5 443,19
102-12	102-12 Nástupišťa AZ v k.ú. Muľa	7 498,73	8 998,48
102-20	102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Muľa	7 861,34	9 433,61
102-21	102-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	6 293,33	7 552,00
102-22	102-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec	6 383,06	7 659,67
102-23	102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Pótor	7 861,34	9 433,61

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
204-00	204-00 Most ev.č.585-012	76 742,60	92 091,12
205-00	205-00 Most ev.č.585-013	80 762,22	96 914,66
206-00	206-00 Most ev.č.585-014	93 480,17	112 176,20
207-00	207-00 Most ev.č.585-015	127 435,51	152 922,61
208-00	208-00 Most ev.č.585-016	108 981,75	130 778,10
209-00	209-00 Most ev.č.585-017	86 472,98	103 767,58
210-00	210-00 Most ev.č.585-018	78 173,13	93 807,76
211-00	211-00 Most ev.č.585-019	125 076,50	150 091,80
212-00	212-00 Most ev.č.585-020	96 564,29	115 877,15

