

Identifikačné údaje

P.S.in, a.s.

M. Rázusa 7

010 01 Žilina

IČO: 477 64 821

IČ DPH: SK2024091102

Zapísaná OR Okresného súdu v Žiline Oddiel Sa Vložka číslo 10827/L

Banka:

SWIFT:

IBAN:

www.psin.sk

Ing. Stopka Patrik - predseda predstavenstva 0905 193 771 psin@psin.sk

Ing. Albert Marián - člen predstavenstva 0917 960 384 marian.albert@psin.sk

Randa Miroslav - člen predstavenstva 0904 474 277 miroslav.randa@psin.sk

Zoznam hospodárskych subjektov číslo: 2018/1-PO-D5598 platnosť do: 26.1.2021

Výpis z registra partnerov verejného sektora číslo vložky: 7945

Obrat 2014 - 1 856 417 € bez DPH

Obrat 2015 - 3 368 685 € bez DPH

Obrat 2016 - 1 883 739 € bez DPH

Obrat 2017 - 3 984 593 € bez DPH

Obrat 2018 - 6 827 797 € bez DPH

Ing. Stopka Patrik - stavbyvedúci pozemné stavby č. oprávnenia 11 446*10 od 11.11.2009

Ing. Albert Marián - stavbyvedúci inžinierske stavby č. oprávnenia 10 882*20 od 28.2.2008

Randa Miroslav - stavbyvedúci pozemné stavby č. oprávnenia 12 741*10 od 15.10.2014

stavebný dozor pozemné stavby č. oprávnenia 11 351*10 od 25.4.2018

ISO 10006:03 project manager č. oprávnenia PCE 17 NA-0936 od 23.11.2017

Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) č. 18/155/LIE

www.tsus.sk

19/211/LIE

Certifikáty ISO:

STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015

STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015

STN OHSAS 18001:2009 / OHSAS 18001:2007

ISO 22310 : 2012

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV K NÁVRHU ZMLUVY

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“)

Názov zákazky:

predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác IA č. 33234 – predmetu zákazky s názvom: **"Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy"**

Druh zákazky:

- zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO;
- podlimitná zákazka v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO zadávaná postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

P.S.in, a.s.

M. Rázusa 7

010 01 Žilina

IČO: 477 64 821

IČ DPH: SK2024091102

Zapísaná OR Okresného súdu v Žiline Oddiel Sa Vložka číslo 10827/L

Banka:

SWIFT:

IBAN: S

SK87 1

www.psin.sk

Ing. Stopka Patrik - predseda predstavenstva 0905 193 771 psin@psin.sk

Ing. Albert Marián - člen predstavenstva 0917 960 384 marian.albert@psin.sk

Randa Miroslav - člen predstavenstva 0904 474 277 miroslav.randa@psin.sk

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

čestne vyhlasujem, že

- záväzne súhlasím/súhlasíme so všetkými predpísanými obchodnými (zmluvnými) podmienkami predmetu zákazky, vrátane sociálneho aspektu uvedeného v bode 5.9 Návrhu zmluvy, ktoré zároveň tvoria časť textovej časti súťažných podkladov B.1 Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu zákazky, v nadväznosti na prílohu č.1 súťažných podkladov, vrátane state B.2 Podrobný opis predmetu zákazky; vrátane zloženia depozitu alebo poskytnutia bankovej záruky vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH (podrobnosti viď. Čl. I Návrhu zmluvy);
- na prvé vyžiadanie verejného obstarávateľa predložíme kompletný Návrh zmluvy v zmysle bodu 7, bodu 16.2.4 textovej časti súťažných podkladov a časti B.1 Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu zákazky textovej časti súťažných podkladov;


Príloha č.7 časti II. súťažných podkladov

- v Návrhu zmluvy uvedieme nasledovné údaje:

Identifikácia údaje v Návrhu zmluvy (bod Návrhu zmluvy)	Údaje uvedené uchádzačom v Návrhu zmluvy
4.1 Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zhotoviteľ zabezpečovať subdodávateľsky:	100 325,69 € %
4.11 Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa	Randa Miroslav, Ing. Stopka Patrik (titul, meno, priezvisko)
5.2 Termín ukončenia realizácie stavebného diela: (do 12 mesiacov)12 mesiacov

v Žiline dňa 21.1.2020

.....
Ing. Stopka Patrik



ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k alternatívnym výrobkom alebo materiálom (ekvivalentom)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“)

Názov zákazky:

predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác IA č. 33234 – predmetu zákazky s názvom:
"Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy"

Druh zákazky:

- zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO;
- podlimitná zákazka v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO zadávaná postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhu a bez použitia elektronickej aukcie.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

P.S.in, a.s.

M. Rázusa 7

010 01 Žilina

IČO: 477 64 821

IČ DPH: SK2024091102

Zapísaná OR Okresného súdu v Žiline Oddiel Sa Vložka číslo 10827/L

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

čestne vyhlasujem,

že v nami predloženej ponuke – v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte boli použité nasledovné alternatívne výrobky alebo materiály (ekvivalenty) od alternatívneho výrobcu/výrobcov s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, v súlade s európskymi a slovenskými normami:

Pôvodný názov výrobku (popis položky Výkazu výmer – Rozpočtu zadaneho verejným obstarávateľom)	Názov položky s ekvivalentným materiálom alebo výrobkom (ponúkaný ekvivalent uchádzačom)
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx

PS **P.S. in, a.s.**
M. Rázusa 7
010 01 Žilina
7764821
SK 2024091102
quality cons

v Žiline, dňa 21.1.2020

Ing. Stopka Patrik

.....
Titul, meno, priezvisko, podpis oprávnenej
osoby uchádzača / skupiny dodávateľov

Príloha: dôkazné prostriedky

Príloha č.10 časti II. súťažných podkladov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV K PODIELU ZÁKAZKY, KTORÁ BUDE ZADANÁ SUBDODÁVATEĽOM

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“)

Názov zákazky:

predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác IA č. 33234 – predmetu zákazky s názvom: **"Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy"**

Druh zákazky:

- zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO;
- podlimitná zákazka v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO zadávaná postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhu a bez použitia elektronickej aukcie.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: P.S.in, a.s.

M. Rázusa 7

010 01 Žilina

IČO: 477 64 821

IČ DPH: SK2024091102

Zapísaná OR Okresného súdu v Žiline Oddiel Sa Vložka číslo 10827/L

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

čestne vyhlasujem, že:

časť SO 01.1 Architektúra (práce, montáže) vykonám sám a v subdodávke budú realizované nasledovné stavebné práce:

Predmet subdodávky: (stručný popis činností vykonávaných v subdodávke, s odkazom aj na stavebný objekt z objektovej skladby, resp. oddiel rozpočtu)	Percentuálne vyjadrenie prác v subdodávke v %	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: - obchodné meno alebo názov; meno a priezvisko - adresa sídla; pobytu - identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak číslo nebolo pridelené IČO
Montáž Zti, plynofikácia, vykurovanie, ORL, VZT	7,36	Bergas Slovakia sro Kalinčiakova 275 Gbeľany Ičo:47551364

Príloha č.7 časti III. súťažných podkladov

Montáž Eli + EPS	5,87	JARS elektro sro Kuzmányho 8424/20A Žilina Ičo: 47381850
SPLOLU:	13,23	---


v Žiline dňa 21.1.2020.

Ing. Stopka Patrik

.....

Titul, meno, priezvisko,

podpis oprávnenej osoby uchádzača / skupiny dodávateľov



Zmluva o dielo

o vykonaní prác, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica

Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
Zastúpený: Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka organizácie
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Dagmar Tešliarová
v technických veciach: Ing. Dagmar Tešliarová
IČO: 35528290
DIČ: 2021204262
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 4467 561
E-mail: riaditelka@vdz-financie.sk; mzdy@vdz-financie.sk
Internetová stránka: www.vdz-financie.sk
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.

Sídlo: M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
Zapísaný: OR OS Žilina oddiel Sa vložka č. 10827/L
Zastúpený: Ing. Stopka Patrik - člen predstavenstva
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Stopka Patrik
v technických veciach: Randa Miroslav
IČO: 477 64 821
DIČ: 2024091102
IČ DPH: SK2024091102
Tel.: 0905 193 771
E-mail: psin@psin.sk
Internetová stránka: www.psin.sk
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác IA č. 33234 – predmetu zákazky s názvom: **"Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy"**. Podrobné špecifikácie: podľa oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, ktorý je súčasťou prílohy č.1 tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluvy“).
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené stavebné dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.

Článok III. Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 3.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – zákazka na uskutočnenie stavebných prác IA č. 33234 – predmetu zákazky s názvom: **"Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy"**, vrátane výzvy na predloženie ponuky s prílohami; informácie získané miestnou obhliadkou realizovaného stavebného diela; oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
- 3.2 Obsah a rozsah predmetu zmluvy:
- obsahom plnenia zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác IA č. 33234 – predmetu zákazky s názvom: **"Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy"**.
 - objektová skladba stavebného diela:
 - SO 01 Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy
 - SO 01.1 Architektúra
 - SO 01.2 Zdravotechnika
 - SO 01.3 Plynofikácia
 - SO 01.4 Vykurovanie
 - SO 01.6 Elektro
 - SO 01.7 EPS + HSP
 - SO 01.8 Vzduchotechnika
 - SO 02 Rozšírenie parkoviska
 - SO 03 Kanalizačná prípojka, lapač tukov a nadzemný hydrant
 - rozsah objektovej skladby stavebných prác: podľa oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 ZoD a PD.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so „ZoVO“).
- 3.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 3.5 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 3.6 Zmluvu možno meniť len v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoVO.
- 3.7 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán, resp. po prípadnom schválení zriaďovateľom, ak to zriaďovateľ bude vyžadovať.
- 3.8 Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak:
- 3.8.1 zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcí a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy,
- 3.8.2 ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej Zmluvy a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- 3.8.3 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ – objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- 3.8.4 ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. uplatnenia podmienky podľa bodu 3.8.1,
2. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa ZoVO alebo
3. skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa alebo hlavného koncesionára voči jeho subdodávateľom podľa § 41 alebo
- 3.8.5 nedochádza k podstatnej zmene zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 3.9 Podmienky na zmenu zmluvy:
- 3.9.1 iniciovať zmenu zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom pripraví návrh dodatku,
- 3.9.2 zmena zmluvy nesmie byť v rozpore s príslušnými ustanoveniami ZoVO,
- 3.9.3 návrh dodatku zmluvná strana predloží druhej zmluvnej strane na posúdenie, pričom je táto povinná posúdenie vykonať do 7 kalendárnych dní odo dňa obdržania návrhu. V prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na deň štátneho sviatku, sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň,
- 3.9.4 zmluvné strany sú povinné riadiť sa pri zmene zmluvy pokynmi, zmluvnými povinnosťami a zriaďovateľom, platnými predpismi a zákonmi SR, resp. EÚ, ak to bude relevantné a príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy, ktoré sa týkajú uzatvárania dodatkov.
- 3.10 Pred schválením zmeny subdodávateľa musí byť splnená povinnosť v zmysle § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 5 ZoVO a tým aj § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO a ostatné povinnosti v zmysle ZoVO (napr. § 11 ZoVO), ak budú relevantné.

Článok IV.

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy, vrátane subdodávky

- 4.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť. Stavebné dielo zhotoviteľ vykoná vlastnými kapacitami. Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zhotoviteľ zabezpečovať subdodávateľsky, bude činiť .21,50 % z podielu celého plnenia, čo vo finančnom vyjadrení činí 100 325,69 € s DPH.

Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávateľia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.

Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého z nižšie uvedených subdodávateľov, musí požiadať objednávateľa a stavebného dozora o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.

Formou subdodávok bude zhotoviteľ realizovať nasledovné stavebné práce:

(stručný popis činností vykonávaných subdodávke) (obchodné meno a sídlo subdodávateľa)

- Montáž Zti, plynofikácia, vykurovanie, ORL, VZT - Bergas Slovakia sro Kalinčiakova 275 Gbeľany
- Montáž Eli + EPS JARS elektro sro Kuzmányho 8424/20A Žilina

- -

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 4.3 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch (3.) pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor tri (3) pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 4.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 5 dní vopred, že stavba je pripravená na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaná Zápisnica z odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 4.5 Odovzdaním a prevzatím diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
- a) podpísanie preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a zhotoviteľa bez väd, nedorobkov a pod., ktoré by bránili bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela (Zápisnice z odovzdávacieho a preberacieho konania bez závažných výhrad). Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo s vadami a nepodpísať preberací protokol až do úplného odstránenia väd,
 - b) stavba musí byť v čase preberacieho konania bez vážnych väd brániacich bezpečnej prevádzke, užívaniu a ostatné drobné vady zhotoviteľ odstráni do 10 – tich dní od začiatku preberacieho konania. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť,
 - c) zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti projektu do dokumentácie skutočného vyhotovenia a v min. troch exemplároch odovzdá objednávateľovi,
 - d) zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky správy, predpísané protokoly o skúškach a revízie, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, záručné listy a pod. potrebné k uvedeniu diela do prevádzky, doklady zákonného likvidovania vznikajúcich odpadov počas výstavby, podrobnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác, fotokópiu stavebného denníka a to všetko minimálne v troch exemplároch,
 - e) zhotoviteľ je povinný uvoľniť a vypratať stavenisko ku dňu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednávateľa a neohrozil život a zdravie zamestnancov objednávateľa a ostatných osôb prítomných na stavbe a stavenisku. Zodpovednosť za škodu počas realizácie prác znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 4.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom a to vo vzájomne dohodnutej lehote medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné súvisiace príslušné právne predpisy, t. j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.
Predmet zmluvy - dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, platné technické normy, výkresovú dokumentáciu, Výkaz výmer - Rozpočet a ostatné špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri príprave a realizácii diela príslušné technické normy a bezpečnostné predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 4.10 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu zákazky – zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť (odpad) uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 4.11 Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Randa Miroslav, Ing. Stopka Patrik
- 4.12 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v PD a v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby vrátane prípadných doplnkov.
- 4.13 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.

Rozoznávajú sa:

- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela

- s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká;
- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do piatich (5.) pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady bezodkladne v zmysle bodu 5. tohto článku, najneskôr do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. V prípade ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
- 4.15 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 4.16 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.

Článok V.

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie stavebných prác

- 5.1 Miestom realizácie stavebného diela je: Tatranská Lomnica, p.č. 212/6, č. 212/22, k.ú. Tatranská Lomnica – bližšie viď. PD.
- 5.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie:
- termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; možnosti financovania a pod.:
 - začiatok realizácie stavebných prác: po podpise ZoD, nadobudnutí jej účinnosti a prevzatí staveniska ale za podmienky zabezpečenia finančného krytia celej investičnej akcie zriaďovateľom objednávateľa - Ministerstvom financií SR, t. j. začiatok plnenia uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom verejného obstarávania (zhotoviteľom) je podmienené zabezpečením finančného krytia celej investičnej akcie zriaďovateľom objednávateľa - Ministerstvom financií SR a následným odovzdaním staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.
 - ukončenie realizácie stavebných prác úspešným odovzdávacím a preberacím konaním: do 12 .mesiacov (max. do 12 mesiacov) odo dňa uzatvorenia zmluvy, po zabezpečení finančného krytia celej investičnej akcie zriaďovateľom objednávateľa - Ministerstvom financií SR a následným odovzdaním staveniska predmetu zákazky pre zhotoviteľa. Uvedená maximálna lehota je pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného stavebného diela do 10 kalendárnych dní po podpise ZoD, ale za podmienok uvedených v bode 5.2 tejto zmluvy.
- Objednávateľ vytýči hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod mechanizmov a dopravy, zriadenie elektrickej staveništnej prípojky, uvoľní časti priestorov dotknutých realizáciou stavby a umožní prístup potrebný pre vykonanie stavebných prác.
- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska tri (3) sady kompletnej PD.

- 5.4 Zápis z odovzdania staveniska pred realizáciou stavebného diela a Zápis z odovzdávacieho a preberacieho konania stavebného diela po realizácii pripraví stavebný dozor.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 5.6 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer - Rozpočtu, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia stavby o dobu, potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou dodatku k ZoD, pričom dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť lehotu plnenia v prípade okolností zapríčinených objednávateľom. Prerušenie lehoty plnenia je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi písomnou formou, ktorý musí prerušenie realizácie odsúhlasiť. Za odsúhlasenie prerušenia realizácie diela zo strany objednávateľa sa považuje potvrdenie zápisu o prerušení výstavby v stavebnom denníku objednávateľom a zároveň stavebným dozorom. Počas prerušenia realizácie diela lehota uvedená v bode 5.2 neplynie. Ukončenie prerušenia lehoty realizácie diela musí byť zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.
- 5.8 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu pokiaľ sa vyskytnú závažné dôvody na základe pokynu objednávateľa aj v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (Tatranská Lomnica resp. okres Poprad).

Článok VI.

Spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, keď sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 6.2 Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie klientov ubytovacieho zariadenia a pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre realizáciu predmetného stavebného diela nie je kontrolný a skúšobný plán potrebný.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela (s poistným plnením min. na ponukovú cenu stavebného diela). Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu ZoD, resp. najneskôr k termínu odovzdania staveniska predložiť:

- podrobný zoznam vlastných pracovníkov a pracovníkov prípadného subdodávateľa, ktorí sa budú podieľať na realizácii stavebného diela, ktorí sa budú pohybovať na pozemku objednávateľa a ktorí budú vstupovať do objektu;
- doklad o ich beztrestnosti – výpis z registra trestov, nakoľko práce budú realizované počas bežnej prevádzky v zariadení.

Podrobný zoznam bude obsahovať: poradové číslo; titul, meno a priezvisko pracovníka; názov a adresa zamestnávateľa; číslo občianskeho preukazu platného počas celej doby realizácie stavebných prác; odsúhlasenie objednávateľom po kontrole. Objednávateľ si pred podpisom zmluvy, resp. ku dňu odovzdania staveniska uvedené skontroluje. V prípade potreby nasadenia pracovníkov, neuvedených v predmetnom zozname, musí zhotoviteľ tento zoznam doplniť o týchto pracovníkov a vydokladovať ich beztrestnosť – výpisom z registra trestov. Objednávateľ, resp. stavebný dozor má právo kedykoľvek skontrolovať pracovníkov zhotoviteľa, či sú na odsúhlasenom zozname, a tým sú oprávnení pohybovať sa na pozemku objednávateľa a vstupovať do objektu.

Článok VII.

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

7.1 Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky:

- Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania. Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer - Rozpočet.
- Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, formou oceneného Výkazu výmer, ako záväzný ponukový rozpočet. Cena je spracovaná na základe listinnej a elektronickej podoby oceneného Výkazu výmer úspešným uchádzačom - zhotoviteľom.

Cena za celý predmet zmluvy činí:

989 062,99 € bez DPH, slovom deväťstoosemdesiatdeväťtisícšesťdesiatdva Eur 99/100 cent

197 812,60 € DPH 20%, slovom jednostodeväťdesiatsedemtisícosemstodvanásť Eur 60/100 cent

1 186 875,59 € s DPH, slovom jedenmiliónjednostoosedesiatšesťtisícosemstosedemdesiatpäť Eur 59/100 cent

- Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.

Súčasťou ceny sú aj všetky náklady súvisiace s realizáciou a odovzdaním stavebného diela (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk + nepredvídateľné náklady nakoľko sa jedná aj o rekonštrukciu a pod. rozložené rovnomerne vo všetkých cenách a sadzbách jednotlivých položiek Výkazu výmer – Rozpočtu). Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer - Rozpočte nevyplýva inak, jednotkové ceny obsahujú:

- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
- náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska, resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu službu,
- náklady na provízorne oploenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávateľom,

- zvýšené náklady, vzhľadom k predpokladu realizácie stavebných prác počas bežnej prevádzky v zariadení,
- náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom, pokiaľ bude potrebné,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,
- náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem stavebných povolení) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na rezanie asfaltbetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre nápravu poškodených komunikácií zhotoviteľom,
- náklady na opravu poškodených komunikácií, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s uvedením do pôvodného stavu,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute zhotoviteľom pri realizácii predmetného stavebného diela na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien a pod.,
- náklady na ďalšie dočasné práce neuvedené vo Výkazoch výmer (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou zhotoviteľa, dočasný zásyp ryhy štrkodrovou alebo obaľovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou) a pod.,
- náklady súvisiace s prípadným obtokovaním jednotlivých objektov počas výstavby (vrátane vypracovania prípadných žiadostí pre úrad ŽP, SVP, š.p. a ďalších dotknutých orgánov a organizácií, ak budú potrebné),
- náklady na výškovú úpravu akýchkoľvek šupátiek, vyrovnávacie prstence, resp. dobetónovanie napr. kanalizačných šachiet pred pokládkou poklopov a pod. do finálnej nivelety komunikácie, chodníka a pod. dotknutých výstavbou,
- náklady napr. na vymedzovacie objímky a koncové manžety pri pretláčaných potrubiach (pokiaľ budú realizované),
- náklady na vyčerpanie a vyčistenie stavebných konštrukcií (potrubí, šachiet, chráničiek a pod.) od nánosov a pod. a na prípadné demontážne práce stavebnej a technologickej časti stavby napr. pri kolízii s podzemnými vedeniami a pod., vrátane nákladov na odstránenie a zneškodnenie týchto demontovaných zariadení, materiálov a médií v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia,
- náklady na stratné,
- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
- náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány,
- náklady na prípadné zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného

značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,

- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
- náklady na čistenie komunikácií, ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu (pokiaľ budú potrebné),
- náklady na prípadné dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody, ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd (pokiaľ budú potrebné),
- náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám, vrátane zaistenia povolenia, vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtláčnych potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky (pokiaľ budú potrebné),
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávatelom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby, vrátane pomoci a súčinnosti s uvedením celého stavebného diela do prevádzky,
- všeobecné riziká, ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.),
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov, vrátane čistenia komunikácií od vlastnej stavebnej činnosti,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávatelovi,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení, ak to bude potrebné) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,
- náklady na vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na prípadné overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,
- náklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm (s poistným plnením min. na ponukovú cenu stavebného diela),
- náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotoviteľa, pokiaľ bude pre zhotoviteľa potrebná,
- náklady na zaznamenanie zmien a odchýlok od pôvodnej PD,
- predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízií, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, dokumentácia skutočného vyhotovenia a pod., podľa pokynov objednávatela).

Objednávatel', projektant a stavebný dozor si vyhradujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa.

d) Cena za dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Čl. II. a III. tejto zmluvy.

Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavby, t. j. je pevná, najneskôr však do 31. 12. 2022. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu

dohodnúť na uplatňovanie inflačného nárastu cien formou dodatku v súlade s výmerom č. R-3/1996 MF SR a opatrením č. R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartály. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

- e) Oceňovanie prípadných viac prác – v zmysle Čl. III. bod 3.3. Vystavenie faktúry za prípadné viac práce – v zmysle bodu 7.5 tohto článku zmluvy.
- 7.2 K cene diela bez DPH bude fakturovaná príslušná DPH podľa platnej sadzby v čase fakturácie.
- 7.3 Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica. Objednávateľ na plnenie zmluvy preddavok ani zálohu neposkytne. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 7.4 Úhrada za zrealizované stavebné dielo bude vykonaná na základe:
- a) skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - b) miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru a objednávateľovi,
 - c) vydokladovania a predloženia zhotoviteľom objednávateľovi potvrdenia o splnení všetkých finančných záväzkov voči všetkým subdodávateľom, podieľajúcim sa na realizácii predmetného stavebného diela. Prílohami potvrdenia zhotoviteľa objednávateľovi o splnení všetkých finančných záväzkov voči všetkým subdodávateľom musia byť originály potvrdení subdodávateľov zhotoviteľovi o splnení všetkých finančných záväzkov zhotoviteľa voči nim, v súlade s Čl. IV., bod 4.1. Tieto potvrdenia subdodávateľov zhotoviteľovi musia obsahovať:
 - obchodné meno a sídlo subdodávateľa,
 - stručný popis činností, vykonávaných v subdodávke,
 - odvolávka na zmluvu resp. objednávku, na základe ktorej bola subdodávka realizovaná,
 - finančný objem predmetu subdodávky v €,
 - potvrdenie z banky o zrealizovaní platby zhotoviteľom na účet subdodávateľa, po jej pripísaní na účet subdodávateľa v plnom finančnom objeme v €, v súlade so zmluvou resp. objednávkou,
 - písomné prehlásenie subdodávateľa, že objednávateľ subdodávateľsky zhotovovaných prác, t. j. zhotoviteľ stavebného diela v súlade s touto ZoD, si uhradil všetky finančné záväzky voči ich spoločnosti,
 - miesto a dátum,
 - pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu subdodávateľa.
- 7.5 Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na vystavenie faktúry vždy po úspešnom odovzdaťacom a preberacom konaní stavebného diela. Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, po odsúhlasení súpisov vykonaných prác stavebným dozorom a objednávateľom. Stavebný dozor odsúhlasí súpisy vykonaných prác do piatich (5.) pracovných dní od ich obdržania, pokiaľ sú správne. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť: odsúhlasené súpisy vykonaných prác stavebným dozorom. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej faktúry. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer.

- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako prílohu č. 1 ZoD, záväzný položkovitý rozpočet aj v elektronickej verzii formátu MS Excel, totožný s rozpočtom vo verejnom obstarávaní, vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 7.8 Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov platným a účinným v čase realizácie zákazky. Z uvedeného dôvodu je v časti VI.2) výzvy na predloženie ponuky uvedené, že sa bude akceptovať elektronická fakturácia. V prípade, že to bude relevantné, zmluvné strany sú povinné pristúpiť k úprave ZoD formou dodatku.

Článok VIII.

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 8.1 Záručná doba na prevzaté dielo sa stanovuje na šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa úspešného prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia, spotrebný materiál a pod.), tu platí záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela vykonaného podľa schválenej PD a podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, sankcie

- 9.1 Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutej objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 9.2 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.
- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 9.4 Objednávateľ je povinný vady dohodnutého diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5.) pracovných dní po ich zistení, písomne oznámiť zhotoviteľovi. V oznámení o vadách diela musí objednávateľ zhotoviteľovi vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú).
- 9.5 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady dohodnutého diela odstrániť.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- a) za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela, v zmysle zmluvných podmienok sa stanovujú na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania,
 - b) za včasné neodstránenie prípadných väd a nedorobkov z preberacieho a odovzdávacieho konania sa stanovujú na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania,
 - c) za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela, ku dňu odovzdania staveniska resp. s nižším poistným plnením ako bolo predpísané, sa stanovujú na 100,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania,

- d) za odstúpenie od zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle Čl. X. bod 10.5, 10.6 sa jednorázová zmluvná pokuta stanovuje na 5 000,00 € s DPH,
 - e) za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru; alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
 - f) za nepredloženie podrobného zoznamu vlastných pracovníkov a pracovníkov prípadného subdodávateľa, ktorí sa budú podieľať na realizácii stavebného diela, ktorí sa budú pohybovať na pozemku objednávateľa a ktorí budú vstupovať do objektu; ich dokladov o ich beztretnosti – výpis z registra trestov sa stanovuje na 5 000,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane, pokiaľ objednávateľ zistí, že čo i len jeden z pracovníkov zhotoviteľa pohybujúcich sa na pozemku objednávateľa alebo vstupujúcich do objektu nie je na odsúhlasenom zozname.
 - g) za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v Čl. VII. bod 7.1 za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných sankcií a pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti dvadsaťjeden dní (21) od jej doručenia.

Článok X.

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Ak zhotoviteľ zistí vady PD, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a projektanta cestou zápisu v stavebnom denníku. Ak objednávateľ a projektant i napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvá na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.
- 10.2 Vážne vady PD sú jedným z dôvodov na pozastavenie prác, čo má za následok pozastavenie plynutia lehoty plnenia a uplatnenie ďalších práv, vyplývajúcich z tejto situácie.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu zmluvy.
- 10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.6 Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
- 10.6.1 neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - 10.6.2 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu primerane určenej lehoty neodstránil,
 - 10.6.3 neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu.
- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa.

- 10.9 Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 10.10 Vyššou mocou sa pre účely zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej strane.
- Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolané inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 10.11 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 10.12 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 10.13 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 10.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto ZoD, pričom nepridelenie finančného príspevku na realizáciu sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za ktorých verejný obstarávateľ – objednávateľ vykonal verejné obstarávanie.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnou deň po jej zverejnení na internetovej stránke Úradu vlády SR (www.crz.gov.sk), v súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Plnenie uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom verejného obstarávania je podmienené zabezpečením finančného krytia celej investičnej akcie zriaďovateľom objednávateľa - Ministerstvom financií SR a následným odovzdaním staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.
- 11.2 Zmluvu je možné zrušiť aj po obojstrannej dohode. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa zrušiť ZoD, ak nastanú relevantné okolnosti uvedené v zákone o verejnom obstarávaní.
- 11.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.
- 11.4 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na internetovej stránke Úradu vlády SR (www.crz.gov.sk). Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na uvedenej internetovej stránke.
- 11.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.

Zmluva o dielo – evid. číslo zhotoviteľa: , evid. číslo objednávateľa:/2020
..... – VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica


11.7 Prílohou k ZoD, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú časť je Príloha č. 1: ocenený Výkaz výmer – Rozpočet.

V Žiline dňa 21.1.2020

V Tatranskej Lomnici, dňa

.....
Ing. Stopka Patrik

.....
Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie
objednávateľ

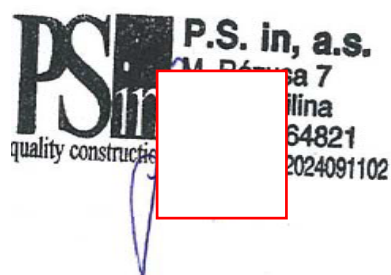

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP2020_003

Stavba: Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba budovy

JKSO:
Miesto: Tatranská Lomnica

KS:
Dátum: 3. 1. 2020

Objednávateľ:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie

IČO: 35528290
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Miroslava Lukešová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	989 062,99
---------------------	-------------------


DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	989 062,99	197 812,60

Cena s DPH	v	EUR	1 186 875,59
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP2020 003

Stavba: Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba budovy

Miesto: Tatranská Lomnica

Dátum: 3. 1. 2020

Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS-Financie

Projektant:

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.

Spracovateľ: Ing.Miroslava Lukešová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		989 062,99	1 186 875,59
SO 01	Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy	934 532,11	1 121 438,53
SO 01.1	ARCHITEKTÚRA	617 134,01	740 560,81
SO 01.2	Zdravotechnika	47 510,22	57 012,26
SO 01.3	Plynofikácia	3 102,00	3 722,40
SO 01.4	Vykurovanie	31 188,31	37 425,97
SO 01.6	Elektroinštalácia	74 687,88	89 625,46
SO 01.6.1	Elektroinštalácia	59 936,43	71 923,72
SO 01.6.2	Bleskozvod	14 751,45	17 701,74
SO 01.7	1.ETAPA - EPS + HSP	57 365,96	68 839,15
1.A	EPS	30 060,68	36 072,82
1.A	EPS	24 819,20	29 783,04
1.A.	EPS-pol.č.31a,č.34b	5 241,48	6 289,78
1.B	HSP 1.etapa	27 305,28	32 766,34
1.B	HSP 1.etapa	14 841,55	17 809,86
1.B-HSP	pol.č.43, č.23	12 463,73	14 956,48
SO01.8	Vzduchotechnika	103 543,73	124 252,48
SO 02	Rozšírenie parkoviska	29 947,26	35 936,71
SO 03	SO 03 Kanalizačná prípojka, lapač tukov a nadzemný hydrant	24 583,62	29 500,34

PS
P.S. in, a.s.
M. Rázusa 7
010 01 Žilina
IČO: 47764821
quality construction IČ DPH: SK 2024091402

**1. TRIEDA
1. CLASSE**

Bančova zmlúka

Súťaž



INPRO POPRAD sro
Ústecko Orlická 300/25
058 01 Poprad

Rekonštrukcia prístavby a nadstavby budovy 11

17

1
DORUČENÉ: POŠTOU
DŇA: 22.1.2020 o 10:55
PREVZÁLA: Ing. JUDITA KUZMČUKOVÁ
ŽILINA 2
010 02 #000018267
POŠTA
€001.70
21.01.2020 01
85105

INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
Register: Sro, 15783/P
IČO: 36 501 476, DIČ: 202:929542
