

Doprastav

TRADÍCIA • KVALITA • PROFESIONALITA

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

Uchádzač:

Skupina dodávateľov s názvom:

„DPS – VIAKORP, Senohrad“

Vedúci člen skupiny:

Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Člen skupiny:

VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7 892, 960 01 Zvolen

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad,
II. etapa“

01.02.2022

Originál

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/SKUPINY DODÁVATEĽOV

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača
(V prípade skupiny uchádzačov, vyplní každý člen skupiny)

Doprastav, a.s. – vedúci člen skupiny

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

„DPS – VIAKORP, Senohrad“

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Závod Žilina, Jesenského 18,
010 37 Žilina

IČO

31 333 320

Právna forma

Akiová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku
štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj
o zápise do tohto registra alebo evidencie

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa; vložka č. 581/B Deň
zápisu: 27.12.1993

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

SR

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina

Bankové spojenie

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefón

E-mail

Ing. Lucia Hroncová, PhD., útvar obchodu závodu Žilina

+421 918 517 271

lucia.hroncova@doprastav.sk

V Žiline, dňa: 01.02.2022

Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Ing. Lucia Hroncová, PhD., útvar obchodu závodu Žilina
(osoba oprávnená na podpis ponuky v mene uchádzača na základe splnomocnenia)

Všeobecné informácie o uchádzačovi

Obchodné meno alebo názov uchádzača	VIAKORP, s.r.o. člen skupiny
Názov skupiny dodávateľov	DPS - VIAKORP, Senohrad
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača	Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01
IČO	50 228 455
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis uchádzača v Obchodnom registri	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro; vložka č. 29450/S, Deň zápisu: 15.03.2016
Štát	SR
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača	meno a priezvisko Ing. Michal Šimko, konateľ
Kontaktné údaje uchádzača	
Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Michal Šimko, konateľ
Telefón	+421 908 714 028
E-mail	obchod@viakorp.sk

- 7 -03- 2022

Vo Zvolene, dňa:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

Ing. Michal Šimko, konateľ spoločnosti

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01

Skupina dodávateľov s názvom: „DPS – VIAKORP, Senohrad“

Vedúci člen skupiny: Doprastav a.s.,
Sídlo alebo miesto podnikania: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
IČO uchádzača: 31 333 320

Člen skupiny: VIAKORP, s.r.o.,
Sídlo alebo miesto podnikania: Strážska cesta 7 892, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača: 50 228 455

Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Lucia Hroncová, PhD., útvar obchodu závodu Žilina
e-mail: lucia.hroncova@doprastav.sk
tel.: +421 918 517 271

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 5 738 879,38

DPH v EUR: 1 147 775,88

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 6 886 655,26

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Žiline, dňa 08.03.2022

Podpis:

Ing. Lucia Hroncová, PhD., útvar obchodu závodu Žilina Doprastav a.s.
(osoba oprávnená na podpis ponuky v mene uchádzača na základe splnomocnenia)

Podpis:

Ing. Michal Šímko, konateľ spoločnosti VIAKORP, s.r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Náklady v €

Stavba: "Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad a II/527 Dobrá Niva-Senohrad, II. etapa-úseky v rámci okresu Zvolen"

Číslo objektu	Názov objektu	Stavebné objekty	Zariadenie staveniska	Spolu
SO ZV-526	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	968 482,05 €		968 482,05 €
SO ZV-526.01	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	847 522,44 €		847 522,44 €
P21958	Nový rámový priepust 1000x600	26 245,40 €		26 245,40 €
P21959	Nový rúrový priepust DN 500	8 687,26 €		8 687,26 €
P21960	Nový rúrový priepust DN 500	13 023,79 €		13 023,79 €
P21961	Nový rúrový priepust DN 500	13 123,24 €		13 123,24 €
P21962	Nový rúrový priepust DN 500	10 714,04 €		10 714,04 €
P21963	Nový rúrový priepust DN 500	9 073,13 €		9 073,13 €
P21964	Nový rúrový priepust DN 500	5 494,97 €		5 494,97 €
P22503	Nový rúrový priepust DN 600	14 142,78 €		14 142,78 €
SO ZV-526.02	Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé	11 980,00 €		11 980,00 €
SO ZV-526.03	Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	8 475,00 €		8 475,00 €
SO ZV-527	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	3 831 728,64 €		3 831 728,64 €
SO ZV-527.01	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	2 037 674,85 €		2 037 674,85 €
SAN527	Sanácia násypu	1 588 067,46 €		1 588 067,46 €
P21844	Rekonštrukcia rámový priepust 2000x1100	3 692,91 €		3 692,91 €
P21847	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	1 750,44 €		1 750,44 €
P21848	Rekonštrukcia rúrový priepust 2xDN 800	11 818,66 €		11 818,66 €
P21849	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	4 456,40 €		4 456,40 €


P21850	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	3 330,67 €		3 330,67 €
P21851	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	5 092,58 €		5 092,58 €
P21852	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	5 663,87 €		5 663,87 €
P21853	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	1 144,09 €		1 144,09 €
P21854	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	7 439,04 €		7 439,04 €
P21855	Nový rúrový priepust DN 600	10 102,93 €		10 102,93 €
P21856	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	3 148,83 €		3 148,83 €
P21857	Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700	9 093,39 €		9 093,39 €
P21858	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	2 179,37 €		2 179,37 €
P21859	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	3 066,64 €		3 066,64 €
P21860	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	11 298,53 €		11 298,53 €
P21861	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	10 892,81 €		10 892,81 €
P21862	Nový rúrový priepust DN 800	12 564,62 €		12 564,62 €
P21952	Nový rúrový priepust DN 600	17 943,26 €		17 943,26 €
P21953	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	1 122,72 €		1 122,72 €
P21965	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	777,68 €		777,68 €
P21966	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 056,20 €		2 056,20 €
P21967	Nový rúrový priepust DN 1000	23 186,24 €		23 186,24 €
P80259	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 500	4 400,39 €		4 400,39 €
SO ZV-527.02	Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé	36 373,56 €		36 373,56 €
SO ZV-527.03	Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	13 390,50 €		13 390,50 €
SO 526-009	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670	324 535,30 €		324 535,30 €
SO 526-009.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt	163 023,42 €		163 023,42 €
SO 526-009.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie	99 875,43 €		99 875,43 €

SO 526-009.03	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková komunikácia	55 008,69 €		55 008,69 €
SO 526-009.04	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - preložka vedenia ST	6 627,77 €		6 627,77 €
SO 527-037	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844	418 527,04 €		418 527,04 €
SO 527-037.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt	326 367,54 €		326 367,54 €
SO 527-037.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie	80 078,23 €		80 078,23 €
SO 527-037.03	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST	12 081,28 €		12 081,28 €
SO 527-041	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193	195 606,35 €		195 606,35 €
SO 527-041.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt	99 568,16 €		99 568,16 €
SO 527-041.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie	96 038,18 €		96 038,18 €
	Celkom bez DPH	5 738 879,38 €		5 738 879,38 €

*ZS máme rozpustené v jednotlivých JC všetkých objektov.



	DPH	1 147 775,88 €		1 147 775,88 €
--	-----	----------------	--	----------------

	Celkom s DPH	6 886 655,26 €		6 886 655,26 €
--	--------------	----------------	--	----------------





Časová OS harmonogramu -Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. Etapa



Harmonogram -Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad, II.

Identifikačný kód	Názov úlohy	322	Štvrť. 1, 2023												Štvrť. 2, 2023				Štvrť. 3, 2023				Štvrť. 4, 2023			
			jan	feb	mar	apr	máj	jun	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jun	júl	aug	sep	okt	nov	dec
1	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. Etapa		300 dní																							
2	Etapa - Úsek č. 1 - Trvanie 60 dní		60 dní																							
879	Etapa - Úsek č.2 - Trvanie 150dní		150 dní																							
1431	Etapa - Úsek č. 3 - Trvanie 90 dní		90 dní																							

100

Harmonogram -Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad, II.

identifikačný kód	Názov úlohy	Štvrť 1, 2023												Štvrť 2, 2023				Štvrť 3, 2023				Štvrť 4, 2023			
		jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec
403	P21856 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800																								
435	P21857 Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700																								
479	P21858 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600																								
504	P21859 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800																								
547	P21860 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800																								
595	P21861 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800																								
641	P21862 Nový rúrový priepust DN 800																								
675	P21952 Nový rúrový priepust DN 600																								
722	P21953 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600																								
733	P21965 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400																								
744	P21966 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800																								
777	P21967 Nový rúrový priepust DN 1000																								
829	P80259 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 500																								
879	Etap - Úsek č.2 - Trvanie 150dní																								

Harmonogram -Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad, II.

Identifil	Názov dlžky	122	Štvrť 1, 2023												Štvrť 2, 2023												Štvrť 3, 2023												Štvrť 4, 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
880	SO ZV-527.02 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Harmonogram -Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad, II.


Identifikačný kód	Názov úlohy	122											
		Štvrť 1, 2023	Štvrť 2, 2023	Štvrť 3, 2023	Štvrť 4, 2023	Štvrť 1, 2023	Štvrť 2, 2023	Štvrť 3, 2023	Štvrť 4, 2023	Štvrť 1, 2023	Štvrť 2, 2023	Štvrť 3, 2023	Štvrť 4, 2023
1623	P21962 Nový rúrový priepust DN 500												
1669	P21963 Nový rúrový priepust DN 500												
1715	P21964 Nový rúrový priepust DN 500												
1738	P22503 Nový rúrový priepust DN 600												
1785	SO ZV-526.02 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé												
1811	SO ZV-526.03 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas												
1813	SO 527-041.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt												
1935	SO 527-041.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie												
1990	SO ZV-526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809												

Stavba : Rekonstrukcia ciest a mostov II/526 Devčie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II.

Platobný kalendár 2022

Mesačný výkon v Eurách bez DPH										
2022/2023										celkom
Celkový výkon / Plán výroby	456 392,93	756 392,92	988 530,63	1 088 530,63	888 530,67	464 955,44	364 955,44	264 955,36	232 817,69	232 817,63
Celkový výkon / Doprastav, a.s.	456 392,93	1 212 785,85	2 201 316,52	3 289 847,15	4 178 377,82	4 643 333,26	5 008 288,70	5 273 244,06	5 506 061,75	5 738 879,38

Mesačný výkon v Eurách bez DPH										
2022/2023										celkom
Celkom - Doprastav, a.s.	456 392,93	756 392,92	988 530,67	1 088 530,63	888 530,67	464 955,44	364 955,44	264 955,36	232 817,69	232 817,63
	456 392,93	1 212 785,85	2 201 316,52	3 289 847,15	4 178 377,82	4 643 333,26	5 008 288,70	5 273 244,06	5 506 061,75	5 738 879,38

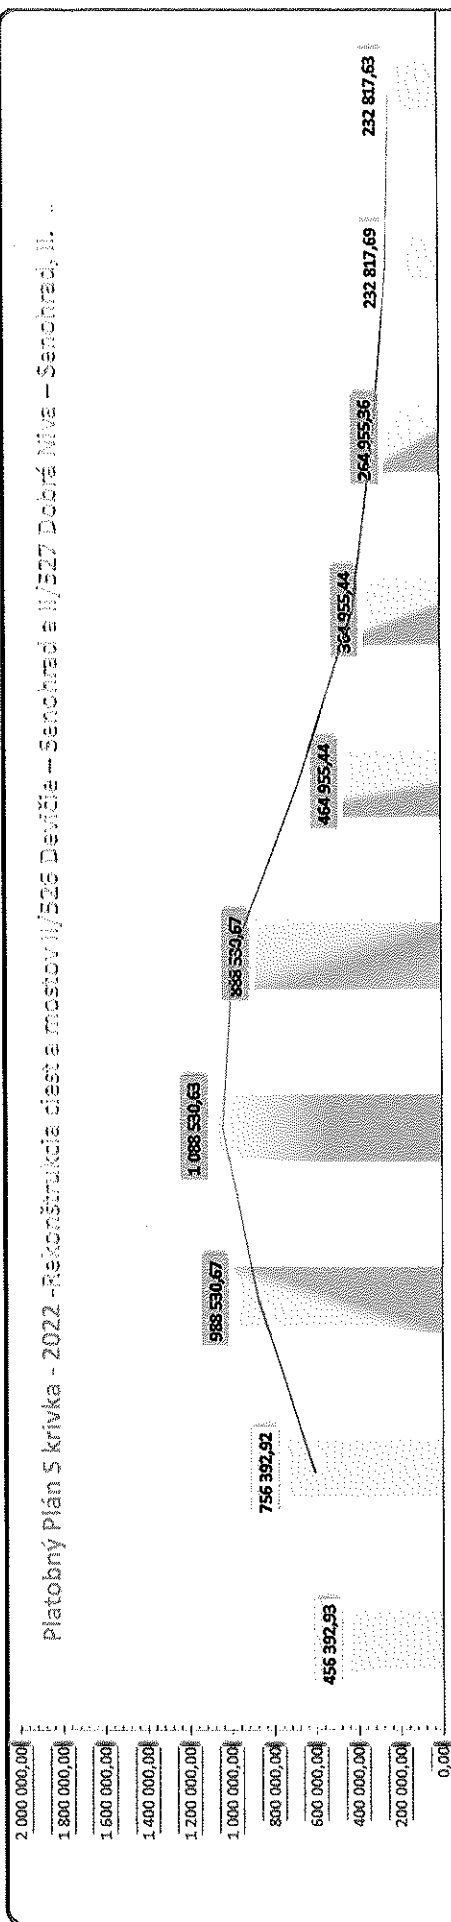

Obchodný súbor/Objekt		Cena Objektu		Predpokladaný mesačný príväz - Faktická 2022/2023						CEZ K/M	
Objekt SO 21-537 Rekonštrukcia I/537 v km 75,454 - 85,566		2 037 674,45 EUR		107 534,97	407 534,97	507 534,97	807 534,97	407 534,95		2 037 674,45	1 588 067,48
SA4557 Snáďa nábytk		1 980 057,46 EUR		317 613,49	317 613,49	317 613,49	317 613,49	517 613,50		1 980 057,46	1 588 067,48
P21844 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		3 032,97 EUR		738,58	738,58	738,58	738,58	738,58		3 032,97	1 762,44
P21847 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21848 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21849 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21850 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21851 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21852 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21853 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21854 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21855 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21856 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21857 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21858 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21859 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21860 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21861 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21862 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21863 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21864 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21865 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21866 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21867 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21868 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21869 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21870 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21871 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21872 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21873 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21874 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21875 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21876 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21877 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21878 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21879 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21880 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21881 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21882 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21883 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21884 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21885 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21886 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21887 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21888 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21889 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21890 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21891 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21892 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21893 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21894 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21895 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21896 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21897 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21898 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21899 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21900 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21901 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21902 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21903 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21904 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21905 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21906 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21907 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21908 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21909 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21910 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21911 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21912 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21913 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21914 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21915 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21916 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21917 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21918 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21919 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21920 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21921 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21922 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21923 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21924 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21925 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21926 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21927 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21928 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21929 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21930 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21931 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21932 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86
P21933 Rekonštrukcia Rinnoviprístav DN 800		1 200,64 EUR		350,09	350,09	350,09	350,09	350,09		1 200,64	1 181,86</
