Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Podlimitná zákazka

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky:

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

133/2023 – 07.07.2023 značka 22315 - WYP

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

OBSAH

1. Splnomocnenie
2. Test bežnej dostupnosti
3. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
4. Výzva na predkladanie ponúk
5. Súťažné podklady so všetkými prílohami
6. Menovanie komisie, menovacie dekréty
7. Ponuky
8. Zápisnica z otvárania ponúk
9. Žiadosť o vysvetlenie ponuky, odpoveď od uchádzača
10. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
11. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
12. Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
13. Čestné vyhlásenia o vylúčení konfliktu záujmov
14. Zmluva o dielo
15. Informácia o výsledku verejného obstarávania

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

VEC: Splnomocnenie na spracovanie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV“

Dolu podpísaný Ing. Ján Novák menujem:
Priezvisko, meno, titul: Balogová Lucia, Ing., zamestnankyňu firmy SVT, s.r.o.,
Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum narodenia: 25.07.1985

za osobu zodpovednú prieskum trhu – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“

Ing. Ján Novák
konateľ

Spišská Nová Ves, 02.07.2023

Test bežnej dostupnosti

Druh zákazky (tovar, služby, práce), názov zákazky: Stavebné práce, Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

Predpokladaná hodnota zákazky: 338 436,02 Eur bez DPH

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti" musí byť naplnená každá z uvedených podmienok:

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu		Áno	Nie
1	nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek		x
2	sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli špecifikované jedinečné požiadavky		x
3	sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu)		x

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 **ÁNO,** je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu		Áno	Nie
4	sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb		x
5	sú spotrebného charakteru		x

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 **ÁNO,** je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Záver*:	~~Bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná práca~~	Nie bežne dostupná stavebná práca

* Nehodiace sa preškrtnite

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky.

Odôvodnenie: Stavebné práce budú prebiehať podľa vypracovaného projektu, ktorý slúži len pre realizáciu konkrétnej stavby. Stavba je uskutočňovaná na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Prieskum trhu

Predmet zákazky:

„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV“

OBSAH

1. Objednávka k realizácii prieskumu trhu
2. Zaslanie Výzvy na prieskum trhu uchádzačom
3. Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
4. Prijaté ponuky
5. Záznam z prieskumu trhu
6. Žiadosť o vysvetlenie ponuky, odpoveď od uchádzača

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,Oddiel: Sro, Vložka číslo : 2601/V
Tel.: 00421/053/4173421,fax: 4173425, IČO : 31 666 205, DIČ : 2020503034

Objednávka č. 2212103

Dátum: 8.12.2022

Dodávateľ:

SVT, s.r.o.
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31652387
DIČ: 2020502847
IC DPH: SK2020502847

Predmet objednávky:

Objednávame si u Vás:

- spracovanie PHZ - „Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"

V celkovej sume cca 300 € bez DPH.

Faktúru vystavte:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.,
Novoveská cesta 9304/28,
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
Číslo účtu :	SK32 1111 0000 0066 0888 2010
IČO :	31 666 205
DIČ :	2020503034
IČ DPH :	SK2020503034

Objednávajúci:

Podpis a pečiatka:

Ing. Ján Novák
riaditeľ – konateľ

Ing. Jozef Perháč
zástupca riaditeľa - konateľ

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Číslo spisu:	35333

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	29.11.2022 22:26:35
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	SN Living s.r.o. (IČO: 50739409, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 35333 - Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Číslo spisu:	35333

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	29.11.2022 22:26:35
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	Lesostav Poprad s.r.o. (IČO: 31728499, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 35333 - Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Číslo spisu:	35333

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	29.11.2022 22:26:35
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. (IČO: 52473732, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 35333 - Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Číslo spisu:	35333

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	29.11.2022 22:26:36
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	MILANKO, spol. s r.o., (IČO: 31731244, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 35333 - Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

V Ý Z V A
NA PREDLOŽENIE INDIKATÍVNEJ CENOVEJ PONUKY

za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní")

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Sídlo organizácie:	Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Novák – riaditeľ – konateľ spoločnosti
IČO:	31666205
Internetová adresa:	www.lesysnv.sk
e-mail:	huta@lesysnv.sk

II. PREDMET ZÁKAZKY

a. Názov predmetu zákazky:

Prieskum trhu - „Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"

b. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail – trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail – trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú nadväzovať na tri jestvujúce trialy (detský trail, a dva enduro trialy). Na začiatku oboch trialov na parcele C-KN 9645/1 je navrhovaný objekt SO-03 – Altánok Skalka s dreveným sedením 2ks, odpadkovými košmi 2ks a ohniskom a lavičkami.
Objekt SO-04 – Altánok Hliníky je navrhovaný na parcele C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík, ktorého súčasťou je drevené sedenie 2ks. Odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.
SO-05 – Altánok Javor Poľana je navrhovaný na parcele C-KN 929, k.ú. Hnilec, ktorého súčasťou je taktiež drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.
Objekt SO-06 rieši rekonštrukciu bežeckých tratí Gloncingerka a Zelený vrch – odvodnenie na parcele C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík a E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík. Momentálne sú trate bez akéhokoľvek odvodnenie. Voda z okolitého terénu tečie priamo na bežecké trate, pretože ich povrch sa nachádza pod úrovňou priľahlého terénu a následne na ich pláni povrchová voda vytvára erózne ryhy, stojace mláky a podmáča ich pláň a podlažie.

Zákazka je rozdelená na 3 časti:

1. časť: SO-01. Cyklistický trail – trasa č.1
   SO-02. Cyklistický trail – trasa č.2
2. časť: SO-03. Altánok Skalka
   03.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko
   SO-04. Altánok Hliníky
   04.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko
   SO-05. Altánok Javor Poľana
   05.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko
3. časť: SO-06. Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH – odvodnenie

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na 1. Časť, 2., 3., ľubovoľné kombinácie jednotlivých častí alebo na všetky časti.

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, estetické a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

c. **Hlavné miesto dodania predmetu zákazky:**
Lesy mesta Spišská Nová Ves
- C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
- E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík
- C-KN 929. K.ú. Hnilčík
- C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík
- E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík

d. **Spoločný slovník obstarávania (CPV):**
Hlavný slovník:
45000000-7 – Stavebné práce

e. **Spôsob určenia ceny:**

Indikatívna cena za predmet zákazky musí byť pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Indikatívna cena musí byť v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách založená na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku. Indikatívna cena musí byť vyjadrená v eurách v súlade so zákonom č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášok č. 97/ 2008 Z. z. a 75/2008Z. z.

Do indikatívnej cenovej ponuky požaduje verejný obstarávateľ zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú cenu uvedie:
- Navrhovaná celková cena bez DPH,
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH".

III. PRÍPRAVA A PREDKLADANIE PONUKY

a. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **03.12.2022 o 00:00 hod.** miestneho času.

b. Spôsob predkladania ponúk:

Indikatívnu cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom IS Josephine.

c. Obsah ponuky:

Indikatívnu cenovú ponuku zasiela hospodársky subjekt vo forme vyplneného výkazu výmer – Indikatívna cenová ponuka", a to v needitovateľnom PDF formáte podpísanú a vo formáte excel. Uchádzač vyplní časť vo výkaze výmer, na ktorú predkladá ponuku.

IV. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku elektronicky prostredníctvom IS Josephine.

Uvedený predmet zákazky je súčasťou projektu financovaného z fondov Európskej únie Výzva č.: 59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra.

Tento prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania na predmet zákazky a podlieha kontrole zo strany sprostredkovateľského orgánu.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša hospodársky subjekt bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Indikatívne cenové ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Obsah a informácie uvedené v ponuke budú použité výlučne len za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.11.2022

Prílohy:
Výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: **Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV**

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 8.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: **Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV**

Miesto:	**Lesy mesta Spišská Nová Ves**	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**0,00**	**0,00**
SO 01	**Cyklistický trail – trasa č. 1**	0,00	0,00
SO 02	**Cyklistický trail – trasa č. 2**	0,00	0,00
SO 03	**Altánok Skalka**	0,00	0,00
SO 03-0	**Altánok**	0,00	0,00
SO 03-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	0,00	0,00
SO 04	**Altánok Hliníky**	0,00	0,00
SO 04-0	**Altánok**	0,00	0,00
SO 04-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	0,00	0,00
SO 05	**Altánok Javor Poľana**	0,00	0,00
SO 05-0	**Altánok**	0,00	0,00
SO 05-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	0,00	0,00
SO 06	**Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie**	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	200,000		0,00
	W		0,1*2*1000		200,000		
	W		Medzisúčet		200,000		
	W		Súčet		200,000		
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	600,000		0,00
	W		2*0,3*1000		600,000		
	W		Medzisúčet		600,000		
	W		Súčet		600,000		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	300,000		0,00
	W		600,000/2		300,000		
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	800,000		0,00
	W		200"ornica		200,000		
	W		600"vykop		600,000		
	W		Medzisúčet		800,000		
	W		Súčet		800,000		
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 600,000		0,00
	W		800*7 'Prepočítané koeficientom množstva		5 600,000		
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	800,000		0,00
	W		200"ornica		200,000		
	W		600"vykop		600,000		
	W		Medzisúčet		800,000		
	W		Súčet		800,000		
7	K	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	15,000		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
8	K	762-01	D+M Záplerky	ks	5,000		0,00
9	K	762-02	D+M Dropu	ks	2,000		0,00
10	K	762-03	D+M Skok	ks	3,000		0,00
11	K	762-04	D+M Mostík	ks	4,000		0,00
12	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	100,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	460,000		0,00
	W		0,1*2*2300		460,000		
	W		Medzisúčet		460,000		
	W		Súčet		460,000		
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 380,000		0,00
	W		2*0,3*2300		1 380,000		
	W		Medzisúčet		1 380,000		
	W		Súčet		1 380,000		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	690,000		0,00
	W		1380/2		690,000		
	W		Medzisúčet		690,000		
	W		Súčet		690,000		
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 840,000		0,00
	W		460"ornica		460,000		
	W		1380"vykop		1 380,000		
	W		Medzisúčet		1 840,000		
	W		Súčet		1 840,000		
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 880,000		0,00
	W		1840*7 'Prepočítané koeficientom množstva		12 880,000		
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 840,000		0,00
	W		460"ornica		460,000		
	W		1380"vykop		1 380,000		
	W		Medzisúčet		1 840,000		
	W		Súčet		1 840,000		
8	K	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	18,000		0,00
9	K	999-02	Zhotovenie viniek	ks	4,000		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
10	K	762-01	D+M Zápierky	ks	12,000		0,00
11	K	762-03	D+M Skok	ks	4,000		0,00
12	K	762-04	D+M Mostík	ks	2,000		0,00
13	K	762-05	D+M Lavice	ks	2,000		0,00
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	230,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Nátery	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV — 0,00

D 1 Zemné práce — 0,00

1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226		0,00
	W		0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornineTr. 3	m3	1,613		0,00
	W		3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226		0,00
	W		3,226		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582		0,00
	W		3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226		0,00
	W		3,226		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452		0,00
	W		3,226*2		6,452		
	W		Medzisúčet		6,452		
	W		Súčet		6,452		

D 2 Zakladanie — 0,00

7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840		0,00
	W		0,8*0,8*1*6		3,840		
	W		Medzisúčet		3,840		
	W		Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	W		(1-0,84)*0,8*4*6		3,072		
	W		Medzisúčet		3,072		
	W		Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072		0,00

D 5 Komunikácie — 0,00

10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	*M*	*592460008100.S R*	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*		*0,00*
	W		39,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000		0,00
	W		8,3*2+4,7*2		26,000		
	W		Medzisúčet		26,000		
	W		Súčet		26,000		
15	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*		*0,00*
	W		26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340		0,00
	W		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000		0,00
	W		2*9		18,000		
	W		Medzisúčet kliestiny		18,000		
	W		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650		0,00
	W		8,6*2		17,200		
	W		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	W		4,15*3		12,450		
	W		Medzisúčet vzpera		12,450		
	W		Súčet		29,650		
20	*M*	*605120007100.S R*	*Hranoly, vid. PD*	*m3*	*1,192*		*0,00*
	W		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	W		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	W		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	W		Medzisúčet vzpera		0,359		
	W		2*9*0,16*0,08		0,230		
	W		Medzisúčet kliestiny		0,230		
	W		Súčet		1,084		
	W		1,084*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000		0,00
	W		8,6*10*2		172,000		
	W		Medzisúčet		172,000		
	W		Súčet		172,000		
22	*M*	*605140001700.S R*	*Laty*	*m3*	*0,454*		*0,00*
	W		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	W		Medzisúčet		0,413		
	W		Súčet		0,413		
	W		0,413*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646		0,00
	W		1,192+0,454		1,646		
	W		Medzisúčet		1,646		
	W		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000		0,00
	W		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	W		Medzisúčet		14,000		
	W		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310		0,00
	W		6*2*3,5		42,000		
	W		Medzisúčet steny		42,000		
	W		3,14*9		28,260		
	W		Medzisúčet krokvy		28,260		
	W		3,65*17		62,050		
	W		Medzisúčet zadna stena		62,050		
	W		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(0,9+1,44)*6		14,040		
	W		4,15*3		12,450		
	W		Medzisúčet		26,490		
	W		Súčet		26,490		
27	*M*	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, vľ. PD*	*m3*	*3,661*		*0,00*
	W		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	W		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	W		Medzisúčet 250mm		0,893		
	W		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	W		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	W		Medzisúčet 150mm		2,339		
	W		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	W		Medzisúčet 120mm		0,158		
	W		Súčet		3,390		
	W		3,39*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661		0,00
	W		3,661		3,661		
	W		Medzisúčet		3,661		
	W		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465		0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200		0,00
	W		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560		0,00
	W		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008		0,00
	W		3,14*8,6*2		54,008		
	W		Medzisúčet		54,008		
	W		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200		0,00
	W		8,6*2		17,200		
	W		Medzisúčet		17,200		
	W		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000		0,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000		0,00
36	*M*	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*		*0,00*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000		0,00
	W		9*2		18,000		
38	*M*	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*		*0,00*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
40	*M*	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
42	*M*	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240		0,00
	W		(1,44+0,9*2)		3,240		
	W		Medzisúčet		3,240		
	W		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581		0,00
	D	783	Nátery				0,00
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575		0,00
	W		8,6*2*(0,16*2+0,18*2)		11,696		
	W		Medzisúčet pomurnica		11,696		
	W		4,15*3*(0,18*2+0,16*2)		8,466		
	W		Medzisúčet vzpera		8,466		
	W		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	W		Medzisúčet kliestiny		8,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		8,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	W		Medzisúčet laty		34,400		
	W		(2*Pi*0,125*0,125+2*Pi*0,125*4,15)		3,368		
	W		(2*Pi*0,125*0,125+2*Pi*0,125*14,04)		11,125		
	W		Medzisúčet 250mm		14,493		
	W		(2*Pi*0,075*0,075+2*Pi*0,075*70,62)		33,314		
	W		(2*Pi*0,075*0,075+2*Pi*0,075*62,05)		29,276		
	W		Medzisúčet 150mm		62,590		
	W		(2*Pi*0,06*0,06+2*Pi*0,06*14)		5,300		
	W		Medzisúčet 120mm		5,300		
	W		Súčet		145,575		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	**0,00**
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
	0,00
2) Ostatné náklady	
GZS	**0,00**
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090		0,00
	W		0,3*0,3*0,5*2		0,090		
	W		Medzisúčet		0,090		
	W		Súčet		0,090		
	D	2	Zakladanie				0,00
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036		0,00
	W		0,3*0,3*0,2*2		0,036		
	W		Medzisúčet		0,036		
	W		Súčet		0,036		
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054		0,00
	W		0,3*0,3*0,3*2		0,054		
	W		Medzisúčet		0,054		
	W		Súčet		0,054		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000		0,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	OST	Ostatné				0,00
10	K	OST-1	Prírodné ohnisko	ks	1,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v **EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Nátery	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves — Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. — Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj — Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226		0,00
	W		0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornineTr. 3	m3	1,613		0,00
	W		3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226		0,00
	W		3,226		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582		0,00
	W		3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226		0,00
	W		3,226		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452		0,00
	W		3,226*2		6,452		
	W		Medzisúčet		6,452		
	W		Súčet		6,452		
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840		0,00
	W		0,8*0,8*1*6		3,840		
	W		Medzisúčet		3,840		
	W		Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	W		(1-0,84)*0,8*4*6		3,072		
	W		Medzisúčet		3,072		
	W		Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	D	5	Komunikácie				0,00
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	592460008100.S R	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*		*0,00*
	W		39,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000		0,00
	W		8,3*2+4,7*2		26,000		
	W		Medzisúčet		26,000		
	W		Súčet		26,000		
15	M	592170001800.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*		*0,00*
	W		26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340		0,00
	W		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000		0,00
	W		2*9		18,000		
	W		Medzisúčet kliestiny		18,000		
	W		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650		0,00
	W		8,6*2		17,200		
	W		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	W		4,15*3		12,450		
	W		Medzisúčet vzpera		12,450		
	W		Súčet		29,650		
20	M	605120007100.S R	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*		*0,00*
	W		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	W		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	W		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	W		Medzisúčet vzpera		0,359		
	W		2*9*0,16*0,08		0,230		
	W		Medzisúčet kliestiny		0,230		
	W		Súčet		1,084		
	W		1,084*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000		0,00
	W		8,6*10*2		172,000		
	W		Medzisúčet		172,000		
	W		Súčet		172,000		
22	M	605140001700.S R	*Laty*	*m3*	*0,454*		*0,00*
	W		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	W		Medzisúčet		0,413		
	W		Súčet		0,413		
	W		0,413*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646		0,00
	W		1,192+0,454		1,646		
	W		Medzisúčet		1,646		
	W		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000		0,00
	W		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	W		Medzisúčet		14,000		
	W		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310		0,00
	W		6*2*3,5		42,000		
	W		Medzisúčet steny		42,000		
	W		3,14*9		28,260		
	W		Medzisúčet krokvy		28,260		
	W		3,65*17		62,050		
	W		Medzisúčet zadna stena		62,050		
	W		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(0,9+1,44)*6		14,040		
	W		4,15*3		12,450		
	W		Medzisúčet		26,490		
	W		Súčet		26,490		
27	*M*	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, vľ. PD*	*m3*	*3,661*		*0,00*
	W		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	W		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	W		Medzisúčet 250mm		0,893		
	W		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	W		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	W		Medzisúčet 150mm		2,339		
	W		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	W		Medzisúčet 120mm		0,158		
	W		Súčet		3,390		
	W		3,39*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661		0,00
	W		3,661		3,661		
	W		Medzisúčet		3,661		
	W		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465		0,00
	D	764	Konštrukcie klamplarske				0,00
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200		0,00
	W		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560		0,00
	W		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008		0,00
	W		3,14*8,6*2		54,008		
	W		Medzisúčet		54,008		
	W		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200		0,00
	W		8,6*2		17,200		
	W		Medzisúčet		17,200		
	W		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000		0,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000		0,00
36	*M*	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*		*0,00*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000		0,00
	W		9*2		18,000		
38	*M*	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*		*0,00*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
40	*M*	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
42	*M*	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240		0,00
	W		(1,44+0,9*2)		3,240		
	W		Medzisúčet		3,240		
	W		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581		0,00
	D	783	Nátery				0,00
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575		0,00
	W		8,6*2*(0,16*2+0,18*2)		11,696		
	W		Medzisúčet pomurnica		11,696		
	W		4,15*3*(0,18*2+0,16*2)		8,466		
	W		Medzisúčet vzpera		8,466		
	W		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	W		Medzisúčet kliestiny		8,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		8,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	W		Medzisúčet laty		34,400		
	W		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*4,15)		3,358		
	W		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*14,04)		11,125		
	W		Medzisúčet 250mm		14,483		
	W		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*70,62)		33,314		
	W		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*62,05)		29,276		
	W		Medzisúčet 150mm		62,590		
	W		(2*PI*0,06*0,06+2*PI*0,06*14)		5,300		
	W		Medzisúčet 120mm		5,300		
	W		Súčet		145,575		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostavenískový presun bez rozlíšenia	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Nátery	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226		0,00
	W		0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornineTr. 3	m3	1,613		0,00
	W		3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226		0,00
	W		3,226		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582		0,00
	W		3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226		0,00
	W		3,226		3,226		
	W		Medzisúčet		3,226		
	W		Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452		0,00
	W		3,226*2		6,452		
	W		Medzisúčet		6,452		
	W		Súčet		6,452		
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840		0,00
	W		0,8*0,8*1*6		3,840		
	W		Medzisúčet		3,840		
	W		Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	W		(1-0,84)*0,8*4*6		3,072		
	W		Medzisúčet		3,072		
	W		Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	D	5	Komunikácie				0,00
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010		0,00
	W		8,3*4,7		39,010		
	W		Medzisúčet		39,010		
	W		Súčet		39,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	*M*	*592460008100.SR*	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*		*0,00*
	W		39,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000		0,00
	W		8,3*2+4,7*2		26,000		
	W		Medzisúčet		26,000		
	W		Súčet		26,000		
15	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*		*0,00*
	W		26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340		0,00
	W		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000		0,00
	W		2*9		18,000		
	W		Medzisúčet kliestiny		18,000		
	W		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650		0,00
	W		8,6*2		17,200		
	W		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	W		4,15*3		12,450		
	W		Medzisúčet vzpera		12,450		
	W		Súčet		29,650		
20	*M*	*605120007100.SR*	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*		*0,00*
	W		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	W		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	W		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	W		Medzisúčet vzpera		0,359		
	W		2*9*0,16*0,08		0,230		
	W		Medzisúčet kliestiny		0,230		
	W		Súčet		1,084		
	W		1,084*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000		0,00
	W		8,6*10*2		172,000		
	W		Medzisúčet		172,000		
	W		Súčet		172,000		
22	*M*	*605140001700.SR*	*Laty*	*m3*	*0,454*		*0,00*
	W		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	W		Medzisúčet		0,413		
	W		Súčet		0,413		
	W		0,413*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646		0,00
	W		1,192+0,454		1,646		
	W		Medzisúčet		1,646		
	W		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000		0,00
	W		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	W		Medzisúčet		14,000		
	W		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310		0,00
	W		6*2*3,5		42,000		
	W		Medzisúčet steny		42,000		
	W		3,14*9		28,260		
	W		Medzisúčet krokvy		28,260		
	W		3,65*17		62,050		
	W		Medzisúčet zadna stena		62,050		
	W		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(0,9+1,44)*6		14,040		
	W		4,15*3		12,450		
	W		Medzisúčet		26,490		
	W		Súčet		26,490		
27	*M*	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, vľ. PD*	*m3*	*3,661*		*0,00*
	W		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	W		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	W		Medzisúčet 250mm		0,893		
	W		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	W		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	W		Medzisúčet 150mm		2,339		
	W		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	W		Medzisúčet 120mm		0,158		
	W		Súčet		3,390		
	W		3,39*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661		0,00
	W		3,661		3,661		
	W		Medzisúčet		3,661		
	W		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465		0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200		0,00
	W		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560		0,00
	W		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008		0,00
	W		3,14*8,6*2		54,008		
	W		Medzisúčet		54,008		
	W		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200		0,00
	W		8,6*2		17,200		
	W		Medzisúčet		17,200		
	W		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000		0,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000		0,00
36	*M*	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*		*0,00*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000		0,00
	W		9*2		18,000		
38	*M*	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*		*0,00*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
40	*M*	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
42	*M*	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240		0,00
	W		(1,44+0,9*2)		3,240		
	W		Medzisúčet		3,240		
	W		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581		0,00
	D	783	Nátery				0,00
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575		0,00
	W		8,6*2*(0,18*2+0,18*2)		11,696		
	W		Medzisúčet pomurnica		11,696		
	W		4,15*3*(0,18*2+0,16*2)		8,466		
	W		Medzisúčet vzpera		8,466		
	W		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	W		Medzisúčet kliestiny		8,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		8,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	W		Medzisúčet laty		34,400		
	W		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*4,15)		3,358		
	W		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*14,04)		11,125		
	W		Medzisúčet 250mm		14,483		
	W		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*70,62)		33,314		
	W		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*62,05)		29,276		
	W		Medzisúčet 150mm		62,590		
	W		(2*PI*0,06*0,06+2*PI*0,06*14)		5,300		
	W		Medzisúčet 120mm		5,300		
	W		Súčet		145,575		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves — Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. — Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj — Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090		0,00
	W		0,3*0,3*0,5*2		0,090		
	W		Medzisúčet		0,090		
	W		Súčet		0,090		
	D	2	Zakladanie				0,00
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036		0,00
	W		0,3*0,3*0,2*2		0,036		
	W		Medzisúčet		0,036		
	W		Súčet		0,036		
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054		0,00
	W		0,3*0,3*0,3*2		0,054		
	W		Medzisúčet		0,054		
	W		Súčet		0,054		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000		0,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	OST	Ostatné				0,00
10	K	OST-1	Ohnisko, viď. PD	ks	1,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	IČ DPH:	Vyplň údaj
Projektant:		IČO:	
	VIA OPTIMA, spol. s r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	VIA OPTIMA, spol. s
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
D1 - Práce HSV	0,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
2 - ZÁKLADY	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	0,00
8 - POTRUBNÉ ROZVODY	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00
99 - PRESUNY HMÔT	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**


ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	VIA OPTIMA, spol. s
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	D1	Práce HSV				0,00
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00
1	K	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	m2	475,000		0,00
2	K	112101121	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	47,000		0,00
3	K	112101122	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	9,000		0,00
4	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	47,000		0,00
5	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	9,000		0,00
6	K	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	23,000		0,00
7	K	122301401	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	28,990		0,00
8	K	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	14,495		0,00
9	K	132301101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	67,100		0,00
10	K	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	33,550		0,00
11	K	132301202	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	91,520		0,00
12	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	45,760		0,00
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	28,990		0,00
14	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	65,240		0,00
15	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	529,140		0,00
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	28,990		0,00
17	K	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	28,990		0,00
18	K	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,620		0,00
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	5 368,650		0,00
20	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	742,710		0,00
21	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	850,800		0,00
22	K	122302202	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 100 m3 do 1000 m3 v hornine triedy 4	m3	464,750		0,00
23	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	232,375		0,00
24	K	OD000501	Odstránenie drevenej odrážky vrátane spálenia odpadového dreva	m	1,000		0,00
25	*M*	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z*	*T*	*55,335*		*0,00*
	D	2	ZÁKLADY				0,00
26	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	M2	3 559,450		0,00
27	K	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	1,500		0,00
28	K	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	11,650		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	11,650		0,00
30	*M*	*6936656009*	*Geosyntetika, E'GRID 30/30 geomreža tuhá dvojosá z polypropylénu,š.3.9m x dl.51.3m, P.K.TECHNICKÉ TEXTÍLIE*	*M2*	*1 922,800*		*0,00*
31	*M*	*6936656025*	*PK-TEX PP 25 Geotextília tkaná z polypropylénu 5,2 x 100 m*	*M2*	*1 992,595*		*0,00*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
32	K	388129220	Montáž prefabrikovaného kanálu zo železobetónu tvaru U s hmotnosťou do 2,5 t	kus	60,000		0,00
33	K	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	108,250		0,00
34	K	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	3,000		0,00
35	*M*	*BG020100*	*BG Lesný žľab sv. š. 100 mm, šírka 512 mm, výška 485 mm, dl. 2500 mm (s výstužou)*	*ks*	*60,000*		*0,00*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00
36	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 200 mm	m2	849,950		0,00
37	K	564772111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 250 mm	m2	880,300		0,00
38	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	848,250		0,00
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	475,750		0,00
40	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	1 212,850		0,00
41	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	3 698,600		0,00
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00
42	K	871420410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 500 mm	m	30,000		0,00
43	K	871470410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 800 mm	m	13,000		0,00
44	*M*	*286161080105*	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 500/6 m*	*KUS*	*6,000*		*0,00*
45	*M*	*286161080107*	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m*	*KUS*	*3,000*		*0,00*
46	*M*	*286161081907*	*PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA*	*KUS*	*1,000*		*0,00*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
47	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	26,660		0,00
48	K	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	13,330		0,00
49	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,165		0,00
50	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,465		0,00
51	K	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,165		0,00
52	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	6,000		0,00
53	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	0,165		0,00
54	*M*	*GU000101*	*Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 mm, dl. 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu*	*KS*	*4,000*		*0,00*
	D	99	PRESUNY HMÔT				0,00
55	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	3 559,032		0,00

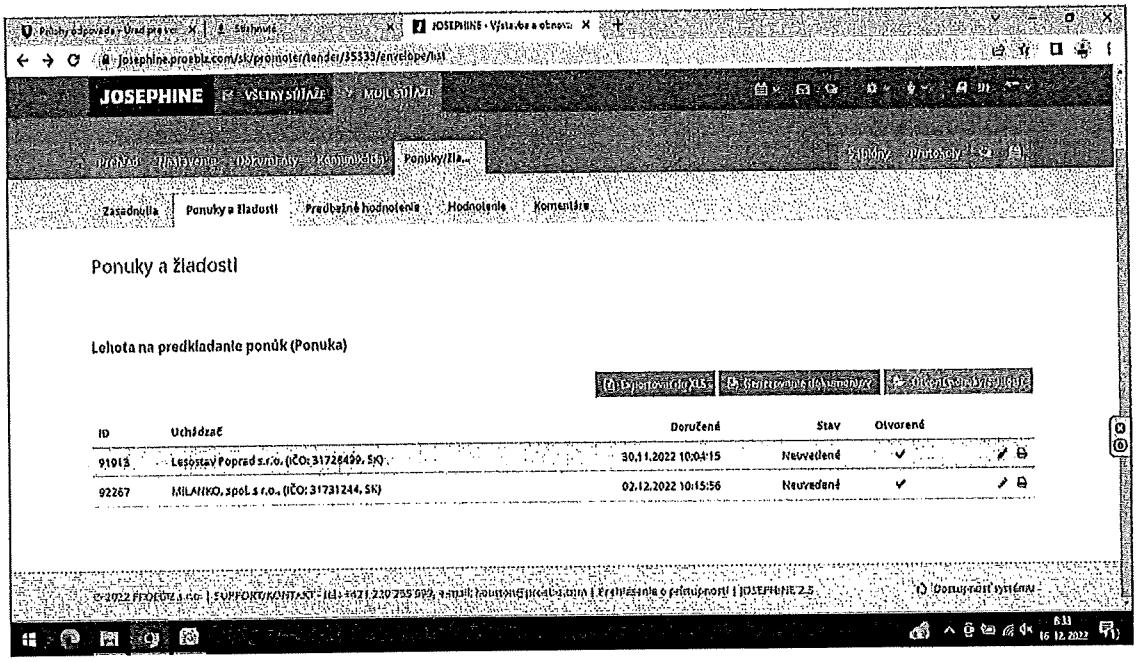
JOSEPHINE
Ponuky a žiadosti
Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka)
ID
Uchádzač
Doručené
Stav
Otvorené
91913
Lesostav Poprad s.r.o. (IČO: 31726499, SK)
30.11.2022 10:04:15
Neuvedené
92267
MILANKO, spol. s r.o. (IČO: 31731244, SK)
02.12.2022 10:15:56
Neuvedené

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Lesy mesta Spišská Nová V
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.		
Projektant	MK2 PLUS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Lesostav Poprad s.r.o.	31728499	SK 2020515145
Spracoval	Lesostav Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	97 747,86	8	Práca nadčas	0,00	13 GZS	
2		Montáž	141 490,36	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 VRN 2	
3	PSV	Dodávky	7 191,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	
4		Montáž	84 530,88	11		0,00	16 Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky					17 VRN 5	
6		Montáž					18 VRN z rozpočtu	12 900,00
7	ZRN (r. 1-6)		330 960,42	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	12 900,00
20	HZS		14 391,50	21	Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	358 251,92
24	DPH 20,00 % z 358 251,92	71 650,38
25	Cena s DPH (r. 23-24)	429 902,30

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

LESOSTAV POPRAD s.r.o.
Levočská 29
058 01 POPRAD

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Cyklistický trail – trasa č. 1

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

Spracoval:
Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**28 602,00**	
	1	**Zemné práce**				**28 602,00**	
1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	200,000	1,16	232,00	
2	131201102.S	m3	m3	600,000	7,16	4 296,00	
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	300,000	1,04	312,00	
4	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	800,000	6,00	4 800,00	
5	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 600,000	0,52	2 912,00	
6	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	800,000	2,25	1 800,00	
7	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	15,000	950,00	14 250,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**17 250,00**	
	762	**Konštrukcie tesárske**				**17 250,00**	
8	762-01	D+M Zápierky	ks	5,000	820,00	4 100,00	
9	762-02	D+M Dropu	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
10	762-03	D+M Skok	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	
11	762-04	D+M Mostík	ks	4,000	1 450,00	5 800,00	
12	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	100,00	450,00	
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**2 500,00**	
13	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	100,000	25,00	2 500,00	
		Celkom				**48 352,00**	

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Cyklistický trail – trasa č. 2

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**52 509,60**	
1		**Zemné práce**				**52 509,60**	
1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	460,000	1,16	533,60	
2	131201102.S	m3	m3	1 380,000	7,16	9 880,80	
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	690,000	1,04	717,60	
4	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 840,000	6,00	11 040,00	
5	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 880,000	0,52	6 697,60	
6	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 840,000	2,25	4 140,00	
7	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	18,000	950,00	17 100,00	
8	999-02	Zhotovenie vlniek	ks	4,000	600,00	2 400,00	
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**21 990,00**	
762		**Konštrukcie tesárske**				**21 990,00**	
9	762-01	D+M Záplerky	ks	12,000	820,00	9 840,00	
10	762-03	D+M Skok	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
11	762-04	D+M Mostík	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
12	762-05	D+M Lavice	ks	2,000	1 400,00	2 800,00	
13	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	100,00	450,00	
HZS		**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**5 750,00**	
14	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	230,000	25,00	5 750,00	
		Celkom				**80 249,60**	

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Lesostav Poprad s.r.o. Spracoval: Lesostav Poprad s.r.o.
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		**Práce HSV**				**159 220,36**	**########**
1		**ZEMNÉ PRÁCE**				**26 261,93**	**3 063,083**
1	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	m2	475,000	2,31	1 097,25	
2	112101121	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	47,000	5,37	252,39	
3	112101122	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	9,000	10,55	94,95	
4	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	47,000	11,34	532,98	0,001
5	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	9,000	26,19	235,71	0,000
6	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	23,000	51,05	1 174,15	1,120
7	122301401	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	28,990	6,92	200,61	
8	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	14,495	0,90	13,05	
9	132301101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	67,100	76,12	5 107,65	
10	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	33,550	17,26	579,07	
11	132301202	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	91,520	27,94	2 557,07	
12	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	45,760	2,88	131,79	
13	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	28,990	1,78	51,60	
14	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	65,240	2,64	172,23	
15	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	529,140	1,24	656,13	
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	28,990	0,99	28,70	
17	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	28,990	4,66	135,09	
18	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,620	21,70	686,15	
19	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	5 368,650	0,55	2 952,76	
20	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	742,710	2,11	1 567,12	
21	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	850,800	1,85	1 573,98	
22	122302202	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 100 m3 do 1000 m3 v hornine triedy 4	m3	464,750	10,48	4 870,58	
23	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	232,375	2,02	469,40	
24	OD000501	Odstránenie drevenej odrážky vrátane spálenia odpadového dreva	m	1,000	110,00	110,00	
25	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z*	*T*	*55,335*	*18,28*	*1 011,52*	*3 061,962*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	2	**ZÁKLADY**				**8 332,48**	**6,273**
26	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	M2	3 559,450	0,65	2 313,64	0,117
27	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	1,500	136,48	204,72	5,226
28	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	11,650	19,73	229,85	0,093
29	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	11,650	3,62	42,17	
30	*6936656009*	*Geosyntetika, E'GRID 30/30 geomreža tuhá dvojosá z polypropylénu,š.3.9m x dl.51.3m, P.K.TECHNICKÉ TEXTÍLIE*	*M2*	*1 922,800*	*1,96*	*3 768,69*	*0,577*
31	*6936656025*	*PK-TEX PP 25 Geotextília tkaná z polypropylénu 5,2 x 100 m*	*M2*	*1 992,595*	*0,89*	*1 773,41*	*0,259*
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**23 757,32**	**4 526,472**
32	388129220	Montáž prefabrikovaného kanálu zo železobetónu tvaru U s hmotnosťou do 2,5 t	kus	60,000	82,20	4 932,00	14,406
33	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	108,250	60,30	6 527,48	97,390
34	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	3,000	139,28	417,84	4,675
35	*BG020100*	*BG Lesný žľab sv. š. 100 mm, šírka 512 mm, výška 485 mm, dl. 2500 mm (s výstužou)*	*ks*	*60,000*	*198,00*	*11 880,00*	*4 410,000*
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**					
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**				**82 299,10**	**3 308,169**
36	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 200 mm	m2	849,950	10,59	9 000,97	328,293
37	564772111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 250 mm	m2	880,300	17,09	15 044,33	529,096
38	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	848,250	4,82	4 088,57	160,379
39	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	475,750	6,81	3 239,86	133,181
40	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	1 212,850	8,84	10 721,59	449,725
41	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	3 698,600	10,87	40 203,78	1 707,496
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**				**7 390,48**	**0,001**
42	871420410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 500 mm	m	30,000	3,47	104,10	0,001
43	871470410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 800 mm	m	13,000	4,06	52,78	0,001
44	*286161080105*	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 500/6 m*	*KUS*	*6,000*	*435,60*	*2 613,60*	
45	*286161080107*	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m*	*KUS*	*3,000*	*1 485,00*	*4 455,00*	
46	*286161081907*	*PIPELIFE ID spojka korugovaná so zárazkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA*	*KUS*	*1,000*	*165,00*	*165,00*	
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**1 249,35**	**0,240**
47	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	26,660	4,96	132,23	
48	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	13,330	6,68	89,04	
49	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,165	17,17	2,83	
50	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,465	0,56	1,94	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,165	71,50	11,80	
52	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	6,000	135,42	812,52	
53	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	0,165	6,01	0,99	
54	*GU000101*	*Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 mm, dĺ. 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu*	*KS*	*4,000*	*49,50*	*198,00*	*0,240*
	99	**PRESUNY HMÔT**				**9 929,70**	
55	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	3 559,032	2,79	9 929,70	
		Celkom				**159 220,36**	**########**

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Altánok Skalka
Časť: Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Lesostav Poprad s.r.o.
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

Spracoval: Lesostav Poprad s.r.o.
Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**18,24**	**0,193**
1		**Zemné práce**				**7,34**	
1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	81,51	7,34	
2		**Zakladanie**				**7,90**	**0,193**
2	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	65,91	2,37	0,075
3	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	102,40	5,53	0,118
99		**Presun hmôt HSV**				**3,00**	
4	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	15,54	3,00	
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**8 996,00**	
762		**Konštrukcie tesárske**				**8 996,00**	
5	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
6	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
7	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000	650,00	1 300,00	
8	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	88,00	396,00	
OST		**Ostatné**				**850,00**	
10	OST-1	Prírodné ohnisko	ks	1,000	850,00	850,00	
VRN		**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**1 000,00**	
11	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 000,00	1 000,00	
		Celkom				**10 864,24**	**0,193**

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Altánok Skalka
Časť: Altánok

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 478,31**	**43,464**
1		**Zemné práce**				**500,08**	
1	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	81,69	263,53	
2	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	1,613	16,35	26,37	
3	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,87	25,39	
4	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,73	16,48	
5	167101101.S	m3	m3	3,226	9,27	29,91	
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	21,45	138,40	
2		**Zakladanie**				**537,11**	**8,437**
7	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	112,64	432,54	8,425
8	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	25,86	79,44	0,012
9	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	8,18	25,13	
5		**Komunikácie**				**2 159,82**	**27,077**
10	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	7,94	309,74	7,376
11	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	9,41	367,08	10,920
12	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	17,82	695,16	3,608
13	*R*	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*19,80*	*787,84*	*5,173*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**538,50**	**7,950**
14	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	5,79	150,54	2,163
15	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*3,39*	*89,02*	*0,604*
16	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	127,75	298,94	5,183
99		**Presun hmôt HSV**				**742,80**	
17	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	17,09	742,80	
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**8 498,07**	**4,049**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	762	**Konštrukcie tesárske**				**5 826,86**	**3,465**
18	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	7,51	135,18	0,005
19	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	13,54	401,46	0,008
20	*R*	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*	*544,50*	*649,04*	*0,656*
21	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	0,97	166,84	
22	*R*	*Laty*	*m3*	*0,454*	*544,50*	*247,20*	*0,250*
23	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	39,74	65,41	0,037
24	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	13,70	191,80	0,003
25	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	16,81	2 224,13	0,028
26	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	26,26	695,63	0,006
27	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*	*198,74*	*727,59*	*2,380*
28	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	28,56	104,56	0,094
29	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	62,92	218,02	
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 078,72**	**0,581**
30	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	6,82	117,30	0,005
31	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	8,73	109,65	0,018
32	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	19,80	1 069,36	0,492
33	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	13,20	227,04	0,037
34	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	32,07	64,14	0,003
35	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,12	12,48	0,000
36	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*	*3,31*	*13,24*	*0,000*
37	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	4,17	75,06	0,003
38	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*	*4,69*	*84,42*	*0,011*
39	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	8,29	33,16	0,000
40	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*13,22*	*52,88*	*0,001*
41	764454442.S	PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	3,44	13,76	
42	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*4,87*	*19,48*	*0,001*
43	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	43,18	139,90	0,009
44	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581	80,63	46,85	
	783	**Nátery**				**592,49**	**0,003**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	783782404.S	proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	4,07	592,49	0,003
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**841,50**	
46	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	16,83	841,50	
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**3 300,00**	
47	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 100,00	1 100,00	
48	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	2 200,00	2 200,00	
		Celkom				**17 117,88**	**47,513**

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Altánok Javor Poľana
Časť: Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Lesostav Poprad s.r.o. Spracoval: Lesostav Poprad s.r.o.
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**18,24**	**0,193**
	1	**Zemné práce**				**7,34**	
1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	81,51	7,34	
	2	**Zakladanie**				**7,90**	**0,193**
2	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	65,91	2,37	0,075
3	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	102,40	5,53	0,118
	99	**Presun hmôt HSV**				**3,00**	
4	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	15,54	3,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 996,00**	
	762	**Konštrukcie tesárske**				**8 996,00**	
5	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
6	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
7	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000	650,00	1 300,00	
8	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	88,00	396,00	
	OST	**Ostatné**				**850,00**	
10	OST-1	Ohnisko, viď. PD	ks	1,000	850,00	850,00	
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**1 000,00**	
11	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 000,00	1 000,00	
		Celkom				**10 864,24**	**0,193**

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Altánok Javor Poľana
Časť: Altánok

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Lesostav Poprad s.r.o. Spracoval: Lesostav Poprad s.r.o.
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 356,21**	**43,464**
1		**Zemné práce**				**500,08**	
1	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	81,69	263,53	
2	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornitr. 3	m3	1,613	16,35	26,37	
3	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,87	25,39	
4	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,73	16,48	
5	167101101.S	m3	m3	3,226	9,27	29,91	
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	21,45	138,40	
2		**Zakladanie**				**537,11**	**8,437**
7	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	112,64	432,54	8,425
8	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	25,86	79,44	0,012
9	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	8,18	25,13	
5		**Komunikácie**				**2 037,72**	**27,077**
10	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	4,82	188,03	7,376
11	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	9,41	367,08	10,920
12	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre pešich do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	17,81	694,77	3,608
13	*R*	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*19,80*	*787,84*	*5,173*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**538,50**	**7,950**
14	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	5,79	150,54	2,163
15	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*3,39*	*89,02*	*0,604*
16	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	127,75	298,94	5,183
99		**Presun hmôt HSV**				**742,80**	
17	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	17,09	742,80	
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**8 498,07**	**4,049**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	762	**Konštrukcie tesárske**				**5 826,86**	**3,465**
18	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	7,51	135,18	0,005
19	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	13,54	401,46	0,008
20	*R*	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*	*544,50*	*649,04*	*0,656*
21	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	0,97	166,84	
22	*R*	*Laty*	*m3*	*0,454*	*544,50*	*247,20*	*0,250*
23	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	39,74	65,41	0,037
24	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	13,70	191,80	0,003
25	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	16,81	2 224,13	0,028
26	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	26,26	695,63	0,006
27	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*	*198,74*	*727,59*	*2,380*
28	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	28,56	104,56	0,094
29	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	62,92	218,02	
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 078,72**	**0,581**
30	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	6,82	117,30	0,005
31	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	8,73	109,65	0,018
32	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	19,80	1 069,36	0,492
33	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	13,20	227,04	0,037
34	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	32,07	64,14	0,003
35	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,12	12,48	0,000
36	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*	*3,31*	*13,24*	*0,000*
37	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	4,17	75,06	0,003
38	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*	*4,69*	*84,42*	*0,011*
39	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	8,29	33,16	0,000
40	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*13,22*	*52,88*	*0,001*
41	764454442.S	PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	3,44	13,76	
42	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*4,87*	*19,48*	*0,001*
43	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	43,18	139,90	0,009
44	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581	80,63	46,85	
	783	**Nátery**				**592,49**	**0,003**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	783782404.S	proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	4,07	592,49	0,003
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 375,00**	
46	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	27,50	1 375,00	
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**3 300,00**	
47	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 100,00	1 100,00	
48	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostavenískový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	2 200,00	2 200,00	
		Celkom				**17 529,28**	**47,513**

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Altánok Hlinky
Časť: Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Lesostav Poprad s.r.o. Spracoval: Lesostav Poprad s.r.o.
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**18,24**	**0,193**
	1	**Zemné práce**				**7,34**	
1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	81,51	7,34	
	2	**Zakladanie**				**7,90**	**0,193**
2	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	65,91	2,37	0,075
3	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	102,40	5,53	0,118
	99	**Presun hmôt HSV**				**3,00**	
4	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	15,54	3,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 996,00**	
	762	**Konštrukcie tesárske**				**8 996,00**	
5	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
6	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
7	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000	650,00	1 300,00	
8	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	88,00	396,00	
	OST	**Ostatné**				**850,00**	
10	OST-1	Ohnisko, viď. PD	ks	1,000	850,00	850,00	
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**1 000,00**	
11	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 000,00	1 000,00	
		Celkom				**10 864,24**	**0,193**

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt: Altánok Hlinky
Časť: Altánok

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: Lesostav Poprad s.r.o.
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

Spracoval: Lesostav Poprad s.r.o.
Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 478,31**	**43,464**
1		**Zemné práce**				**500,08**	
1	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	81,69	263,53	
2	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,613	16,35	26,37	
3	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,87	25,39	
4	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,73	16,48	
5	167101101.S	m3	m3	3,226	9,27	29,91	
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	21,45	138,40	
2		**Zakladanie**				**537,11**	**8,437**
7	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	112,64	432,54	8,425
8	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	25,86	79,44	0,012
9	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	8,18	25,13	
5		**Komunikácie**				**2 159,82**	**27,077**
10	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	7,94	309,74	7,376
11	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	9,41	367,08	10,920
12	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	17,82	695,16	3,608
13	*R*	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*19,80*	*787,84*	*5,173*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**538,50**	**7,950**
14	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	5,79	150,54	2,163
15	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*3,39*	*89,02*	*0,604*
16	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	127,75	298,94	5,183
99		**Presun hmôt HSV**				**742,80**	
17	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	17,09	742,80	
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**8 498,07**	**4,049**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	762	**Konštrukcie tesárske**				**5 826,86**	**3,465**
18	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	7,51	135,18	0,005
19	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	13,54	401,46	0,008
20	*R*	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*	*544,50*	*649,04*	*0,656*
21	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	0,97	166,84	
22	*R*	*Laty*	*m3*	*0,454*	*544,50*	*247,20*	*0,250*
23	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	39,74	65,41	0,037
24	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	13,70	191,80	0,003
25	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	16,81	2 224,13	0,028
26	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	26,26	695,63	0,006
27	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*	*198,74*	*727,59*	*2,380*
28	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	28,56	104,56	0,094
29	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	62,92	218,02	
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 078,72**	**0,581**
30	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	6,82	117,30	0,005
31	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	8,73	109,65	0,018
32	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	19,80	1 069,36	0,492
33	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	13,20	227,04	0,037
34	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	32,07	64,14	0,003
35	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,12	12,48	0,000
36	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*	*3,31*	*13,24*	*0,000*
37	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	4,17	75,06	0,003
38	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*	*4,69*	*84,42*	*0,011*
39	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	8,29	33,16	0,000
40	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*13,22*	*52,88*	*0,001*
41	764454442.S	PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	3,44	13,76	
42	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*4,87*	*19,48*	*0,001*
43	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	43,18	139,90	0,009
44	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581	80,63	46,85	
	783	**Nátery**				**592,49**	**0,003**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	783782404.S	proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	4,07	592,49	0,003
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 375,00**	
46	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	27,50	1 375,00	
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**3 300,00**	
47	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 100,00	1 100,00	
48	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	2 200,00	2 200,00	
		Celkom				**17 651,38**	**47,513**

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: **Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV**

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 8.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves

IČO: 31731244
IČ DPH:

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

.

Náklady z rozpočtov	304 158,80
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**304 158,80**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	304 158,80	60 831,76

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**364 990,56**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

- 2 -

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	01		
Stavba:	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV		
Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**304 158,80**	**364 990,56**
SO 01	Cyklistický trail – trasa č. 1	44 484,96	53 381,95
SO 02	Cyklistický trail – trasa č. 2	74 891,24	89 869,49
SO 03	Altánok Skalka	20 403,75	24 484,50
SO 03-0	Altánok	17 886,00	21 463,20
SO 03-1	Lavičky a odpadkové koše, ohnisko	2 517,75	3 021,30
SO 04	Altánok Hlinky	19 043,13	22 851,76
SO 04-0	Altánok	16 578,76	19 894,51
SO 04-1	Lavičky a odpadkové koše, ohnisko	2 464,37	2 957,24
SO 05	Altánok Javor Poľana	19 143,13	22 971,76
SO 05-0	Altánok	16 678,76	20 014,51
SO 05-1	Lavičky a odpadkové koše, ohnisko	2 464,37	2 957,24
SO 06	Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENY VRCH - odvodnenie	126 192,59	151 431,11
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**304 158,80**	**364 990,56**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves

IČO: 31731244
IČ DPH: 0

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 484,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**44 484,96**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	44 484,96	20,00%	8 896,99

Cena s DPH	**v EUR**	**53 381,95**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH: SK 2020506190
Tel: 00421 53 41 73 232

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**44 484,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	34 990,00
1 - Zemné práce	34 990,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 494,96
762 - Konštrukcie tesárske	7 494,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 000,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**44 484,96**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH, SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**44 484,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				34 990,00
	D	1	Zemné práce				34 990,00
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	200,000	1,28	256,00
	VV		0,1*2*1000		200,000		
	VV		Medzisúčet		200,000		
	VV		Súčet		200,000		
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	600,000	5,93	3 558,00
	VV		2*0,3*1000		600,000		
	VV		Medzisúčet		600,000		
	VV		Súčet		600,000		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	300,000	0,96	288,00
	VV		600,000/2		300,000		
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	800,000	6,28	5 024,00
	VV		200"ornica		200,000		
	VV		600"výkop		600,000		
	VV		Medzisúčet		800,000		
	VV		Súčet		800,000		
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 600,000	0,54	3 024,00
	VV		800*7 'Prepočítané koeficientom množstva		5 600,000		
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	800,000	2,30	1 840,00
	VV		200"ornica		200,000		
	VV		600"výkop		600,000		
	VV		Medzisúčet		800,000		
	VV		Súčet		800,000		
7	K	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	15,000	1 400,00	21 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 494,96
	D	762	Konštrukcie tesárske				7 494,96
8	K	762-01	D+M Zápierky	ks	5,000	340,00	1 700,00
9	K	762-02	D+M Dropu	ks	2,000	320,00	640,00
10	K	762-03	D+M Skok	ks	3,000	496,00	1 488,00
11	K	762-04	D+M Mostík	ks	4,000	880,00	3 520,00
12	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7 348,000	0,02	146,96
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 000,00
13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	100,000	20,00	2 000,00

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 31751244, IČ DPH SK 2020505190
Tel +0421 53 41 73 232

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

JKSO:		KS:	
Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31731244
	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	MK2 PLUS, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	74 891,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**74 891,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	74 891,24	20,00%	14 978,25

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**89 869,49**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
- 2 -

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**74 891,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	62 017,00
1 - Zemné práce	62 017,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 274,24
762 - Konštrukcie tesárske	8 274,24
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 600,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**74 891,24**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731214 IČ DPH SK 2020505190
Tel. 00421 53 41 73 232

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**74 891,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				62 017,00
	D	1	Zemné práce				62 017,00
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	460,000	1,28	588,80
	VV		0,1*2*2300		460,000		
	VV		Medzisúčet		460,000		
	VV		Súčet		460,000		
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 380,000	5,93	8 183,40
	VV		2*0,3*2300		1 380,000		
	VV		Medzisúčet		1 380,000		
	VV		Súčet		1 380,000		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	690,000	0,96	662,40
	VV		1380/2		690,000		
	VV		Medzisúčet		690,000		
	VV		Súčet		690,000		
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 840,000	6,28	11 555,20
	VV		460"ornica		460,000		
	VV		1380"vykop		1 380,000		
	VV		Medzisúčet		1 840,000		
	VV		Súčet		1 840,000		
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 880,000	0,54	6 955,20
	VV		1840*7 Prepočítané koeficientom množstva		12 880,000		
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 840,000	2,30	4 232,00
	VV		460"ornica		460,000		
	VV		1380"vykop		1 380,000		
	VV		Medzisúčet		1 840,000		
	VV		Súčet		1 840,000		
8	K	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	18,000	1 400,00	25 200,00
9	K	999-02	Zhotovenie vlnek	ks	4,000	1 160,00	4 640,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 274,24
	D	762	Konštrukcie tesárske				8 274,24
10	K	762-01	D+M Zápierky	ks	12,000	340,00	4 080,00
11	K	762-03	D+M Skok	ks	4,000	320,00	1 280,00
12	K	762-04	D+M Mostík	ks	2,000	496,00	992,00
13	K	762-05	D+M Lavice	ks	2,000	880,00	1 760,00
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8 112,000	0,02	162,24
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4 600,00
15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom tralle	hod	230,000	20,00	4 600,00

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel. 00421 53 41 73 232
- 2 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
IČO: 31731244
IČ DPH: 0

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 886,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**17 886,00**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 886,00	20,00%	3 577,20

Cena s DPH	**v EUR**	**21 463,20**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
- 2 -

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**17 886,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 979,97
1 - Zemné práce	299,84
2 - Zakladanie	576,51
5 - Komunikácie	2 002,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	753,48
99 - Presun hmôt HSV	1 347,38
PSV - Práce a dodávky PSV	11 106,03
762 - Konštrukcie tesárske	5 222,92
764 - Konštrukcie klampiarske	4 500,15
783 - Nátery	1 382,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 000,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	800,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**17 886,00**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731214 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 886,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 979,97
	D	1	Zemné práce				299,84
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	42,00	135,49
	VV		0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,613	2,25	3,63
	VV		3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,48	24,13
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,69	15,58
	VV		3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226	7,51	24,23
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	15,00	96,78
	VV		3,226*2		6,452		
	VV		Medzisúčet		6,452		
	VV		Súčet		6,452		
	D	2	Zakladanie				576,51
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	127,43	489,33
	VV		0,8*0,8*1*6		3,840		
	VV		Medzisúčet		3,840		
	VV		Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	20,12	61,81
	VV		(1-0,84)*0,8*4*6		3,072		
	VV		Medzisúčet		3,072		
	VV		Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	8,26	25,37
	D	5	Komunikácie				2 002,76
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	6,43	250,83
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	8,49	331,19
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	15,00	585,15
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel: 00421 53 41 73 232

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	592460008100.S R	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*21,00*	*835,59*
	VV		39,01*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				753,48
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	9,20	239,20
	VV		8,3*2+4,7*2		26,000		
	VV		Medzisúčet		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
15	M	592170001800.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*8,00*	*210,08*
	VV		26*1,01 Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	130,00	304,20
	VV		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 347,38
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	31,00	1 347,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 106,03
	D	762	Konštrukcie tesárske				5 222,92
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	6,90	124,20
	VV		2*9		18,000		
	VV		Medzisúčet kliesniny		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	6,50	192,73
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet vzpera		12,450		
	VV		Súčet		29,650		
20	M	605120007100.S R	*Hranoly, vlč. PD*	*m3*	*1,192*	*550,00*	*655,60*
	VV		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	VV		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	VV		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	VV		Medzisúčet vzpera		0,359		
	VV		2*9*0,16*0,08		0,230		
	VV		Medzisúčet kliesniny		0,230		
	VV		Súčet		1,084		
	VV		1,084*1,1 Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	2,00	344,00
	VV		8,6*10*2		172,000		
	VV		Medzisúčet		172,000		
	VV		Súčet		172,000		
22	M	605140001700.S R	*Laty*	*m3*	*0,454*	*600,00*	*272,40*
	VV		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	VV		Medzisúčet		0,413		
	VV		Súčet		0,413		
	VV		0,413*1,1 Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	46,30	76,21
	VV		1,192+0,454		1,646		
	VV		Medzisúčet		1,646		
	VV		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	6,50	91,00
	VV		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	VV		Medzisúčet		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	8,00	1 058,48
	VV		6*2*3,5		42,000		
	VV		Medzisúčet steny		42,000		
	VV		3,14*9		28,260		
	VV		Medzisúčet krokvy		28,260		
	VV		3,65*17		62,050		
	VV		Medzisúčet zadná stena		62,050		
	VV		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	8,50	225,17

MILANKO spol. s r.o.
Chrepčiakova 29, 962 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČDPH SK 2020105190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(0,9+1,44)*6		14,040		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet		26,490		
	VV		Súčet		26,490		
27	M	052130001300.S	*Výrez slipový, vid. PD*	m3	3,661	500,00	1 830,50
	VV		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	VV		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	VV		Medzisúčet 250mm		0,893		
	VV		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	VV		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	VV		Medzisúčet 150mm		2,339		
	VV		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	VV		Medzisúčet 120mm		0,158		
	VV		Súčet		3,390		
	VV		3,39*1,08 Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	46,30	169,50
	VV		3,661		3,661		
	VV		Medzisúčet		3,661		
	VV		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	52,85	183,13
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 500,15
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	16,50	283,80
	VV		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	17,00	213,52
	VV		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	55,00	2 970,44
	VV		3,14*8,6*2		54,008		
	VV		Medzisúčet		54,008		
	VV		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	16,00	275,20
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet		17,200		
	VV		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	40,00	80,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	12,00	48,00
36	M	553440000600.S	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	ks	4,000	25,00	100,00
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	12,00	216,00
	VV		9*2		18,000		
38	M	553440047100.S	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	ks	18,000	6,00	108,00
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	6,00	24,00
40	M	553440004200.S	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	ks	4,000	15,00	60,00
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	5,40	21,60
42	M	553440051000.S	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	ks	4,000	5,20	20,80
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	12,90	41,80
	VV		(1,44+0,9*2)		3,240		
	VV		Medzisúčet		3,240		
	VV		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581	63,67	36,99
	D	783	Nátery				1 382,96
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	9,50	1 382,96
	VV		6,6*2*(0,16*2+0,10*2)		11,696		
	VV		Medzisúčet pomumica		11,696		
	VV		4,15*3*(0,18*2+0,16*2)		8,466		
	VV		Medzisúčet vzpera		8,466		
	VV		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	VV		Medzisúčet kliestiny		8,640		

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 31731240 IČ DPH SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	VV		Medzisúčet laty		34,400		
	VV		(2*Pi*0,125*0,125+2*Pi*0,125*4,15)		3,358		
	VV		(2*Pi*0,125*0,125+2*Pi*0,125*14,04)		11,125		
	VV		Medzisúčet 250mm		14,483		
	VV		(2*Pi*0,075*0,075+2*Pi*0,075*70,62)		33,314		
	VV		(2*Pi*0,075*0,075+2*Pi*0,075*62,05)		29,276		
	VV		Medzisúčet 150mm		62,590		
	VV		(2*Pi*0,06*0,06+2*Pi*0,06*14)		5,300		
	VV		Medzisúčet 120mm		5,300		
	VV		Súčet		145,575		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	20,00	1 000,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				800,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostaveniskova doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	300,00	300,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne stažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00

MILANKO spol. s r.o.
Chrepčiakova 29, 082 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731241, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
- 2 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO.03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO: KS:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: IČO:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31731244
MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
MK2 PLUS, s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 517,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**2 517,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 517,75	20,00%	503,55

Cena s DPH	**v EUR**	**3 021,30**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
2

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 517,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	20,55
1 - Zemné práce	5,67
2 - Zakladanie	12,42
99 - Presun hmôt HSV	2,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 897,20
762 - Konštrukcie tesárske	1 897,20
OST - Ostatné	500,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	100,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 517,75**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
.2.

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 517,75**
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20,55
D		1	Zemné práce				5,67
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	63,00	5,67
VV			0,3*0,3*0,5*2		0,090		
VV			Medzisúčet		0,090		
VV			Súčet		0,090		
D		2	Zakladanie				12,42
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	45,00	1,62
VV			0,3*0,3*0,2*2		0,036		
VV			Medzisúčet		0,036		
VV			Súčet		0,036		
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	200,00	10,80
VV			0,3*0,3*0,3*2		0,054		
VV			Medzisúčet		0,054		
VV			Súčet		0,054		
D		99	Presun hmôt HSV				2,46
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	12,75	2,46
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 897,20
D		762	Konštrukcie tesárske				1 897,20
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, vid. PD	ks	2,000	150,00	300,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 860,000	0,02	37,20
D		OST	Ostatné				500,00
10	K	OST-1	Prírodné ohnisko	ks	1,000	500,00	500,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				100,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	100,00	100,00

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 31731241, IČ DPH: SK 2020505190
Tel. 00421 53 41 73 232
- 2 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves

IČO: 31731244
IČ DPH: 0

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 578,76
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**16 578,76**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 578,76	20,00%	3 315,75

Cena s DPH	v EUR	**19 894,51**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
-2-

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**16 578,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 168,07
1 - Zemné práce	299,84
2 - Zakladanie	576,51
5 - Komunikácie	2 002,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	753,48
99 - Presun hmôt HSV	535,48
PSV - Práce a dodávky PSV	11 110,69
762 - Konštrukcie tesárske	5 227,58
764 - Konštrukcie klampiarske	4 500,15
783 - Nátery	1 382,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 000,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	300,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**16 578,76**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
-2-

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 578,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 168,07
	D	1	Zemné práce				299,84
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	42,00	135,49
	VV		0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,613	2,25	3,63
	VV		3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,48	24,13
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,69	15,58
	VV		3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226	7,51	24,23
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	15,00	96,78
	VV		3,226*2		6,452		
	VV		Medzisúčet		6,452		
	VV		Súčet		6,452		
	D	2	Základanie				576,51
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	127,43	489,33
	VV		0,8*0,8*1*6		3,840		
	VV		Medzisúčet		3,840		
	VV		Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	20,12	61,81
	VV		(1-0,84)*0,8*4*6		3,072		
	VV		Medzisúčet		3,072		
	VV		Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	8,26	25,37
	D	5	Komunikácie				2 002,76
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	6,43	250,83
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	8,49	331,19
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre pešich do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	15,00	585,15
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731214, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	592460008100.S R	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*21,00*	*835,59*
	VV		39,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				753,48
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	9,20	239,20
	VV		8,3*2+4,7*2		26,000		
	VV		Medzisúčet		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
15	M	592170001800.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*8,00*	*210,08*
	VV		26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	130,00	304,20
	VV		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				535,48
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	12,32	535,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 110,69
	D	762	Konštrukcie tesárske				5 227,58
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	6,50	117,00
	VV		2*9		18,000		
	VV		Medzisúčet kilestiny		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	6,90	204,59
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet vzpera		12,450		
	VV		Súčet		29,650		
20	M	605120007100.S R	*Hranoly, vid. PD*	*m3*	*1,192*	*550,00*	*655,60*
	VV		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	VV		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	VV		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	VV		Medzisúčet vzpera		0,359		
	VV		2*9*0,16*0,08		0,230		
	VV		Medzisúčet kilestiny		0,230		
	VV		Súčet		1,084		
	VV		1,084*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
21	K	762341201.S	Montáž laťovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	2,00	344,00
	VV		8,6*10*2		172,000		
	VV		Medzisúčet		172,000		
	VV		Súčet		172,000		
22	M	605140001700.S R	*Laty*	*m3*	*0,454*	*600,00*	*272,40*
	VV		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	VV		Medzisúčet		0,413		
	VV		Súčet		0,413		
	VV		0,413*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	46,30	76,21
	VV		1,192+0,454		1,646		
	VV		Medzisúčet		1,646		
	VV		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	6,50	91,00
	VV		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	VV		Medzisúčet		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	8,00	1 058,48
	VV		6*2*3,5		42,000		
	VV		Medzisúčet steny		42,000		
	VV		3,14*9		28,260		
	VV		Medzisúčet krokvy		28,260		
	VV		3,65*17		62,050		
	VV		Medzisúčet zadna stena		62,050		
	VV		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	8,80	233,11

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišské Vlachy
IČO 31731244 IČ DPH SK 2020505190
Tel 00421 53 41 73 232
-2-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(0,9+1,44)*6		14,040		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet		26,490		
	VV		Súčet		26,490		
27	M	052130001300.S	*Výrez stĺpový, vid. PD*	*m3*	*3,661*	*500,00*	*1 830,50*
	VV		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	VV		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	VV		Medzisúčet 250mm		0,893		
	VV		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	VV		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	VV		Medzisúčet 150mm		2,339		
	VV		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	VV		Medzisúčet 120mm		0,158		
	VV		Súčet		3,390		
	VV		3,39*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	46,30	169,50
	VV		3,661		3,661		
	VV		Medzisúčet		3,661		
	VV		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	52,85	183,13
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 600,15
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	16,50	283,80
	VV		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	17,00	213,52
	VV		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	55,00	2 970,44
	VV		3,14*8,6*2		54,008		
	VV		Medzisúčet		54,008		
	VV		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	16,00	275,20
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet		17,200		
	VV		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	40,00	80,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	12,00	48,00
36	M	553440000600.S	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*	*25,00*	*100,00*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	12,00	216,00
	VV		9*2		18,000		
38	M	553440047100.S	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*	*6,00*	*108,00*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	6,00	24,00
40	M	553440004200.S	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*15,00*	*60,00*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	5,40	21,60
42	M	553440051000.S	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*5,20*	*20,80*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	12,90	41,80
	VV		(1,44+0,9*2)		3,240		
	VV		Medzisúčet		3,240		
	VV		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,681	63,67	36,99
	D	783	Nátery				1 382,96
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	9,50	1 382,96
	VV		8,6*2*(0,16*2+0,16*2)		11,696		
	VV		Medzisúčet pomurnica		11,696		
	VV		4,15*3*(0,16*2+0,16*2)		8,466		
	VV		Medzisúčet vzpera		8,466		
	VV		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	VV		Medzisúčet klesliny		8,640		

MILANKO spol. s r.o.
Chrepčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731243, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	VV		Medzisúčet laty		34,400		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*4,16)		3,358		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*14,04)		11,125		
	VV		Medzisúčet 250mm		14,483		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*70,62)		33,314		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*62,05)		29,276		
	VV		Medzisúčet 150mm		62,590		
	VV		(2*PI*0,06*0,06+2*PI*0,06*14)		5,300		
	VV		Medzisúčet 120mm		5,300		
	VV		Súčet		146,676		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	20,00	1 000,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				300,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	100,00	100,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne stažený vnútrostavenisková presun bez rozlíšenia	eur	1,000	200,00	200,00

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 922 01 Šp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 0421 53 41 73 232
- 2 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hlinky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:		KS:	
Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31731244
	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	MK2 PLUS, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 464,37
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**2 464,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 464,37	20,00%	492,87

Cena s DPH	**v EUR**	**2 957,24**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
	MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190 Tel.: 00421 53 41 73 232
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hlinky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 464,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	17,17
1 - Zemné práce	5,67
2 - Zakladanie	9,04
99 - Presun hmôt HSV	2,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 897,20
762 - Konštrukcie tesárske	1 897,20
OST - Ostatné	400,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	150,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 464,37**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH SK 2020505190
Tel.: 0421 53 41 73 232
- 2 -

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hlinky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 464,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17,17
	D	1	Zemné práce				5,67
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	63,00	5,67
	VV		0,3*0,3*0,5*2		0,090		
	VV		Medzisúčet		0,090		
	VV		Súčet		0,090		
	D	2	Zakladanie				9,04
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	45,00	1,62
	VV		0,3*0,3*0,2*2		0,036		
	VV		Medzisúčet		0,036		
	VV		Súčet		0,036		
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	137,43	7,42
	VV		0,3*0,3*0,3*2		0,054		
	VV		Medzisúčet		0,054		
	VV		Súčet		0,054		
	D	99	Presun hmôt HSV				2,46
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	12,75	2,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 897,20
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 897,20
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, vid. PD	ks	2,000	150,00	300,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 860,000	0,02	37,20
	D	OST	Ostatné				400,00
10	K	OST-1	Ohnisko, vid. PD	ks	1,000	400,00	400,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				150,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731248 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
- 2 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves

IČO: 31731244
IČ DPH: 0

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 678,76
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**16 678,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 678,76	20,00%	3 335,75

Cena s DPH	v EUR	**20 014,51**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
- 2 -

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**16 678,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 168,07
1 - Zemné práce	299,84
2 - Zakladanie	576,51
5 - Komunikácie	2 002,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	753,48
99 - Presun hmôt HSV	535,48
PSV - Práce a dodávky PSV	11 110,69
762 - Konštrukcie tesárske	5 227,58
764 - Konštrukcie klampiarske	4 500,15
783 - Nátery	1 382,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 000,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	400,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**16 678,76**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 31731244 DIČ 2020505180 DPH SK 2020505180
Tel.: 00421 53 41 73 232
-2-

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 678,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 168,07
	D	1	Zemné práce				299,84
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	42,00	135,49
	VV		0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,613	2,25	3,63
	VV		3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,48	24,13
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,69	15,58
	VV		3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226	7,51	24,23
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	15,00	96,78
	VV		3,226*2		6,452		
	VV		Medzisúčet		6,452		
	VV		Súčet		6,452		
	D	2	Základanie				576,51
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	127,43	489,33
	VV		0,8*0,8*1*6		3,840		
	VV		Medzisúčet		3,840		
	VV		Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	20,12	61,81
	VV		(1+0,84)*0,8*4*6		3,072		
	VV		Medzisúčet		3,072		
	VV		Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	8,26	25,37
	D	5	Komunikácie				2 002,76
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	6,43	250,83
	VV		6,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	8,49	331,19
	VV		6,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	15,00	585,15
	VV		6,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	592460008100.S R	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*21,00*	*835,59*
	VV		39,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				753,48
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	9,20	239,20
	VV		8,3*2+4,7*2		26,000		
	VV		Medzisúčet		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
15	M	592170001800.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*8,00*	*210,08*
	VV		26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	130,00	304,20
	VV		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				535,48
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	12,32	535,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 110,69
	D	762	Konštrukcie tesárske				5 227,58
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	6,50	117,00
	VV		2*9		18,000		
	VV		Medzisúčet kliešiny		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	6,90	204,59
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet vzpera		12,450		
	VV		Súčet		29,650		
20	M	605120007100.S R	*Hranoly, vid. PD*	*m3*	*1,192*	*550,00*	*655,60*
	VV		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	VV		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	VV		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	VV		Medzisúčet vzpera		0,359		
	VV		2*9*0,16*0,08		0,230		
	VV		Medzisúčet kliešiny		0,230		
	VV		Súčet		1,084		
	VV		1,084*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	2,00	344,00
	VV		8,6*10*2		172,000		
	VV		Medzisúčet		172,000		
	VV		Súčet		172,000		
22	M	605140001700.S R	*Laty*	*m3*	*0,454*	*600,00*	*272,40*
	VV		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	VV		Medzisúčet		0,413		
	VV		Súčet		0,413		
	VV		0,413*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	46,30	76,21
	VV		1,192+0,454		1,646		
	VV		Medzisúčet		1,646		
	VV		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	6,50	91,00
	VV		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	VV		Medzisúčet		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	8,00	1 058,48
	VV		6*2*3,5		42,000		
	VV		Medzisúčet steny		42,000		
	VV		3,14*9		28,260		
	VV		Medzisúčet krokvy		28,260		
	VV		3,65*17		62,050		
	VV		Medzisúčet zadná stena		62,050		
	VV		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	8,50	225,17

MILANKO spol. s r.o.
Chrepčiakova 29, 064 01 Sp. Nová Ves
IČO 31241[illegible] DPH SK 2020505190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(0,9+1,44)*6		14,040		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet		26,490		
	VV		Súčet		26,490		
27	M	052130001300.S	Výrez slípový, vid. PD	m3	3,661	500,00	1 830,50
	VV		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	VV		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	VV		Medzisúčet 250mm		0,893		
	VV		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	VV		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	VV		Medzisúčet 150mm		2,339		
	VV		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	VV		Medzisúčet 120mm		0,158		
	VV		Súčet		3,390		
	VV		3,39*1,08 Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	46,30	169,50
	VV		3,661		3,661		
	VV		Medzisúčet		3,661		
	VV		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	52,65	183,13
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 500,15
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	16,50	283,80
	VV		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	17,00	213,52
	VV		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	55,00	2 970,44
	VV		3,14*8,6*2		54,008		
	VV		Medzisúčet		54,008		
	VV		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	16,00	275,20
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet		17,200		
	VV		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	40,00	80,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	12,00	48,00
36	M	553440000600.S	Čelo lisované polkruhové pozink farebný	ks	4,000	25,00	100,00
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	12,00	216,00
	VV		9*2		18,000		
38	M	553440047100.S	Hák s prelisom polkruhový pozink farebný	ks	18,000	6,00	108,00
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	6,00	24,00
40	M	553440004200.S	Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm	ks	4,000	15,00	60,00
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	5,40	21,60
42	M	553440051000.S	Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	4,000	5,20	20,80
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	12,90	41,80
	VV		(1,44+0,9*2)		3,240		
	VV		Medzisúčet		3,240		
	VV		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581	63,67	36,99
	D	783	Nátery				1 382,96
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	9,50	1 382,96
	VV		8,6*2*(0,16*2+0,18*2)		11,696		
	VV		Medzisúčet pomurnica		11,696		
	VV		4,15*3*(0,16*2+0,16*2)		8,466		
	VV		Medzisúčet vzpera		8,466		
	VV		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	VV		Medzisúčet kliestiny		8,640		

MILANKO spol. s r.o.
Chrepčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		6,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	VV		Medzisúčet laty		34,400		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*4,15)		3,358		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*14,04)		11,125		
	VV		Medzisúčet 250mm		14,483		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*70,62)		33,314		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*62,05)		29,276		
	VV		Medzisúčet 150mm		62,590		
	VV		(2*PI*0,06*0,06+2*PI*0,06*14)		5,300		
	VV		Medzisúčet 120mm		5,300		
	VV		Súčet		146,575		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	20,00	1 000,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				400,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	200,00	200,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostavenískový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	200,00	200,00

MILANKO spol. s r.o.
Chrepčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH: SK2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
- 2 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
IČO: 31731244
IČ DPH: 0

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 464,37
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**2 464,37**

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znížená	0,00	20,00%	0,00
	2 464,37	20,00%	492,87
Cena s DPH		**v EUR**	**2 957,24**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Zhotoviteľ: MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	**2 464,37**
1 - Zemné práce	17,17
2 - Zakladanie	5,67
99 - Presun hmôt HSV	9,04
PSV - Práce a dodávky PSV	2,46
762 - Konštrukcie tesárske	1 897,20
OST - Ostatné	1 897,20
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	400,00
	150,00
2) Ostatné náklady	
GZS	**0,00**
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 464,37**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731211 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
- 2 -

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 464,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17,17
	D	1	Zemné práce				5,67
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	63,00	5,67
	VV		0,3*0,3*0,5*2		0,090		
	VV		Medzisúčet		0,090		
	VV		Súčet		0,090		
	D	2	Zakladanie				9,04
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	45,00	1,62
	VV		0,3*0,3*0,2*2		0,036		
	VV		Medzisúčet		0,036		
	VV		Súčet		0,036		
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	137,43	7,42
	VV		0,3*0,3*0,3*2		0,054		
	VV		Medzisúčet		0,054		
	VV		Súčet		0,054		
	D	99	Presun hmôt HSV				2,46
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	12,75	2,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 897,20
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 897,20
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, vid. PD	ks	2,000	150,00	300,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, vid. PD	ks	1,000	520,00	520,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 860,000	0,02	37,20
	D	OST	Ostatné				400,00
10	K	OST-1	Ohnisko, vid. PD	ks	1,000	400,00	400,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				150,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 31734264 IČ DPH SK 2020505190
Tel. 00421 53 41 73 232
-2-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31731244
	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	VIA OPTIMA, spol. s r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	126 192,59
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**126 192,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	126 192,59	20,00%	25 238,52

Cena s DPH	v **EUR**	**151 431,11**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	VIA OF TIVIA, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**126 192,59**
D1 - Práce HSV	126 192,59
1 - ZEMNÉ PRÁCE	23 392,35
2 - ZÁKLADY	18 746,94
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	12 483,51
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	54 984,02
8 - POTRUBNÉ ROZVODY	5 977,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 247,76
99 - PRESUNY HMÔT	9 360,25
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**126 192,59**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731243, DIČ: DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: VIA OPTIMA, spol. s
Zhotoviteľ: MILANKO,Chrapčiakova 29,Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**126 192,59**
	D	D1	Práce HSV				126 192,59
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				23 392,35
1	K	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	m2	475,000	1,83	869,25
2	K	112101121	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	47,000	4,39	206,33
3	K	112101122	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	9,000	8,62	77,58
4	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	47,000	9,56	449,32
5	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	9,000	21,65	194,85
6	K	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	23,000	47,88	1 101,24
7	K	122301401	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	28,990	5,34	154,81
8	K	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	14,495	0,81	11,74
9	K	132301101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	67,100	62,39	4 186,37
10	K	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	33,550	12,19	408,97
11	K	132301202	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	91,620	23,88	2 185,50
12	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna.Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	45,760	2,45	112,11
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	28,990	1,84	53,34
14	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	65,240	2,54	165,71
15	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	529,140	1,19	629,68
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	28,990	1,00	28,99
17	K	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	28,990	3,97	115,09
18	K	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,620	25,81	816,11
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	5 368,650	0,52	2 791,70
20	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	742,710	1,78	1 322,02
21	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	850,800	1,57	1 335,76
22	K	122302202	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 100 m3 do 1000 m3 v hornine triedy 4	m3	464,750	9,53	4 429,07
23	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	232,375	1,64	381,10
24	K	OD000501	Odstránenie drevenej odrážky vrátane spálenia odpadového dreva	m	1,000	10,00	10,00
25	M	5833333300	*Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z*	T	55,335	24,50	1 355,71
	D	2	ZÁKLADY				18 746,94
26	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	M2	3 559,450	0,47	1 672,94
27	K	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	1,500	140,00	210,00
28	K	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	11,650	14,97	174,40

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel: 00421 53 41 73 232

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	274361212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	11,650	4,82	56,15
30	M	6936656009	*Geosyntetika, E´GRID 30/30 geomreža tuhá dvojosá z polypropylénu,š.3.9m x dl.51.3m; P.K.TECHNICKÉ TEXTÍLIE*	*M2*	*1 922,800*	*4,35*	*8 364,18*
31	M	6936656025	*PK-TEX PP 25 Geotextília tkaná z polypropylénu 5,2 x 100 m*	*M2*	*1 992,595*	*4,15*	*8 269,27*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				12 483,51
32	K	388129220	Montáž prefabrikovaného kanálu zo železobetónu tvaru U s hmotnosťou do 2,5 t	kus	60,000	68,98	4 138,80
33	K	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad 20 m2, 300mm	M2	108,250	43,80	4 741,35
34	K	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	3,000	101,12	303,36
35	M	BG020100	*BG Lesný žľab sv. š. 100 mm, šírka 512 mm, výška 486 mm, dl. 2500 mm (s výstužou)*	*ks*	*60,000*	*55,00*	*3 300,00*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				54 984,02
36	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 200 mm	m2	849,950	6,19	5 261,19
37	K	564772111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 250 mm	m2	880,300	10,27	9 040,68
38	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	848,250	3,43	2 909,50
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	475,750	4,79	2 278,84
40	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	1 212,850	6,18	7 495,41
41	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	3 698,600	7,57	27 998,40
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				5 977,76
42	K	871420410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 500 mm	m	30,000	48,31	1 449,30
43	K	871470410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 800 mm	m	13,000	171,42	2 228,46
44	M	286161080105	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 500/6 m*	*KUS*	*6,000*	*240,00*	*1 440,00*
45	M	286161080107	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m*	*KUS*	*3,000*	*270,00*	*810,00*
46	M	286161081907	*PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8.- SN 10,800 pre PP ID PRAGMA*	*KUS*	*1,000*	*50,00*	*50,00*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 247,76
47	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	26,660	4,71	125,57
48	K	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	13,330	5,49	73,18
49	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,165	14,87	2,45
50	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,465	0,53	1,84
51	K	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,165	100,00	16,50
52	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 600 do 800 mm, - 2,05500t	m	6,000	107,23	643,38
53	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	0,165	5,09	0,84
54	M	GU000101	*Osadenie smerového kola z gufatiny priemeru 125-175 mm, dl. 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu*	*KS*	*4,000*	*96,00*	*384,00*
	D	99	PRESUNY HMÔT				9 360,25
55	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	3 559,032	2,63	9 360,25

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731249, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

Plná moc

Splnomocniteľ

Názov:	MILANKO spol. s r.o.,
IČO:	317 312 44
Sídlo:	Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves
PSČ:	052 01
Meno splnomocniteľa:	JUDr. Milan Tkáč
Funkcia:	konateľ spoločnosti

Splnomocnenec

Meno splnomocnenca:	Anna Šteinerová
Adresa:	Trieda 1. mája 55/2 Spišská Nová Ves
PSČ:	052 05
Dátum narodenia:	18. 07. 1958

Splnomocniteľ poveruje týmto splnomocnenca, aby na základe tejto plnej moci vykonával za splnomocniteľa a jeho menom všetky úkony týkajúce sa verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE, hlavne:

- **predkladať ponuky,**
- **odosielať žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov,**
- **dopĺňovať kvalifikáciu a podávať vysvetlenie k podaným ponukám,**
- **podávať námietky,**
- **komunikovať s obstarávateľom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa postupov vo verejnom obstarávaní,**
- **v prípade hodnotenia ponúk elektronickou aukciou vykonávať úkony v elektronickej aukcii, prípadne určiť zodpovednú osobu za elektronickú aukciu,**
- **poskytovať obstarávateľovi verejného obstarávania súčinnosť pri uzatvorení zmluvy.**

Splnomocnenec je ďalej oprávnený spravovať prístupy splnomocniteľa, čoby účastníka vo verejnom obstarávaní realizovaných v elektronickom systéme JOSEPHINE a to vrátane vytvárania oprávnení ďalším osobám či ukončenie týchto oprávnení.
Splnomocnenec nie je oprávnený na základe tejto plnej moci uzatvárať s obstarávateľom zmluvu.
Tato plná moc zanikne jej odvolaním splnomocniteľom alebo výpoveďou splnomocnenca.

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

V Spišská Nová Ves dňa 28. 06. 2021

.....
za splnomocniteľa
JUDr. Milan Tkáč

Plnú moc prijímam
V Spišská Nová Ves dňa 28. 06. 2021

.....
za splnomocnenca
Anna Šteinerová

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v platnom znení

Číslo opatrenia	8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Číslo podopatrenia	8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	59/PRV/2022, Pôdohospodárska agentúra
Názov zákazky:	*„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"*
Predmet zákazky:	*„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"*
Prijímateľ[1]:	*Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.* *Novoveská cesta 9304/28* *053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta* *IČO: 31 666 205* *DIČ: 2020503034*
Kód projektu	*SA.103303*
ID obstarávania	
Zastúpená:	*Ing. Ján Novák – riaditeľ – konateľ spoločnosti*

VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU

1. **Časť: SO-01. Cyklistický trail - trasa č.1**
   SO-02. Cyklistický trail – trasa č.2

Identifikačné údaje OSLOVENÉHO DODÁVATEĽA	SPÔSOB OSLOVENIA	CENA v € bez DPH	DOKLADY ZÍSKANÉ PRIESKUMOM
1. Lesostav Poprad s.r.o. **Levočaská 29, 058 01 Poprad**	**Josephine**	**128 601,60**	

[1] V zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 označenie prijímateľ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku ako aj pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

2.MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves	Josephine	119 376,20	

CENA PHZ v € bez DPH[2] 123 988,90

CENA PHZ v € s DPH[3] 148 786,68

2. časť: SO-03. Altánok Skalka
   03.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko
   SO-04. Altánok Hliníky
   04.1. Lavičky odpadové koše a ohnisko
   SO-05. Altánok Javor Poľana
   05.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko

Identifikačné údaje OSLOVENÉHO DODÁVATEĽA	SPÔSOB OSLOVENIA	CENA v € bez DPH	DOKLADY ZÍSKANÉ PRIESKUMOM
1.Lesostav Poprad s.r.o. Levočaská 29, 058 01 Poprad	Josephine	84 891,26	
2.MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves	Josephine	58 590,01	

CENA PHZ v € bez DPH[2] 71 740,64

CENA PHZ v € s DPH[3] 86 088,76

[2] PHZ sa odporúča vypočítať aritmetickým priemerom
[3] PHZ sa odporúča vypočítať aritmetickým priemerom

3. časť: SO-06. Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Identifikačné údaje OSLOVENÉHO DODÁVATEĽA	SPÔSOB OSLOVENIA	CENA v € bez DPH	DOKLADY ZÍSKANÉ PRIESKUMOM
1.Lesostav Poprad s.r.o. Levočaská 29, 058 01 Poprad	**Josephine**	**159 220,36**	
2.MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves	**Josephine**	**126 192,59**	

CENA PHZ v € bez DPH[2] 142 706,48

CENA PHZ v € s DPH[3] 171 247,78

Ako prijímateľ zákazky na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb Vám predkladám záznam zo stanovenia PHZ poštou/osobne/cez e-slovensko/cez ITMS2014+/cez elektronický obstarávací systém[4]

a zároveň **čestne vyhlasujem**, že:

- predkladaná dokumentácia je pravdivá, úplná a kompletná a uvedené dokumenty sú totožné s orginálnou dokumentáciou archivovanou u mňa, ktorú viem kedykoľvek na požiadanie poskytovateľovi preložiť;

V Spišskej Novej Vsi dňa 20.12.2022

podpis a pečiatka[5] štatutárneho zástupcu[6]*** (kópia)

[4] Nehodiace prečiarknuť
[5] Doplniť, ak je relevantné
[6] resp. poverenej osoby vykonávaním PHZ, v takom prípade je potrebné priložiť kópiu notársky overeného plnomocenstva. V prípade, že sa uvedené doklady prekladajú do elektronického obstarávacieho systéme alebo ITMS2014+, prijímateľ vloží len sken plnomocenstva a tohto podpísaného dokumentu a originál uchová u seba pre potreby k nahliadnutiu/ resp. k predloženiu na základe požiadavky poskytovateľa. V prípade poštového styku, prijímateľ predkladá dokument podpísaný štatutárnym zástupcom resp. poverenou osobou.

Prílohy:

Zoznam dokumentácie				
Prílohy, ktoré je obstarávateľ povinný predložiť v tlačenej a elektronickej podobe[7]	**Listinná forma**		**Elektronická forma**	
	Áno/Nie/Nie je potrebné	**Kópia/Originál[8]**	**Áno/Nie/Nie je potrebné**	**Kópia/Originál[9]**
Plnomocenstvo	Nie je potrebné	Originál	Nie je potrebné	Kópia
Všetky doklady z prieskumu trhu na určenie PHZ[10]	Nie je potrebné	Kópia	Áno	Kópia
Písomné zdôvodnenie získania nižšieho počtu ako troch cenových ponúk na stanovenie PHZ[11]	Nie	Originál	Nie	Kópia
Dôkaz písomného zdôvodnenia nižšieho počtu ako troch cenových ponúk na stanovenie PHZ[12]	Nie	Kópia	Nie	Kópia

[7] Vyberie sa položka: áno/nie/nie je potrebné

[8] Resp. notársky overená kópia

[9] Resp. notársky overená kópia

[10] Ide o všetky dokumenty, ktoré boli podkladom pre vytvorenie PHZ, napr. oslovenia, odpovede, zmluvy z CRZ, cenníky dodávateľov, rozpočet autorizovaného projektanta atď. Zároveň súčasťou príloh sú aj potvrdenia o doručení (v prípade e-mailovej a listinnej forme komunikácie), obálky (v prípade listinnej komunikácie)

[11] Ak relevantné

[12] Ak relevantné

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Číslo spisu:	35333

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	19.12.2022 10:07:28
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	Lesostav Poprad s.r.o. (IČO: 31728499, SK)
Typ:	Žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky
Nutné odpovedať do:	21.12.2022 00:00:00
Predmet:	Vysvetlenie ponuky
Správa:	Prajem dobrý deň, v prílohe posielam Žiadosť o vysvetlenie ponuky. S pozdravom

Prílohy

Názov súboru	Veľkosť
zladost_vysvetlenie_ponuky_Lesostav Poprad s r o (1).pdf	178.16 KB

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Lesostav Poprad, s.r.o.
Levočská 29
058 01 Poprad

VEC: Žiadosť o vysvetlenie ponuky, na predmet zákazky- „Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"

V zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o **vysvetlenie Vašej ponuky, ktorú ste predložili** na predmet zákazky Prieskum trhu **„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV".**

Zákazka je rozdelená na 3 časti:

1. časť: SO-01. Cyklistický trail - trasa č.1
   SO-02. Cyklistický trail - trasa č.2
2. časť: SO-03. Altánok Skalka
   03.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko
   SO-04. Altánok Hliníky
   04.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko
   SO-05. Altánok Javor Poľana
   05.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko
3. časť: SO-06. Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Vo Vašej ponuke ste predložili podpísaný a pečiatkou opatrený Krycí list rozpočtu, v ktorom je uvedený súčet za všetky časti spolu: 358 251,92 € bez DPH / 429 902,30 € s DPH, správne by malo byť uvedené 372 713,22 € bez DPH / 447 255,86 € s DPH. V rekapitulácii rozpočtu sú sumy za jednotlivé časti uvedené správne.

Žiadame Vás o vysvetlenie nesprávneho súčtu a zároveň o doplnenie podpísaných krycích listov za jednotlivé časti.

Vaše písomné vysvetlenie / doplnenie ponuky žiadame doručiť elektronicky prostredníctvom JOSEPHINE **najneskôr do dvoch (2) pracovných dní** odo dňa doručenia tejto žiadosti o vysvetlenie ponuky.

S pozdravom

Ing. Veronika Vodhanelová, v. r.
Osoba zodpovedná za
proces verejného obstarávania

V Spišskej Novej Vsi, 19.12.2022

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Číslo spisu:	35333

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	19.12.2022 16:28:22
Od:	Lesostav Poprad s.r.o. (IČO: 31728499, SK)
Komu:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Typ:	Žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky
Predmet:	RE: Vysvetlenie ponuky
Správa:	Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie danej nezrovnalosti uvádzame nasledovné : predložený krycí list stavby bol vytlačený a pripravený na odoslanie ešte skôr, ako sme dokončili a definitívne uzavreli ceny na jednotlivých objektoch. Predmetný krycí list tak nezahŕňal konečné ceny na jednotlivých objektoch. Program Cenkros, ktorý používame pri tvorbe ponukových rozpočtov, spočítava ceny jednotlivých položiek a samozrejme následne aj jednotlivých objektov automaticky a tak sme si túto nezrovnalosť a chybu z našej strany ani neuvedomili. Boli sme sami prekvapení toto skutočnosťou a toto je jediné vysvetlenie, ako k tomu mohlo dôjsť. Podpísala sa na tom zrejme aj časová tieseň, lebo čas medzi zverejnením a predložením ponuky bol pomerne krátky. Napriek tomu nás mrzí, že sme si to pred odoslaním ešte raz a dôkladne neskontrolovali. V prílohe posielame krycie listy jednotlivých objektov, ako aj krycí list stavby. S pozdravom Ing. Bohuš Demjan, Lesostav Poprad s. r. o.

Prílohy

Názov súboru	Veľkosť
Vyst. a obnova obc. infastruktury ... kryci list stavby.pdf	213.07 KB
Vyst. a obnova obc. infrastruktury ... krycie listy objektov.pdf	1.25 MB

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV	JKSO	
Názov objektu	Cyklistický trail – trasa č. 1	EČO	
		Miesto	Lesy mesta Spišská Nová V
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.		
Projektant	MK2 PLUS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Lesostav Poprad s.r.o.	31726499	SK 2020515145
Spracoval	Lesostav Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	28 602,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	17 250,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		45 852,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-16)		0,00
20	HZS		2 500,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	48 352,00
24	DPH 20,00 % z 48 352,00	9 670,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)	58 022,40

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +, -	0,00

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
LESOSTAV POPRAD s.r.o.
Levočská 29
058 01 Poprad-4
IČO: 31726499 DIČ: 2020515145

Spracované systémom EMKROS 4, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV	JKSO	
Názov objektu	Cyklistický trail – trasa č. 2	EČO	
		Miesto	Lesy mesta Spišská Nová V
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.		
Projektant	MK2 PLUS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Lesostav Poprad s.r.o.	31726499	SK 2020515145
Spracoval	Lesostav Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž 52 509,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž 21 990,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	74 499,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	6 750,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	80 249,60
24	DPH 20,00 % z 80 249,60	16 049,92
25	Cena s DPH (r. 23-24)	96 299,52

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie, + -	0,00

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
LESOSTAV POPRAD s.r.o.
Levočská 29
058 01 Poprad
IČO: 31726499 DIČ: 2020515145

Spracované systémom CENEROS 4, tel. 041/707 16 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV	JKSO	
Názov objektu	Altánok Skalka	EČO	
		Miesto	Lesy mesta Spišská Nová Ves
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.		
Projektant	MK2 PLUS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Lesostav Poprad s.r.o.	31728499	SK 2020515145
Spracoval	Lesostav Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	30.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 617,69	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2	Montáž	2 878,86	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV Dodávky	2 397,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	15 096,96	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	VRN 5		0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		4 300,00
7	ZRN (r. 1-6)	21 990,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		4 300,00
20	HZS	1 691,50	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	27 982,12
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 27 982,12	5 596,42
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	33 578,54
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	LESOSTAV POPRAD s.r.o. Levočská 29 058 01 Poprad IČO: 31728499 IČ DPH: SK2020515145	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Klzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV	JKSO	
Názov objektu	Altánok Hlinky	EČO	
		Miesto	Lesy mesta Spišská Nová Ves
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.		
Projektant	MK2 PLUS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Lesostav Poprad s.r.o.	31728499	SK 2020515146
Spracoval	Lesostav Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa: 30.11.2022	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 617,69	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 878,86	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	2 397,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	15 096,96	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		4 300,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 990,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		4 300,00
20	HZS		2 225,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	28 515,62
24	DPH 20,00 % z 28 515,62	5 703,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	34 218,74

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Iná položka	0,00
28	Zvýhodnenie +/-	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

LESOSTAV POPRAD s.r.o.
Levočská 29
058 01 Poprad
IČO: 31728499 IČ DPH: SK2020515146

Spracované systémom ORIS KROS 4, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV	JKSO	
Názov objektu	Altánok Javor Poľana	EČO	
		Miesto	Lesy mesta Spišská Nová V
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.		
Projektant	MK2 PLUS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Lesostav Poprad s.r.o.	31728499	SK 2020515145
Spracoval	Lesostav Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa 30.11.2022	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 617,69	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 756,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	2 397,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	15 096,96	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 6	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	4 300,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 868,52	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	4 300,00
20	HZS		2 225,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	28 393,52
24	DPH 20,00 % z 28 393,52	5 678,70
25	Cena s DPH (r. 23-24)	34 072,22

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

LESOSTAV POPRAD s.r.o.
Levočská 29
058 01 Poprad
IČO: 31728499 DIČ: SK2020515145

Spracované systémom CENKROS 4, (c) 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV	JKSO	
Názov objektu	Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH + odvodnenie	EČO	
		Miesto	Lesy mesta Spišská Nová V
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.		
Projektant	MK2 PLUS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Lesostav Poprad s.r.o.	31728499	SK 2020515145
Spracoval	Lesostav Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa 30.11.2022	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	102 171,46	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	57 048,90	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projekčné práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		159 220,36	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	159 220,36
24	DPH 20,00 % z 159 220,36	31 844,07
25	Cena s DPH (r.23-24)	191 064,43

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka: LESOSTAV POPRAD s.r.o. Levočská 29 058 01 Poprad IČO: 31728499 IČ DPH: SK2020515145

Spracované systémom CENKROS 4.14.041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a obnova obĺanskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Lesy mesta Spišská Nová V
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.		
Projektant	MK2 PLUS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Lesostav Poprad s.r.o.	31726499	SK 2020615145
Spracoval	Lesostav Poprad s.r.o.		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa 30.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	107 024,53	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00
2		Montáž	146 674,98	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	7 191,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	84 630,88	11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 6	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	12 900,00
7	ZRN (r. 1-6)		345 421,72	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	12 900,00
20	HZS		14 391,50	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	372 713,22
24	DPH 20,00 % z 372 713,22	74 542,64
25	Cena s DPH (r. 23-24)	447 255,86

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

LESOSTAV POPRAD s.r.o.
Lavočkina 29
057 01 Poprad
IČO: 31726499 DIČ: 2020615145

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/767 10 11

22315 - WYP

Vestník č. 133/2023 - 07.07.2023

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu výzvy

Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO: 31666205

Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ján Novák - riaditeľ

Telefón: +421 534173425

Email: huta@lesysnv.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavná adresa(URL): www.lesysnv.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/459408

Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE

SVT, s.r.o.

IČO: 31652387

Starosaská 15 , 052 01 Spišská Nová Ves

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Mária Kleinová

Telefón: +421 903601138

Email: svt@svt.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/459408

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

§7 ods. 1d)

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

Referenčné číslo: 2023/VO/LesySNV/07

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú nadväzovať na tri jestvujúce trialy (detský trail, adva enduro trialy).

Na začiatku oboch trialov na parcele C-KN 9645/1 je navrhovaný objekt SO-03 Altánok Skalka s dreveným sedením 2ks, odpadkovými košmi 2ks a ohniskom a lavičkami.

Objekt SO-04 Altánok Hliníky je navrhovaný na parcele C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík, ktorého súčasťou je drevené sedenie 2ks. Odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.

Objekt SO-05 Altánok Javor Poľana je navrhovaný na parcele C-KN 929, k.ú. Hnilec, ktorého súčasťou je taktiež drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.

Objekt SO-06 rieši rekonštrukciu bežeckých tratí Gloncingerka a Zelený vrch odvodnenie na parcele C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík aE-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík.

Momentálne sú trate bez akéhokoľvek odvodnenie. Voda z okolitého terénu tečie priamo na bežecké trate, pretože ich povrch sa nachádza pod úrovňou priľahlého terénu a následne na ich pláni povrchová voda vytvára erózne ryhy, stojace mláky a podmáča ich pláň a podlažie.

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

338 436,02 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Áno

Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3

Ponuky možno predkladať na: všetky časti

II.2) OPIS

Časť: 1

II.2.1) Názov

SO-01: Cyklistický trail trasa č.1, SO-02: Cyklistický trail trasa č.2

Časť č.: 1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233162-2

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK04

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves -SO-01

II.2.4) Opis obstarávania

SO-01: Cyklistický trail trasa č. 1

Objekt SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) je riešený na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves. Jedná sa o stredne náročný až ťažký trail.

Terén, v ktorom sa nachádza červený trail je strmší a členitejší, čo je ideálne pre ťažší a technickejší trail určený pre skúsených cyklistov. Využité bude pri ňom čo najviac prírodných prekážok, ako sú koreňové a kamenisté pasáže, skaly a iné. Zároveň je navrhnutých niekoľko umelo vytvorených prekážok ako sú dropy 2ks alebo skoky 3ks, zápierky 5ks v príliš odklopených úsekoch, klopené zákruty 15ks a mostíky 4ks.

SO-02: Cyklistický trail trasa č. 2

SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) je riešený na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves. Trail (fialový) sa nachádza v menej strmom teréne, ktorý poskytuje ideálne podmienky na stavbu ľahšieho enduro trailu ideálny pre začiatočníkov. Využité budú pri ňom technicky menej náročné úseky. Čo sa týka prekážok, na tomto traile sú navrhnuté hlavne klopené zákruty 18ks, niekoľko menších skokov 4ks, zápierky 12ks, lavice 2ks, vlny 4ks a mostíky 2ks.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Predpokladaná hodnota

123 988,90 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 12

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Identifikácia projektu: Fond z Európskej únie Výzva č.: 59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra

Časť: 2

II.2.1) Názov

SO-03: Altánok Skalka

03.1: Lavičky, odpadové koše a ohnisko

SO-04: Altánok Hliníky

04.1: Lavičky, odpadové koše a ohnisko

SO-05: Altánok Javor Poľana

05.1: Lavičky, odpadové koše a ohnisko

Časť č.: 2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

44112100-9

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK04

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Lesy mesta Spišská Nová Ves, E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

II.2.4) Opis obstarávania

O-03. Altánok Skalka:

Stavebný objekt rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť

drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.
Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu 120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.
Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.
Kotvenie nosných stĺpov 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

SO-04 Altánok Hliníky:
Stavebný objekt rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.
Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu 120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.
Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.
Kotvenie nosných stĺpov 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť zo zrubov bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

O-05 Altánok Javor Poľana:
Stavebný objekt rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.
Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu 120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.
Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.
Kotvenie nosných stĺpov 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť zo zrubov bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Predpokladaná hodnota

71 740,64 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 6

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Fond z Európskej únie Výzva č.: 59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra

Časť: 3

II.2.1) Názov

SO-06. Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH odvodnenie
Časť č.: 3

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45236114-2

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK04

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Lesy mesta Spišská Nová Ves na parcele C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík a E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík

II.2.4) Opis obstarávania

Trasa bežeckej trate Glocingerka Borovniak sa začiatkom napája na jestvujúcu čiastočne spevnenú lesnú odvoznú cestu triedy 2L v JPRL 435, trasa pokračuje smerom na severovýchod cez JPRL 434, 433, 425, 428 a 424, kde za krížením potoka Borovniak končí. Dĺžka trasy je 1 203 m. Trasa bežeckej trate Glocingerka Hliníky sa ľavostranným výjazdom napája na trasu Glocingerka Borovniak v staničení km 0,420, trasa pokračuje smerom na západ cez JPRL 406, 409 a 407, kde napojením na trvalú približovaciu lesnú cestu končí. Dĺžka trasy je 534 m, spevnenie a odvodnenie sa navrhuje v len úsekoch km 0,116 0,193; km 0,216 0,272 a km 0,432 0,502 (dĺ. 173 m). Trasa bežeckej trate Glocingerka Prepojka sa začiatkom napája na rovnakú jestvujúcu čiastočne spevnenú lesnú odvoznú cestu triedy 2L ako trasa Glocingerka Borovniak v JPRL 440, trasa vedie smerom na juhozápad a koncom sa napája taktiež na trvalú približovaciu lesnú cestu. Dĺžka trasy je 101 m. Trasa bežeckej trate Zelený vrch sa začiatkom napája na trvalú približovaciu lesnú cestu na rozhraní lúky a lesného porastu v lokalite Žliabky a vedie smerom na sever cez JPRL 444 a 445. Dĺžka trasy je 239 m.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Predpokladaná hodnota

142 706,48 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 12

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Identifikácia projektu: Fond z Európskej únie Výzva č.: 59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo

b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo

c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa §34 ods. 1 písm a) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a

odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky / časť, na ktorú uchádzač predkladá ponuku.
Zoznam stavebných prác má obsahovať:
- názov a sídlo objednávateľa,
- kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet predmetu zmluvy,
- doba dodania,
- zmluvná cena bez DPH

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 27.07.2023 10:00

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
CS

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 31.12.2023

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 27.07.2023 10:30
Miesto: SVT, s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky, z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
5. Nepoužije sa elektronická aukcia.
6. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

05.07.2023

EVO

Dokument EVO

Oznámenie pre záujemcov/uchádzačov

Názov zákazky: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Obstarávateľ, 25.07.2023 o 09:28:55

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že sa posúva lehota na predkladanie ponúk do 31.07.2023, 10:00 hod.

Otváranie / sprístupnenie ponúk sa uskutoční dňa 31.07.2023, 10:30 hod.

EVO

Dokument EVO

Oznámenie pre záujemcov/uchádzačov

Názov zákazky: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Obstarávateľ, 28.07.2023 o 10:00:54

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že sa posúva lehota na predkladanie ponúk do 04.08.2023, 10:00 hod.

Otváranie / sprístupnenie ponúk sa uskutoční dňa 04.08.2023, 10:30 hod.

EVO

Dokument EVO

Oznámenie pre záujemcov/uchádzačov

Názov zákazky: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Obstarávateľ, 02.08.2023 o 10:25:35

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že sa posúva lehota na predkladanie ponúk do 08.08.2023, 10:00 hod.

Otváranie / sprístupnenie ponúk sa uskutoční dňa 08.08.2023, 10:30 hod.

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA STAVEBNÉ PRÁCE
BEŽNÝ POSTUP

Podľa § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní", alebo „ZVO")
Prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „systém IS EVO") bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PREDMET ZÁKAZKY:

„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"

August 2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Úvodné ustanovenia

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.
Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
6. Zdroj finančných prostriedkov
7. Druh zákazky
8. Lehota viazanosti ponuky

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

ČasťIII.
Príprava dokladov ponuky

12. Vyhotovenie dokladov
13. Jazyk ponuky
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15. Zábezpeka viazanosti ponuky
16. Obsah ponuky
17. Náklady na prípravu ponuky

Časť IV.
Predkladanie ponuky

18. Predloženie dokladov ponuky
19. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

ČasťV.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

21. Otváranie / Sprístupnenie ponúk
22. Komisia
23. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
24. Preskúmanie ponúk
25. Vyhodnotenie ponúk
26. Vysvetľovanie a oprava chýb v ponukách

Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

27. Dôvernosť procesu zadávania zákazky
28. Opravné prostriedky

ČasťVII.
Prijatie ponuky

29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
30. Uzavretie zmluvy
31. Podmienky poskytnutia súčinnosti k podpisu zmluvy

32. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
32. Uzatváranie dodatkov ku zmluve

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

B.3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

B.4 OBCHODNÉ PODMIENKY ZMLUVY

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje podmienky verejného obstarávateľa, ako výlučné podmienky tohto verejného obstarávania.
Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preskúmajú a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre zmluvné ustanovenia a špecifikácie obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch.
Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, a všetky doplnky k súťažným podkladom vydané v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace so všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenua charakter ponuky alebo realizáciu diela. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovanýžiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedenýchpovinností.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zabezpečil aj súhlasy všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v prípade, ak to bolo potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov:	Lesy mesta Spišská Nová Ves
Adresa:	Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves
IČO:	316 662 05
DIČ:	
IČ DPH:	neplatca DPH
Internetová adresa:	www.lesysnv.sk
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Novák - riaditeľ
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Ing. Ján Novák - riaditeľ
Telefón:	+421 053/4173425
E-mail:	huta@lesysnv.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania:

Kontaktná osoba:	Ing. Mária Kleinová
Telefón:	+421 903 601 138
Email:	svt@svt.sk

2 PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy k súťažným podkladom.

2.2 Názov predmetu zákazky: **„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"**:
Predmetom zákazky Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV je Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer. výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré

budú nadväzovať na tri jestvujúce trialy (detský trail, adva enduro trialy). Na začiatku oboch trialov na parcele C-KN 9645/1 je navrhovaný objekt SO-03 Altánok Skalka s dreveným sedením 2ks, odpadkovými košmi 2ks a ohniskom a lavičkami.
Objekt SO-04 Altánok Hliníky je navrhovaný na parcele C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík, ktorého súčasťou je drevené sedenie 2ks. Odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami. SO-05 Altánok Javor Poľana je navrhovaný na parcele C-KN 929, k.ú. Hnilec, ktorého súčasťou je taktiež drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.
Objekt SO-06 rieši rekonštrukciu bežeckých tratí Gloncingerka a Zelený vrch odvodnenie na parcele C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík aE-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík. Momentálne sú trate bez akéhokoľvek odvodnenie. Voda z okolitého terénu tečie priamo na bežecké trate, pretože ich povrch sa nachádza pod úrovňou priľahlého terénu a následne na ich pláni povrchová voda vytvára erózne ryhy, stojace mláky a podmáča ich pláň a podlažie.

2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 338 436,02 Eur bez DPH

2.4 Kód spoločného slovníka obstarávania (CPV):
450000000-7– Stavebné práce

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Zákazka je rozdelená na 3 časti:
1. časť: SO-01. Cyklistický trail trasa č.1
SO-02. Cyklistický trail trasa č.2
2. časť: SO-03. Altánok Skalka
03.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko SO-04. Altánok Hliníky
04.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko SO-05. Altánok Javor Poľana
05.1. Lavičky, odpadové koše a ohnisko
3. časť: SO-06. Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH odvodnenie

Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť samostatne (napr. časť 1, 2 alebo 3) alebo na celý predmet zákazky.

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

5 MIESTO A TERMÍN USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miesto alebo miesta uskutočnenia predmetu zákazky:

Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík
C-KN 929, k.ú. Hnilec
C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík
E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík

5.2 Termín uskutočnenia predmetu zákazky: do **6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.**

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ. Fond z Európskej únie Výzva č.: 59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra
6.2 Lehota splatnosti faktúry bude do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6.3 Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavky.

7 DRUH ZÁKAZKY

7.1 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Výsledok postupu zadávania zákazky: zadanie zákazky.

7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok/požiadaviek na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1, B.2, B.3 a B.4 týchto **súťažných podkladov** (ďalej len – „**týchto SP**").

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

8.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným obstarávateľom do **31.12.2023**

8.2 V prípade uplatnenia námietky proti postupu verejného obstarávateľa alebo v prípade vykonávania kontroly postupu zadávania zákazky podľa príslušných ustanovení Zákona lehoty neplynú. To sa týka aj lehoty viazanosti ponúk. O skutočnosti, týkajúcej sa podanej námietky alebo vykonávanej kontroly, upovedomí kontrolovaný všetkých známych záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade verejný obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk primerane predĺži a o predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov. Uchádzač nemusí byť schopný pri predĺžení lehoty viazanosti ponúk plniť to, čo pôvodne ponúkol / predložil v ponuke s ohľadom na pôvodne určenú lehotu viazanosti ponúk. Uchádzač je povinný vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s daným predĺžením lehoty bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia.

Časť II
KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

9 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

9.1 Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „dorozumievanie") medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

9.2 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní nasledovne:

9.3 Elektronickou formou prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu:
- poskytnutie súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov verejným obstarávateľom na portáli EVO, neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca v systéme EVO bezplatne, resp. z profilu verejného obstarávateľa t.j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na: http://www.uvo.gov.sk/profily, verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe,
- poskytnutie vysvetlení súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie prostredníctvom portálu EVO, pokiaľ záujemcovia o vysvetlenie požiadali,
- doplnenie informácií, uvedených v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré zverejnil verejný obstarávateľ na portáli EVO, ak je to nevyhnutné,
- predkladanie ponuky uchádzačmi podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, stanovených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch,
- odoslanie Zápisnice z otvárania ponúk,
- odoslanie žiadosti o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov,
- odoslanie žiadosti o vysvetlenie ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk, doručenie vysvetlenia ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk,
- doručenie doplnenia alebo vysvetlenia predložených dokladov (doklady týkajúce sa podmienok účasti),
- odoslanie informácie o vylúčení uchádzača z procesu verejného obstarávania ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6 a ods. 7, alebo v prípade vylúčenia ponuky uchádzača podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- odoslanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk,
- v prípade uplatnenia revíznych postupov záujemca alebo uchádzač postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,

9.4. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky.

9.5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie" sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

9.6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.

10 VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

10.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO.

10.2. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní

10.3. O odoslaní vysvetlenia budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO upozornení notifikačným e-mailom systému EVO. Vysvetlenie na predložené otázky nájdu záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO v položke menu „Prehľad" systému EVO pre dané zadávanie zákazky a súčasne v časti „Verejné podklady". Predložené otázky a vysvetlenie zverejní verejný obstarávateľ aj v profile zákazky, t.j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na http://www.uvo.gov.sk/profily.

10.4. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom **najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na prekladanie ponúk**. O doplnení súťažných podkladov budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO upozornení notifikačným e-mailom systému EVO v lehote podľa zákona o VO. Akékoľvek doplnenie a spresnenie sa stáva súčasťou súťažných podkladov.

11 OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

11.1 V prípade záujmu o obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky záujemca požiada o termín obhliadky (tj. navrhne aspoň 2 termíny v pracovných dňoch v čase medzi 8:00 – 15:00 prostredníctvom IS EVO. Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie záujemcovi prostredníctvom komunikačného systému IS EVO oznámi termín zvolený obhliadky. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek nezrovnalostí zistených počas obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, postupuje záujemca v zmysle príslušného bodu týchto súťažných podkladov, na mieste obhliadky nebudú zodpovedané otázky záujemcov (a to z dôvodu dodržania princípu rovnosti zaobchádzania), bude sprístupnené len miesto realizácie predmetu zákazky.

Časť III
PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY

12 VYHOTOVENIE DOKLADOV

Ponuka sa predkladá elektronicky v systéme EVO.

12.1 Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom, aby vo svojej ponuke predložil Štandardný formulár jednotného európskeho dokumentu alebo môže uchádzač použiť elektronickú verziu Jednotného európskeho dokumentu. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk. Verejný obstarávateľ v súvislosti s vyplnením JED dokumentu vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, tzn. umožňuje vyplnenie Globálneho údaju. Aj vzhľadom k tomu, že sa umožňuje predložiť čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO.

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku požadované vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bol postup podlimitnej zákazky vyhlásený a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené v elektronickej podobe ako naskenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

12.3 Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, v súlade s požiadavkami, uvedenými v týchto súťažných podkladoch.

12.4. Uchádzač bude v systéme EVO vkladať ponuku ako celok, t.j. nebude rozdelená na časť „Ostatné „ a časť „Kritéria".

12.5 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady – technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky (http://www.uvo.gov.sk) pre:
- verejného obstarávateľa v Príručke (verzia 1.0, 18.10.2018)
- podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (verzia 1.1, 22.12.2020) a pre
- záujemcu/uchádzača v Príručke (verzia 1.2, 17.09.2019).

13 JAZYK PONUKY

13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v slovenskom) jazyku.

13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, budú vyjadrená v EUR (€).

14.2 Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

14.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú cenu uvedie v zložení:
a. navrhovaná ponuková cena bez DPH,
b. suma DPH,
c. navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.

14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke a v Návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 4 súťažných podkladov).

15 ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY

Nevyžaduje sa.

16 OBSAH PONUKY

16.1 Ponuka bude predložená elektronicky uchádzačom prostredníctvom jednoobálkového systému predkladania ponúk.

16.2. Ponuka bude obsahovať nasledovné doklady:
- **Obsah predložených dokumentov** - Dokumenty zasielané v elektronickej forme v systéme EVO sú evidované na sprievodnom liste, ktorý sa automaticky vytvorí po vložení ponuky do systému.;
- **titulný list ponuky** s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov,
- **vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi"** uvedený v prílohe č. 1týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen,

-doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk Oddiel III. a Súťažných podkladov v časti B.3,

-čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 5týchto súťažných podkladov, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami súťaže uvedenými v častiach B.4 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", B.1 – „Opis predmetu zákazky" a B.2 – „Spôsob určenia ceny" súťažných podkladov. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

-návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti *A.2 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia"* a prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov vrátane podrobnej cenovej ponuky,

- podpísaný návrh zmluvy o dielo

- vyplnený a ocenený výkaz výmer
- zoznam ekvivalentných položiek, ak je relevantné
- zoznam subdodávateľov, ak je relevantné
- indikatívny časový harmonogram prác, záväzný harmonogram prác predloží úspešný uchádzač k Zmluve o dielo.
- Čestné vyhlásenie, či uchádzač vypracoval ponuku sám alebo ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

17 NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY

17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.
PREDKLADANIE PONUKY

18 PREDLOŽENIE DOKLADOV PONUKY

18.1 Ponuka musí byť predložená elektronicky v systéme EVO verzia 18.0. Doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa kapitoly B.3. Podmienky účasti osobné postavenie, musia byť predložené v elektronickej forme ako oskenované originály alebo oskenované overené kópie.

18.2 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

18.3 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy a ručí za záväzky spoločne a nerozdielne.

19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

19.1 Ponuku je potrebné vložiť do systému EVO verzia 18.0. v lehote na predkladanie ponúk.

19.2 Lehota na predkladanie ponúk v elektronickej forme uplynie **namiesto: 04.08.2023 o 10:00 hod. má byť: 08.08.2023 o 10:00 hod.**

19.3 Ak niektorá časť ponuky bude predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, podľa bodu 19.2 - elektronická časť nebude systémom prijatá.

20 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

20.1 Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť svoju ponuku, resp. časť svojej ponuky.

20.2 Pokiaľ chce uchádzač zmeniť svoju ponuku v systéme IS EVO, je potrebné stiahnuť (zmeniť do stavu „pripravovaná") alebo vymazať a vytvoriť novú ponuku.

20.3 Uchádzač môže ponuku/časť ponuky meniť alebo vziať späť do lehoty na predkladanie ponúk.

Časť V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

21 OTVÁRANIE / SPRÍSTUPNENIE PONÚK

21.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
SVT, s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

21.2 Termín otvárania ponúk: **namiesto: 04.08.2023 o 10:30 hod. má byť: 08.08.2023 o 10:30 hod.** a pre uchádzačov, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk je verejné.

21.3 Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na sprístupnení elektronických ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.

21.4 Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční v zmysle § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v zmysle § 52 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk.

22 KOMISIA

22.1 Verejný obstarávateľ zriadi najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk v lehote podľa bodu 21.

23 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

23.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
- 23.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.Uchádzač preukáže osobné postavenie predložením originálnych alebo úradne overených dokladov v zmysle: ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, III.1) PODMIENKY ÚČASTI Výzvy na predkladanie ponúk.

23.2 požadovaných podmienok účasti v súťaži týkajúcich sa:
- 23.2.1 ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladov a dokumentov, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie uvedené v Oddiele III., časť III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie.
- 23.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov a dokumentov, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedené v Oddiele III., časť III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť.

23.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti;
- 23.3.1 podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,
- 23.3.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,

23.3.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.

23.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 23.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov sa bude posudzovať na základe dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 23.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.

23.5 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa výzvy na predkladanie ponúk alebo predloží neplatné doklady alebo nepredloží po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z verejnej súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu.

24 PRESKÚMANIE PONÚK

24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
24.1.1 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.

24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené.

24.3 Uchádzačovi bude písomne prostredníctvom elektronického systému EVO odoslané vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 164 Zákona.

25 VYHODNOTENIE PONÚK

25 .1 Komisia môže písomne prostredníctvom elektronického systému EVO požiadať uchádzačov o vysvetlenie alebo spresnenie predloženej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

25 2. Ak sa pri zadávaní zákazky objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k prácam, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

25.3 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov a bude primerane postupovať v zmysle § 53 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.Komisia vylúči uchádzača zo súťaže v prípade ak,

a)ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,

a)uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa ods. 1 – (Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.) do

1.dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

2.piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,

c)uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 - (Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.),

d)uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
d)uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 ods. 2
f)uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h)uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

25.4 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.

25.5 Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet zákazky uvedených v oznámení a v týchto súťažných podkladoch sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje najmä zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia a zoznam ponúk, ktoré budú komisiou vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení a v týchto súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom vylúčenie ich ponúk s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 Zákona.

25.6 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky v zmysle § 112 ods. 6 – vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

25.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie a ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 53 ods. 9 zákona.

25.8 Využitie subdodávateľov:

25.8.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby

i. uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,

ii. navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

25.8.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ZVO, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa predošlej vety, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

25.8.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.

26 VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH

26.1 V prípade, ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ je pri vyhodnocovaní tejto ponuky povinný určiť, ktorý z viacerých rôznych návrhov v ponuke uchádzača je potrebné kvalifikovať ako rozhodný:

26.1.1 Ak by rôzne návrhy na plnenie toho istého kritéria znamenali rôzne poradie uchádzača vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ je povinný v súlade s princípom nediskriminácie ako rozhodný návrh pri vyhodnocovaní danej ponuky kvalifikovať ten návrh, ktorý je z hľadiska poradia vo verejnom obstarávaní najvýhodnejší pre ostatných uchádzačov. Uchádzač, ktorý svojou nedôslednosťou pri príprave ponuky zapríčinil stav, keď z jeho ponuky vyplývajú viaceré návrhy na plnenie toho istého kritériá, totiž nemôže týmto konaním dosiahnuť pre seba priaznivejšie postavenie oproti uchádzačom, ktorí pri koncipovaní svojej ponuky postupovali dôsledne.

26.1.2 V prípade, že akceptovanie ktoréhokoľvek z viacerých návrhov na plnenie toho istého kritéria v ponuke uchádzača nemá vplyv na poradie uchádzačov, je potrebné za rozhodný považovať ten návrh, ktorý je v zmysle stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk najvýhodnejší pre verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa

26.1.3 Ak sa následne v dôsledku opravy chýb v písaní alebo počítaní zistí, že sa uchádzač pri príprave svojej ponuky dopustil chyby, ktorá má vplyv na hodnotu jeho návrhu na plnenie kritéria, tak vznikne de facto ďalší návrh, odlišný od pôvodného. Ani prípadná matematická

alebo logická správnosť druhého návrhu na plnenie toho istého kritéria však neznamená, že pôvodný návrh uchádzača nebol slobodný a vážny. Aj v takých prípadoch je potrebné postupovať prioritne tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania, na základe čoho je potrebné aplikovať vyššie uvedené pravidlá pre výber rozhodného návrhu na plnenie kritéria, ktorým je ten návrh, ktorý je pre daného uchádzača najmenej výhodný. Takýto postup totiž v súlade s princípom transparentnosti vylučuje, aby sa z viacerých do úvahy pripadajúcich návrhov vybral ako rozhodný ten, ktorý je najvýhodnejší pre uchádzača, a to na úkor iných uchádzačov alebo na úkor verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa.

26.2 Ak vo verejnom obstarávaní dôjde k výberu jedného z viacerých návrhov uchádzača na plnenie toho istého kritéria, verejný obstarávateľ je v súlade s princípom transparentnosti povinný svoj výber zachytiť v zápisnici o vyhodnotení ponúk spolu s odôvodnením použitia jedného z pravidiel uvedených v tomto výkladovom stanovisku

Časť VI.
DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

27 DÔVERNOSŤ PROCESU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

27.1 Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 51 Zákona.

27.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely Zákona o VO možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie je dotknutá povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu pre VO dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia v zmysle Zákona o VO, ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu pre VO zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa Zákona o VO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

27.3 Ponuku uchádzača, ani jej jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

27.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ"), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik"), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ"), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

28 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

28.1 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní.

28.2 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného môže pred uzavretím zmluvy, alebo rámcovej dohody podať námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní. Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi.

Časť VII.
PRIJATIE PONUKY

29 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

29.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne prostredníctvom elektronického systému EVO oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že neuspel/i a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky/ponúk. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 ods. 4.

29.2 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

30 UZAVRETIE ZMLUVY

30.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov alebo v predĺženej lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

30.2 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi na základe Zmluvy o NFP, sa **zhotoviteľ** zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP (aj v nadväznosti na článok 7.2.Zmluvy o NFP) a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

31 PODMIENKY POSKYTNUTIA SÚČINNOSTI K PODPISU ZMLUVY

Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje:

31.1 Zmluva o združení členov združenia podľa § 37 ZVO (ak relevantné)

31.2 Zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje.

31.3 Predloženie zoznamu subdodávateľov podľa bodu 25 týchto súťažných podkladov

31.4 Zloženie zmluvnej zábezpeky / zádržného podľa pokynov uvedených v Zmluve o dielo.

31.5 Predloženie Časového harmonogramu zhotovenia diela (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov), vo forme podrobného grafického a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických noriem. Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác.

31.6 Vyzvaný uchádzač v lehote určenej vo výzve doručí verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu o dielo v príslušnom počte vyhotovení a vyššie uvedené doklady. Návrh zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podkladov je záväzný a nie je možné ho nijako meniť, to neplatí pre úpravy chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení. Vyzvaný uchádzač doplní do zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknuté ceny, ktoré zodpovedajú predloženej ponuke, informácie týkajúce sa subdodávateľov a ostatné požadované informácie.

32 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

32.1 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak

32.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,

32.1.2 nedostal ani jednu ponuku,

32.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,

32.1.4 jeho zrušenie nariadil úrad.

32.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

32.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo pôvodný predmet koncesie.

32.4 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú, či zadávanie zákazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom opätovného uverejnenia.

33 UZATVÁRANIE DODATKOV KU ZMLUVE

33.1 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 18 a tým zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania vtedy, ak:

a) pôvodná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy,

b) ide o doplňujúce tovary, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

d) ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. uplatnenia podmienky podľa písmena a),
2. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona alebo
3. skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa alebo hlavného koncesionára voči jeho subdodávateľom podľa § 41 alebo

e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

33.2 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako

a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
c) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

A.2KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Ponuky sa vyhodnocujú na **základe kritériá najnižšej ceny v EUR bez DPH.**
3. Uchádzač uvedie návrh na plnenia kritéria vo svojej ponuke, v tabuľke podľa **prílohy č. 4 Návrh na plnenie kritéria** k tejto časti súťažných podkladov.

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – **„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"**

Predmetom zákazky je **Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV**

Predmetom zákazky: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV je výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú nadväzovať na tri jestvujúce trialy (detský trail, adva enduro trialy). Na začiatku oboch trialov na parcele C-KN 9645/1 je navrhovaný objekt SO-03 Altánok Skalka s dreveným sedením 2ks, odpadkovými košmi 2ks a ohniskom a lavičkami.
Objekt SO-04 Altánok Hliníky je navrhovaný na parcele C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík, ktorého súčasťou je drevené sedenie 2ks. Odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami. SO-05 Altánok Javor Poľana je navrhovaný na parcele C-KN 929, k.ú. Hnilec, ktorého súčasťou je taktiež drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.
Objekt SO-06 rieši rekonštrukciu bežeckých tratí Gloncingerka a Zelený vrch odvodnenie na parcele C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík aE-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík. Momentálne sú trate bez akéhokoľvek odvodnenie. Voda z okolitého terénu tečie priamo na bežecké trate, pretože ich povrch sa nachádza pod úrovňou priľahlého terénu a následne na ich pláni povrchová voda vytvára erózne ryhy, stojace mláky a podmáča ich pláň a podlažie.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

V prípade, že bude projektová dokumentácia / položka výkazu výmer odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent alebo typ, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu.

V prípade, že uchádzač pri spracovaní ceny predmetu zákazky použije ekvivalentné výrobky a zariadenia, predloží do ponuky aj „Prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení" použitých pri ocenení predmetu zákazky v členení podľa poskytnutého výkazu výmer, oddiel a číslo položky s uvedením ekvivalentnej dodávky. Uvedený prehľad bude tvoriť súčasť ponuky uchádzača. Ak uchádzač tento prehľad nevypracuje alebo niektorú položku do neho nezahrnie, bude verejný obstarávateľ mať za to, že uchádzač ocenil výrobky a zariadenia uvedené v poskytnutom výkaze výmer.

V prípade uvedenia konkrétnych značiek materiálov a výrobkov, pri ktorých sú uvedené minimálne požiadavky, môže uchádzač predložiť aj materiály/výrobky lepších parametrov. Dôkaz o ich vhodnosti musí byť priložený v ponuke. Uchádzač je povinný s ponukou predložiť výrobný list tohto výrobku / materiálu, v ktorom preukáže, že ním navrhovaný ekvivalent spĺňa rovnaké alebo lepšie parametre, ako sú minimálne požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii.

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena bude stanovená v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky. Práce oceniť podľa počtu merných jednotiek a ceny za mernú jednotku, špecifikovaných podľa náročnosti jednotlivých druhov prác.

2. Uchádzač musí oceniť všetky položky uvedené v priloženom výkaze výmer. Každá neocenená položka sa bude považovať za zahrnutú v cene iných položiek a nebude verejným obstarávateľom uhradená. Má sa za to, že zisk a režijné náklady sú rozložené rovnomerne vo všetkých sadzbách a cenách.

3. Jednotkové ceny je potrebné uviesť v eurách na dve desatinné miesta

4. Cena za predmet plnenia predmetu zákazky v návrhu zmluvy musí byť totožná s cenou v ponuke (príloha č. 4 týchto SP).

5. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejnej súťaže. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa týchto SP.

B.3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo
b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uchádzačov

Nevyžaduje sa.

3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov

1. Podľa §34 ods. 1 písm a) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne

svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky / časť, na ktorú uchádzač predkladá ponuku.
Zoznam stavebných prác má obsahovať:
- názov a sídlo objednávateľa,
- kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet predmetu zmluvy,
- doba dodania,
- zmluvná cena bez DPH

4. Ďalšie informácie týkajúce sa predkladania dokladov k preukázaniu splnenia podmienok účasti

4.1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa tejto kapitoly tejto časti súťažných podkladov, musia byť predložené v slovenskom jazyku v origináli alebo overenej fotokópii alebo v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku (ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku) a musia byť predložené v origináli alebo overenej fotokópii.

4.2. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je uchádzač povinný zabezpečiť pre verejného obstarávateľa súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval obchodné tajomstvo, je uchádzač povinný toto označiť.

4.3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa tejto kapitoly bodu 1 tejto časti súťažných podkladov za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

4.4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tejto kapitoly čl. 2 a 3 tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.

4.5. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa tejto kapitoly tejto časti súťažných podkladov musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne štandardov a podmienok účasti požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že doklady a informácie na preukazovanie minimálne požadovanej úrovne štandardov a splnenia podmienok účasti sa týkajú osoby uchádzača.

4.6.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s touto súťažou, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

Príloha č. 1 k SP

Všeobecné informácie o uchádzačovi

Obchodné meno alebo názov uchádzača *úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača*	
Názov skupiny dodávateľov *vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku*	
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača *úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača*	
IČO	
Právna forma	
Zápis uchádzača v Obchodnom registri *označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie*	
Štát *názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený*	
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača	meno a priezvisko
Kontaktné údaje uchádzača *pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže* Meno a priezvisko kontaktnej osoby Telefón E-mail Fax	
Kontaktné údaje zodpovednej osoby Meno a priezvisko kontaktnej osoby Telefón E-mail	

V....., dňa:.....

.....
Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

Príloha č. 2 k SP

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na uskutočnenie predmetu zákazky **„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"** sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:
.....

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V ..... dňa .....
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
.....
meno a priezvisko, funkcia:
podpis

V..... dňa.....
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
.....
meno a priezvisko, funkcia:
podpis

Doplniť podľa počtu členov skupiny dodávateľov

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

Príloha č. 3 k SP

Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):
(Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu))

1....

2. ...

udeľuje/ú plnomocenstvo splnomocnencovi:
(meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov)

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní **„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"**, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V ..... dňa ....
podpis splnomocniteľa

V ..... dňa ....
podpis splnomocniteľa

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Plnomocenstvo prijímam:

V ..... dňa ....
podpis splnomocnenca

Príloha č. 4 k SP

NÁVRH plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk:

„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"

Názov a sídlo uchádzača:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH:

Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH:	
DPH:	
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH:	

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

Podpis .....
(Osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum:

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

Príloha č. 5 k SP

VYHLÁSENIE

1. Vyhlasujeme, že bez výhrady a obmedzenia súhlasíme s platnými podmienkami verejného obstarávania na obstaranie zákazky s názvom ***„Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"*** určenými verejným obstarávateľom, výzvou na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasíme s tým, že obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu obstarávania podľa časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu obstarávania

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

4. Vyhlasujem, že táto cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

5. Vyhlasujem, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislsti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Vyhlasujem, že uchádzač je držiteľom dokladu o oprávnení podnikať a rozsah oprávnenia je minimálne na hlavný predmet zákazky (§ 32 ods. 1 písm. e)).

7. Vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konenčným rozhodnutím v SR, resp. EÚ (§ 32 ods. 1 písm. f)).

8. Vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO – Konflikt záujmov.

V ..... dňa .....

meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača
a pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 8.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v **EUR** **0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	01		
Stavba:	**Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV**		
Miesto:	**Lesy mesta Spišská Nová Ves**	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**0,00**	**0,00**
SO 01	**Cyklistický trail – trasa č. 1**	0,00	0,00
SO 02	**Cyklistický trail – trasa č. 2**	0,00	0,00
SO 03	**Altánok Skalka**	0,00	0,00
SO 03-0	**Altánok**	0,00	0,00
SO 03-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	0,00	0,00
SO 04	**Altánok Hliníky**	0,00	0,00
SO 04-0	**Altánok**	0,00	0,00
SO 04-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	0,00	0,00
SO 05	**Altánok Javor Poľana**	0,00	0,00
SO 05-0	**Altánok**	0,00	0,00
SO 05-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	0,00	0,00
SO 06	**Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie**	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	200,000		0,00
VV			0,1*2*1000		200,000		
VV			Medzisúčet		200,000		
VV			Súčet		200,000		
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	600,000		0,00
VV			2*0,3*1000		600,000		
VV			Medzisúčet		600,000		
VV			Súčet		600,000		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	300,000		0,00
VV			600,000/2		300,000		
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	800,000		0,00
VV			200"ornica		200,000		
VV			600"vykop		600,000		
VV			Medzisúčet		800,000		
VV			Súčet		800,000		
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 600,000		0,00
VV			800*7 'Prepočítané koeficientom množstva		5 600,000		
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	800,000		0,00
VV			200"ornica		200,000		
VV			600"vykop		600,000		
VV			Medzisúčet		800,000		
VV			Súčet		800,000		
K		999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	15,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konštrukcie tesárske				0,00
8	K	762-01	D+M Zápierky	ks	5,000		0,00
9	K	762-02	D+M Dropu	ks	2,000		0,00
10	K	762-03	D+M Skok	ks	3,000		0,00
11	K	762-04	D+M Mostík	ks	4,000		0,00
12	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	100,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	460,000		0,00
VV			0,1*2*2300		460,000		
VV			Medzisúčet		460,000		
VV			Súčet		460,000		
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 380,000		0,00
VV			2*0,3*2300		1 380,000		
VV			Medzisúčet		1 380,000		
VV			Súčet		1 380,000		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	690,000		0,00
VV			1380/2		690,000		
VV			Medzisúčet		690,000		
VV			Súčet		690,000		
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 840,000		0,00
VV			460"ornica		460,000		
VV			1380"vykop		1 380,000		
VV			Medzisúčet		1 840,000		
VV			Súčet		1 840,000		
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 880,000		0,00
VV			1840*7 'Prepočítané koeficientom množstva		12 880,000		
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 840,000		0,00
VV			460"ornica		460,000		
VV			1380"vykop		1 380,000		
VV			Medzisúčet		1 840,000		
VV			Súčet		1 840,000		
8	K	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	18,000		0,00
9	K	999-02	Zhotovenie vlniek	ks	4,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konštrukcie tesárske				0,00
10	K	762-01	D+M Zápierky	ks	12,000		0,00
11	K	762-03	D+M Skok	ks	4,000		0,00
12	K	762-04	D+M Mostík	ks	2,000		0,00
13	K	762-05	D+M Lavice	ks	2,000		0,00
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	230,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Nátery	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226		0,00
VV			0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
VV			Medzisúčet		3,226		
VV			Súčet		3,226		
K		132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,613		0,00
VV			3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226		0,00
VV			3,226		3,226		
VV			Medzisúčet		3,226		
VV			Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582		0,00
VV			3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226		0,00
VV			3,226		3,226		
VV			Medzisúčet		3,226		
VV			Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452		0,00
VV			3,226*2		6,452		
VV			Medzisúčet		6,452		
VV			Súčet		6,452		
D	2		Zakladanie				0,00
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840		0,00
VV			0,8*0,8*1*6		3,840		
VV			Medzisúčet		3,840		
VV			Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072		0,00
VV			(1-0,84)*0,8*4*6		3,072		
VV			Medzisúčet		3,072		
VV			Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072		0,00
D	5		Komunikácie				0,00
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010		0,00
VV			8,3*4,7		39,010		
VV			Medzisúčet		39,010		
VV			Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010		0,00
VV			8,3*4,7		39,010		
VV			Medzisúčet		39,010		
VV			Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010		0,00
VV			8,3*4,7		39,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
13	M	592460008100.SR	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*		*0,00*
	VV		39,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000		0,00
	VV		8,3*2+4,7*2		26,000		
	VV		Medzisúčet		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
15	M	592170001800.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*		*0,00*
	VV		26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340		0,00
	VV		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000		0,00
	VV		2*9		18,000		
	VV		Medzisúčet kliestiny		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet vzpera		12,450		
	VV		Súčet		29,650		
20	M	605120007100.SR	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*		*0,00*
	VV		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	VV		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	VV		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	VV		Medzisúčet vzpera		0,359		
	VV		2*9*0,16*0,08		0,230		
	VV		Medzisúčet kliestiny		0,230		
	VV		Súčet		1,084		
	VV		1,084*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000		0,00
	VV		8,6*10*2		172,000		
	VV		Medzisúčet		172,000		
	VV		Súčet		172,000		
22	M	605140001700.SR	*Laty*	*m3*	*0,454*		*0,00*
	VV		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	VV		Medzisúčet		0,413		
	VV		Súčet		0,413		
	VV		0,413*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646		0,00
	VV		1,192+0,454		1,646		
	VV		Medzisúčet		1,646		
	VV		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000		0,00
	VV		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	VV		Medzisúčet		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310		0,00
	VV		6*2*3,5		42,000		
	VV		Medzisúčet steny		42,000		
	VV		3,14*9		28,260		
	VV		Medzisúčet krokvy		28,260		
	VV		3,65*17		62,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet zadna stena		62,050		
	VV		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490		0,00
	VV		(0,9+1,44)*6		14,040		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet		26,490		
	VV		Súčet		26,490		
27	M	605130001300.S	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*		*0,00*
	VV		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	VV		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	VV		Medzisúčet 250mm		0,893		
	VV		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	VV		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	VV		Medzisúčet 150mm		2,339		
	VV		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	VV		Medzisúčet 120mm		0,158		
	VV		Súčet		3,390		
	VV		3,39*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661		0,00
	VV		3,661		3,661		
	VV		Medzisúčet		3,661		
	VV		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465		0,00
		764	Konštrukcie klampiarske				0,00
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560		0,00
	VV		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008		0,00
	VV		3,14*8,6*2		54,008		
	VV		Medzisúčet		54,008		
	VV		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet		17,200		
	VV		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000		0,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000		0,00
	M	553440000600.S	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*		*0,00*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000		0,00
	VV		9*2		18,000		
38	M	553440004710.S	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*		*0,00*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
40	M	553440004200.S	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
42	M	553440051000.S	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240		0,00
	VV		(1,44+0,9*2)		3,240		
	VV		Medzisúčet		3,240		
	VV		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581		0,00
	D	783	Nátery				0,00
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8,6*2*(0,16*2+0,18*2)		11,696		
	VV		Medzisúčet pomurnica		11,696		
	VV		4,15*3*(0,18*2+0,16*2)		8,466		
	VV		Medzisúčet vzpera		8,466		
	VV		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	VV		Medzisúčet kliestiny		8,640		
	VV		8,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	VV		Medzisúčet laty		34,400		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*4,15)		3,358		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*14,04)		11,125		
	VV		Medzisúčet 250mm		14,483		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*70,62)		33,314		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*62,05)		29,276		
	VV		Medzisúčet 150mm		62,590		
	VV		(2*PI*0,06*0,06+2*PI*0,06*14)		5,300		
	VV		Medzisúčet 120mm		5,300		
	VV		Súčet		145,575		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00
	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v **EUR** **0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090		0,00
	VV		0,3*0,3*0,5*2		0,090		
	VV		Medzisúčet		0,090		
	VV		Súčet		0,090		
	D	2	Zakladanie				0,00
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-	m3	0,036		0,00
	VV		0,3*0,3*0,2*2		0,036		
	VV		Medzisúčet		0,036		
	VV		Súčet		0,036		
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054		0,00
	VV		0,3*0,3*0,3*2		0,054		
	VV		Medzisúčet		0,054		
	VV		Súčet		0,054		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000		0,00
	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	OST	Ostatné				0,00
10	K	OST-1	Prírodné ohnisko	ks	1,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Nátery	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226		0,00
	VV		0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	1,613		0,00
	VV		3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226		0,00
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582		0,00
	VV		3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226		0,00
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452		0,00
	VV		3,226*2		6,452		
	VV		Medzisúčet		6,452		
	VV		Súčet		6,452		
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840		0,00
	VV		0,8*0,8*1*6		3,840		
	VV		Medzisúčet		3,840		
	VV		Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	VV		(1-0,84)*0,8*4*6		3,072		
	VV		Medzisúčet		3,072		
	VV		Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	D	5	Komunikácie				0,00
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010		0,00
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010		0,00
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010		0,00
	VV		8,3*4,7		39,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
13	M	592460008100.SR	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*		*0,00*
	VV		39,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000		0,00
	VV		8,3*2+4,7*2		26,000		
	VV		Medzisúčet		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
15	M	592170001800.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*		*0,00*
	VV		26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340		0,00
	VV		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000		0,00
	VV		2*9		18,000		
	VV		Medzisúčet kliestiny		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet vzpera		12,450		
	VV		Súčet		29,650		
20	M	605120007100.SR	*Hranoly, vid'. PD*	*m3*	*1,192*		*0,00*
	VV		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	VV		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	VV		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	VV		Medzisúčet vzpera		0,359		
	VV		2*9*0,16*0,08		0,230		
	VV		Medzisúčet kliestiny		0,230		
	VV		Súčet		1,084		
	VV		1,084*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000		0,00
	VV		8,6*10*2		172,000		
	VV		Medzisúčet		172,000		
	VV		Súčet		172,000		
22	M	605140001700.SR	*Laty*	*m3*	*0,454*		*0,00*
	VV		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	VV		Medzisúčet		0,413		
	VV		Súčet		0,413		
	VV		0,413*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646		0,00
	VV		1,192+0,454		1,646		
	VV		Medzisúčet		1,646		
	VV		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000		0,00
	VV		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	VV		Medzisúčet		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310		0,00
	VV		6*2*3,5		42,000		
	VV		Medzisúčet steny		42,000		
	VV		3,14*9		28,260		
	VV		Medzisúčet krokvy		28,260		
	VV		3,65*17		62,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet zadna stena		62,050		
	VV		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490		0,00
	VV		(0,9+1,44)*6		14,040		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet		26,490		
	VV		Súčet		26,490		
27	M	0521300001300.S	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*		*0,00*
	VV		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	VV		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	VV		Medzisúčet 250mm		0,893		
	VV		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	VV		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	VV		Medzisúčet 150mm		2,339		
	VV		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	VV		Medzisúčet 120mm		0,158		
	VV		Súčet		3,390		
	VV		3,39*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661		0,00
	VV		3,661		3,661		
	VV		Medzisúčet		3,661		
	VV		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465		0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560		0,00
	VV		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008		0,00
	VV		3,14*8,6*2		54,008		
	VV		Medzisúčet		54,008		
	VV		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet		17,200		
	VV		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000		0,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000		0,00
	M	553440000600.S	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*		*0,00*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000		0,00
	VV		9*2		18,000		
38	M	553440047100.S	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*		*0,00*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
40	M	553440004200.S	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
42	M	553440051000.S	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240		0,00
	VV		(1,44+0,9*2)		3,240		
	VV		Medzisúčet		3,240		
	VV		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581		0,00
	D	783	Nátery				0,00
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8,6*2*(0,16*2+0,18*2)		11,696		
	VV		Medzisúčet pomurnica		11,696		
	VV		4,15*3*(0,18*2+0,16*2)		8,466		
	VV		Medzisúčet vzpera		8,466		
	VV		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	VV		Medzisúčet kliestiny		8,640		
	VV		8,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	VV		Medzisúčet laty		34,400		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*4,15)		3,358		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*14,04)		11,125		
	VV		Medzisúčet 250mm		14,483		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*70,62)		33,314		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*62,05)		29,276		
	VV		Medzisúčet 150mm		62,590		
	VV		(2*PI*0,06*0,06+2*PI*0,06*14)		5,300		
	VV		Medzisúčet 120mm		5,300		
	VV		Súčet		145,575		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00
[illegible]	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090		0,00
	VV		0,3*0,3*0,5*2		0,090		
	VV		Medzisúčet		0,090		
	VV		Súčet		0,090		
	D	2	Zakladanie				0,00
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-	m3	0,036		0,00
	VV		0,3*0,3*0,2*2		0,036		
	VV		Medzisúčet		0,036		
	VV		Súčet		0,036		
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054		0,00
	VV		0,3*0,3*0,3*2		0,054		
	VV		Medzisúčet		0,054		
	VV		Súčet		0,054		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000		0,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	OST	Ostatné				0,00
10	K	OST-1	Ohnisko, viď. PD	ks	1,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
783 - Nátery	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226		0,00
	VV		0,8*0,8*(0,9-0,06)*6		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	1,613		0,00
	VV		3,226/2		1,613		
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226		0,00
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582		0,00
	VV		3,226*7 'Prepočítané koeficientom množstva		22,582		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226		0,00
	VV		3,226		3,226		
	VV		Medzisúčet		3,226		
	VV		Súčet		3,226		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452		0,00
	VV		3,226*2		6,452		
	VV		Medzisúčet		6,452		
	VV		Súčet		6,452		
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840		0,00
	VV		0,8*0,8*1*6		3,840		
	VV		Medzisúčet		3,840		
	VV		Súčet		3,840		
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	VV		(1-0,84)*0,8*4*6		3,072		
	VV		Medzisúčet		3,072		
	VV		Súčet		3,072		
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072		0,00
	D	5	Komunikácie				0,00
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010		0,00
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010		0,00
	VV		8,3*4,7		39,010		
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010		0,00
	VV		8,3*4,7		39,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet		39,010		
	VV		Súčet		39,010		
13	M	592460008100.SR	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*		*0,00*
	VV		39,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000		0,00
	VV		8,3*2+4,7*2		26,000		
	VV		Medzisúčet		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
15	M	592170001800.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*		*0,00*
	VV		26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,260		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340		0,00
	VV		26,000*0,3*0,3		2,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000		0,00
	VV		2*9		18,000		
	VV		Medzisúčet kliestiny		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet pomurnica		17,200		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet vzpera		12,450		
	VV		Súčet		29,650		
20	M	605120007100.SR	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*		*0,00*
	VV		8,6*2*0,16*0,18		0,495		
	VV		Medzisúčet pomurnica		0,495		
	VV		4,15*3*0,18*0,16		0,359		
	VV		Medzisúčet vzpera		0,359		
	VV		2*9*0,16*0,08		0,230		
	VV		Medzisúčet kliestiny		0,230		
	VV		Súčet		1,084		
	VV		1,084*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,192		
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000		0,00
	VV		8,6*10*2		172,000		
	VV		Medzisúčet		172,000		
	VV		Súčet		172,000		
22	M	605140001700.SR	*Laty*	*m3*	*0,454*		*0,00*
	VV		8,6*10*2*0,06*0,04		0,413		
	VV		Medzisúčet		0,413		
	VV		Súčet		0,413		
	VV		0,413*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,454		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646		0,00
	VV		1,192+0,454		1,646		
	VV		Medzisúčet		1,646		
	VV		Súčet		1,646		
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000		0,00
	VV		1*(4*2+2+2+2)		14,000		
	VV		Medzisúčet		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310		0,00
	VV		6*2*3,5		42,000		
	VV		Medzisúčet steny		42,000		
	VV		3,14*9		28,260		
	VV		Medzisúčet krokvy		28,260		
	VV		3,65*17		62,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet zadna stena		62,050		
	VV		Súčet		132,310		
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490		0,00
	VV		(0,9+1,44)*6		14,040		
	VV		4,15*3		12,450		
	VV		Medzisúčet		26,490		
	VV		Súčet		26,490		
27	M	0521300001300.S	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*		*0,00*
	VV		(PI*0,125*0,125*4,15)		0,204		
	VV		(PI*0,125*0,125*14,04)		0,689		
	VV		Medzisúčet 250mm		0,893		
	VV		(PI*0,075*0,075*70,26)		1,242		
	VV		(PI*0,075*0,075*62,05)		1,097		
	VV		Medzisúčet 150mm		2,339		
	VV		(PI*0,06*0,06*14)		0,158		
	VV		Medzisúčet 120mm		0,158		
	VV		Súčet		3,390		
	VV		3,39*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		3,661		
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661		0,00
	VV		3,661		3,661		
	VV		Medzisúčet		3,661		
	VV		Súčet		3,661		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465		0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560		0,00
	VV		3,14*4		12,560		
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008		0,00
	VV		3,14*8,6*2		54,008		
	VV		Medzisúčet		54,008		
	VV		Súčet		54,008		
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200		0,00
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Medzisúčet		17,200		
	VV		Súčet		17,200		
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000		0,00
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000		0,00
	M	553440000600.S	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*		*0,00*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000		0,00
	VV		9*2		18,000		
38	M	553440004710.S	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*		*0,00*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
40	M	553440004200.S	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000		0,00
42	M	553440051000.S	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*		*0,00*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240		0,00
	VV		(1,44+0,9*2)		3,240		
	VV		Medzisúčet		3,240		
	VV		Súčet		3,240		
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581		0,00
	D	783	Nátery				0,00
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8,6*2*(0,16*2+0,18*2)		11,696		
	VV		Medzisúčet pomurnica		11,696		
	VV		4,15*3*(0,18*2+0,16*2)		8,466		
	VV		Medzisúčet vzpera		8,466		
	VV		2*9*(0,16*2+0,08*2)		8,640		
	VV		Medzisúčet kliestiny		8,640		
	VV		8,6*10*2*(0,06*2+0,04*2)		34,400		
	VV		Medzisúčet laty		34,400		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*4,15)		3,358		
	VV		(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*14,04)		11,125		
	VV		Medzisúčet 250mm		14,483		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*70,62)		33,314		
	VV		(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*62,05)		29,276		
	VV		Medzisúčet 150mm		62,590		
	VV		(2*PI*0,06*0,06+2*PI*0,06*14)		5,300		
	VV		Medzisúčet 120mm		5,300		
	VV		Súčet		145,575		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00
	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			0,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**0,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090		0,00
	VV		0,3*0,3*0,5*2		0,090		
	VV		Medzisúčet		0,090		
	VV		Súčet		0,090		
	D	2	Zakladanie				0,00
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-	m3	0,036		0,00
	VV		0,3*0,3*0,2*2		0,036		
	VV		Medzisúčet		0,036		
	VV		Súčet		0,036		
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054		0,00
	VV		0,3*0,3*0,3*2		0,054		
	VV		Medzisúčet		0,054		
	VV		Súčet		0,054		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000		0,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000		0,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	OST	Ostatné				0,00
10	K	OST-1	Ohnisko, viď. PD	ks	1,000		0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
VIA OPTIMA, spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV

Objekt:

SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	VIA OPTIMA,
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
D1 - Práce HSV	0,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
2 - ZÁKLADY	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	0,00
8 - POTRUBNÉ ROZVODY	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00
99 - PRESUNY HMÔT	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV

Objekt:

SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Projektant: VIA OPTIMA,

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	D1	Práce HSV				0,00
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00
1	K	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	m2	475,000		0,00
2	K	112101121	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	47,000		0,00
3	K	112101122	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	9,000		0,00
4	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	47,000		0,00
5	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	9,000		0,00
6	K	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	23,000		0,00
7	K	122301401	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	28,990		0,00
8	K	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	14,495		0,00
9	K	132301101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	67,100		0,00
10	K	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	33,550		0,00
11	K	132301202	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	91,520		0,00
12	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	45,760		0,00
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	28,990		0,00
14	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	65,240		0,00
15	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	529,140		0,00
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	28,990		0,00
17	K	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	28,990		0,00
18	K	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,620		0,00
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	5 368,650		0,00
20	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	742,710		0,00
21	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	850,800		0,00
22	K	122302202	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 100 m3 do 1000 m3 v hornine triedy 4	m3	464,750		0,00
23	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	232,375		0,00
24	K	OD000501	Odstránenie drevenej odrážky vrátane spálenia odpadového dreva	m	1,000		0,00
25	*M*	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z*	*T*	*55,335*		*0,00*
	D	2	ZÁKLADY				0,00
26	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	M2	3 559,450		0,00
27	K	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	1,500		0,00
28	K	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	11,650		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	11,650		0,00
30	*M*	*6936656009*	*Geosyntetika, E'GRID 30/30 geomreža tuhá dvojosá z polypropylénu,š.3.9m x dl.51.3m, P.K.TECHNICKÉ TEXTÍLIE*	*M2*	*1 922,800*		*0,00*
31	*M*	*6936656025*	*PK-TEX PP 25 Geotextília tkaná z polypropylénu 5,2 x 100 m*	*M2*	*1 992,595*		*0,00*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
32	K	388129220	Montáž prefabrikovaného kanálu zo železobetónu tvaru U s hmotnosťou do 2,5 t	kus	60,000		0,00
33	K	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	108,250		0,00
34	K	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	3,000		0,00
35	*M*	*BG020100*	*BG Lesný žľab sv. š. 100 mm, šírka 512 mm, výška 485 mm, dl. 2500 mm (s výstužou)*	*ks*	*60,000*		*0,00*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00
36	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 200 mm	m2	849,950		0,00
37	K	564772111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 250 mm	m2	880,300		0,00
38	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	848,250		0,00
	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	475,750		0,00
40	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	1 212,850		0,00
41	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	3 698,600		0,00
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00
42	K	871420410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 500 mm	m	30,000		0,00
43	K	871470410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 800 mm	m	13,000		0,00
44	*M*	*286161080105*	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 500/6 m*	*KUS*	*6,000*		*0,00*
45	*M*	*286161080107*	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m*	*KUS*	*3,000*		*0,00*
46	*M*	*286161081907*	*PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA*	*KUS*	*1,000*		*0,00*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
47	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	26,660		0,00
	K	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	13,330		0,00
49	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,165		0,00
50	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,465		0,00
51	K	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,165		0,00
52	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	6,000		0,00
53	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	0,165		0,00
54	*M*	*GU000101*	*Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 mm, dl. 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu*	*KS*	*4,000*		*0,00*
	D	99	PRESUNY HMÔT				0,00
55	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	3 559,032		0,00

ZMLUVA O DIELO
číslo: 01/2023
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Názov spoločnosti: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta
Zapísaná: v Obchodnom registri vedenom v Okresný súd Košice pod číslom: 2601/V
Zastúpená: Ing. Ján Novák, Ing. Jozef Perháč
IČO: 31666205
DIČ: 2020503034
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK32 1111 0000 0066 0888 2010
BIC kód banky:
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať vo veciach technických: Ing. Ján Novák, Ing. Jozef Perháč

(ďalej len „objednávateľ"),

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrovaný:
Bankové spojenie:
SWIFT KÓD:
IBAN:
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať:

(ďalej len „zhotoviteľ"),

Čl. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu o dielo na vykonanie diela:
   „Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV"
2. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo na svoje náklady vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
3. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie s názvom: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV, ktorú vypracoval: Ing. Martin Kráľ, Ing. Marián Böhmer, PhD.
4. PD je majetkom objednávateľa, pričom zhotoviteľ potvrdzuje, že PD prevzal od objednávateľa pri podpise tejto zmluvy.
5. Rozsah, technické podmienky a požiadavky na zhotovenie diela sú uvedené v PD, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, ako príloha č. 1 a v predloženej súťažnej ponuke zhotoviteľa, ktorej rozpis je rovnako súčasťou tejto zmluvy, ako príloha č. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej súťažnej ponuky.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že na dotknutých pozemkoch, na ktorých sa dielo realizuje, má právo toto dielo vykonať.
7. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, platnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných

skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zároveň riadne a včas.

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť zmeny v rozsahu realizácie diela (t.j. naviac práce, dodatočné práce atď.), pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnym zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.

Čl. II
ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy v termíne najneskôr do: **6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.**
2. Písomný časový harmonogram realizácie diela, tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo (technologicky funkčné a bez závad) prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom (podľa čl. II. ods.1), zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia odovzdávací a preberací protokol.
6. V prípade odôvodnenej potreby zmeny termínu realizácie diela sa zmluvné strany zaväzujú po vzájomnej písomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu realizácie diela.
7. Termín je splnený úplným dokončením diela, resp. jeho samostatnej časti, teda podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jednotlivých častí diela oboma zmluvnými stranami. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacemu užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých vád a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť.
8. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

Čl. III.
ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v rámci zákazky, ktorá bola predložená zhotoviteľom ako uchádzačom vo verejnom obstarávaní.

Cena	
Cena bez DPH	€
DPH 20%	€
Cena spolu s DPH:	€

Špecifikácia ceny – rozpočet zhotoviteľa podľa súťažnej ponuky je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, ako jej príloha č.2

Cena za dielo uvedená v ods. 1 tohto článku bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľmi po zrealizovaní diela a prevzatí obstarávateľom.

2. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a náležitosti predpísané v zmysle Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:
   - Názov diela
   - Predmet úhrady
   - Číslo ZoD (dodatku k ZoD)
   - Vecný popis vykonaných prác dokladovaný odsúhlasenými súpismi
   - Čiastku k úhrade spolu
   - Splatnosť faktúry
4. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (vecný popis vykonaných prác dokladovaný odsúhlasenými súpismi), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
5. Dodávateľovi (Zhotoviteľ/ Subdodávateľ) sa nebudú poskytovať zálohy.
6. Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie po ukončení ucelenej časti diela na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonávaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so skladbou projektu diela a ponukového rozpočtu. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru vo výške minimálne 30% z ceny diela, 2. Faktúru vo výške minimálne 30% z ceny diela po ukončení ucelenej časti diela a následne vystaví zhotoviteľ faktúru na zostávajúcu časť z celkovej ceny diela. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7. Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
8. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objednávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, v súlade s ods. 8 tohto článku.
9. Cena diela je pevná a počas celej realizácie diela nemenná, s výnimkou ak sa strany dohodnú na jej zmene formou písomného dodatku k tejto zmluve. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (rozpočet) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.
10. V prípade, že nastane situácia podľa ods. 11 tohto článku, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce"). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatky k tejto zmluve budú uzatvorené iba v prípade ak ich uzavretie bude v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať. Uvedená skutočnosť bude oznámená zhotoviteľovi.
12. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa budú vykonané práce vyúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
13. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním príslušnej finančnej čiastky na bankový účet zhotoviteľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
14. Zhotoviteľ/subdodávateľ doručí faktúru na adresu objednávateľa.

Čl. IV.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný:
   - predložiť pri podpise tejto zmluvy objednávateľovi časový harmonogram realizácie diela, podľa ktorého je zhotoviteľ povinný dielo realizovať a ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako jej príloha č. 3. Podstatným porušením tejto zmluvy je omeškanie s realizáciou diela oproti harmonogramu viac než o 5 dní. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu tejto zmluvy, objednávateľ má právo od nej odstúpiť jednostranným právnym úkonom.

- vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v odbornej kvalite, podľa právnych a technických predpisov, vyhlášok a STN platných na území SR, podmienok PD, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrení verejnoprávnych orgánov a inštitúcií,
- použiť materiály vyšpecifikované v PD a súťažnej cenovej ponuke, prípadné zmeny realizovať až po odsúhlasení projektantom,
- zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku, neznečisťovať a nepoškodzovať najbližšie okolie, zelene a porasty; a v prípade že k uvedenému dôjde, je zhotoviteľ povinný uviesť veci do pôvodného stavu,
- viesť riadnu evidenciu stavby formou stavebného denníka, prípadne montážnych denníkov
- viesť evidenciu vzniku a likvidácie odpadov na stavbe,
- umožniť objednávateľovi výkon technického dozoru stavby,
- nenarušiť svojou činnosťou bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte, ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, a zabezpečiť zaistenie staveniska podľa platných predpisov,
- plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi a to o všetkých skutočnostiach ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na dielo, cenu a čas plnenia, vzťahy voči tretím osobám,
- prizvať objednávateľa, a to písomnou formou minimálne 3 dni pred ukončením realizácie diela, ku komplexným skúškam, viesť v spolupráci s ním podrobné technické záznamy o ich priebehu a výsledkoch. Tieto záznamy musia obsahovať všetky údaje potrebné na vyhodnotenie komplexného vyskúšania. O tomto zhodnotení sa vyhotoví zápis, ktorý je súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- dodržiavať platné predpisy bezpečnosti práce v plnom rozsahu. Pred začatím realizácie diela je nutné poučiť o pravidlách bezpečnosti práce všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe, resp. všetky osoby a subdodávateľov zúčastnených na realizácii diela. Uskutočnenie poučenia o bezpečnosti práce musí byť zaznamenané do stavebného denníka, s uvedením dátumu, zúčastnených osôb a osoby alebo organizácie zodpovednej za poučenie.
- písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a/alebo zmenu v osobe subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.

2. Objednávateľ je povinný:
   - zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania realizácie diela a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.

3. Zhotoviteľ a subdodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu/ overovania súvisiaceho splnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/ auditu/ overovania sú najmä:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyššíkontrolnýúradsr,príslušnásprávafinančnejkontroly,Certitikačnýorgánanimipoverenéosoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a)až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

Čl. V.
STAVENISKO

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ako celok, respektíve jeho jednotlivé časti v prípade, že odovzdaniu celku bránia iné okolnosti.
2. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska nie sú prekážkou začatia prác zhotoviteľom a budú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska s termínom ich odstránenia.
3. Objednávateľ zabezpečí a určí prípadné plochy pre skladovanie technologických častí a materiálu súvisiacich s realizáciou diela vo svojich priestoroch.
4. Objednávateľ určí odberné miesta médií, vrátane možnosti ich napojenia. V prípade potreby na výzvu zhotoviteľa je objednávateľ povinný zabezpečiť odstávky týchto médií.
5. Zhotoviteľ zabezpečí dostatočnú ochranu staveniska a realizačných priestorov tak, aby nedošlo k ujme na zdraví tretím osobám, alebo k inej škode.

6. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.
8. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska a odpadov sú súčasťou zmluvnej ceny podľa tejto zmluvy.

Čl. VI.
SPOLUPÔSOBENIE

1. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v potrebnom rozsahu zabezpečí predovšetkým:
   - odovzdanie staveniska pre realizáciu diela,
   - odovzdanie kompletne vypracovanej PD pre realizáciu diela,
   - v prípade nutnosti spoluprácu s verejnoprávnymi orgánmi a inštitúciami.
2. Vyžiadané spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú zmluvné strany, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl.VII
SPLNOMOCNENCI

1. Zhotoviteľa zastupuje/jú: _____
2. Objednávateľa zastupuje pri technickom riešení problémov, zabezpečení spolupôsobenia, ako aj technického dozoru stavby Ing. Ľubomír Snopko.

Čl.VIII
SUBDODÁVATEĽ

- Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
- Subdodávatelia zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a majú oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoré má plniť.
- Objednávateľ umožňuje, že náležité platby za stavebné práce uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý uskutočnil stavebné práce, ak o to subdodávateľ požiada a ak úhrada nebola už poukázaná Zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný bezprostredne po vykonaní úhrady subdodávateľovi túto skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy výslovne súhlasí s týmto ustanovením. Subdodávateľ sa pre účely tohto ustanovenia stáva platobným miestom príslušnej časti ceny diela.
- Spôsob platby subdodávateľovi bude vykonaný spôsobom uvedeným v čl. 3, tejto zmluvy v rozsahu ceny položiek - rozpočtu (prílohy č. 3 zmluvy) za ukončené stavebné práce

Čl. IX
PREBERANIE DIELA

1. S dielom musia byť odovzdané všetky písomnosti, doklady, atesty, skúšky, potvrdenia, ktoré k nemu prináležia, inak dielo nie je kompletné a objednávateľ ho nepreberie.
2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
   - Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
   - Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
   - Doklady o vykonaných funkčných skúškach,
   - Stavebný denník, prípadne montážne denníky,
3. Preberanie a odovzdávanie diela vykonávajú splnomocnenci podľa čl. VII. tejto zmluvy.
4. K odovzdaniu a prevzatiu diela vyzve písomne zhotoviteľ objednávateľa po ukončení diela ako celku a to minimálne 3 dni pred tým, ako je dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

5. O priebehu a výsledkoch preberacieho a odovzdávajúceho konania spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ vyslovene uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením dôvodu. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.

Čl. X.
KVALITA A ZÁRUKY, ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a garantuje, že dielo túto kvalitu bude mať v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas celej záručnej doby, t.j. predmet plnenia bude spôsobilý na dohodnutý účel.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.
3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela voči PD a požiadavkám objednávateľa
4. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti PD a požiadavkám objednávateľa, ktorá nebráni funkčnej technologickej prevádzke diela.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania a ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
6. V prípade vady diela je zhotoviteľ povinný túto vadu na vlastné náklady odstrániť najneskôr do 48 hodín od jej nahlásenia. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne písomne upozornili objednávateľa a ten na ich použití trval.
7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou.
8. Ak objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi reklamáciu na vady diela po jeho odovzdaní, zástupca zhotoviteľa sa bezodkladne zúčastní na prehliadke objednávateľom reklamovaných vád, najneskôr však do 12 hodín od oznámenia vady diela. Termín odstránenia vady sa určí v deň prehliadky reklamovaných vád a dohodne sa písomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú je zhotoviteľ povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu. V prípadne, že zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu zistených vád v uvedenom termíne, môže objednávateľ vykonať opravu na vlastné náklady a je oprávnený si výšku týchto nákladov uplatniť u zhotoviteľa.
9. V prípade, že bude možné vady odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia vady má v každom jednotlivom prípade objednávateľ.
10. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

Čl. XI.
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

1. Objednávateľ má v prípade zhotoviteľom nedodržaného termínu odovzdania diela uvedeného v čl. II. ods.1, právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 5000 €.
2. Zhotoviteľ má v prípade objednávateľom nedodržaného termínu splatnosti faktúry vystavenej v zmysle čl. III., právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. XII.
VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť (t. j. vojna, živelná pohroma,...).
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia vyššej moci, resp. jej účinkom dôjde ku škode na predmete plnenia tejto zmluvy, požiada jedna zo zmluvných strán druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Čl. XIII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a tiež v prípade, keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
   - 3.1 ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,
   - 3.2 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v čl. II. „ČAS PLNENIA" tejto zmluvy,
   - 3.3 ak zhotoviteľ bude vykonávať práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
   - 3.4 porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu,
   - 3.5 neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
   - 3.6 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane neodstráni poruchy a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,
   - 3.7 vadné plnenie zhotoviteľa,
   - 3.8 podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy .
4. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie.
6. V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a iná adresa nie je zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy" alebo „nezastihnutý" za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.

Čl. XIV.
OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Zhotovitelia a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepostúpia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení premetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzujú sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitelia sa budú riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu objednávateľa. - chceš tieto ustanovenia?
5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, majetku Mesta Spišská Nová Ves alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
7. Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne, alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takého práce a použitý materiál nebudú zhotoviteľovi objednávateľom uhradené.

Čl. XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, v troch vyhotoveniach pre objednávateľa a v jednom vyhotovení pre zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať druhú stranu o všetkých náležitostiach týkajúcich sa tejto zmluvy, ktoré by mohli ohroziť plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomnosti" budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú v súlade s čl. XII. ods. 6 tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je uzavretá v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto Zmluva nemôže nadobudnúť platnosť a účinnosť skôr ako dôjde k ukončeniu verejného obstarávania na dielo spôsobom vybratia víťazného návrhu.
5. Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
6. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpísali.
8. Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 : Rozpočet
Príloha č. 3: rozpočet pre subdodávateľa + zoznam subdodávateľov ak sa uplatňuje

V Spišskej Novej Vsi dňa:		V dňa:
Ing. Ján Novák riaditeľ Lesy mesta Spišská Nová Ves	**Ing. Jozef Perháč** konateľ Lesy mesta Spišská Nová Ves	xxxx xxxx konateľ spoločnosti

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

A - Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík
C-KN 929, k.ú. Hnilec
C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík
E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
VIA OPTIMA, spol. s r.o., 960 01 Zvolen, ul. Jedľová 1364/1
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ, Ing. Marián Böhmer, PhD.
www.architekti-kosice.sk

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Projekt rieši výstavbu a obnovu občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu.

Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trailov SO-01 Cyklistický trail – trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail – trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na percele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú nadväzovať na tri jestvujúce traily (detský trail, a dva enduro traily).

Na začiatku oboch trailov na percele C-KN 9645/1 je navrhovaný objekt SO-03 - Altánok Skalka s dreveným sedením 2ks, odpadkovými košmi 2ks a ohniskom s lavičkami.

Objekt SO-04 - Altánok Hliníky je navrhovaný na percele C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík, ktorého súčasťou je drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.

SO-05 - Altánok Javor Poľana je navrhovaný na percele C-KN 929, k.ú. Hnilec, ktorého súčasťou je taktiež drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.

Objekt SO-06 rieši rekonštrukciu bežeckých tratí Gloncingerka a Zelený vrch - odvodnenie na parcele C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík a E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík. Momentálne sú trate bez akéhokoľvek odvodnenia. Voda z okolitého terénu tečie priamo na bežecké trate, pretože ich povrch sa nachádza pod úrovňou priľahlého terénu a následne na ich pláni povrchová voda vytvára erózne ryhy, stojace mláky a podmáča ich pláň

a podložie. K podmáčaniu pláne a podložia intenzívnejšie dochádza v miestach kríženia sezónnych drobných vodných tokov. V podmáčaných úsekoch trás lyžiarskych bežeckých tratí je únosnosť pláne znížená do takej miery, že ani počas snehovej pokrývky ich nie je možné udržiavať pásovou technikou. Uvedené nedostatky odvodnenia a únosnosti lyžiarskych bežeckých tratí sa stavebník rozhodol koncepčne riešiť ich rekonštrukciou zahŕňajúcou ich spevnenie, vybudovanie pozdĺžneho a priečneho odvodnenia a v miestach kríženia drobných vodných tokov aj vybudovanie rúrových priepustov.

3. Prehľad východiskových podkladov:

- zámer investora
- katastrálna mapa
- štúdia riešenia
- konzultácie s orgánmi štátnej správy a samosprávy

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

Predmetom tohto projektu sú tieto stavebné objekty:

SO-01. Cyklistický trail – trasa č. 1
SO-02. Cyklistický trail – trasa č. 2
SO-03. Altánok Skalka
    03.1. Lavičky, odpadkové koše a ohnisko
SO-04. Altánok Hliníky
    04.1. Lavičky, odpadkové koše a ohnisko
SO-05. Altánok Javor Poľana
    05.1. Lavičky, odpadkové koše a ohnisko
SO-06. SO 06 – Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH – odvodnenie

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície:

Pre realizáciu zámeru nie sú žiadne požiadavky na súvisiace investície.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov:

Prevádzkovateľom stavby bude investor fy Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

7. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby:

zahájenie: 03/2023
ukončenie: 03/2024
lehota výstavby: 12 mesiacov

8. Predpokladané investičné náklady stavby:

313 718,83 - € bez DPH

Košice 09/2022 vypracoval: Ing.Martin Kráľ

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
(Dokumentácia pre ohlásenie stavby)

B - Súhrnná technická správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík
C-KN 929, k.ú. Hnilec
C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík
E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
VIA OPTIMA, spol. s r.o., 960 01 Zvolen, ul. Jedľová 1364/1
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ, Ing. Marián Böhmer, PhD.
www.architekti-kosice.sk

2. Charakteristika územia:

2.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska:

Projekt rieši výstavbu a obnovu občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, na pozemkoch C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík a na percele C-KN 929, k.ú. Hnilec. Objekt SO-06 na parc. C-KN 1133, 1339, 1341 a E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík

2.2. Použité mapové a geodetické podklady:

- katastrálna mapa
- lesnícka porastová mapá v mierke 1 : 10 000

2.3. Príprava pre výstavbu:

Príprava pre výstavbu bude pozostávať z odstránenia popadaných stromov a z HTÚ (hrubé terénne úpravy) - skrývky ornice. Počas prípravných prác a prác pri realizácii jednotlivých objektov je potrebné dodržiavať bezpečnosť práce.

3. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby:

3.1. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby:

Urbanistické riešenie vychádza z väzieb na jestvujúcu infraštruktúru a majetkoprávne danosti lokality. Objekty sú napojené na jestvujúce lesné komunikácie. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trailov SO-01 Cyklistický trail – trasa č. 1(celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail – trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) , ktoré budú nadväzovať na tri jestvujúce traily (detský trail, a dva enduro traily). Na začiatku oboch trailov je navrhovaný objekt SO-03 - Altánok Skalka s dreveným sedením 2ks, odpadkovými košmi 2ks a ohniskom s lavičkami. Objekt SO-04 - Altánok Hliníky je navrhovaný v k.ú. Hnilčík, ktorého súčasťou je drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami. Objekt SO-05 - Altánok Javor Poľana je navrhovaný v k.ú. Hnilec, ktorého súčasťou je taktiež drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a ohnisko s lavičkami.

Architektonické riešenie je založené na použití prírodných prvkov (drevo, kameň) s uplatnením vhodného merítka stavebných objektov s akcentom na uplatnenie prírodných daností.

Objekt SO-06 rieši rekonštrukciu bežeckých tratí Gloncingerka a Zelený vrch -odvodnenie na parcele C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík a E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík. Momentálne sú trate bez akéhokoľvek odvodnenia. Voda z okolitého terénu tečie priamo na bežecké trate, pretože ich povrch sa nachádza pod úrovňou priľahlého terénu a následne na ich pláni povrchová voda vytvára erózne ryhy, stojace mláky a podmáča ich pláň a podložie. K podmáčaniu pláne a podložia intenzívnejšie dochádza v miestach kríženia sezónnych drobných vodných tokov. V podmáčaných úsekoch trás lyžiarskych bežeckých tratí je únosnosť pláne znížená do takej miery, že ani počas snehovej pokrývky ich nie je možné udržiavať pásovou technikou. Uvedené nedostatky odvodnenia a únosnosti lyžiarskych bežeckých tratí sa stavebník rozhodol koncepčne riešiť ich rekonštrukciou zahŕňajúcou ich spevnenie, vybudovanie pozdĺžneho a priečneho odvodnenia a v miestach kríženia drobných vodných tokov aj vybudovanie rúrových priepustov.

3.3. Starostlivosť o životné prostredie:

Realizácia zámeru bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, primárne vyčistením zanedbaného priestoru a sekundárne vytvorením priestoru pre oddych a športové vyžitie obyvateľstva. Prevádzka realizácie zámeru nebude produkovať odpadové látky zaťažujúce ovzdušie prípadne podzemné vody. Komunálny odpad bude sústreďovaný a vyvážaný v rámci zberu. Objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dažďové vody budú zvedené do podmoku na pozemku investora. Objekt SO-06 Rekonštrukcia lyžiarskych bežeckých tratí sa bude realizovať v území s prvým, všeobecným, stupňom ochrany prírody v zmysle zákona 543/2002 Z.z. a možno ju charakterizovať ako šetrnú k okolitému prostrediu, jej realizáciou sa zamedzí erózii, ktorá v súčasnosti na tratiach prebieha. Prevádzkovaním lyžiarskych bežeckých tratí nedôjde k negatívnym vplyvom na okolie.

V zmysle vyhl. 365/2015 Zz. budú počas výstavby vznikať nasledujúce odpady:

170107 zmesi betónu, tehál, škridle	0
170201 drevo	0
170405 železo, oceľ	0
170203 Plasty (zo zrezaných koncov priepustov)	0
170506 výkopová zemina	0
030301 Odpad z dreva (pne, korene, krovie)	0

3.4. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke:

Pri realizácii stavebných objektov budú realizované jednoduché stavby. Pri realizácii je potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci, vybavenie pracovníkov bezpečnostnými prostriedkami, zabezpečiť odborný dozor pri realizácii a dodržiavať predpisy BOZP.

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle:
- vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonníka práce,
- zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- stavebného zákona č. 237/2000 Z.z.,
- zákona č. 222/1996 o organizovaní miestnej a štátnej správy,
-STN 73 30 50 – Zemné práce.

Pred začatím stavebných prác je potrebné overiť a presne vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami, a to i siete nezakreslené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. Počas realizácie sa musia rešpektovať vyjadrenia správcov sietí a jednotlivé siete sa musia ochrániť v zmysle týchto vyjadrení. Prípadné výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Prípadné preložky inžinierskych sietí je možné vykonávať iba so súhlasom ich správcu v dohodnutých termínoch a to osobami, resp. organizáciami na to oprávnenými (STN 73 6005).

3.5. Ochranné pásma:

Pri realizácii stavebných objektov nebudú dotknuté ochranné pásma.

4. Popis stavebných objektov:

4.1. SO-01. Cyklistický trail – trasa č. 1

Objekt SO-01 Cyklistický trail – trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) je riešený na percele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves. Jedná sa o stredne náročný až ťažký trail.

Terén, v ktorom sa nachádza červený trail je strmší a členitejší, čo je ideálne pre ťažší a technickejší trail určený pre skúsených cyklistov. Využité bude pri ňom čo najviac prírodných prekážok, ako sú koreňové a kamenisté pasáže, skaly a iné. Zároveň je navrhnutýhc niekoľko umelo vytvorených prekážok ako sú dropy 2ks alebo skoky 3ks, zápierky 5ks v príliš odklopených úsekoch, klopené zákruty 15ks a mostíky 4ks.

4.2. SO-02. Cyklistický trail – trasa č. 2

SO-02 Cyklistický trail – trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) je riešený na percele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves.

Trail (fialový) sa nachádza v menej strmom teréne, ktorý poskytuje ideálne podmienky na stavbu ľahšieho enduro trailu ideálny pre začiatočníkov. Využité budú pri ňom technicky menej náročné úseky. Čo sa týka prekážok, na tomto traile sú navrhnuté hlavne klopené zákruty 18ks , niekoľko menších skokov 4ks, zápierky 12ks, lavice 2ks, vlny 4ks a mostíky 2ks.

Príklady umelo vytvorených prekážok a technických prvkov:

1. Lavica



Technický prvok zložený z odpalu a dopadu. Cieľom cyklistu je odraziť sa od odpalu a dopadnúť do dopadu. Priestor medzi odpalom a dopadom je vyplnený ideálne hlinou, prípadne dreveným mostíkom aby pomalší cyklisti vedeli po prekážke pohodlne prejsť aj bez toho aby vyskočili

2. Klopená zákruta



Hlinený násyp v zákrute, ktorý umožňuje prejsť zákrutou pri zachovaní čo najväčšej rýchlosti. Klopené zákruty na flow trailoch sú zvyčajne omnoho vyššie a širšie ako na bežných singletrailoch.

3. Vlny



Súbor viacerých, rovnako veľkých vĺn nasledujúcich po sebe, ktoré sa cyklista snaží prepumpovať, prípadne skočiť z jednej do druhej.

4. Drop




5. Skok / Roadgap





6. Zápierka



7. Mostík



4.3. SO-03. Altánok Skalka:

Stavebný objekt rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.

Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru Ø 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu Ø120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.

Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.

Kotvenie nosných stĺpov Ø 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť zo zrubov bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

zastavaná plocha objektu: 24,94m²
obostavaný priestor: 104,3m³

4.4. SO-04 Altánok Hliníky:

Stavebný objekt rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.

Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru Ø 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu Ø120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.

Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.

Kotvenie nosných stĺpov Ø 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť zo zrubov bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

zastavaná plocha objektu: 24,94m²
obostavaný priestor: 104,3m³

4.5. SO-05 Altánok Javor Poľana:

Stavebný objekt rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.

Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru Ø 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu Ø120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.

Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.

Kotvenie nosných stĺpov Ø 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť zo zrubov bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

zastavaná plocha objektu: 24,94m²
obostavaný priestor: 104,3m³


4.6. SO-06 Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH – odvodnenie:

Objekt rieši rekonštrukciu bežeckých tratí Gloncingerka a Zelený vrch -odvodnenie na parcele C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík a E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík.

Trasa bežeckej trate Glocingerka – Borovniak sa začiatkom napája na jestvujúcu čiastočne spevnenú lesnú odvoznú cestu triedy 2L v JPRL 435, trasa pokračuje smerom na severovýchod cez JPRL 434, 433, 425, 428 a 424, kde za križením potoka Borovniak končí. Dĺžka trasy je 1 203 m. Trasa bežeckej trate Glocingerka – Hliníky sa ľavostranným výjazdom napája na trasu Glocingerka – Borovniak v staničení km 0,420, trasa pokračuje smerom na západ cez JPRL 406, 409 a 407, kde napojením na trvalú približovaciu lesnú cestu končí. Dĺžka trasy je 534 m, spevnenie a odvodnenie sa navrhuje v len úsekoch km 0,116 – 0,193; km 0,216 – 0,272 a km 0,432 – 0,502 (dĺ. 173 m). Trasa bežeckej trate Glocingerka – Prepojka sa začiatkom napája na rovnakú jestvujúcu čiastočne spevnenú lesnú odvoznú cestu triedy 2L ako trasa Glocingerka – Borovniak v JPRL 440, trasa vedie smerom na juhozápad a koncom sa napája taktiež na trvalú približovaciu lesnú cestu. Dĺžka trasy je 101 m. Trasa bežeckej trate Zelený vrch sa začiatkom napája na trvalú približovaciu lesnú cestu na rozhraní lúky a lesného porastu v lokalite Žliabky a vedie smerom na sever cez JPRL 444 a 445. Dĺžka trasy je 239 m.

Dĺžka tratí: Glocingerka – Borovniak 1 203 m Glocingerka – Hliníky 534 m z toho upravované: 173 m Glocingerka – Prepojka 101 m Zelený vrch 239 m Spolu: 2077 m z toho upravované: 1716 m
Šírka tratí: 2,50 – 10,00 m
Povrch tratí: spevnenie z kameniva
Odvodnenie cesty: zemné priekopy, prefabrikované odrážky – 30 ks
Objekty: rúrové priepusty – 7 ks

Košice 09/2022 vypracoval: Ing.Martin Kráľ

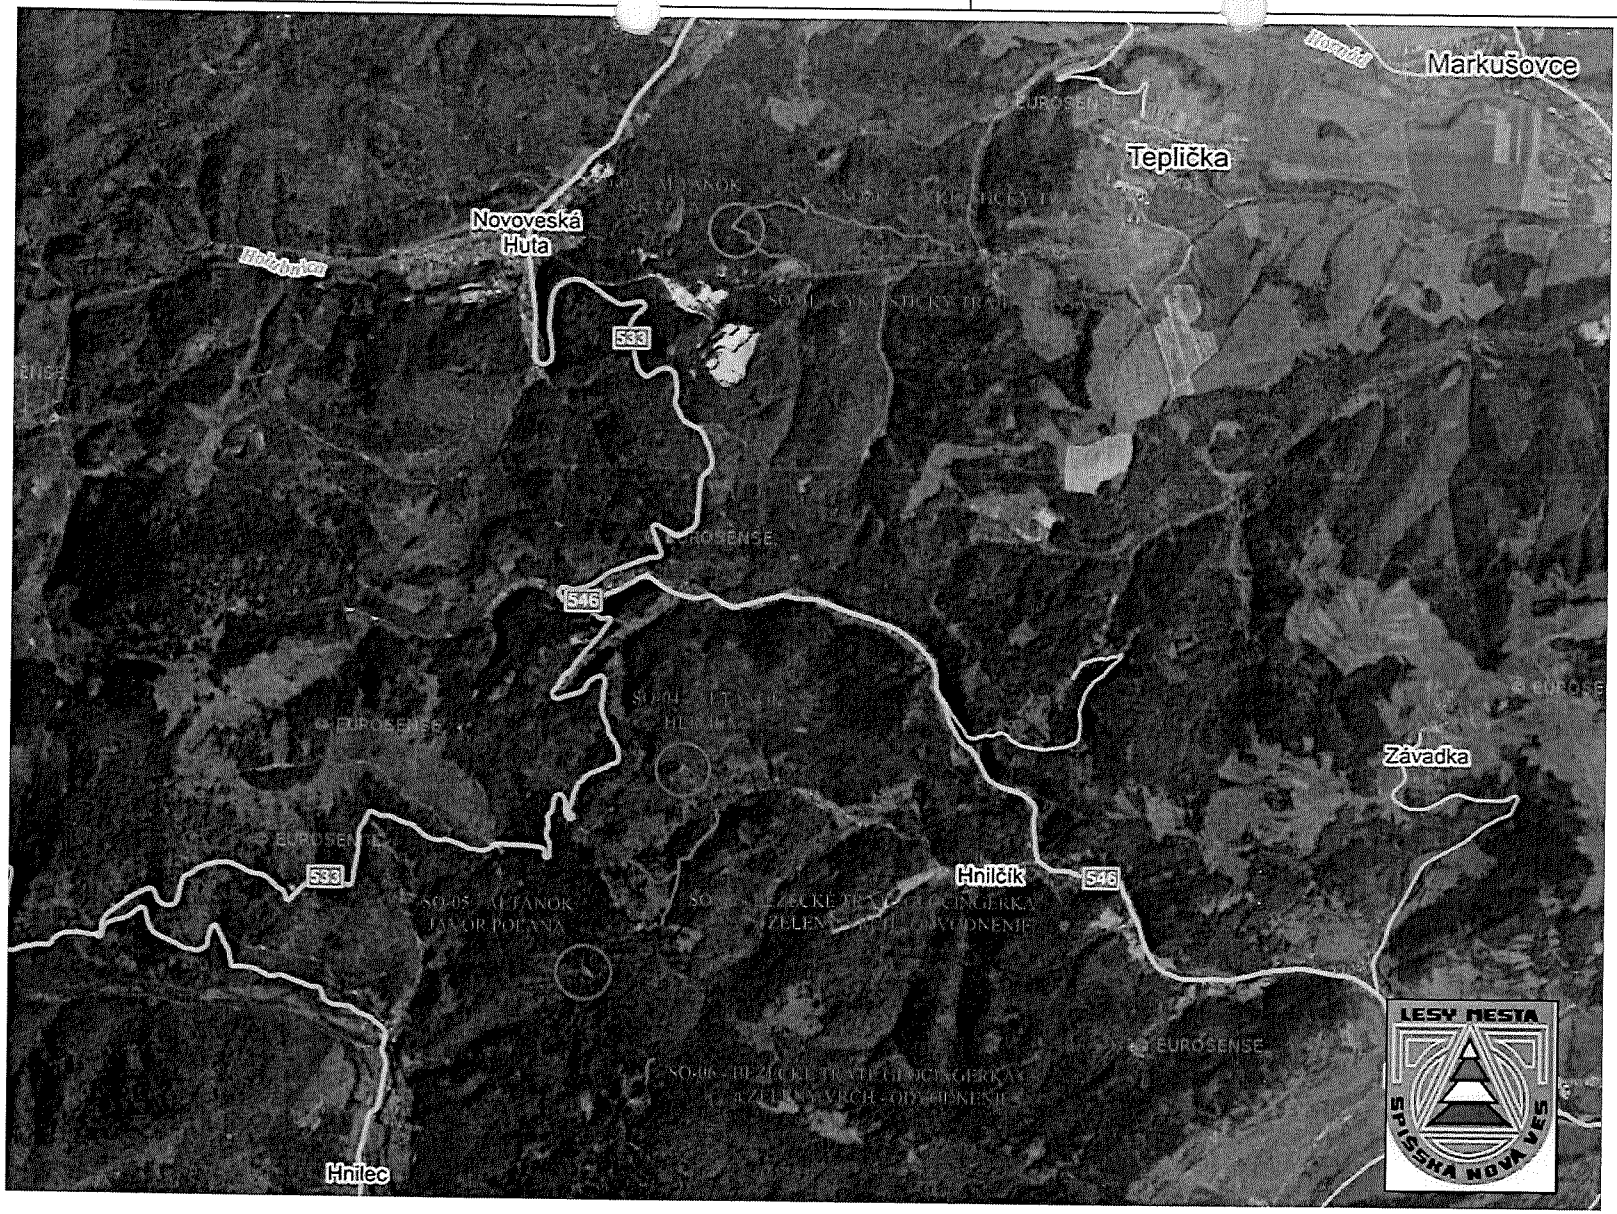

OBJEKTOVÁ SÚSTAVA:

SO-01 - CYKLISTICKÝ TRAIL - TRASA č.1 (C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves)
SO-02 - CYKLISTICKÝ TRAIL - TRASA č.2 (C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves)
SO-03 - ALTÁNOK - SKALKA (C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves)
SO-04 - ALTÁNOK - HLINÍKY (E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík)
SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA (C-KN 929, k.ú. Hnilec)
SO-06 - BEŽECKÉ TRATE GLONCINGERKA a ZELENÝ VRCH - ODVODNENIE
(C-KN 1133, 1339, 1341 a E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík)

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

miesto stavby
Lesy mesta Spišská Nová Ves
C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík
C-KN 929, k.ú. Hnilec
C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík
E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

projektant

MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182, Liptovský Ján 032 03

VIA OPTIMA, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, ul. Jedľová 1364/1

vypracoval
Ing. Martin Kráľ
Ing. Marián Böhmer, PhD.

dátum: 09/2022

obsah výkresu:
SITUÁCIA - CELKOVÁ OBJEKTOVÁ SÚSTAVA


mierka:	1 : 40 000
č. výkresu: D	formát: 2xA4

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV (Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík
C-KN 929, k.ú. Hnilec
C-KN 1133, 1339, 1341 k.ú. Hnilčík
E-KN 3-8647/1, 3-8648, 3-8654 k.ú. Hnilčík
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
VIA OPTIMA, spol. s r.o., 960 01 Zvolen, ul. Jedľová 1364/1
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ, Ing. Marián Böhmer, PhD.


www.architekti-kosice.sk

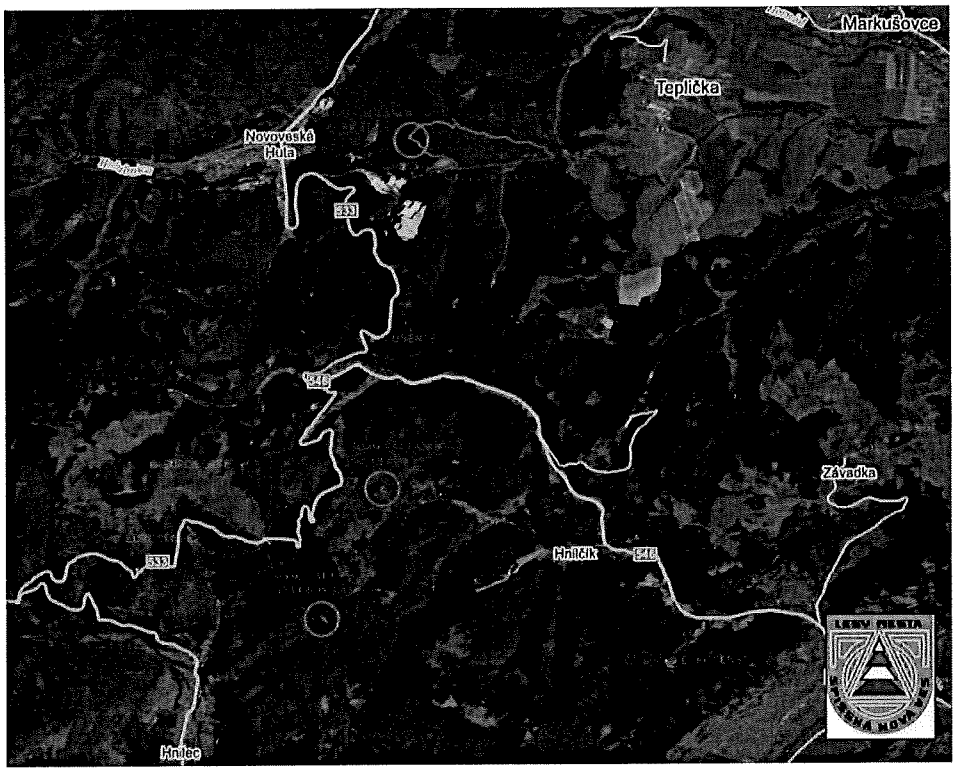

OBSAH:

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C. Projektové energetické posúdenie
D. Situácia celková – Objektová sústava
1. SO-01 - Cyklistický trail – trasa č. 1
2. SO-02 - Cyklistický trail – trasa č. 2
3. SO-03 - Altánok Skalka
4. SO-04 - Altánok Hliníky
5. SO-05 - Altánok Javor Poľana
6. SO-06 – Bežecké trate Gloncingerka a Zelený vrch - odvodnenie
E. Rozpočet, Výkaz výmer



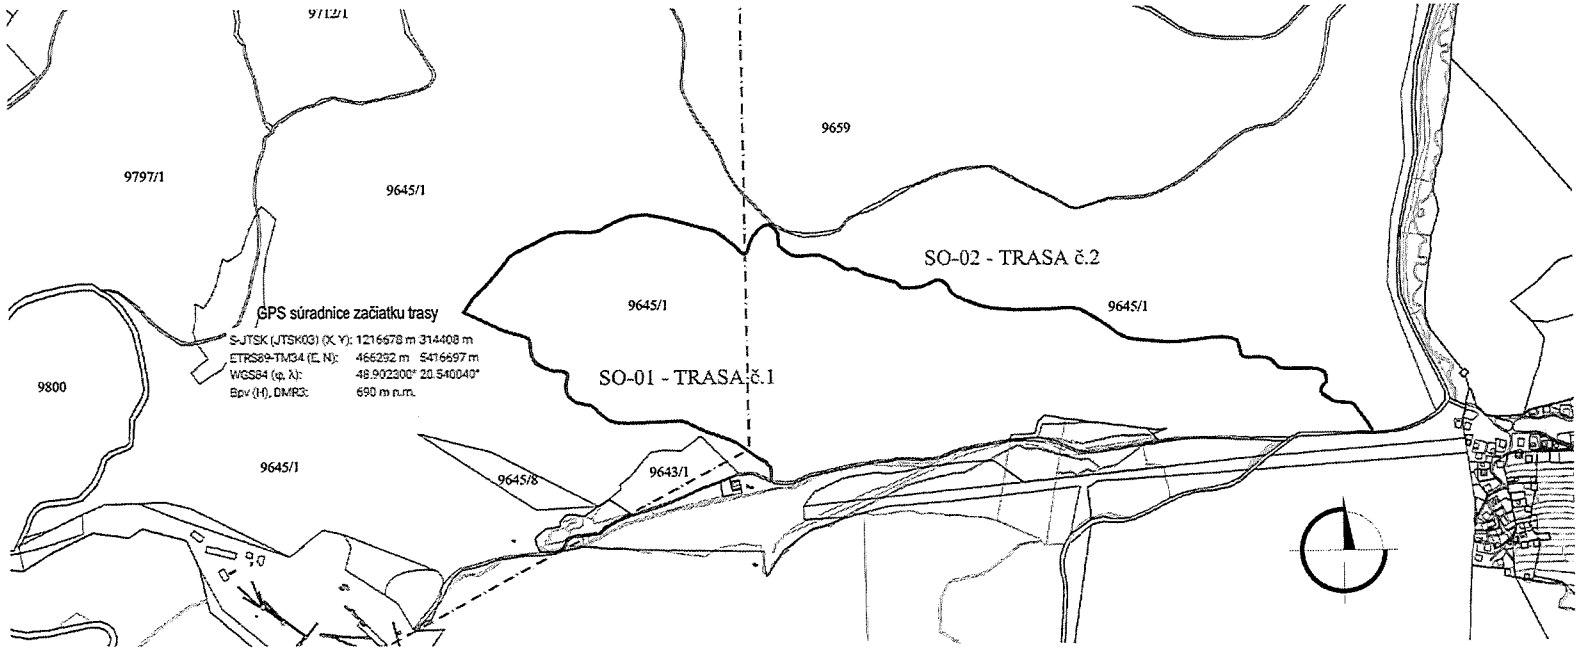

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-01 - CYKLISTICKÝ TRAIL TRASA č.1

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk

zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

SITUÁCIA
ŠIRŠIE VZŤAHY, KAT. MAPA

mierka:	**1 : 10 000**
č. výkresu: **1**	formát: **2xA4**


DROP.....2ks



SKOK.....3ks



ZÁPIERKA.....5ks




KLOPENÁ ZÁKRUTA.....15ks



MOSTÍK.....4ks



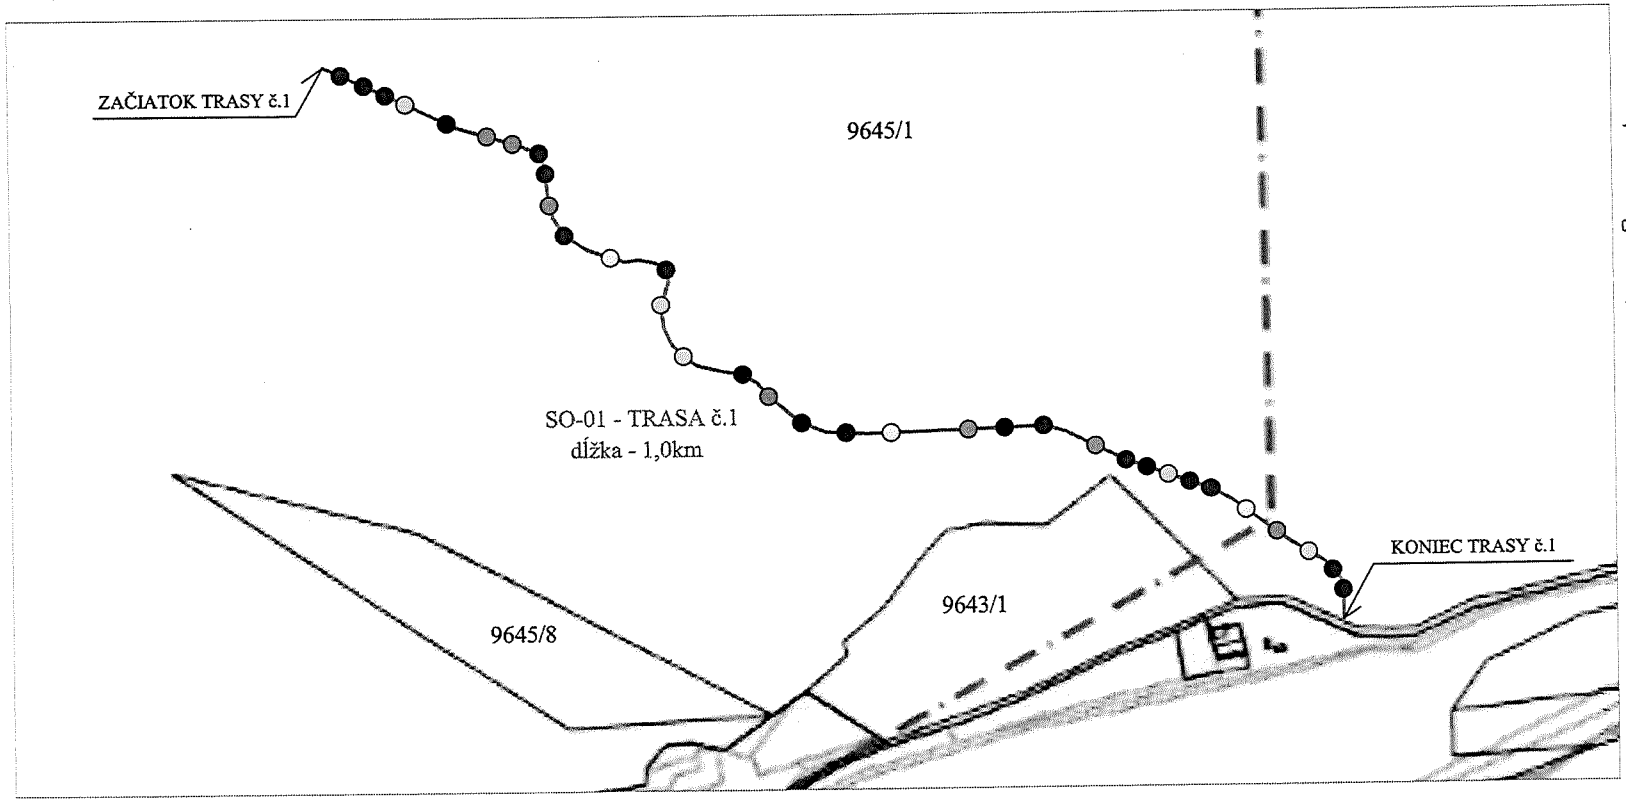

PREKÁŽKY A TECHNICKÉ PRVKY:

DROP.....2ks
SKOK.....3ks
ZÁPIERKA.....5ks
KLOPENÁ ZÁKRUTA.....15ks
MOSTÍK.....4ks

POZNÁMKA:
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ PRESNÉ TRASOVANIE TRAILU
- UMIESTNENIE PREKÁŽOK A TECHNICKÝCH PRVKOV JE LEN ORIENTAČNÉ - PRESNÁ POLOHA BUDE URČENÁ PO VYTÝČENÍ TRASY

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-01 - CYKLISTICKÝ TRAIL TRASA č.1

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk

zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

SITUÁCIA
KOORDINAČNÝ VÝKRES

mierka:	1 : 3 000
č. výkresu: 2	formát: 2xA4

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065


Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-01 – CYKLISTICKÝ TRAIL - TRASA č.1

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ

www.architekti-kosice.sk

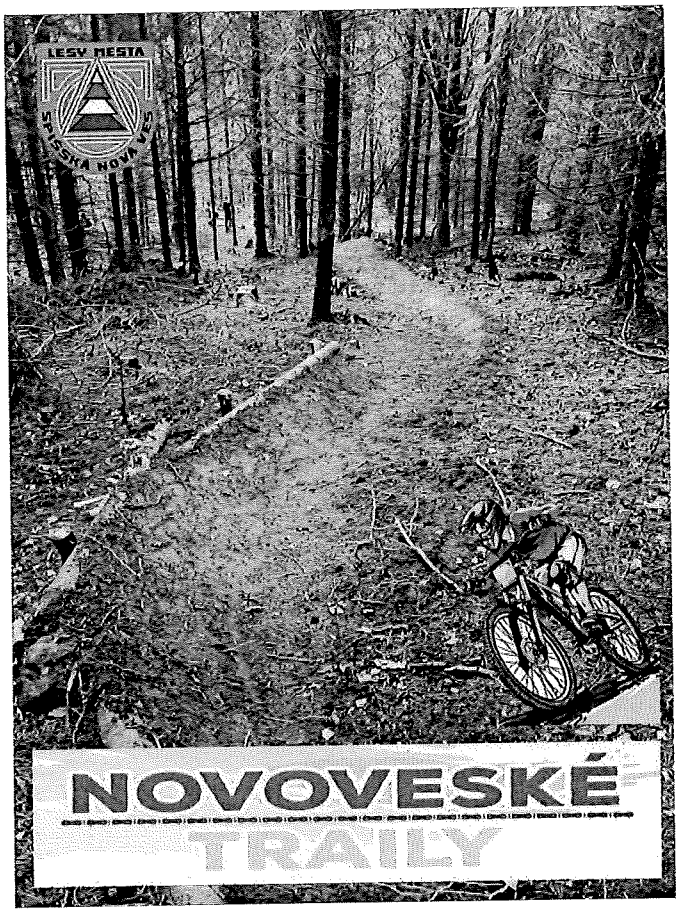

OBSAH:

Technická správa
1. Situácia širšie vzťahy, kat. mapa M=1:10 000
2. Situácia koordinačný výkres M=1:3 000

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-01 – CYKLISTICKÝ TRAIL - TRASA č.1

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Technická správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ
www.architekti-kosice.sk

2. Základné údaje:

Projekt rieši výstavbu občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu.

Objekt SO-01 Cyklistický trail – trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) je riešený na percele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves. Jedná sa o stredne náročný až ťažký trail.
Terén, v ktorom sa nachádza červený trail je strmší a členitejší, čo je ideálne pre ťažší a technickejší trail určený pre skúsených cyklistov. Využité bude pri ňom čo najviac prírodných prekážok, ako sú koreňové a kamenisté pasáže, skaly a iné. Zároveň je navrhnutýhc niekoľko umelo vytvorených prekážok ako sú dropy 2ks alebo skoky 3ks, zápierky 5ks v príliš odklopených úsekoch, klopené zákruty 15ks a mostíky 4ks.

3. Konštrukčné riešenie:

Trasovanie trailu je vyznačené na výkrese č.1 a 2 v celkovej dĺžke 1000m a šírke š=1,50 - 2,00m.

Konštrukcia trialu bude pozostávať z upraveného a zhutneného rastlého terénu, ktorá bude doplnená o prírodné prekážky, ako sú koreňové a kamenisté pasáže, skaly a iné. Umelo vytvorené prekážky budú tvorené z drevených profilov, štrkových a kamenných násypov. Lavice, mostíky, dropy a skoky budú opatrené pletivom proti pošmyknutiu.

Trail je vedený orientačne a bude dotvorený priamo v teréne .

4. Príklady umelo vytvorených prekážok a technických prvkov:

1. Lavica



Technický prvok zložený z odpalu a dopadu. Cieľom cyklistu je odraziť sa od odpalu a dopadnúť do dopadu. Priestor medzi odpalom a dopadom je vyplnený ideálne hlinou, prípadne dreveným mostíkom aby pomalší cyklisti vedeli po prekážke pohodlne prejsť aj bez toho aby vyskočili

2. Klopená zákruta



Hlinený násyp v zákrute, ktorý umožňuje prejsť zákrutou pri zachovaní čo najväčšej rýchlosti. Klopené zákruty na flow trailoch sú zvyčajne omnoho vyššie a širšie ako na bežných singletrailoch.

3. Vlny




Súbor viacerých, rovnako veľkých vĺn nasledujúcich po sebe, ktoré sa cyklista snaží prepumpovať, prípadne skočiť z jednej do druhej.

4. Drop




5. Skok / Roadgap





6. Zápierka



7. Mostík



5. Starostlivosť o životné prostredie:

Realizácia zámeru bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, primárne vyčistením zanedbaného priestoru a sekundárne vytvorením priestoru pre oddych a športové vyžitie obyvateľstva. Prevádzka realizácie zámeru nebude produkovať odpadové látky zaťažujúce ovzdušie prípadne podzemné vody. Komunálny odpad bude sústreďovaný do zberných košov a vyvážaný v rámci zberu.

Objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dažďové vody budú zvedené do podmoku na pozemku investora.

V zmysle vyhl. 365/2015 Zz. budú počas výstavby vznikať nasledujúce odpady:

170201 drevo	0
170506 výkopová zemina	0

6. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke:

Pri realizácii stavebných objektov budú realizované jednoduché stavby. Pri realizácii je potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci, vybavenie pracovníkov bezpečnostnými prostriedkami, zabezpečiť odborný dozor pri realizácii a dodržiavať predpisy BOZP.

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle:


- vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonníka práce,
- zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- stavebného zákona č. 237/2000 Z.z.,
- zákona č. 222/1996 o organizovaní miestnej a štátnej správy,
-STN 73 30 50 – Zemné práce.

7. Ochranné pásma:

Pri realizácii stavebných objektov nebudú dotknuté ochranné pásma.

Košice 09/2022 vypracoval: Ing.Martin Kráľ



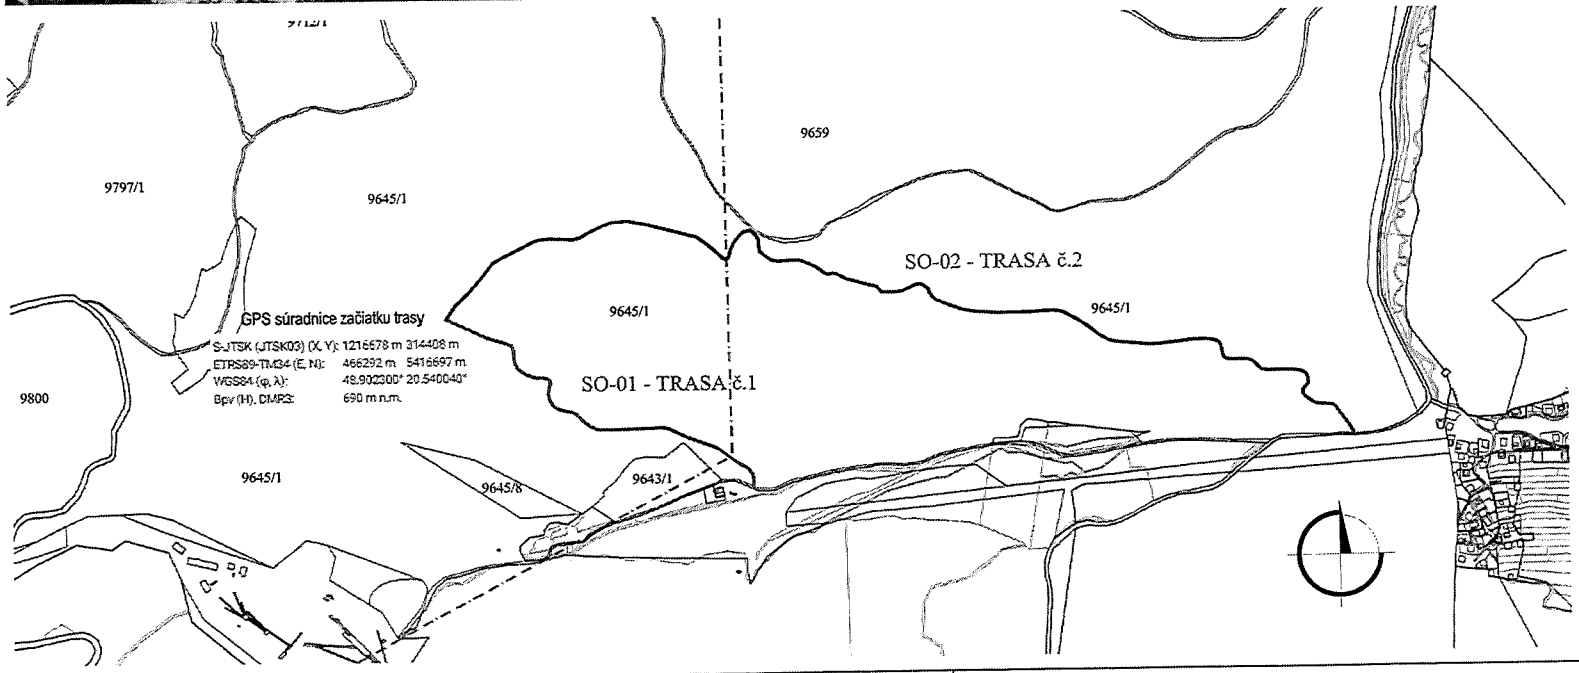

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-02 - CYKLISTICKÝ TRAIL TRASA č.2

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk

zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:


SITUÁCIA
ŠIRŠIE VZŤAHY, KAT. MAPA

mierka:	1 : 10 000
č. výkresu: 1	formát: 2xA4

VLNY.....4ks



SKOK.....4ks



ZÁPIERKA.....12ks




KLOPENÁ ZÁKRUTA.....18ks



LAVICA.....2ks



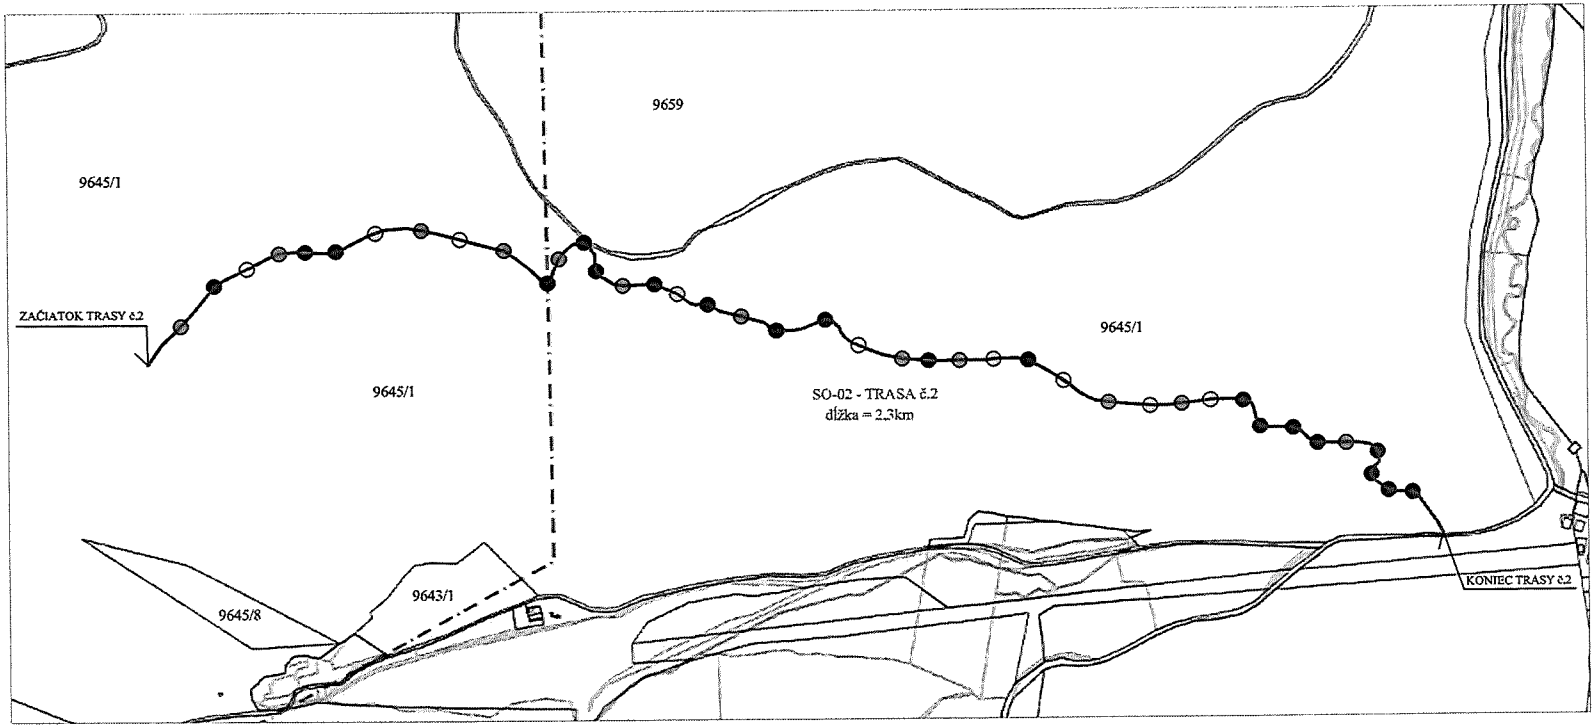



MOSTÍK.....2ks

PREKÁŽKY A TECHNICKÉ PRVKY:

SKOK.....4ks
ZÁPIERKA.....12ks
KLOPENÁ ZÁKRUTA.....18ks
LAVICA.....2ks
VLNY.....4ks
MOSTÍK.....2ks

POZNÁMKA:
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ PRESNÉ TRASOVANIE TRAILU
- UMIESTNENIE PREKÁŽOK A TECHNICKÝCH PRVKOV JE LEN ORIENTAČNÉ - PRESNÁ POLOHA BUDE URČENÁ PO VYTÝČENÍ TRASY

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-02 - CYKLISTICKÝ TRAIL TRASA č.2

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk

zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

SITUÁCIA
KOORDINAČNÝ VÝKRES

mierka:	1 : 7 000
č. výkresu: 2	formát: 2xA4

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065


Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-02 – CYKLISTICKÝ TRAIL - TRASA č.2

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ

www.architekti-kosice.sk



OBSAH:

Technická správa
1. Situácia širšie vzťahy, kat. mapa M=1:10 000
2. Situácia koordinačný výkres M=1:3 000

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-02 – CYKLISTICKÝ TRAIL - TRASA č.2

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Technická správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ
www.architekti-kosice.sk

2. Základné údaje:

Projekt rieši výstavbu občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu.

SO-02 Cyklistický trail – trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) je riešený na percele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves.

Trail (fialový) sa nachádza v menej strmom teréne, ktorý poskytuje ideálne podmienky na stavbu ľahšieho enduro trailu ideálny pre začiatočníkov. Využité budú pri ňom technicky menej náročné úseky. Čo sa týka prekážok, na tomto traile sú navrhnuté hlavne klopené zákruty 18ks , niekoľko menších skokov 4ks, zápierky 12ks, lavice 2ks, vlny 4ks a mostíky 2ks.

3. Konštrukčné riešenie:


Trasovanie trailu je vyznačené na výkrese č.1 a 2 v celkovej dĺžke 1000m a šírke š=1,50 - 2,00m.

Konštrukcia trialu bude pozostávať z upraveného a zhutneného rastlého terénu, ktorá bude doplnená o prírodné prekážky, ako sú koreňové a kamenisté pasáže, skaly a iné. Umelo vytvorené prekážky budú tvorené z drevených profilov, štrkových a kamenných násypov. Lavice, mostíky, dropy a skoky budú opatrené pletivom proti pošmyknutiu.

Trail je vedený orientačne a bude dotvorený priamo v teréne .

4. Príklady umelo vytvorených prekážok a technických prvkov:

1. Lavica



Technický prvok zložený z odpalu a dopadu. Cieľom cyklistu je odraziť sa od odpalu a dopadnúť do dopadu. Priestor medzi odpalom a dopadom je vyplnený ideálne hlinou, prípadne dreveným mostíkom aby pomalší cyklisti vedeli po prekážke pohodlne prejsť aj bez toho aby vyskočili

2. Klopená zákruta




Hlinený násyp v zákrute, ktorý umožňuje prejsť zákrutou pri zachovaní čo najväčšej rýchlosti. Klopené zákruty na flow trailoch sú zvyčajne omnoho vyššie a širšie ako na bežných singletrailoch.

3. Vlny




Súbor viacerých, rovnako veľkých vĺn nasledujúcich po sebe, ktoré sa cyklista snaží prepumpovať, prípadne skočiť z jednej do druhej.

4. Drop




5. Skok / Roadgap





6. Zápierka



7. Mostík



5. Starostlivosť o životné prostredie:

Realizácia zámeru bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, primárne vyčistením zanedbaného priestoru a sekundárne vytvorením priestoru pre oddych a športové vyžitie obyvateľstva. Prevádzka realizácie zámeru nebude produkovať odpadové látky zaťažujúce ovzdušie prípadne podzemné vody. Komunálny odpad bude sústreďovaný do zberných košov a vyvážaný v rámci zberu.

Objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dažďové vody budú zvedené do podmoku na pozemku investora.

V zmysle vyhl. 365/2015 Zz. budú počas výstavby vznikať nasledujúce odpady:

170201 drevo	0
170506 výkopová zemina	0

6. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke:

Pri realizácii stavebných objektov budú realizované jednoduché stavby. Pri realizácii je potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci, vybavenie pracovníkov bezpečnostnými prostriedkami, zabezpečiť odborný dozor pri realizácii a dodržiavať predpisy BOZP.

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle:


- vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonníka práce,
- zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- stavebného zákona č. 237/2000 Z.z.,
- zákona č. 222/1996 o organizovaní miestnej a štátnej správy,
-STN 73 30 50 – Zemné práce.


7. Ochranné pásma:

Pri realizácii stavebných objektov nebudú dotknuté ochranné pásma.

Košice 09/2022

vypracoval: Ing.Martin Kráľ

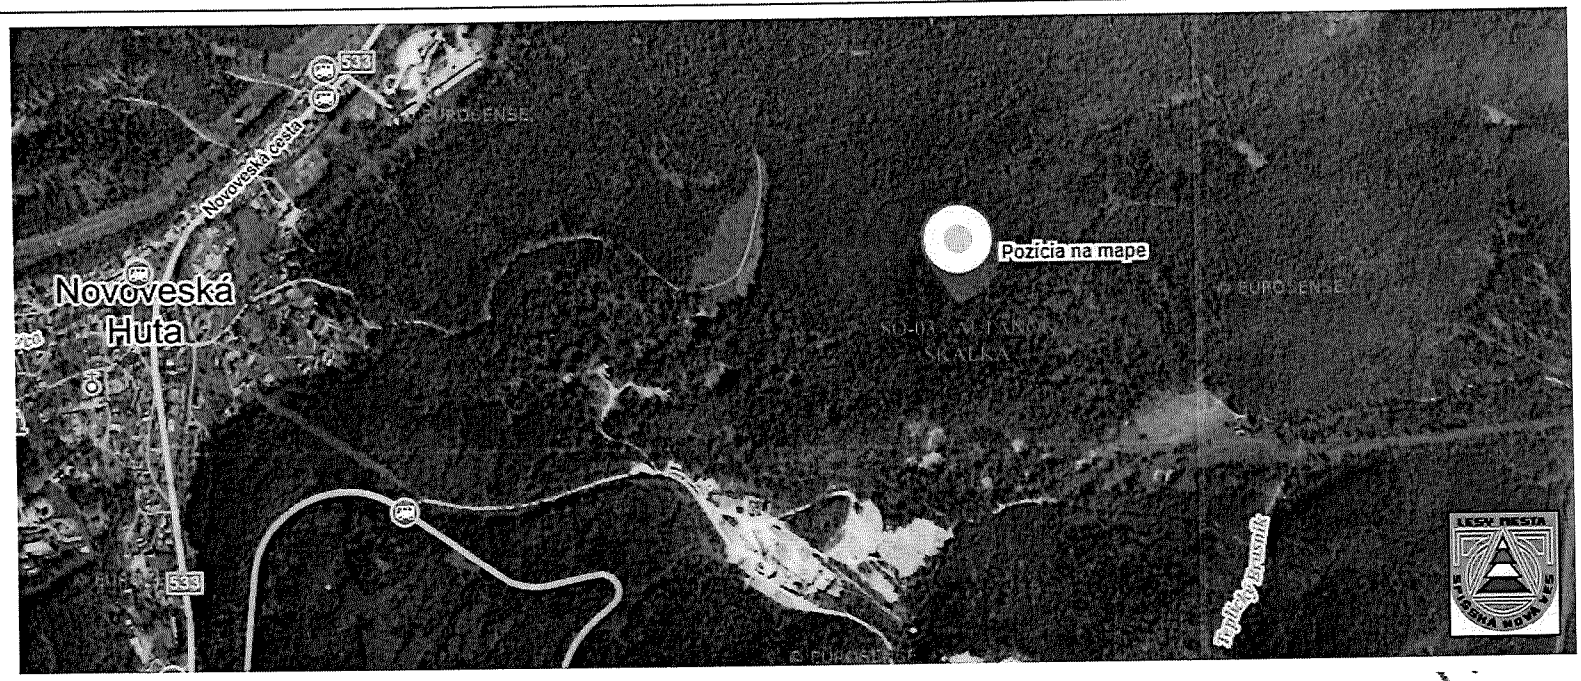

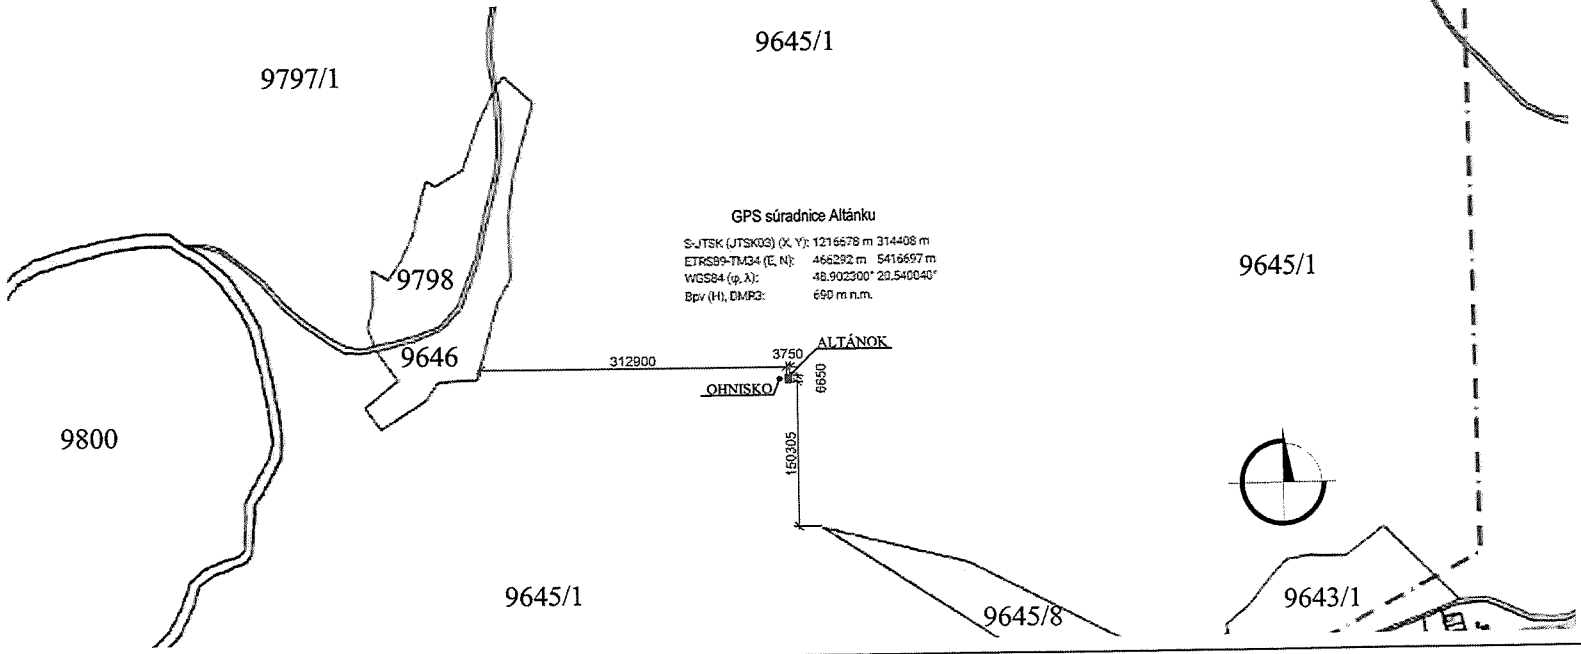

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-03 - ALTÁNOK SKALKA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

SITUÁCIA
ŠIRŠIE VZŤAHY, KAT. MAPA

mierka:	1 : 10 000, 1 : 5 000
č. výkresu: 1	formát: 2xA4

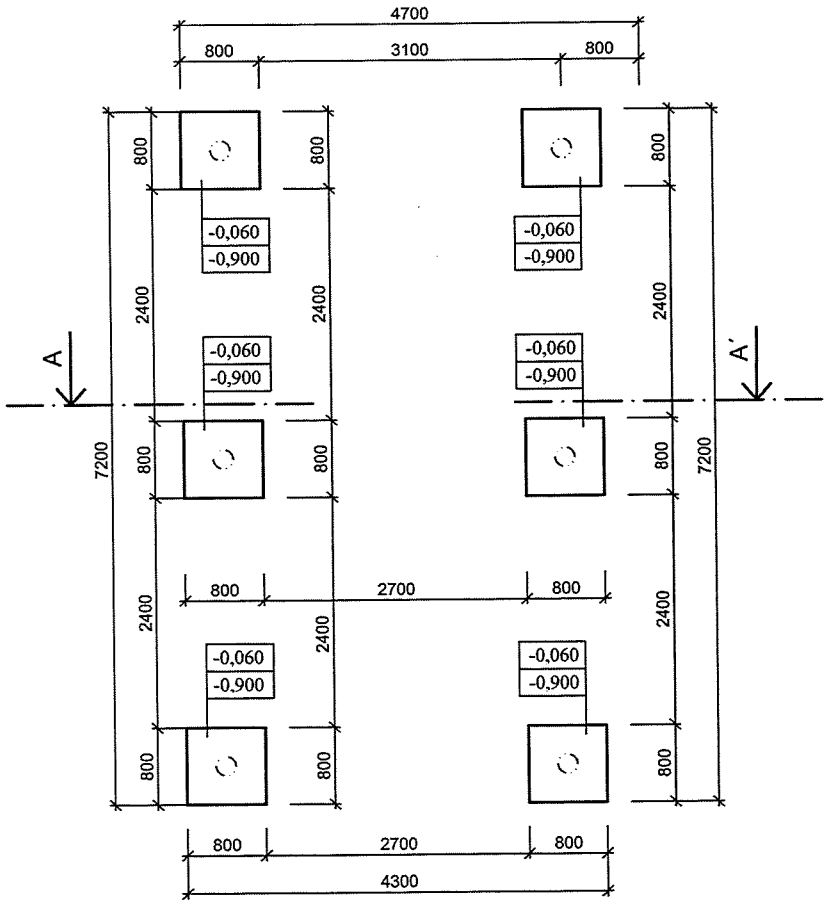



REZ A-A´

SPOTREBA BETÓNU:
Základové pätky sú navrhnuté z betónu B15 (C12/15)..... 3,3m3

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-03 - ALTÁNOK SKALKA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ ZÁKLADOV

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 2	formát: 2xA4

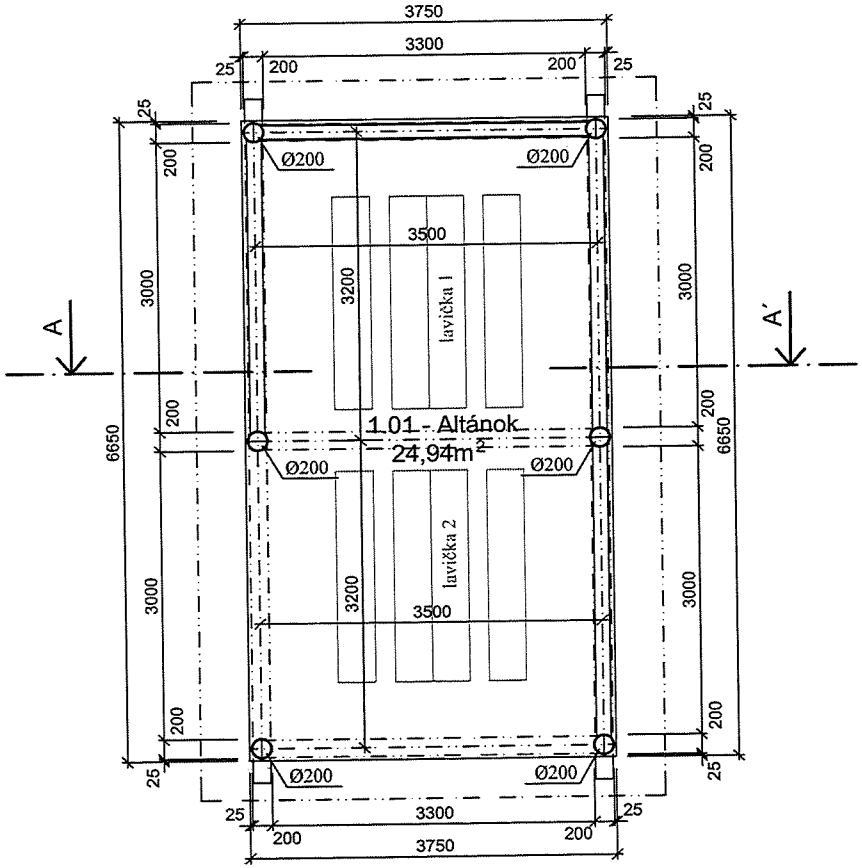

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-03 - ALTÁNOK SKALKA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

PÔDORYS PRÍZEMIA

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 3	formát: 2xA4

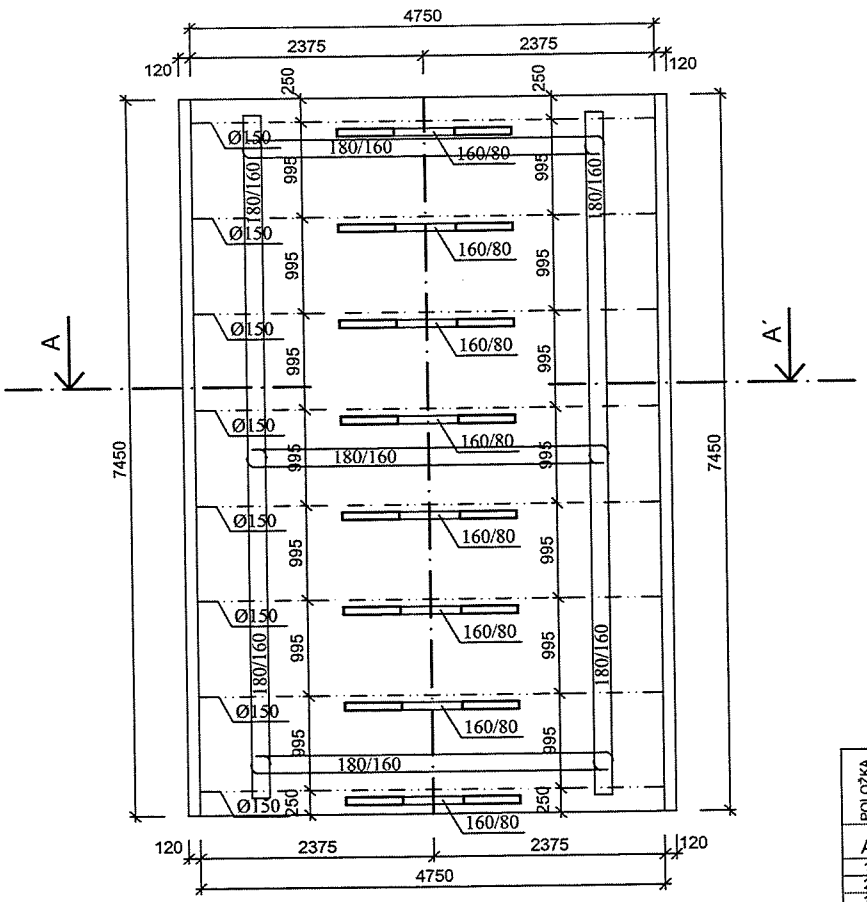



POLOŽKA	NÁZOV	POČET	ROZMER PRIEREZ (mm)	ROZMER DĹŽKA (m)	DĹŽKA CELKOM	MNOŽSTVO (m2)	MNOŽSTVO (m3)	POZNÁMKA
A	Altánok - výkaz dreva							
1	Stĺp	6	ø200	2,34	14,04	0,0314	0,44086	
2	Priečny trám	3	180/160	3,68	11,04	0,0288	0,31795	
3	Pozdĺžny trám	4	180/160	3,68	14,72	0,0288	0,42394	
4	Krokva	16	ø150	2,91	46,56	0,0177	0,82411	
5	Klieštiny	8	160/80	1,8	14,4	0,0128	0,18432	
6	Pásik	12	ø120	0,97	11,64	0,0113	0,13153	
7	Laťovanie	1	35/50	135	135	0,00175	0,23625	
8	Zábradlie	18	ø150	3,2	57,6	0,0177	1,01952	
9	Zadná stena	16	ø150	3,5	56	0,0177	0,9912	
10	Čelné laty	4	120/25	2,9	11,6	0,003	0,0348	
	SPOLU						4,60448	

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-03 - ALTÁNOK SKALKA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022


obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ KROVU

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 4	formát: 2xA4

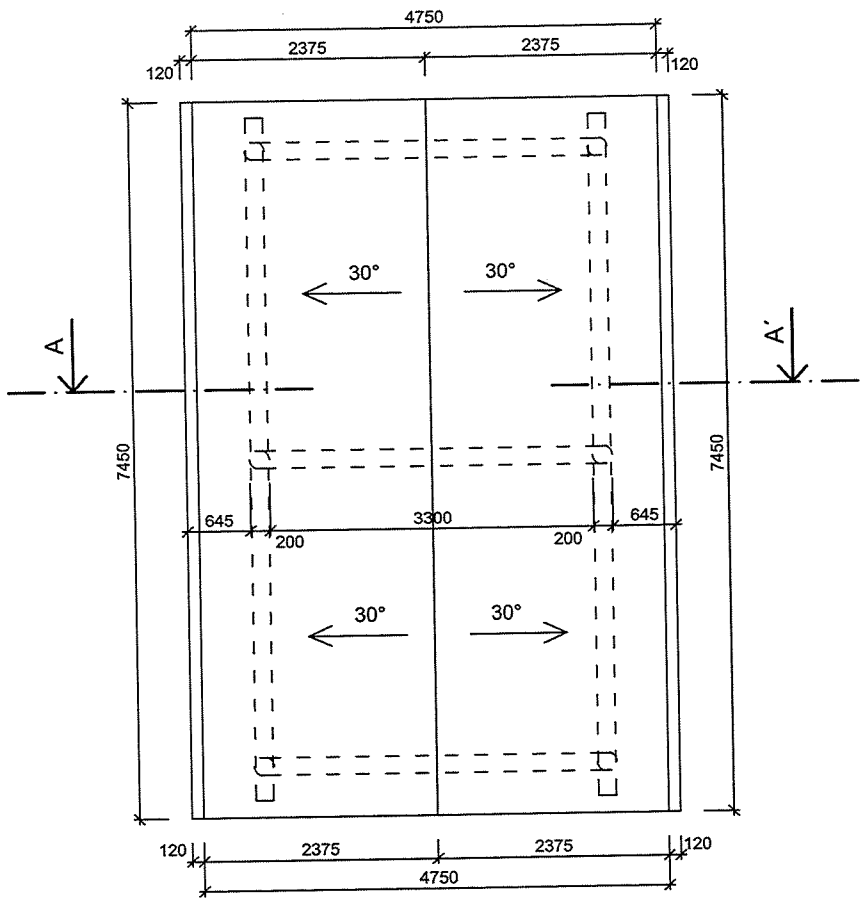

REZ A-A´



STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ.....42m ^{2}

ODKVAPOVÝ SYSTÉM:
Strešný žľab - pozink 2 x 7,45m.....14,9m
Zvodová rúra - pozink 2 x 2,3m.....4,6m
Príslušenstvo

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-03 - ALTÁNOK SKALKA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022


obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ STRECHY

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 5	formát: 2xA4

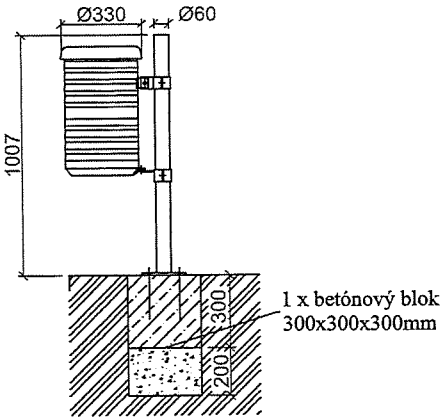



REZOPOHLAD - ODPADKOVÝ KÔŠ, M 1:20.....2ks

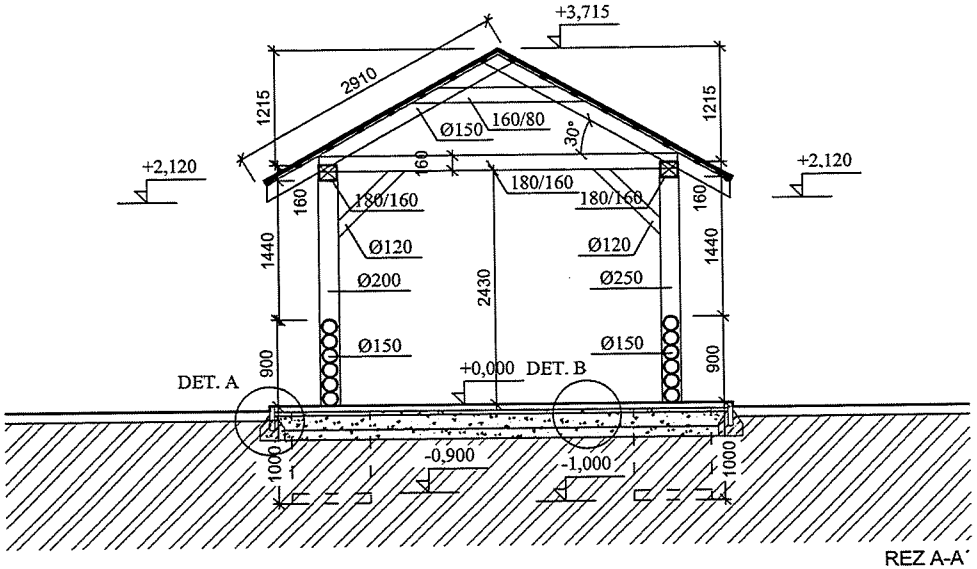


REZ A-A´


LAVIČKA 1, 2 M=1:40

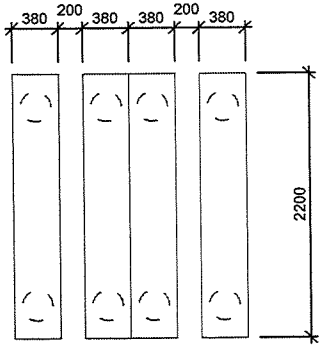






DET. A
Osadenie parkových obrubníkov



DET. B
Skladba podlahy



Prírodné ohnisko so sedením



PRÍKLAD RIEŠENIA PRÍRODNÉHO OHNISKA KAMENÁČ - ILUST. FOTO

POLOŽKA	NÁZOV	POČET	ROZMER PRIEREZ (mm)	ROZMER DĹŽKA (m)	DĹŽKA CELKOM	MNOŽSTVO (m2)	MNOŽSTVO (m3)	POZNÁMKA
A	Lavička - výkaz dreva							
1	Noha	4	Ø250	0,55	2,2	0,049	0,1078	
2	Noha	4	Ø250	0,3	1,2	0,049	0,0588	
3	Stolová doska	2	380/200	2,2	4,4	0,0288	0,12672	
4	Lavičková doska	2	380/150	2,2	4,4	0,0177	0,07788	
5	Priečny trám	2	100/100	0,76	1,52	0,0128	0,01945	
6	Priečny trám	2	100/250	2	4	0,0113	0,0452	
	SPOLU						0,43586	

POZNÁMKA:
UVÁDZANÉ VÝROBKY SÚ LEN ODPORÚČANÉ A PRI REALIZÁCII JE MOŽNÉ PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM NAVRHNÚŤ AJ INÝ TYP VÝROBKU PRI ZACHOVANÍ PARAMETROV.

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-03 - ALTÁNOK SKALKA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03


www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:
REZ A-A´
LAVIČKY A ODPADKOVÝ KÔŠ

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 6	formát: 2xA4

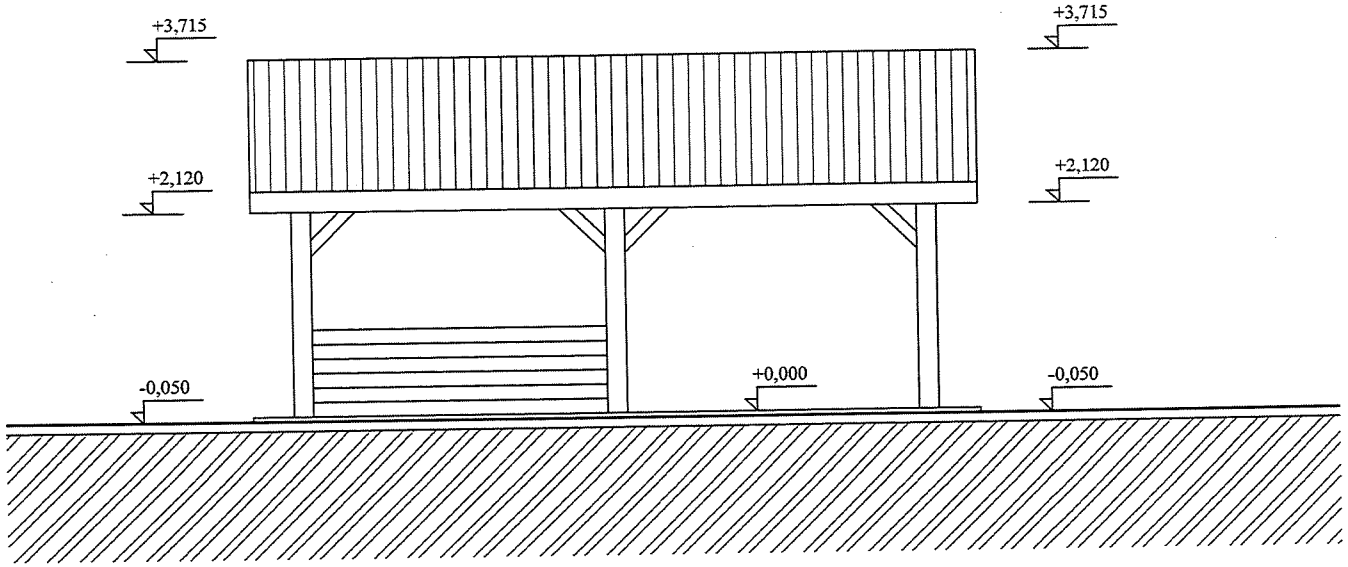

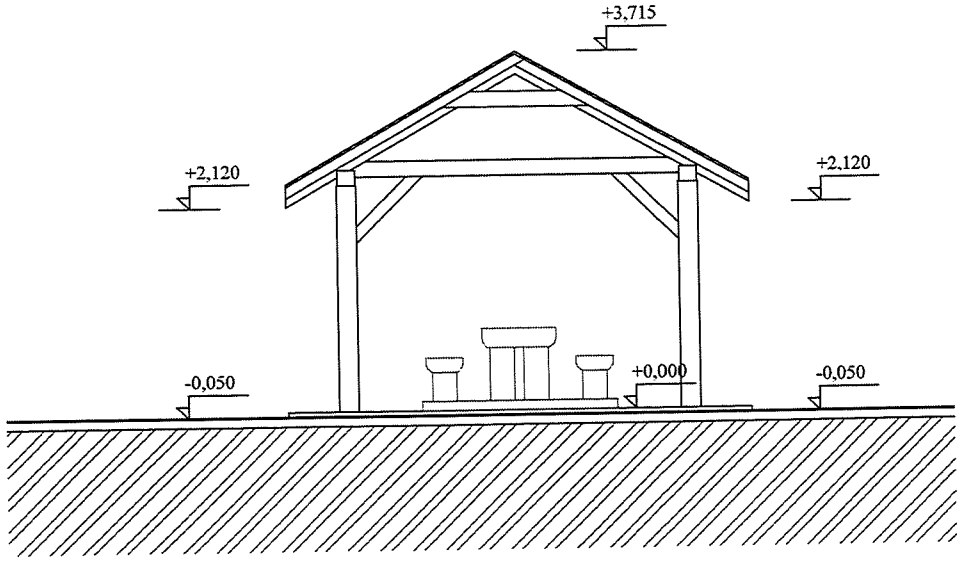

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-03 - ALTÁNOK SKALKA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

POHĽAD BOČNÝ, PREDNÝ

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **7**	formát: **2xA4**

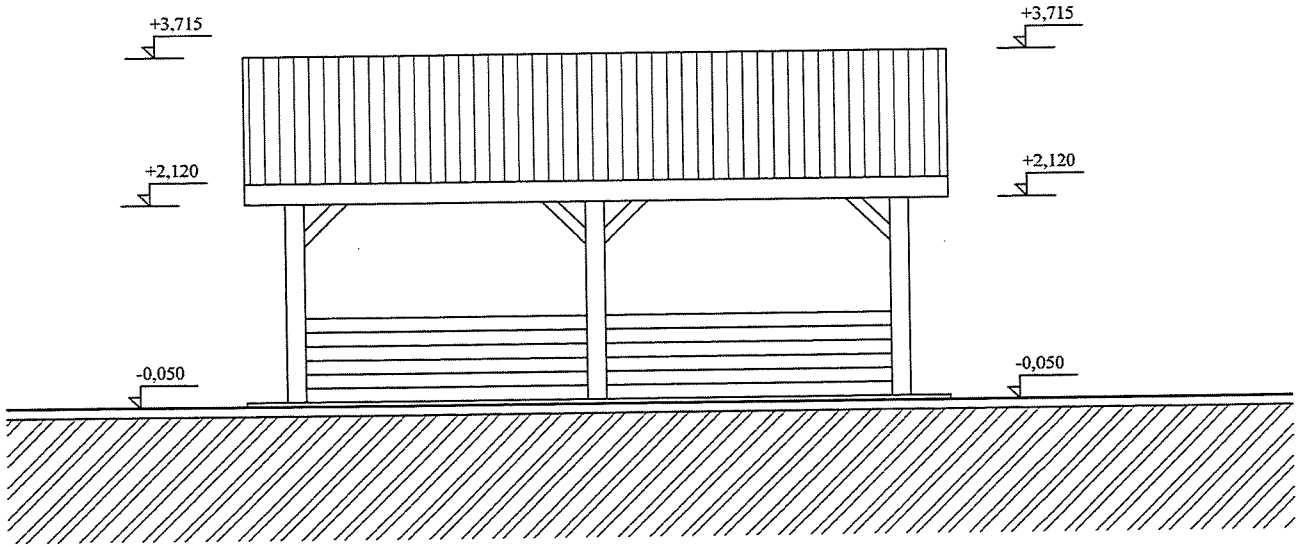

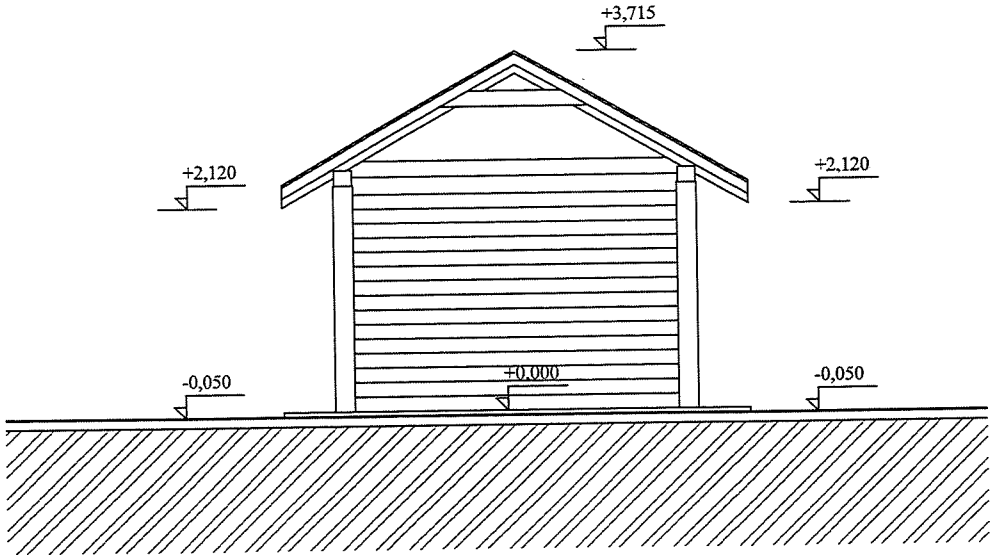

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-03 - ALTÁNOK SKALKA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk

zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

POHĽAD BOČNÝ, ZADNÝ

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **8**	formát: **2xA4**

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065


Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-03 – ALTÁNOK SKALKA

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ

www.architekti-kosice.sk

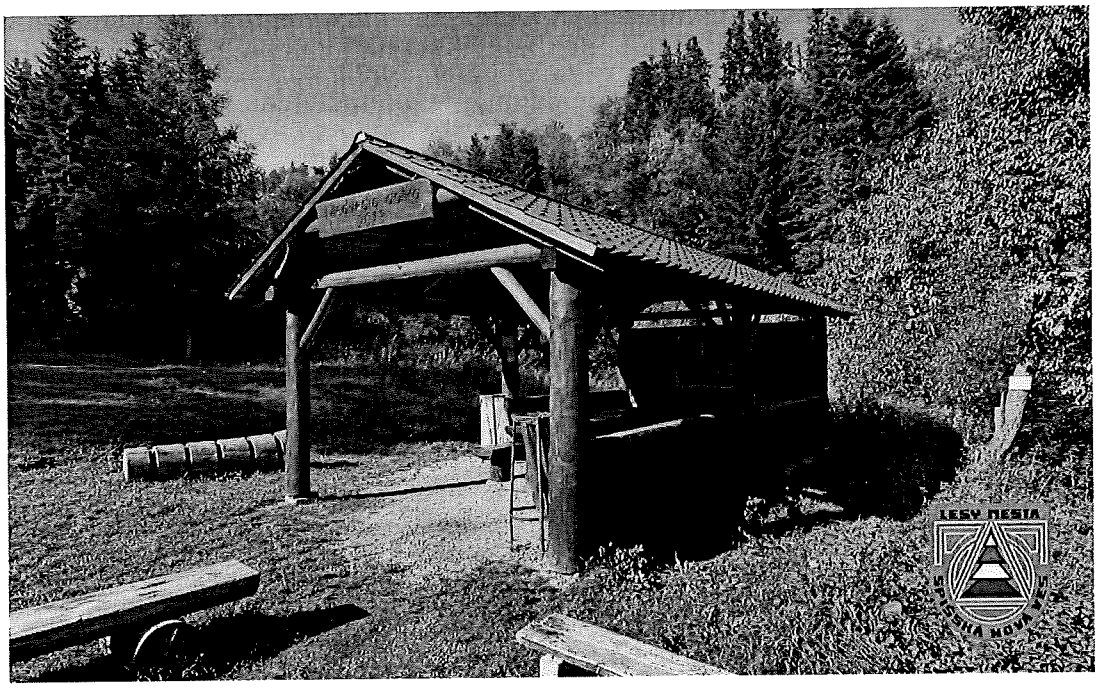

OBSAH:

Technická správa
1. Situácia širšie vzťahy, kat. mapa M=1:10 000, 1:5 000
2. Pôdorys, rez základov M=1:50
3. Pôdorys prízemia M=1:50
4. Pôdorys, rez krovu M=1:50
5. Pôdorys, rez strechy M=1:50
6. Rez A-A´, Lavičky, Odpadkový kôš M=1:50, M=1:40, M=1:20
7. Pohľad bočný, predný M=1:50
8. Pohľad bočný, zadný M=1:50

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-03 – ALTÁNOK SKALKA

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Technická správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Výstavba občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ
www.architekti-kosice.sk

2. Základné údaje:

Projekt rieši výstavbu občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu.

Objekt SO-03 Altánok Skalka je navrhnutý v rámci projektu výstavby občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu. Stavebný objekt nebude napojený na inžinierske siete a rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.

Jedná sa o drevenú drobnú stavbu o rozmere 6,65x3,75m na percele C-KN 9645/1 k.ú. Spišská Nová Ves.

3. Konštrukčné riešenie:

Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru Ø 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu Ø120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.

Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.

Kotvenie nosných stĺpov Ø 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť zo zrubov bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

zastavaná plocha objektu: 24,94m²
obostavaný priestor: 104,3m³

4. Skladba podlahy:

- zámková dlažba.....60mm
- kamenivo fr. 4-8.....40mm
- kamenivo fr. 4-16.....150mm
- kamenivo fr. 0-63.....40mm

5. Skladba strechy:

- plechová krytina
- laťovanie.....35/50mm
- krokva.....Ø150mm

6. Starostlivosť o životné prostredie:

Prevádzka realizácie zámeru nebude produkovať odpadové látky zaťažujúce ovzdušie prípadne podzemné vody. Komunálny odpad bude sústreďovaný a vyvážaný v rámci zberu.

Objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dažďové vody budú zvedené do podmoku na pozemku investora.

V zmysle vyhl. 365/2015 Zz. budú počas výstavby vznikať nasledujúce odpady:

170107 zmesi betónu, tehál, škridle	0
170201 drevo	0
170405 železo, oceľ	0
170506 výkopová zemina	0

7. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke:

Pri realizácii stavebných objektov budú realizované jednoduché stavby. Pri realizácii je potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci, vybavenie pracovníkov bezpečnostnými prostriedkami, zabezpečiť odborný dozor pri realizácii a dodržiavať predpisy BOZP.

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle:


- vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonníka práce,
- zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- stavebného zákona č. 237/2000 Z.z.,
- zákona č. 222/1996 o organizovaní miestnej a štátnej správy,
-STN 73 30 50 – Zemné práce.


8. Ochranné pásma:

Pri realizácii stavebných objektov nebudú dotknuté ochranné pásma.

Košice 09/2022

vypracoval: Ing.Martin Kráľ

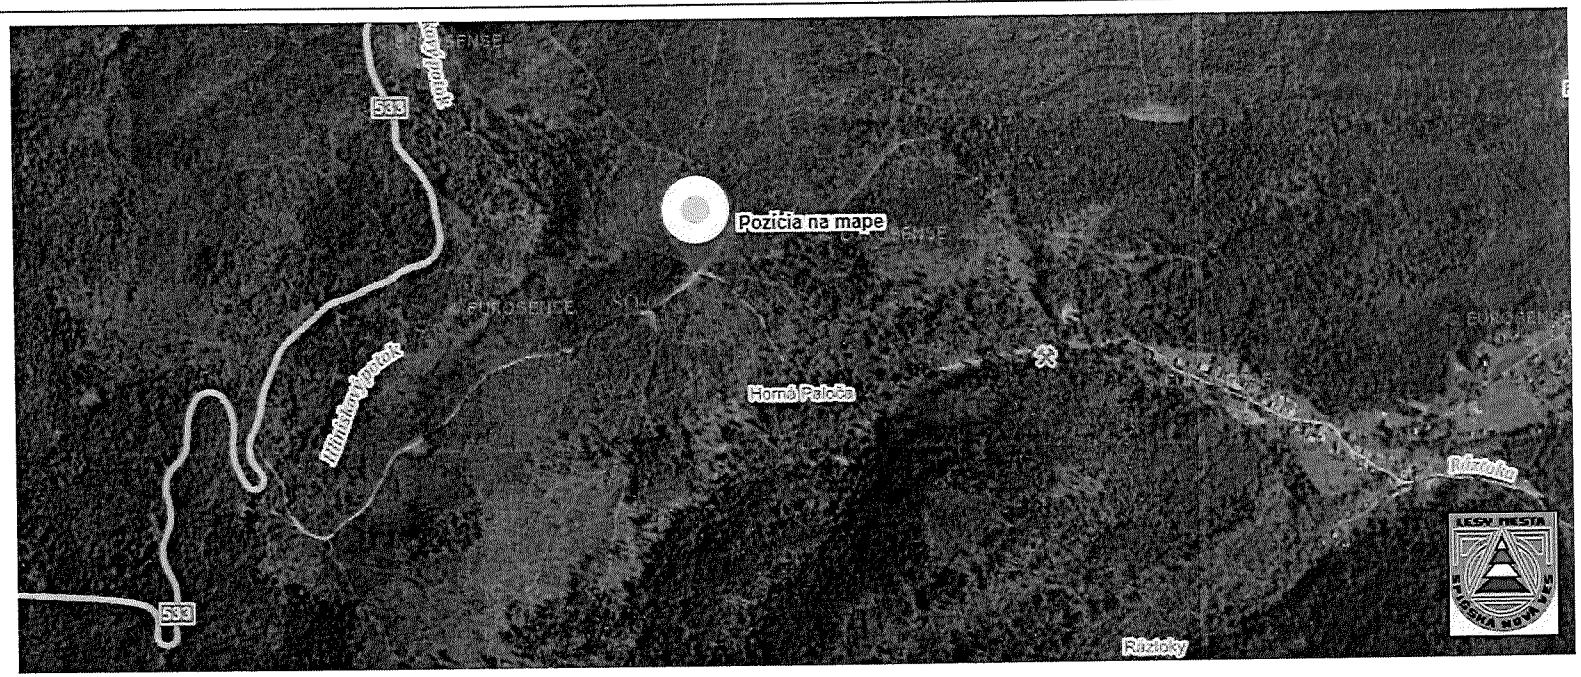

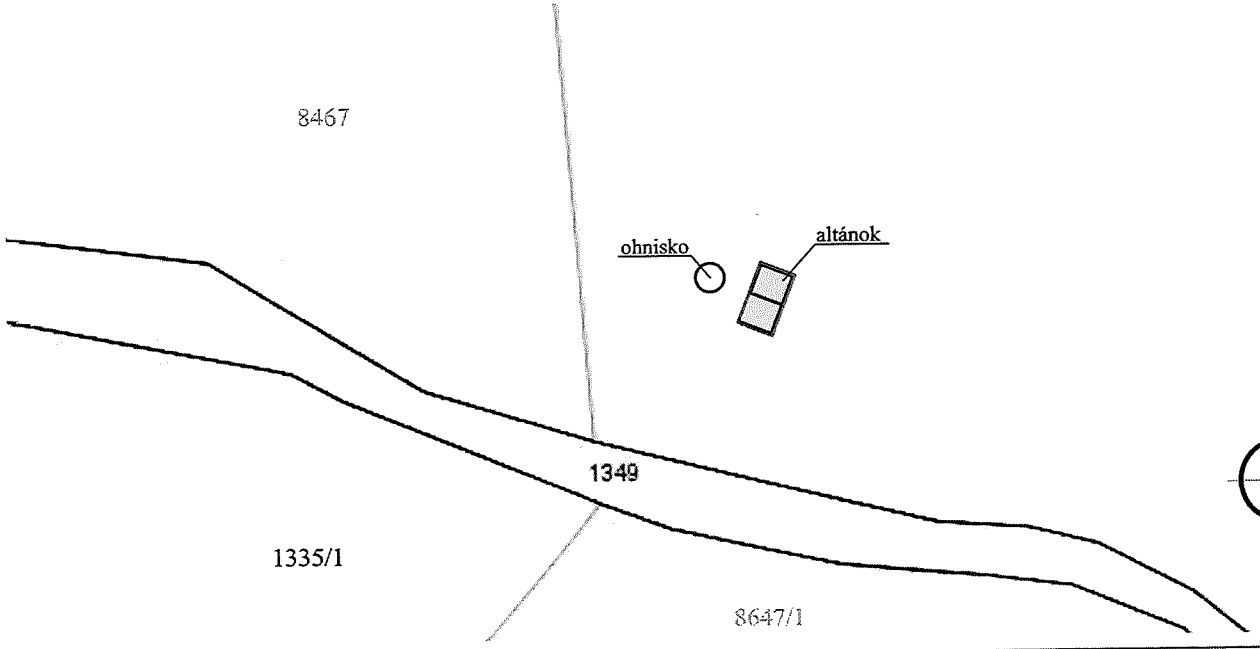

Dokumentácia pre stavebné povolenie

názov:

SO-04 - ALTÁNOK HLINÍKY

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

SITUÁCIA
ŠIRŠIE VZŤAHY, KAT. MAPA

mierka:	1 : 10 000, 1 : 5 00
č. výkresu: 1	formát: 2xA4

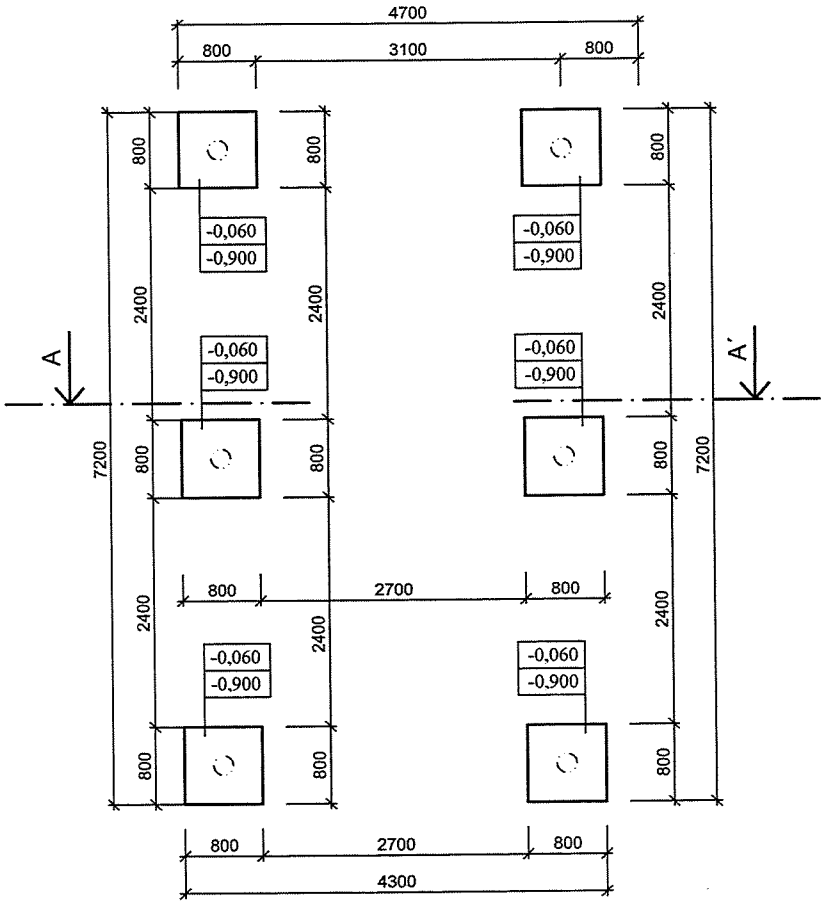



REZ A-A´

SPOTREBA BETÓNU:
Základové pätky sú navrhnuté z betónu B15 (C12/15)..... 3,3m3

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-04 - ALTÁNOK HLINÍKY

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ ZÁKLADOV

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 3	formát: 2xA4

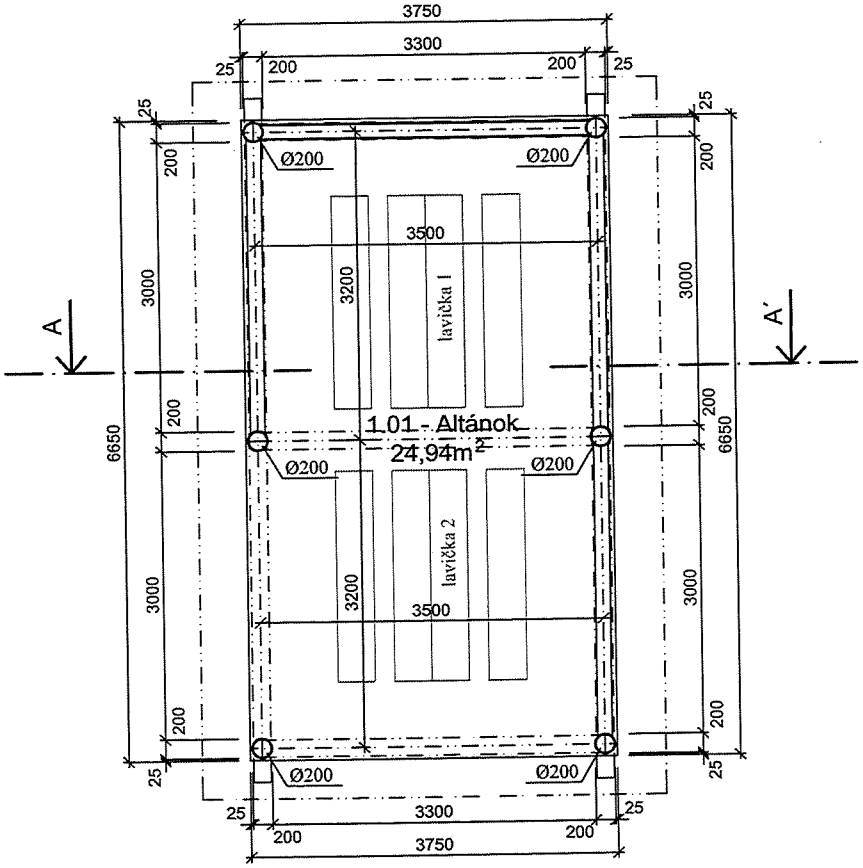

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-04 - ALTÁNOK HLINÍKY

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11


dátum: 09/2022

obsah výkresu:


PÔDORYS PRÍZEMIA

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 4	formát: 2xA4

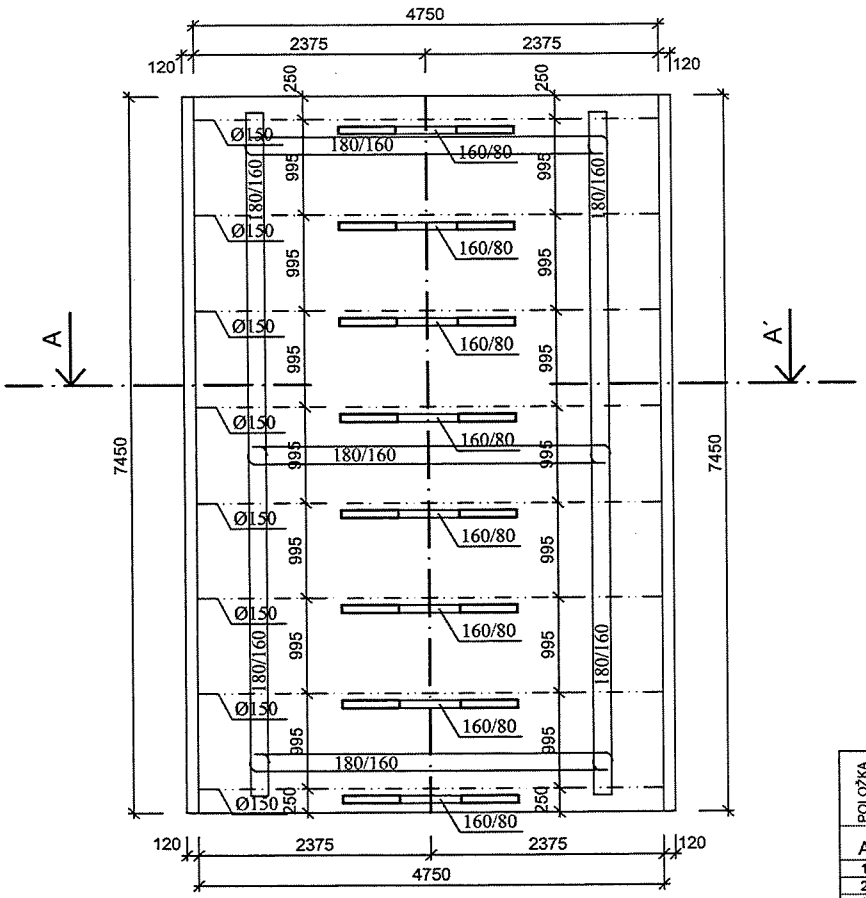



POLOŽKA	NÁZOV	POČET	ROZMER PRIEREZ (mm)	ROZMER DĹŽKA (m)	DĹŽKA CELKOM	MNOŽSTVO (m2)	MNOŽSTVO (m3)	POZNÁMKA
A	Altánok - výkaz dreva							
1	Stĺp	6	ø200	2,34	14,04	0,0314	0,44086	
2	Priečny trám	3	180/160	3,68	11,04	0,0288	0,31795	
3	Pozdĺžny trám	4	180/160	3,68	14,72	0,0288	0,42394	
4	Krokva	16	ø150	2,91	46,56	0,0177	0,82411	
5	Klieštiny	8	160/80	1,8	14,4	0,0128	0,18432	
6	Pásik	12	ø120	0,97	11,64	0,0113	0,13153	
7	Laťovanie	1	35/50	135	135	0,00175	0,23625	
8	Zábradlie	18	ø150	3,2	57,6	0,0177	1,01952	
9	Zadná stena	16	ø150	3,5	56	0,0177	0,9912	
10	Čelné laty	4	120/25	2,9	11,6	0,003	0,0348	
	SPOLU						4,60448	



Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-04 - ALTÁNOK HLINÍKY

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022


obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ KROVU

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 5	formát: 2xA4

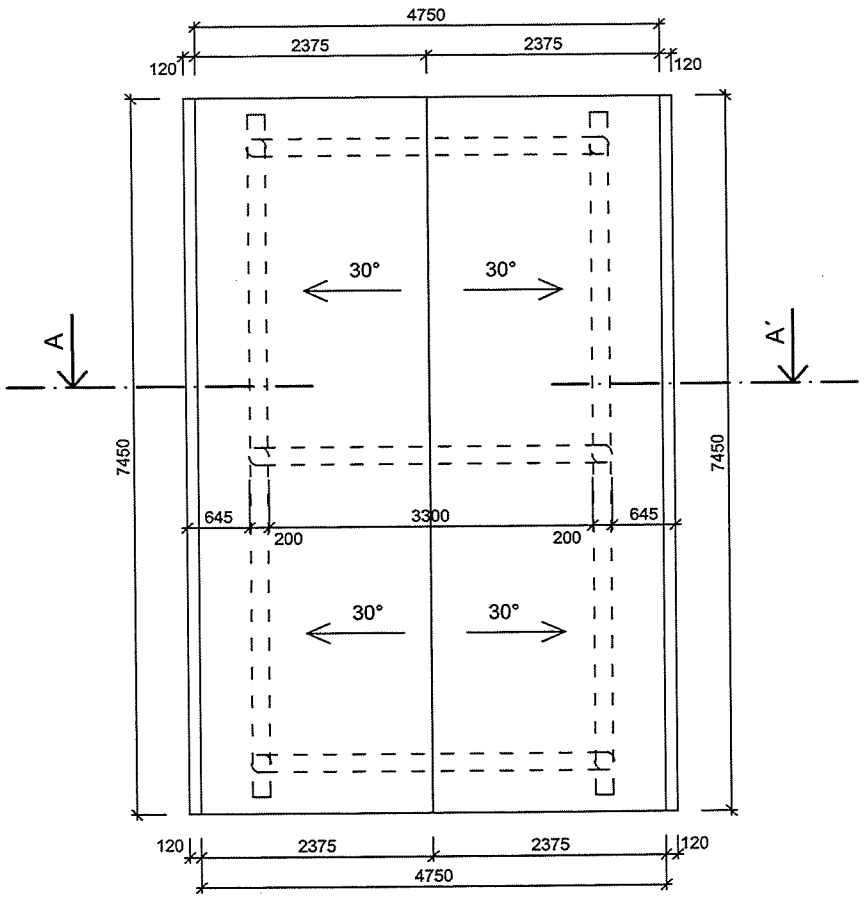

REZ A-A´



STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ.....42m ^{2}

ODKVAPOVÝ SYSTÉM:
Strešný žľab - pozink 2 x 7,45m.....14,9m
Zvodová rúra - pozink 2 x 2,3m.....4,6m
Príslušenstvo

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-04 - ALTÁNOK HLINÍKY

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022


obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ STRECHY

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 6	formát: 2xA4

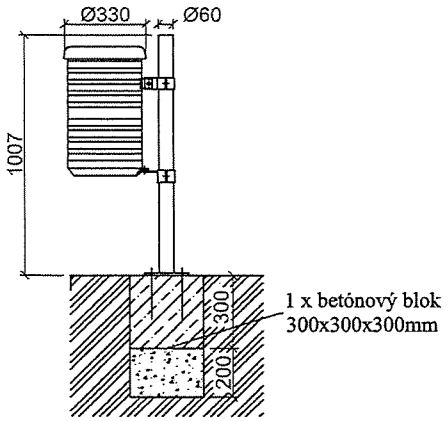



REZOPOHLAD - ODPADKOVÝ KÔŠ, M 1:20.....2ks

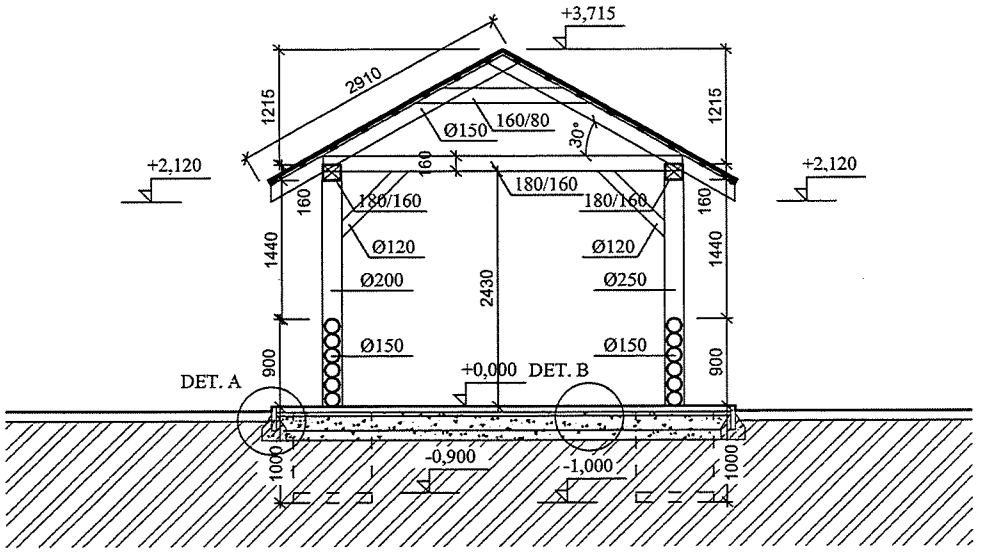


REZ A-A´


LAVIČKA 1, 2 M=1:40

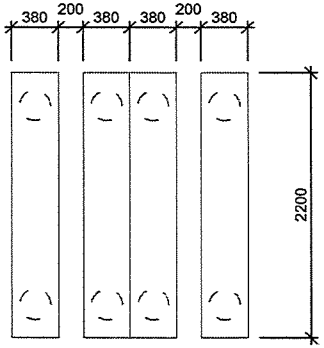







DET. A
Osadenie parkových obrubníkov



DET. B
Skladba podlahy



Prírodné ohnisko so sedením



PRÍKLAD RIEŠENIA PRÍRODNÉHO OHNISKA - ILUST. FOTO

POLOŽKA	NÁZOV	POČET	ROZMER PRIEREZ (mm)	ROZMER DĹŽKA (m)	DĹŽKA CELKOM	MNOŽSTVO (m2)	MNOŽSTVO (m3)	POZNÁMKA
A	Lavička - výkaz dreva							
1	Noha	4	Ø250	0,55	2,2	0,049	0,1078	
2	Noha	4	Ø250	0,3	1,2	0,049	0,0588	
3	Stolová doska	2	380/200	2,2	4,4	0,0288	0,12672	
4	Lavičková doska	2	380/150	2,2	4,4	0,0177	0,07788	
5	Priečny trám	2	100/100	0,76	1,52	0,0128	0,01945	
6	Priečny trám	2	100/250	2	4	0,0113	0,0452	
	SPOLU						0,43586	

POZNÁMKA:
UVÁDZANÉ VÝROBKY SÚ LEN ODPORÚČANÉ A PRI REALIZÁCII JE MOŽNÉ PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM NAVRHNÚŤ AJ INÝ TYP VÝROBKU PRI ZACHOVANÍ PARAMETROV.

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-04 - ALTÁNOK HLINÍKY

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03


www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:
REZ A-A´
LAVIČKY A ODPADKOVÝ KÔŠ

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 7	formát: 2xA4

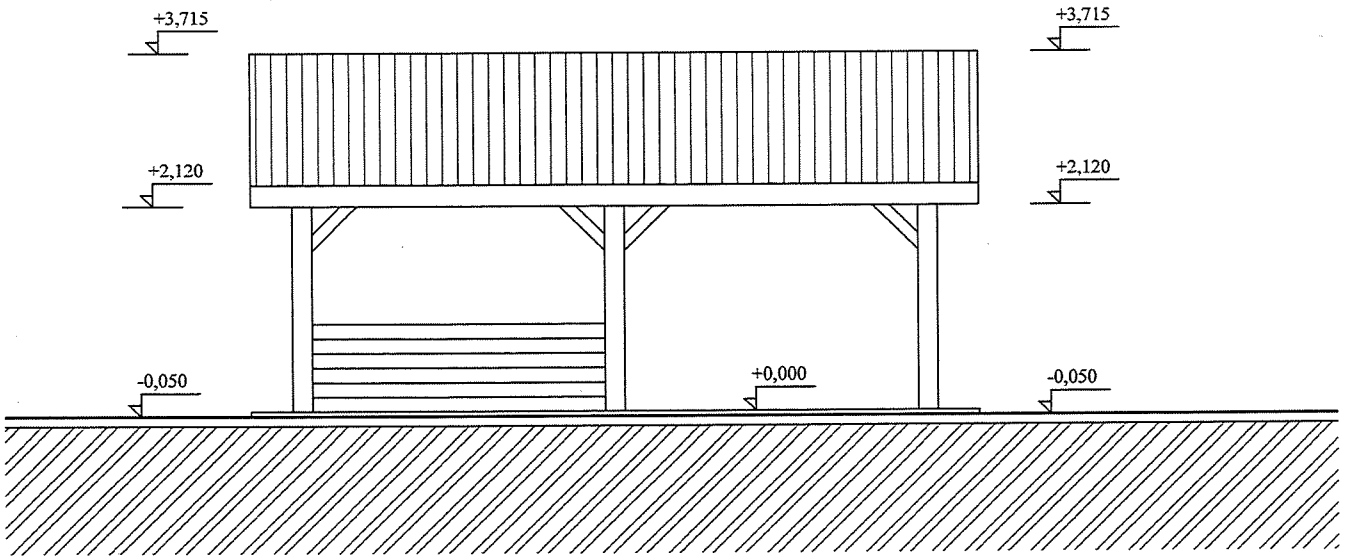

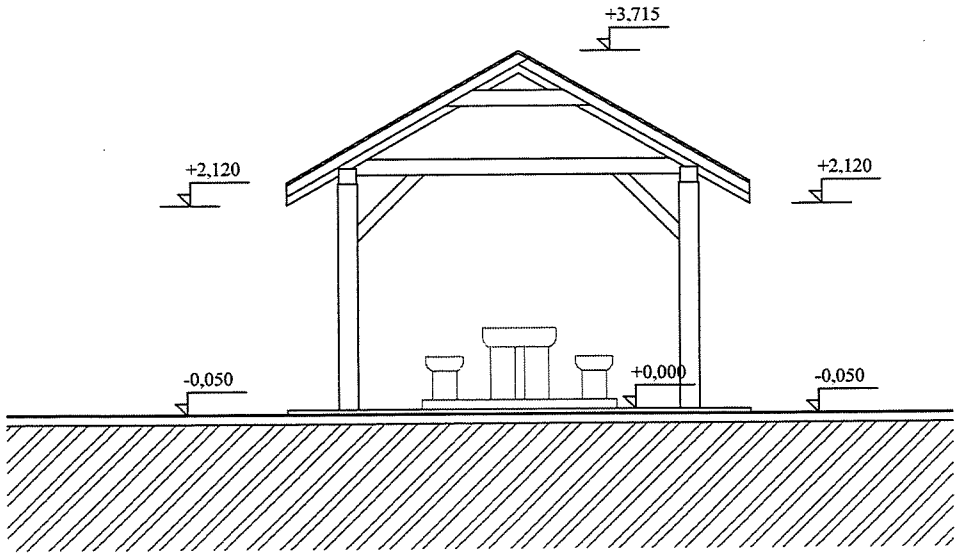

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-04 - ALTÁNOK HLINÍKY

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*I1


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

POHĽAD ZÁPADNÝ, JUŽNÝ

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **8**	formát: **2xA4**

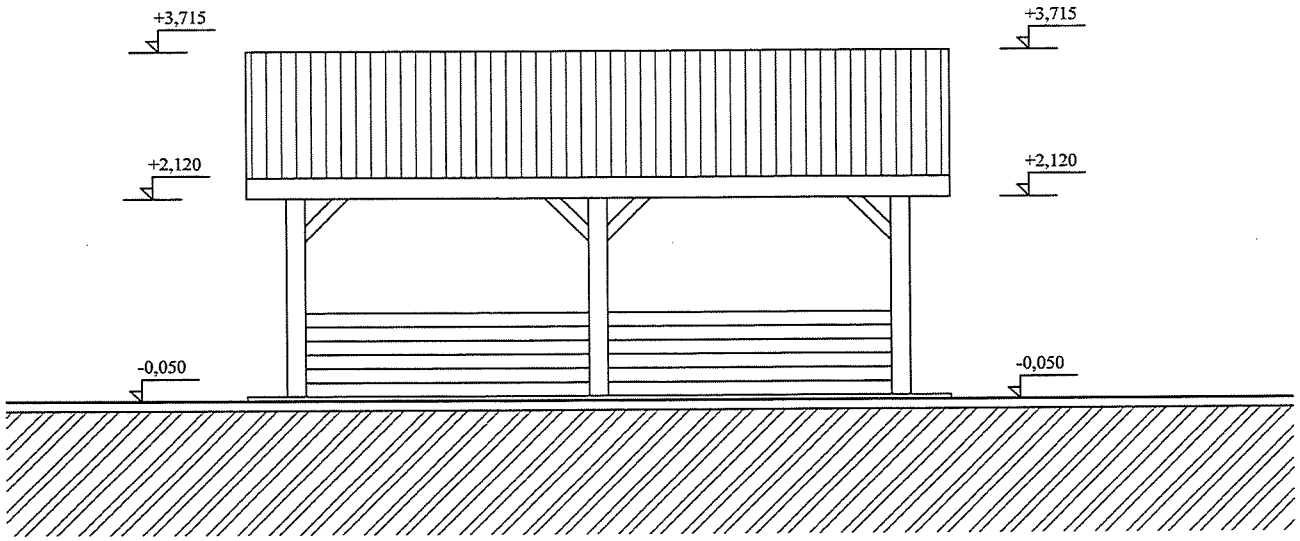

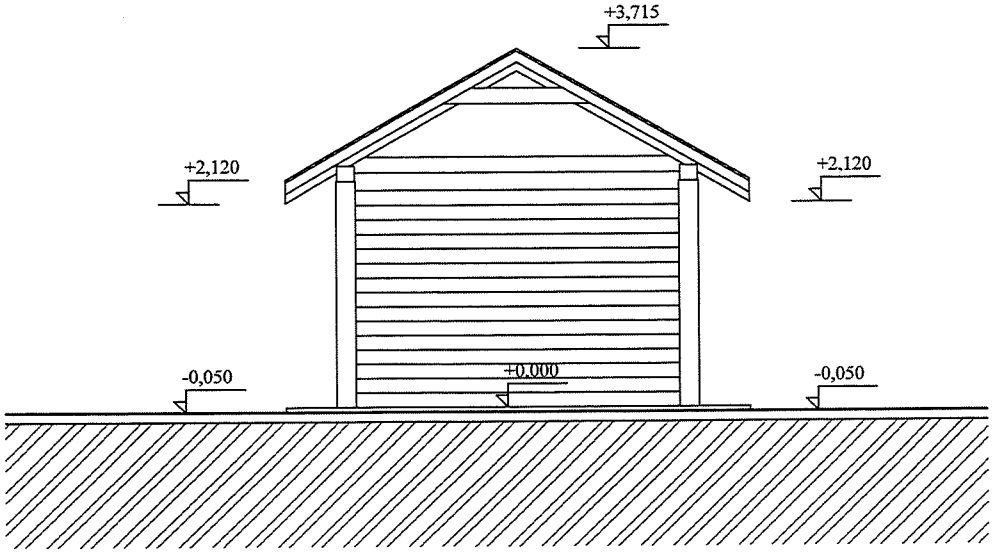

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-04 - ALTÁNOK HLINÍKY

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk

zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

POHĽAD VÝCHODNÝ, SEVERNÝ

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **9**	formát: **2xA4**

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065


Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-04 – ALTÁNOK HLINÍKY

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ

www.architekti-kosice.sk

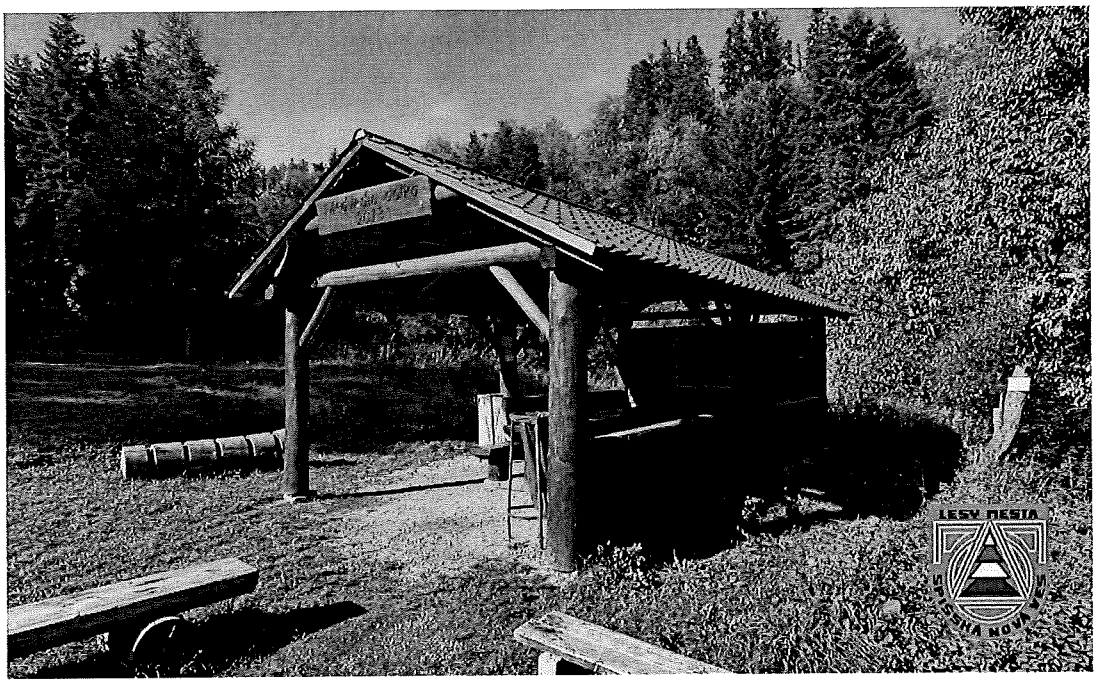

OBSAH:

Technická správa
1. Situácia širšie vzťahy, kat. mapa M=1:10 000, 1:500
2. Situácia – Koordinačný výkres M=1:500
3. Pôdorys, rez základov M=1:50
4. Pôdorys prízemia M=1:50
5. Pôdorys, rez krovu M=1:50
6. Pôdorys, rez strechy M=1:50
7. Rez A-A´, Lavičky, Odpadkový kôš M=1:50, M=1:40, M=1:20
8. Pohľad západný, južný M=1:50
9. Pohľad východný, severný M=1:50

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-04 – ALTÁNOK HLINÍKY

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Technická správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ
www.architekti-kosice.sk

2. Základné údaje:

Projekt rieši výstavbu občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu.

Objekt SO-04 Altánok Hliníky je navrhnutý v rámci projektu výstavby občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu. Stavebný objekt nebude napojený na inžinierske siete a rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.

Jedná sa o drevenú drobnú stavbu o rozmere 6,65x3,75m na percele C-KN 1668 resp. E-KN 3-8476/1, k.ú. Hnilčík.

3. Konštrukčné riešenie:

Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru Ø 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu Ø120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.

Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.

Kotvenie nosných stĺpov Ø 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť zo zrubov bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

zastavaná plocha objektu: 24,94m^2
obostavaný priestor: 104,3m^3

4. Skladba podlahy:

- zámková dlažba.....60mm
- kamenivo fr. 4-8.....40mm
- kamenivo fr. 4-16.....150mm
- kamenivo fr. 0-63.....40mm

5. Skladba strechy:

- plechová krytina
- laťovanie.....35/50mm
- krokva.....Ø150mm

6. Starostlivosť o životné prostredie:

Prevádzka realizácie zámeru nebude produkovať odpadové látky zaťažujúce ovzdušie prípadne podzemné vody. Komunálny odpad bude sústreďovaný a vyvážaný v rámci zberu.

Objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dažďové vody budú zvedené do podmoku na pozemku investora.

V zmysle vyhl. 365/2015 Zz. budú počas výstavby vznikať nasledujúce odpady:

170107 zmesi betónu, tehál, škridle	0
170201 drevo	0
170405 železo, oceľ	0
170506 výkopová zemina	0

7. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke:

Pri realizácii stavebných objektov budú realizované jednoduché stavby. Pri realizácii je potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci, vybavenie pracovníkov bezpečnostnými prostriedkami, zabezpečiť odborný dozor pri realizácii a dodržiavať predpisy BOZP.

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle:

- vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonníka práce,
- zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- stavebného zákona č. 237/2000 Z.z.,
- zákona č. 222/1996 o organizovaní miestnej a štátnej správy,
-STN 73 30 50 – Zemné práce.

8. Ochranné pásma:

Pri realizácii stavebných objektov nebudú dotknuté ochranné pásma.

Košice 09/2022

vypracoval: Ing.Martin Kráľ



Dokumentácia pre stavebné povolenie

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*I1


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

SITUÁCIA
KOORDINAČNÝ VÝKRES

mierka:	**1 : 500**
č. výkresu: **2**	formát: **2xA4**

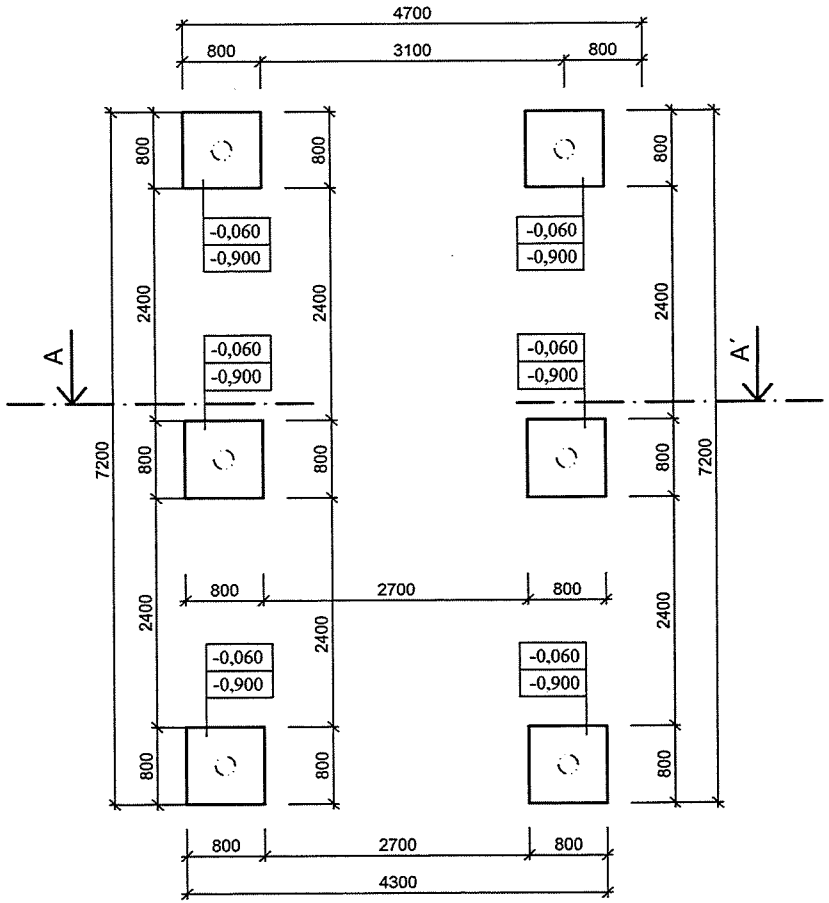



REZ A-A´

SPOTREBA BETÓNU:
Základové pätky sú navrhnuté z betónu B15 (C12/15)..... 3,3m3

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*I1

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ ZÁKLADOV

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 3	formát: 2xA4

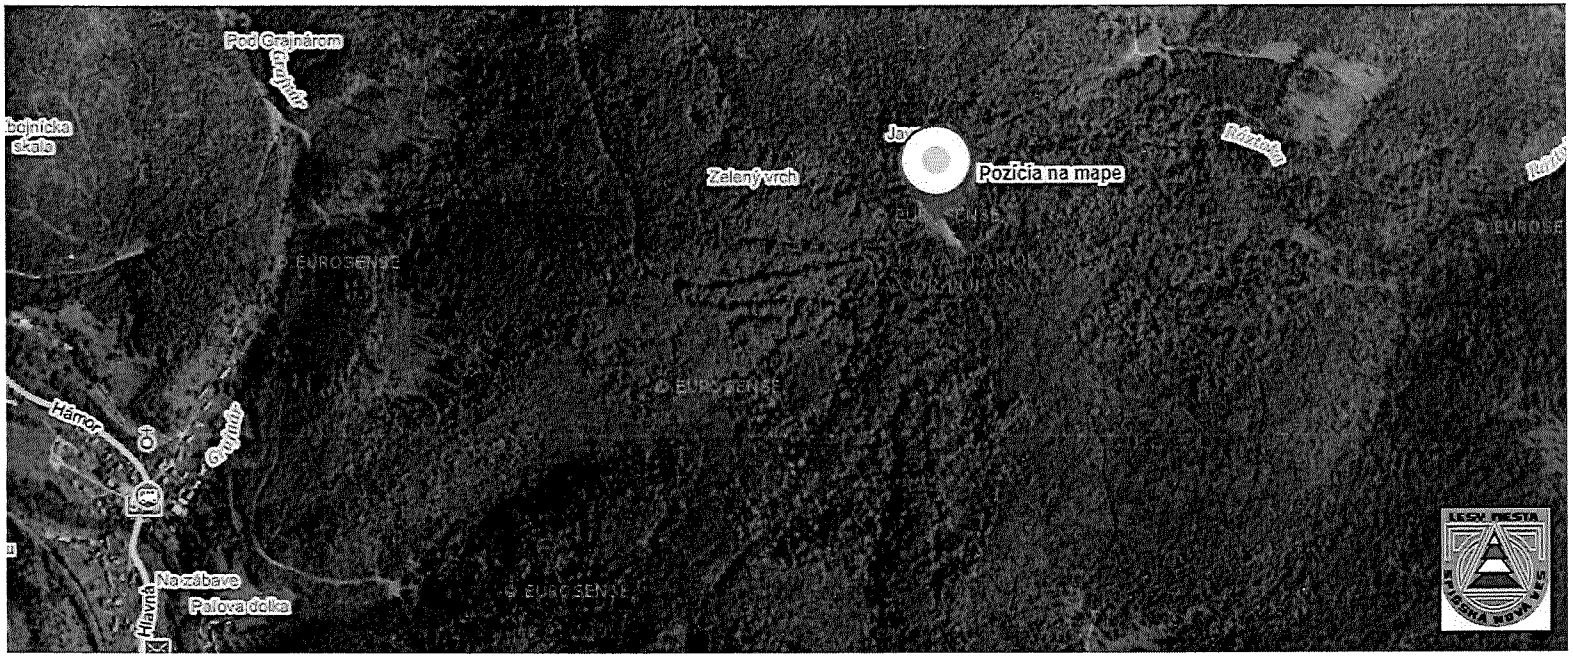



Dokumentácia pre stavebné povolenie

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

SITUÁCIA
ŠIRŠIE VZŤAHY, KAT. MAPA

mierka:	1 : 10 000, 1 : 5 000
č. výkresu: 1	formát: 2xA4

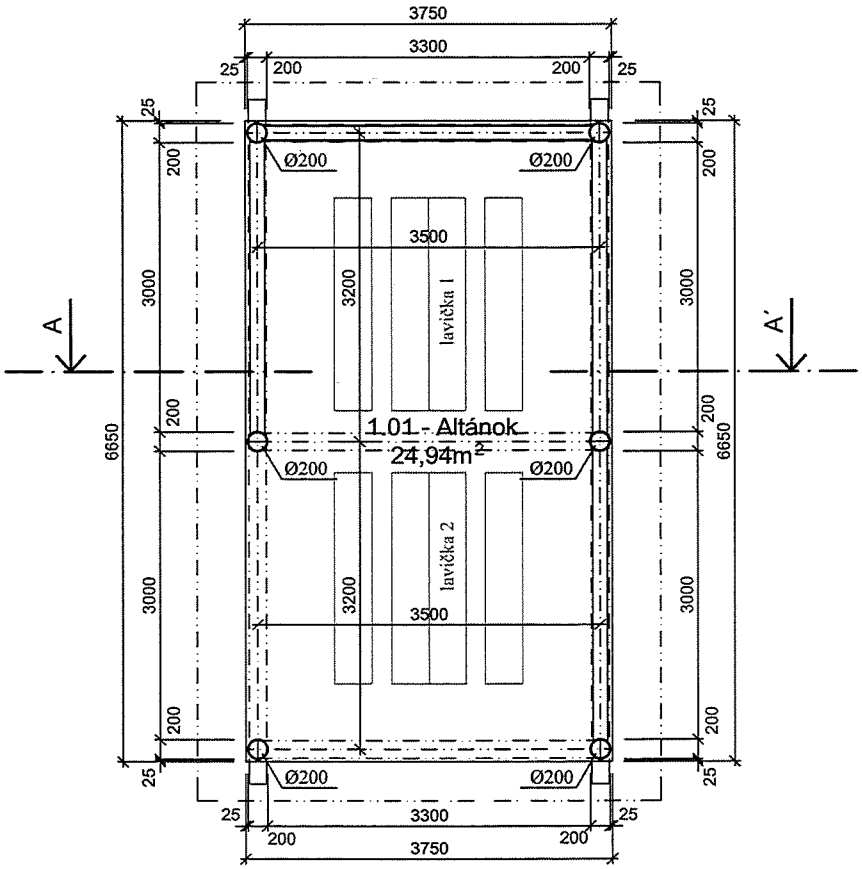

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

PÔDORYS PRÍZEMIA

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **4**	formát: **2xA4**

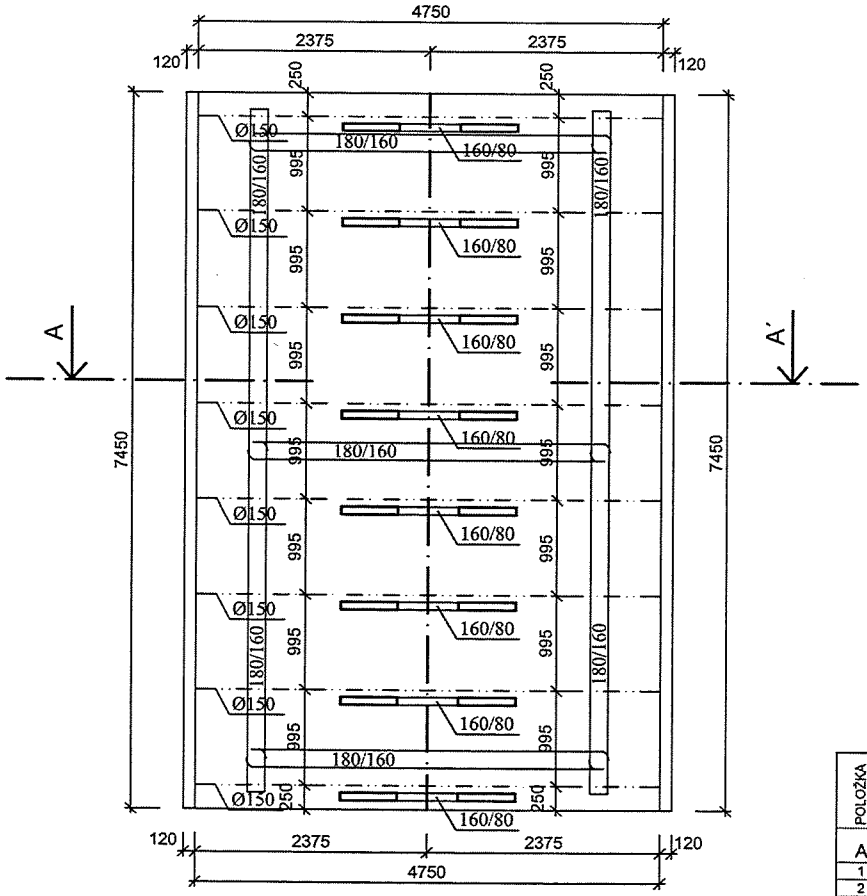



POLOŽKA	NÁZOV	POČET	ROZMER PRIEREZ (mm)	ROZMER DĹŽKA (m)	DĹŽKA CELKOM	MNOŽSTVO (m2)	MNOŽSTVO (m3)	POZNÁMKA
A	Altánok - výkaz dreva							
1	Stĺp	6	ø200	2,34	14,04	0,0314	0,44086	
2	Priečny trám	3	180/160	3,68	11,04	0,0288	0,31795	
3	Pozdĺžny trám	4	180/160	3,68	14,72	0,0288	0,42394	
4	Krokva	16	ø150	2,91	46,56	0,0177	0,82411	
5	Klieštiny	8	160/80	1,8	14,4	0,0128	0,18432	
6	Pásik	12	ø120	0,97	11,64	0,0113	0,13153	
7	Laťovanie	1	35/50	135	135	0,00175	0,23625	
8	Zábradlie	18	ø150	3,2	57,6	0,0177	1,01952	
9	Zadná stena	16	ø150	3,5	56	0,0177	0,9912	
10	Čelné laty	4	120/25	2,9	11,6	0,003	0,0348	
	SPOLU						4,60448	

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022


obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ KROVU

mierka:	1 : 50
č. výkresu: 5	formát: 2xA4

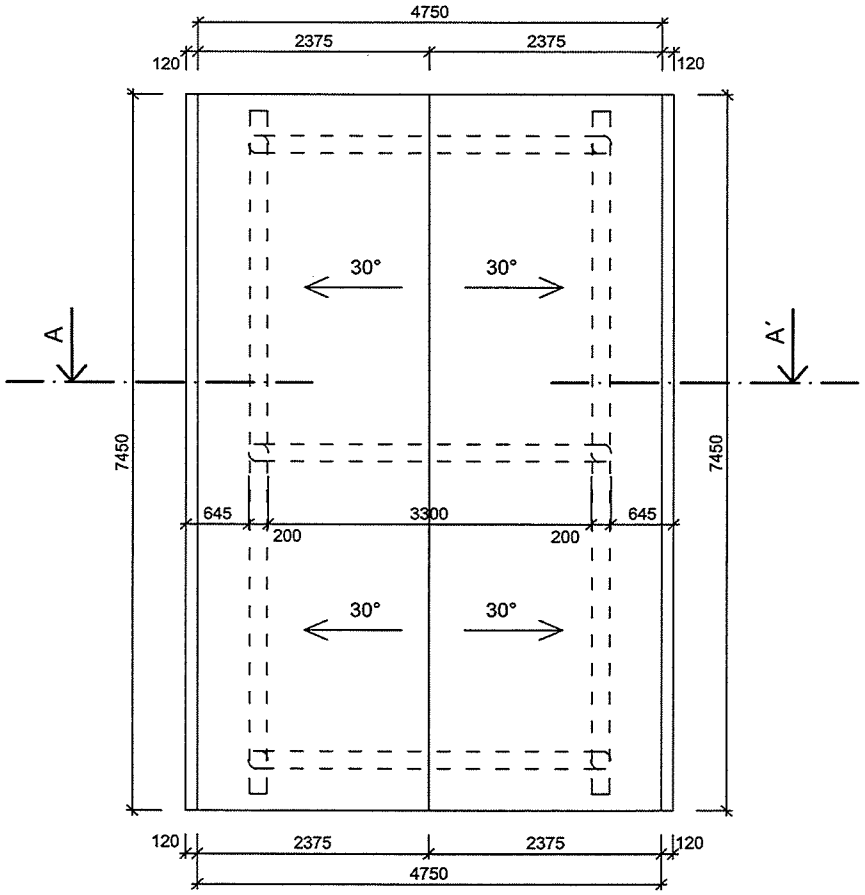

REZ A-A´



STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ.....42m²

ODKVAPOVÝ SYSTÉM:
Strešný žľab - pozink 2 x 7,45m.....14,9m
Zvodová rúra - pozink 2 x 2,3m.....4,6m
Príslušenstvo

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022


obsah výkresu:

PÔDORYS, REZ STRECHY

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **6**	formát: **2xA4**

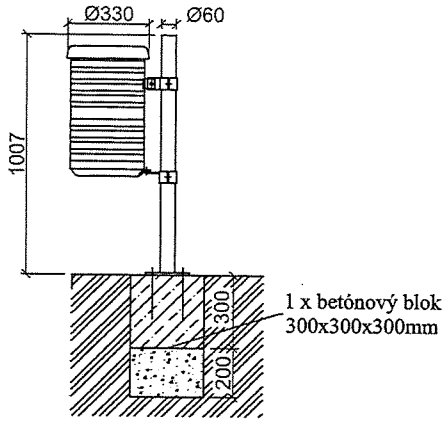



REZOPOHLAD - ODPADKOVÝ KÔŠ, M 1:20.....2ks

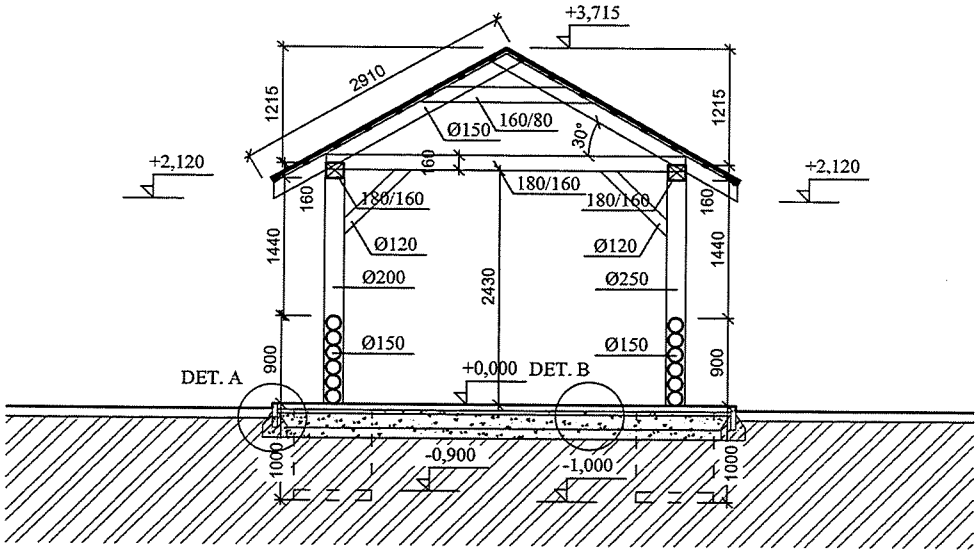


REZ A-A´


LAVIČKA 1, 2 M=1:40

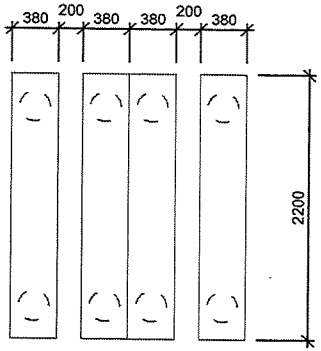






DET. A
Osadenie parkových obrubníkov




DET. B
Skladba podlahy



POLOŽKA	NÁZOV	POČET	ROZMER PRIEREZ (mm)	ROZMER DĹŽKA (m)	DĹŽKA CELKOM	MNOŽSTVO (m2)	MNOŽSTVO (m3)	POZNÁMKA
A	Lavička - výkaz dreva							
1	Noha	4	ø250	0,55	2,2	0,049	0,1078	
2	Noha	4	ø250	0,3	1,2	0,049	0,0588	
3	Stolová doska	2	380/200	2,2	4,4	0,0288	0,12672	
4	Lavičková doska	2	380/150	2,2	4,4	0,0177	0,07788	
5	Priečny trám	2	100/100	0,76	1,52	0,0128	0,01945	
6	Priečny trám	2	100/250	2	4	0,0113	0,0452	
	SPOLU						0,43565	

Prírodné ohnisko so sedením



PRÍKLAD RIEŠENIA PRÍRODNÉHO OHNISKA - ILUST. FOTO

POZNÁMKA:
UVÁDZANÉ VÝROBKY SÚ LEN ODPORÚČANÉ A PRI REALIZÁCII JE MOŽNÉ PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM NAVRHNÚŤ AJ INÝ TYP VÝROBKU PRI ZACHOVANÍ PARAMETROV.

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03


www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:
REZ A-A´
LAVIČKY A ODPADKOVÝ KÔŠ

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **7**	formát: **2xA4**

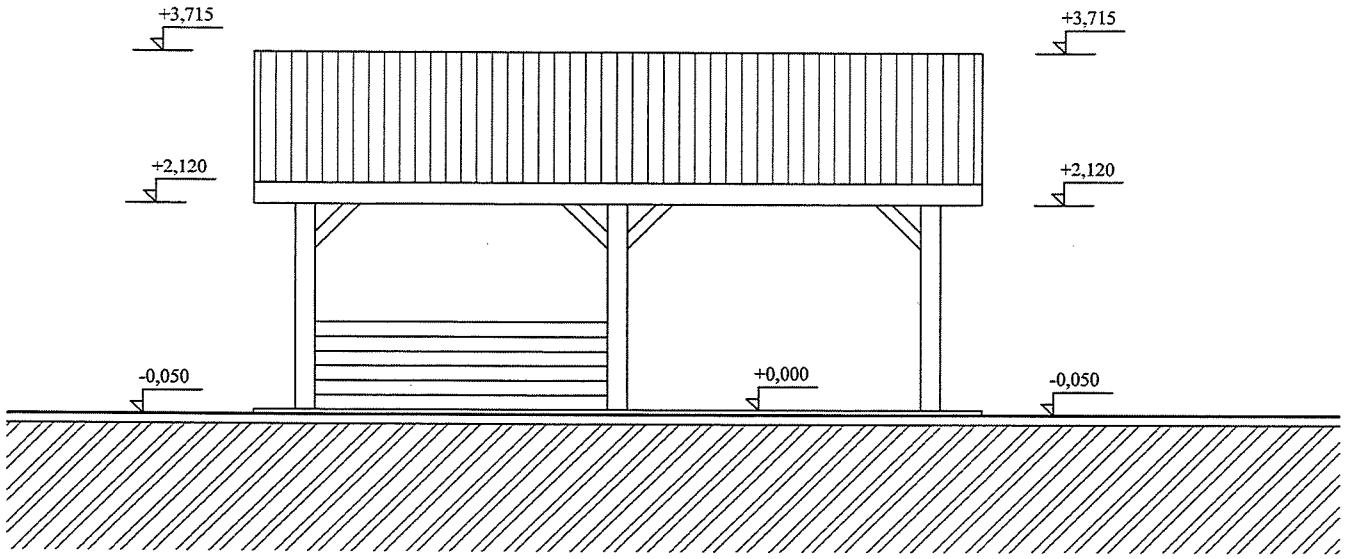

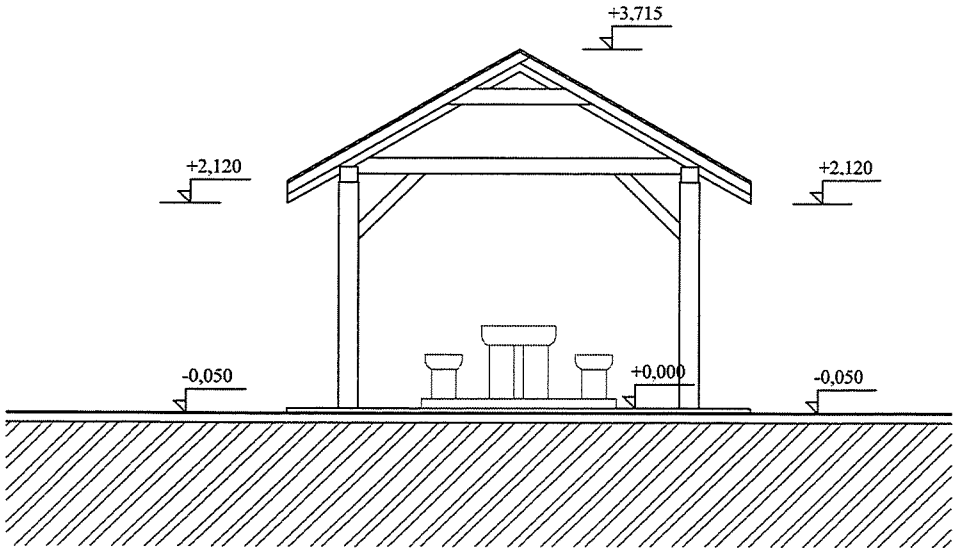

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk


zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*I1


dátum: 09/2022

obsah výkresu:

POHĽAD JUŽNÝ, VÝCHODNÝ

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **8**	formát: **2xA4**

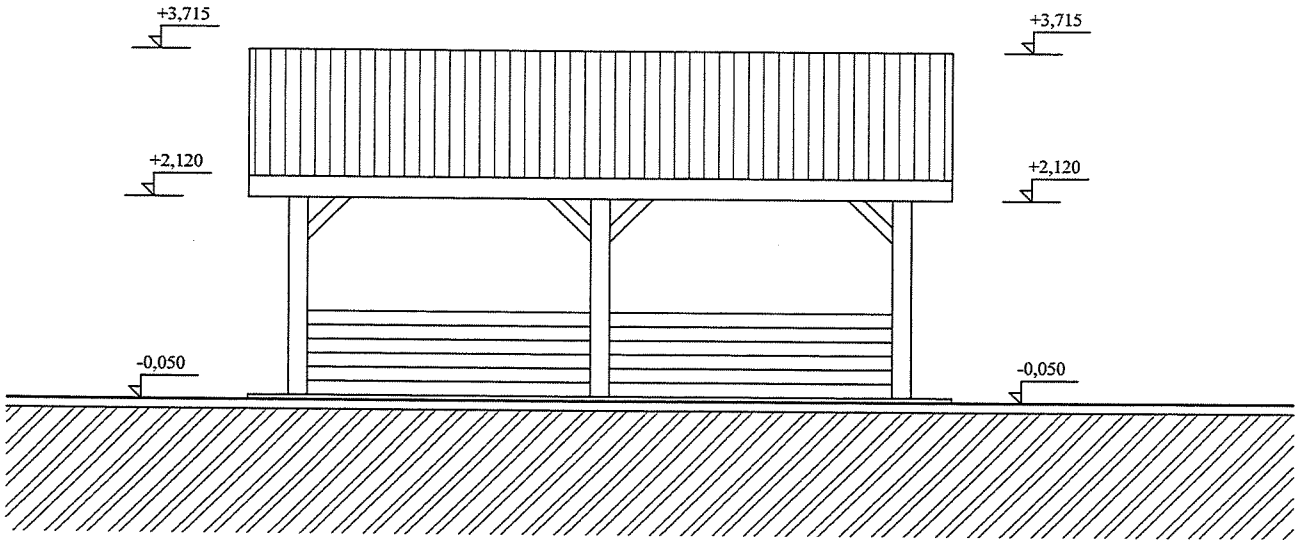

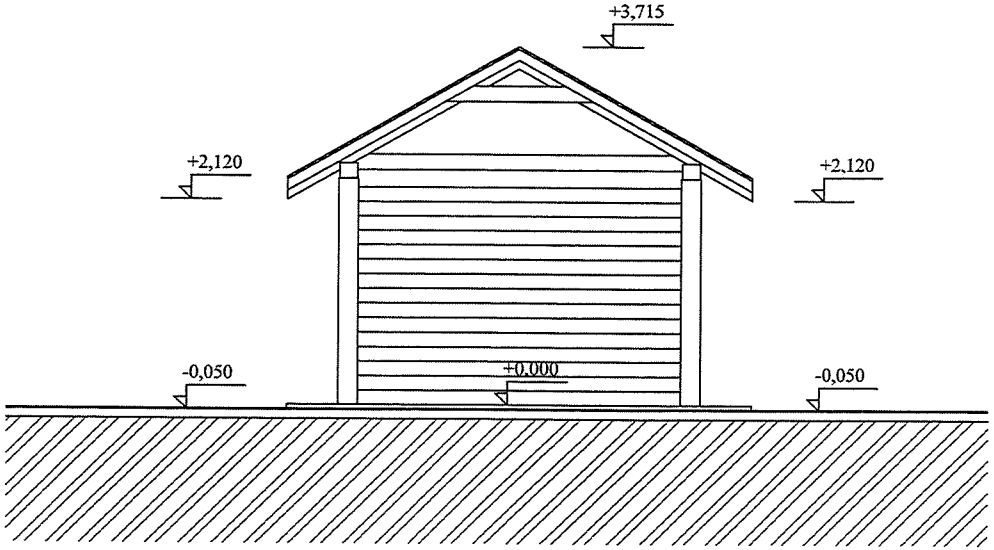

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

názov:

SO-05 - ALTÁNOK - JAVOR POĽANA

miesto stavby

Lesy mesta Spišská Nová Ves

C-KN 929, k.ú. Hnilec

investor

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

vypracoval

Ing. Martin Kráľ
MK2 PLUS, s.r.o.
Nová 182
Liptovský Ján 032 03

www.architekti-kosice.sk

zodpovedný projektant
Ing. MARTIN KRÁĽ
autor. stavebný inž. reg. č. 6585*11

dátum: 09/2022

obsah výkresu:

POHĽAD SEVERNÝ, ZÁPADNÝ

mierka:	**1 : 50**
č. výkresu: **9**	formát: **2xA4**

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065


Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-05 – ALTÁNOK JAVOR POĽANA

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 929, k.ú. Hnilec
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ

www.architekti-kosice.sk

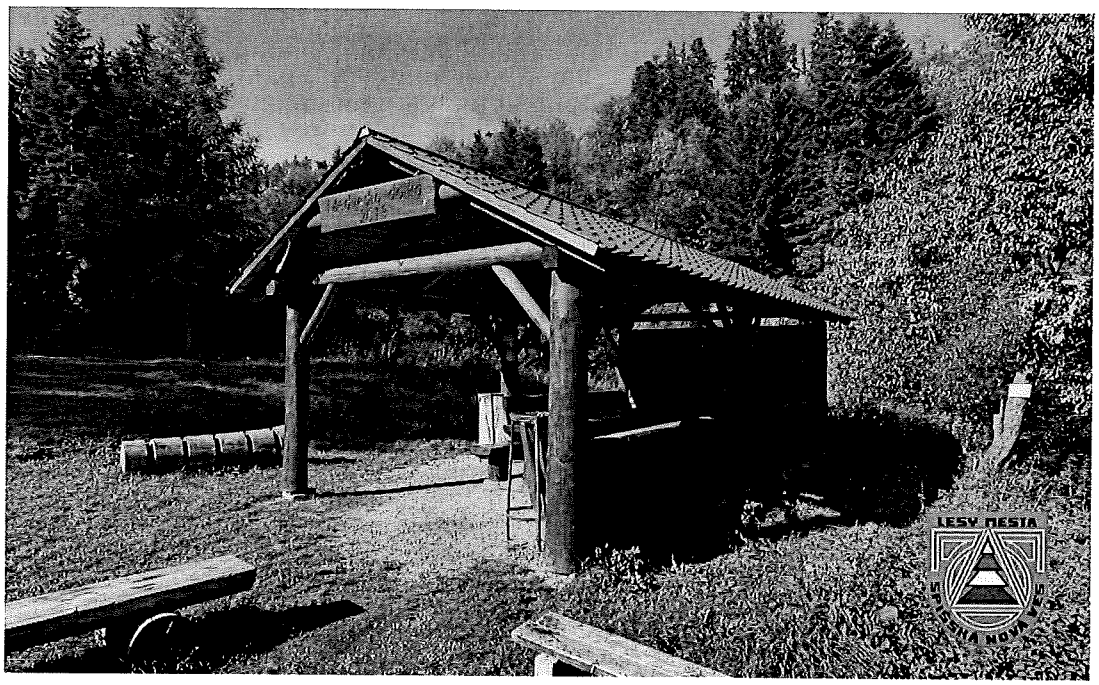

OBSAH:

Technická správa
1. Situácia širšie vzťahy, kat. mapa M=1:10 000, 1:500
2. Situácia – Koordinačný výkres M=1:500
3. Pôdorys, rez základov M=1:50
4. Pôdorys prízemia M=1:50
5. Pôdorys, rez krovu M=1:50
6. Pôdorys, rez strechy M=1:50
7. Rez A-A´, Lavičky, Odpadkový kôš M=1:50, M=1:40, M=1:20
8. Pohľad južný, východný M=1:50
9. Pohľad severný, západný M=1:50

MK2 Plus s.r.o.
Projekčná kancelária Nová 182, 032 03 Liptovský Ján, tel. +421 908 163065

Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV

SO-05 – ALTÁNOK JAVOR POĽANA

(Dokumentácia pre ohlásenie staby)

Technická správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Miesto stavby: Lesy mesta Spišská Nová Ves, C-KN 929, k.ú. Hnilec
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Investor: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta č. 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Projektant: MK2 Plus s.r.o., Nová 182, 032 03 Liptovský Ján
Vypracoval: Ing. Martin Kráľ
www.architekti-kosice.sk

2. Základné údaje:

Projekt rieši výstavbu občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu.

Objekt SO-05 Altánok Javor Poľana je navrhnutý v rámci projektu výstavby občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves, ktorá má nevýrobný charakter a je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstava s dôrazom na športové vyžitie a poznávacie aktivity vo väzbe na okolitú prírodu. Stavebný objekt nebude napojený na inžinierske siete a rieši priestor, ktorý bude využívaný ako odpočívadlo pre cyklistov, aby si mohli odpočinúť, opraviť drobné závady na bicykli, privolať pomoc, upresniť navigáciu, skryť sa pred nepriaznivým počasím a zoznámiť sa údajmi na informačnej tabuli. Zároveň bude v altánku osadené drevené sedenie 2ks, odpadkové koše 2ks a pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami, kde si budú môcť návštevníci pripraviť teplé jedlo a nápoje.

Jedná sa o drevenú drobnú stavbu o rozmere 6,65x3,75m na percele C-KN 929, k.ú. Hnilec.

3. Konštrukčné riešenie:

Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmere 6,65x3,75m a je drevenej konštrukcie, má sedlovú strechu s plechovou krytinou. Obvodový plášť do výšky 0,9m a zadná zrubová stena bude tvorená z guľatiny priemeru Ø 150mm. Objekt je vybavený sedením z masívnej drevenej konštrukcie. Taktiež konštrukcia stolov je masívna drevená. Vodu zo strechy budú zachytávať žľaby z pozinkovaného plechu Ø120mm a dažďové vody budú zvedené na terén.

Založenie objektu je na základových pätkách 800/800mm z prostého betónu v hĺbke 1,0m od úrovne +-0,000. Podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm uložená do zhutneného podkladu z kameniva fr. 4-8 hr. 40mm, fr 4-16 hr. 150mm a fr. 0-63 hr. 100mm.

Kotvenie nosných stĺpov Ø 200mm bude do oceľových pásov. Obvodový plášť zo zrubov bude od podlahy osadený na 50mm oceľovými podložkami. Konštrukcia krovu bude tvorená taktiež z guľatiny.

zastavaná plocha objektu: 24,94m^2
obostavaný priestor: 104,3m^3

4. Skladba podlahy:

- zámková dlažba.....60mm
- kamenivo fr. 4-8.....40mm
- kamenivo fr. 4-16.....150mm
- kamenivo fr. 0-63.....40mm

5. Skladba strechy:

- plechová krytina
- laťovanie.....35/50mm
- krokva.....Ø150mm

6. Starostlivosť o životné prostredie:

Prevádzka realizácie zámeru nebude produkovať odpadové látky zaťažujúce ovzdušie prípadne podzemné vody. Komunálny odpad bude sústreďovaný a vyvážaný v rámci zberu.

Objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dažďové vody budú zvedené do podmoku na pozemku investora.

V zmysle vyhl. 365/2015 Zz. budú počas výstavby vznikať nasledujúce odpady:

170107 zmesi betónu, tehál, škridle	0
170201 drevo	0
170405 železo, oceľ	0
170506 výkopová zemina	0

7. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke:

Pri realizácii stavebných objektov budú realizované jednoduché stavby. Pri realizácii je potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci, vybavenie pracovníkov bezpečnostnými prostriedkami, zabezpečiť odborný dozor pri realizácii a dodržiavať predpisy BOZP.

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle:

- vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonníka práce,
- zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- stavebného zákona č. 237/2000 Z.z.,
- zákona č. 222/1996 o organizovaní miestnej a štátnej správy,
-STN 73 30 50 – Zemné práce.

8. Ochranné pásma:

Pri realizácii stavebných objektov nebudú dotknuté ochranné pásma.

Košice 09/2022

vypracoval: Ing.Martin Kráľ

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1 Identifikačné a základné údaje charakterizujúce stavbu:

Názov stavby:	SO 06 – Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH – odvodnenie
Miesto stavby:	Glocingerka – Borovniak – Žliabky
Katastrálne územie:	Hnilčík
Charakter stavby:	rekonštrukcia
Typ stavby:	inžinierska – 2412 Ostatné športové a rekreačné stavby
Šírka tratí:	2,50 – 10,00 m
Dĺžka tratí:	1 716 m
Povrch tratí:	spevnenie z kameniva
Vlastník pozemkov:	mesto Spišská Nová Ves podľa čl. 7
Kultúra dotknutých pozemkov:	les

2 Identifikačné údaje stavebníka a projektanta stavby:

Názov stavebníka:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Sídlo stavebníka:	053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta Novoveská cesta 9304/28
Názov projektanta:	VIA OPTIMA, spol. s r.o.
Sídlo projektanta:	960 01 Zvolen, ul. Jedľová 1364/1

3 Umiestnenie stavby a popis územia:

Stavba sa nachádza v oblasti Slovenského rudohoria, v západnej časti celku Volovské vrchy, v podcelku Knola, v jej severovýchodnej časti, západne od obce Hnilčík v lokalite Glocingerka, Borovniak a Žliabky. Trasy bežeckých tratí vedú čiastočne po trvalých približovacích lesných cestách v rozsahu do 15 % a cez čiastočne spevnené lesné cesty triedy 2L a 3L sú napojené na verejnú komunikáciu II/533.

Umiestnenie trás lyžiarskych bežeckých tratí navrhovaných na rekonštrukciu je znázornené v prílohe 2 „Prehľadná situácia". Trasy bežeckých tratí sa nachádzajú v nadmorskej výške 839 – 1030 m. Územie je charakteru pahorkatinného, vegetáciu tvoria ihličnaté porasty s prevažným zastúpením dreviny smrek.

4 Východiskový stav a zdôvodnenie stavby:

Podkladom pre spracovanie projektu bola terénna obhliadka so zameraním na stav odvodnenia a únosnosti lyžiarskych bežeckých tratí v predmetnej lokalite. Stavebník tiež poskytol projektantovi lesnícku porastovú mapu v mierke 1 : 10 000. Počas terénnej obhliadky sa konštatovalo, že trasy lyžiarskych bežeckých tratí vedú čiastočne po trvalých približovacích lesných cestách v rozsahu do 15 %, pričom sú trate bez akéhokoľvek odvodnenia. Voda z okolitého terénu tečie priamo na bežecké trate, pretože ich povrch sa nachádza pod úrovňou priľahlého terénu a následne na ich pláni povrchová voda vytvára erózne ryhy, stojace mláky a podmáča ich pláň a podložie. K podmáčaniu pláne a podložia intenzívnejšie dochádza v miestach kríženia sezónnych drobných vodných tokov. V podmáčaných úsekoch trás

lyžiarskych bežeckých tratí je únosnosť pláne znížená do takej miery, že ani počas snehovej pokrývky ich nie je možné udržiavať pásovou technikou.

Uvedené nedostatky odvodnenia a únosnosti lyžiarskych bežeckých tratí sa stavebník rozhodol koncepčne riešiť ich rekonštrukciou zahŕňajúcou ich spevnenie, vybudovanie pozdĺžneho a priečneho odvodnenia a v miestach kríženia drobných vodných tokov aj vybudovanie rúrových priepustov.

5 Členenie stavby:

Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné ju členiť na jednotlivé stavebné objekty. Projektová dokumentácia rekonštrukcie je spracovaná ako jednotný celok na úrovni pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby.

6 Vecné a časové väzby stavby:

Rekonštrukcia tratí sa bude realizovať nezávisle od akejkoľvek inej výstavby a neobmedzí prevádzku na priľahlých pozemkoch. Z časového hľadiska stavba nebude viazaná voči iným stavbám.

7 Prehľad vlastníkov a užívateľov pozemkov:

Rekonštrukcia cesty sa bude uskutočňovať v k.ú. Hnilčík na nasledovných parcelách:

Register:	**Číslo parcely:**	**č. LV:**	**vlastník/správca:**
KN-C	1133, 1336, 1339, 1341	665	mesto Sp. Nová Ves
KN-E	3-8647/1, 3-8648, 3-8649, 3-8654	1034	mesto Sp. Nová Ves

Prístup na stavenisko je z cesty II/533 a po čiastočne spevnených lesných cestách triedy 2L a 3L, na ktoré sa trasy predmetných bežeckých tratí napájajú. Skládky materiálov sa nepredpokladajú. Počas realizácie stavebných prác bude na trasy bežeckých tratí obmedzený prístup.

8 Prevádzkovanie stavby a jej vplyvy:

Lyžiarske bežecké trate sú účelové komunikácie slúžiace pre športové a rekreačné vyžitie rekreantov pri využívaní účelovej funkcie prímestských lesov. Bezpečnosť premávky na nich sa bude zabezpečovať v súlade s nariadeniami a pokynmi prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ tiež upozorní na prípadné aktuálne obmedzenia týkajúce sa bezpečnosti premávky.

Rekonštrukcia lyžiarskych bežeckých tratí bude realizovaná po jestvujúcich trvalých približovacích lesných cestách. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. a „Katalógu odpadov" vznikne pri realizácii stavby odpad, s ktorým sa naloží nasledovne:

17 01 01	Betón (z búrania rúrových priepustov)	13,33 t	recyklácia do nestmelených vrstiev vozovky - zhodnotenie R5	O
03 03 01	Odpad z dreva (pne, korene)	56 ks	miesto uskladnenia určí stavebník	O
03 03 01	Odpad z dreva (krovie)	475 m^2	miesto uskladnenia určí stavebník	O
17 02 03	Plasty (zo zrezaných koncov priepustov)	164 kg	odvoz na skládku – uskladnenie D1	O
17 05 06	Výkopová zemina - čistá	529,14 m^3	rozprestretie nad výkopovým svahom priekopy a v priľahlých lesných porastoch v šírke do 6,0 m a v priemernej hrúbke do 25 cm	O

Poznámka:
O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy
N - Nebezpečný odpad

Rozprestretím zeminy v priľahlých lesných porastoch spôsobom akým sa navrhuje nedôjde ku podstatnej zmene ekologickej stability krajiny, nakoľko sa predpokladá, že uložená zemina prerastie vegetáciou autochtónnych druhov. Nedôjde tiež ku zmene vzhľadu krajiny, k zmene jej využitia a nezmenia sa ani odtokové pomery v území.

Rekonštrukcia lyžiarskych bežeckých tratí sa bude realizovať v území s prvým, všeobecným, stupňom ochrany prírody v zmysle zákona 543/2002 Z.z. a možno ju charakterizovať ako šetrnú k okolitému prostrediu, jej realizáciou sa zamedzí erózii, ktorá v súčasnosti na tratiach prebieha. Prevádzkovaním lyžiarskych bežeckých tratí nedôjde k negatívnym vplyvom na okolie.

Zvolen, november 2022

TECHNICKÁ SPRÁVA

1 Technické parametre cesty:

Dĺžka tratí:

Glocingerka – Borovniak	1 203 m		
Glocingerka – Hliníky	534 m	z toho upravované:	173 m
Glocingerka – Prepojka	101 m		
Zelený vrch	239 m		
Spolu:	**2077 m**	**z toho upravované:**	**1716 m**

Šírka tratí:	2,50 – 10,00 m
Povrch tratí:	spevnenie z kameniva
Odvodnenie cesty:	zemné priekopy, prefabrikované odrážky – 30 ks
Objekty:	rúrové priepusty – 7 ks

2 Umiestnenie a popis smeru bežeckých tratí:

Umiestnenie lyžiarskych bežeckých tratí je znázornené v prílohe 2 „Prehľadná situácia". Trasa bežeckej trate **Glocingerka – Borovniak** sa začiatkom napája na jestvujúcu čiastočne spevnenú lesnú odvoznú cestu triedy 2L v JPRL 435, trasa pokračuje smerom na severovýchod cez JPRL 434, 433, 425, 428 a 424, kde za križením potoka Borovniak končí. Dĺžka trasy je 1 203 m.

Trasa bežeckej trate **Glocingerka – Hliníky** sa ľavostranným výjazdom napája na trasu Glocingerka – Borovniak v staničení km 0,420, trasa pokračuje smerom na západ cez JPRL 406, 409 a 407, kde napojením na trvalú približovaciu lesnú cestu končí. Dĺžka trasy je 534 m, spevnenie a odvodnenie sa navrhuje v len úsekoch km 0,116 – 0,193; km 0,216 – 0,272 a km 0,432 – 0,502 (dĺ. 173 m).

Trasa bežeckej trate **Glocingerka – Prepojka** sa začiatkom napája na rovnakú jestvujúcu čiastočne spevnenú lesnú odvoznú cestu triedy 2L ako trasa Glocingerka – Borovniak v JPRL 440, trasa vedie smerom na juhozápad a koncom sa napája taktiež na trvalú približovaciu lesnú cestu. Dĺžka trasy je 101 m.

Trasa bežeckej trate **Zelený vrch** sa začiatkom napája na trvalú približovaciu lesnú cestu na rozhraní lúky a lesného porastu v lokalite Žliabky a vedie smerom na sever cez JPRL 444 a 445. Dĺžka trasy je 239 m.

3 Návrh priečneho usporiadania a spevnenia bežeckých tratí:

Návrh priečneho tvaru lyžiarskych bežeckých tratí v jednotlivých úsekoch je znázornený v prílohe 3 „Vzorové priečne rezy". Šírka tratí je 2,50 m s rozšíreniami podľa jestvujúceho stavu. Priečny sklon spevnenia tratí je 3,0 %. Sklony svahov telesa trratí sú navrhnuté vo výkope 1:1 a v násype 1:1,5. Inžinierskogeologický prieskum zadávateľ projektovej dokumentácie neposkytol a ani nepožadoval spracovať ho. Sklony výkopových a násypových svahov boli preto navrhnuté podľa sklonu stabilných svahov na priľahlých lesných cestách.

Návrh spevnenia lesných bežeckých tratí:

S ohľadom na charakter podložia, ktoré je podmáčané a s mimoriadne zníženou únosnosťou, ďalej v zmysle STN 73 6126, čl. 5.3.2 sa taktiež nedá predpokladať splnenie kritéria na zamedzenie vzájomnej infiltrácie nestmelenej vrstvy a materiálu konštrukčnej pláne, sa preto navrhuje ochranná vrstva spevnenia oddeliť separačno-výstužnou geotextíliou a spodná podkladová vrstva vystužiť geomrežou. Návrh spevnenia bežeckých tratí je znázornený a popísaný v prílohe 3 „Vzorové priečne rezy".

Návrhový parameter zhutnenia zemnej pláne sa nepredpisuje, nakoľko sa predpokladá, že v daných podmienkach nebude merateľný.

Priebeh šírky spevnenia tratí, úsekov rozšírenia a výpočet výmer spevnenia sú uvedené v tabuľke 2, prílohy 5 – "Výkaz výmer".

4 Odvodnenie bežeckých tratí:

Priečne odvodnenie lyžiarskych bežeckých tratí zabezpečuje priečny sklon navrhovaného spevnenia 3,0 % smerom na násypový svah alebo voľne do klesajúceho priľahlého terénu. V úsekoch tratí s pozdĺžnym sklonom nad 4 % sa navrhujú odrážky z prefabrikovaných železobetónových žľabov s rozostupom 28 – 91 m a vyústením na násypovú stranu telesa cesty alebo voľne do klesajúceho priľahlého terénu. Celková dĺžka navrhovaných odrážok je 150,0 m. Pre zabezpečenie rozptýlenia zachyteného povrchového odtoku do priľahlého terénu sa navrhuje pod výtokovým koncom odrážok vybudovať zemné priekopy s priemernou hĺbkou dna 30 cm pod úrovňou priľahlého terénu a sklonom svahov 1:1. Odrážky z prefabrikovaných železobetónových žľabov sa navrhujú vybudovať na bežeckých tratiach Glocingerka – Borovniak a Zelený vrch v počte 30 ks s nasledovnými parametrami:

Číslo	Staničenie (km)	Orientácia (L=>P / P=>L)	Dĺžka (m)		Objem výkopu (m^3)	Poznámka
			Odrážky	Priekopy		
Glocingerka - Borovniak						
1.	0.068	P => L	5.0		1.50	
2.	0.116	P => L	5.0		1.50	
3.	0.164	P => L	5.0		1.50	
4.	0.211	P => L	5.0		1.50	
5.	0.258	P => L	5.0		1.50	
6.	0.303	P => L	5.0		1.50	
7.	0.331	L => P	5.0	4.0	2.30	
8.	0.383	L => P	5.0	3.0	2.10	
9.	0.420	L => P	5.0	1.0	1.70	
10.	0.461	L => P	5.0	1.0	1.70	
11.	0.506	L => P	5.0	5.0	2.50	
12.	0.540	L => P	5.0	6.0	2.70	
13.	0.603	L => P	5.0	6.0	2.70	
14.	0.658	L => P	5.0	3.0	2.10	
15.	0.710	L => P	5.0	2.0	1.90	
16.	0.760	L => P	5.0	9.0	3.30	
17.	0.808	L => P	5.0	3.0	2.10	
18.	0.873	L => P	5.0	3.0	2.10	
19.	0.900	L => P	5.0	2.0	1.90	
20.	0.944	L => P	5.0	1.0	1.70	
21.	0.984	L => P	5.0	0.0	1.50	
22.	1.037	P => L	5.0	1.0	1.70	pinga
23.	1.074	L => P	5.0	0.0	1.50	
24.	1.165	P => L	5.0	1.0	1.70	
25.	1.203	L => P	5.0	3.0	2.10	odstrániť jestvujúcu drevenú odrážku - dĺ. 5 m
Zelený vrch						
1.	0.005	P => L	5.0	14.0	4.30	
2.	0.062	L => P	5.0	10.0	3.50	
3.	0.125	L => P	5.0	5.0	2.50	
4.	0.184	L => P	5.0	11.0	3.70	
5.	0.239	L => P	5.0	9.0	3.30	
Spolu:			**150.0**	**103.0**	**65.60**	**Počet žľabov: 60 ks**

Konštrukcia odrážky z prefabrikovaných železobetónových žľabov je zobrazená v prílohe 4 „Odvodňovacie objekty".

Na zabezpečenie **pozdĺžneho odvodnenia** podmočeného zemného telesa lyžiarskych bežeckých tratí sa vo výkope navrhujú otvorené lichobežníkové priekopy s umiestnením dna 30 cm pod úrovňou upravenej zemnej pláne na trase bežeckej trate Glocingerka – Borovniak v úseku km 0,068 – 0,305 vľavo a na trase bežeckej trate Glocingerka – Hliníky taktiež vľavo v úsekoch km 0,116 – 0,193; km 0,216 – 0,272; km 0,283 – 0,303 a km 0,432 – 0,502. Tvar a umiestnenie priekop sú zobrazené a popísané v prílohe 3 – „Vzorové priečne rezy".

4.1 Rúrové priepusty

Na bežeckej trati Glocingerka – Borovniak sa navrhujú vybudovať dva rúrové priepusty s nasledovnými parametrami:

Číslo	Staničenie (km)	Typ	Priemer (mm)	Dĺžka (m)	Uhol kríženia	Poznámka
1.	0.305	HDPE SN 8	500	5.0	$\alpha = 105°$	jednosmerné napojenie vtoku priekopy
2.	1.171	HDPE SN 8	800	13.0	$\alpha = 100°$	na potoku Borovniak bez napojenia priekopy

A na bežeckej trati Glocingerka – Hliníky sa navrhuje vybudovať päť rúrových priepustov s nasledovnými parametrami:

Číslo	Staničenie (km)	Typ	Priemer (mm)	Dĺžka (m)	Uhol kríženia	Poznámka
3.	0.188	HDPE SN 8	500	5.0	$\alpha = 100°$	jednosmerné napojenie priameho vtoku priekopy
4.	0.263	HDPE SN 8	500	5.0	$\alpha = 100°$	jednosmerné napojenie priameho vtoku priekopy
5.	0.291	HDPE SN 8	500	5.0	$\alpha = 90°$	obojsmerné napojenie priameho vtoku priekopy
6.	0.461	HDPE SN 8	500	5.0	$\alpha = 90°$	obojsmerné napojenie priameho vtoku priekopy
7.	0.485	HDPE SN 8	500	5.0	$\alpha = 90°$	obojsmerné napojenie priameho vtoku priekopy

Vzorové konštrukčné riešenia rúrových priepustov z rúr HDPE SN 8 s priamym vtokom so stálym prietokom vody, s priamym vtokom z lichobežníkovej priekopy a s priamym vtokom z lichobežníkovej priekopy s obojsmerným napojením priekopy sú zobrazené v prílohe 4 „Odvodňovacie objekty" vo výkresoch vzorových rúrových priepustov. Pozdĺžne rezy jednotlivých priepustov sú zobrazené v rovnakej prílohe. Kapacitné posúdenia prietokového profilu priepustu v mieste kríženia potoka Borovniak na trase Glocingerka – Borovniak (staničenie km 1,171) je uvedené v prílohe 1 tejto správy.

5 Technológia prác:

Práce na stavbe z hľadiska použitia jednotlivých technológií nebudú náročné a pôjde o tieto hlavné práce:

- zemné práce pre úpravu pláne a vybudovanie odvodňovacích priekop v priemernom rozsahu 0,23 m^3 na 1 bežný meter trate a výkop rýh pre osadenie rúrových priepustov,
- osadenie rúrových priepustov,
- rozprestretie geotextílií a geomreží,
- osadenie prefabrikovaných odrážok a drevených smerových kolov
- vybudovanie vrstiev spevnenia z kameniva.

5.1 Zemné práce

Na trasách bežeckých tratí sa vo výkope predpokladá zemina triedy 4 v rozsahu 100 %, čo úhrnom predstavuje 558,13 m^3. Nakoľko inžinierskogeologický prieskum obstarávateľ projektovej dokumentácie neposkytol a ani ho nepožadoval spracovať, bolo toto zatriedenie odhadnuté v teréne vizuálne na základe odkrytých výkopov jestvujúcich trvalých približovacích lesných ciest v predmetnej lokalite.

Prebytočná zemina z výkopu v množstve 529,14 m^3 sa priebežne rozprestretie nad výkopovým svahom priekopy a v priľahlých lesných porastoch v šírke do 6,0 m a v priemernej hrúbke do 25 cm. Miesto na uloženie pňov určí stavebník.

6 Ochranné a bezpečnostné zariadenia:

Drevené smerové koly je potrebné osadiť na trase Glocingerka – Borvnia pri navrhovanom rúrovom priepuste v staničení km 1,171 v počte 4 ks. Rozmery drevených smerových kolov sú nasledovné: dĺžka 1600 mm, priemer 125 – 175 mm, hĺbka zapustenia 500 mm. Smerové koly sa vyrobia z odkôrnenej guľatiny a ošetria sa fungicídnym prípravkom a na vrchnej strane sa natrú červenou farbou v páse šírky 20 cm.

7 Staveniskové zariadenia:

Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné samostatne riešiť staveniskové zariadenia. Skládky materiálov sa nepredpokladajú. V prípade, že by bolo potrebné uskladniť dielce priepustov a prefabrikované žľaby, tak tieto sa môžu uložiť na priľahlých lesných skladoch. Ostatný materiál (štrkodrvina, kameň, ap.) sa zabudujú priamo na stavenisku. Prístup na stavenisko je z cesty II/533 a po čiastočne spevnených lesných cestách triedy 2L a 3L, na ktoré sa predmetné bežecké trate napájajú. Zdroj úžitkovej vody je z potoka Borovniak. Zdroj elektrickej energie sa na trasách lyžiarskych bežeckých tratí nenachádza.

8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci počas výstavby:

Pri doprave materiálov na pozemných komunikáciách musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Realizáciu stavebných prác s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je nutné vykonávať v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (vyhl. č. 46/2014 Z.z. a vyhl. č. 100/2015 Z.z.); nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (zák. č. 154/2013 Z.z.).

Stavebné práce je nutné realizovať v zmysle platných STN a pri realizácii stavby je nevyhnutné rešpektovať platný projekt stavby, pripomienky orgánov štátnej správy a podmienky stanovené pri stavebnom konaní. Všetky zmeny a doplnky schváleného projektu sa musia konzultovať s projektantom a stavebníkom a musia byť písomne zdokumentované v stavebnom denníku stavby.

Pred začatím stavebných prác je potrebné overiť a presne vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami, a to i siete nezakreslené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. Počas realizácie sa musia rešpektovať vyjadrenia správcov sietí a jednotlivé siete sa musia ochrániť v zmysle týchto vyjadrení. Prípadné výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Prípadné preložky inžinierskych sietí je možné vykonávať iba so súhlasom ich správcu v dohodnutých termínoch a to osobami, resp. organizáciami na to oprávnenými (STN 73 6005).


9 Podklady:

Návrh bol spracovaný na základe terénneho merania vykonaného v mesiaci september 2022 na vtedy existujúci stav.

Zvolen, november 2022

PRÍLOHA 1


Hydrotechnické výpočty

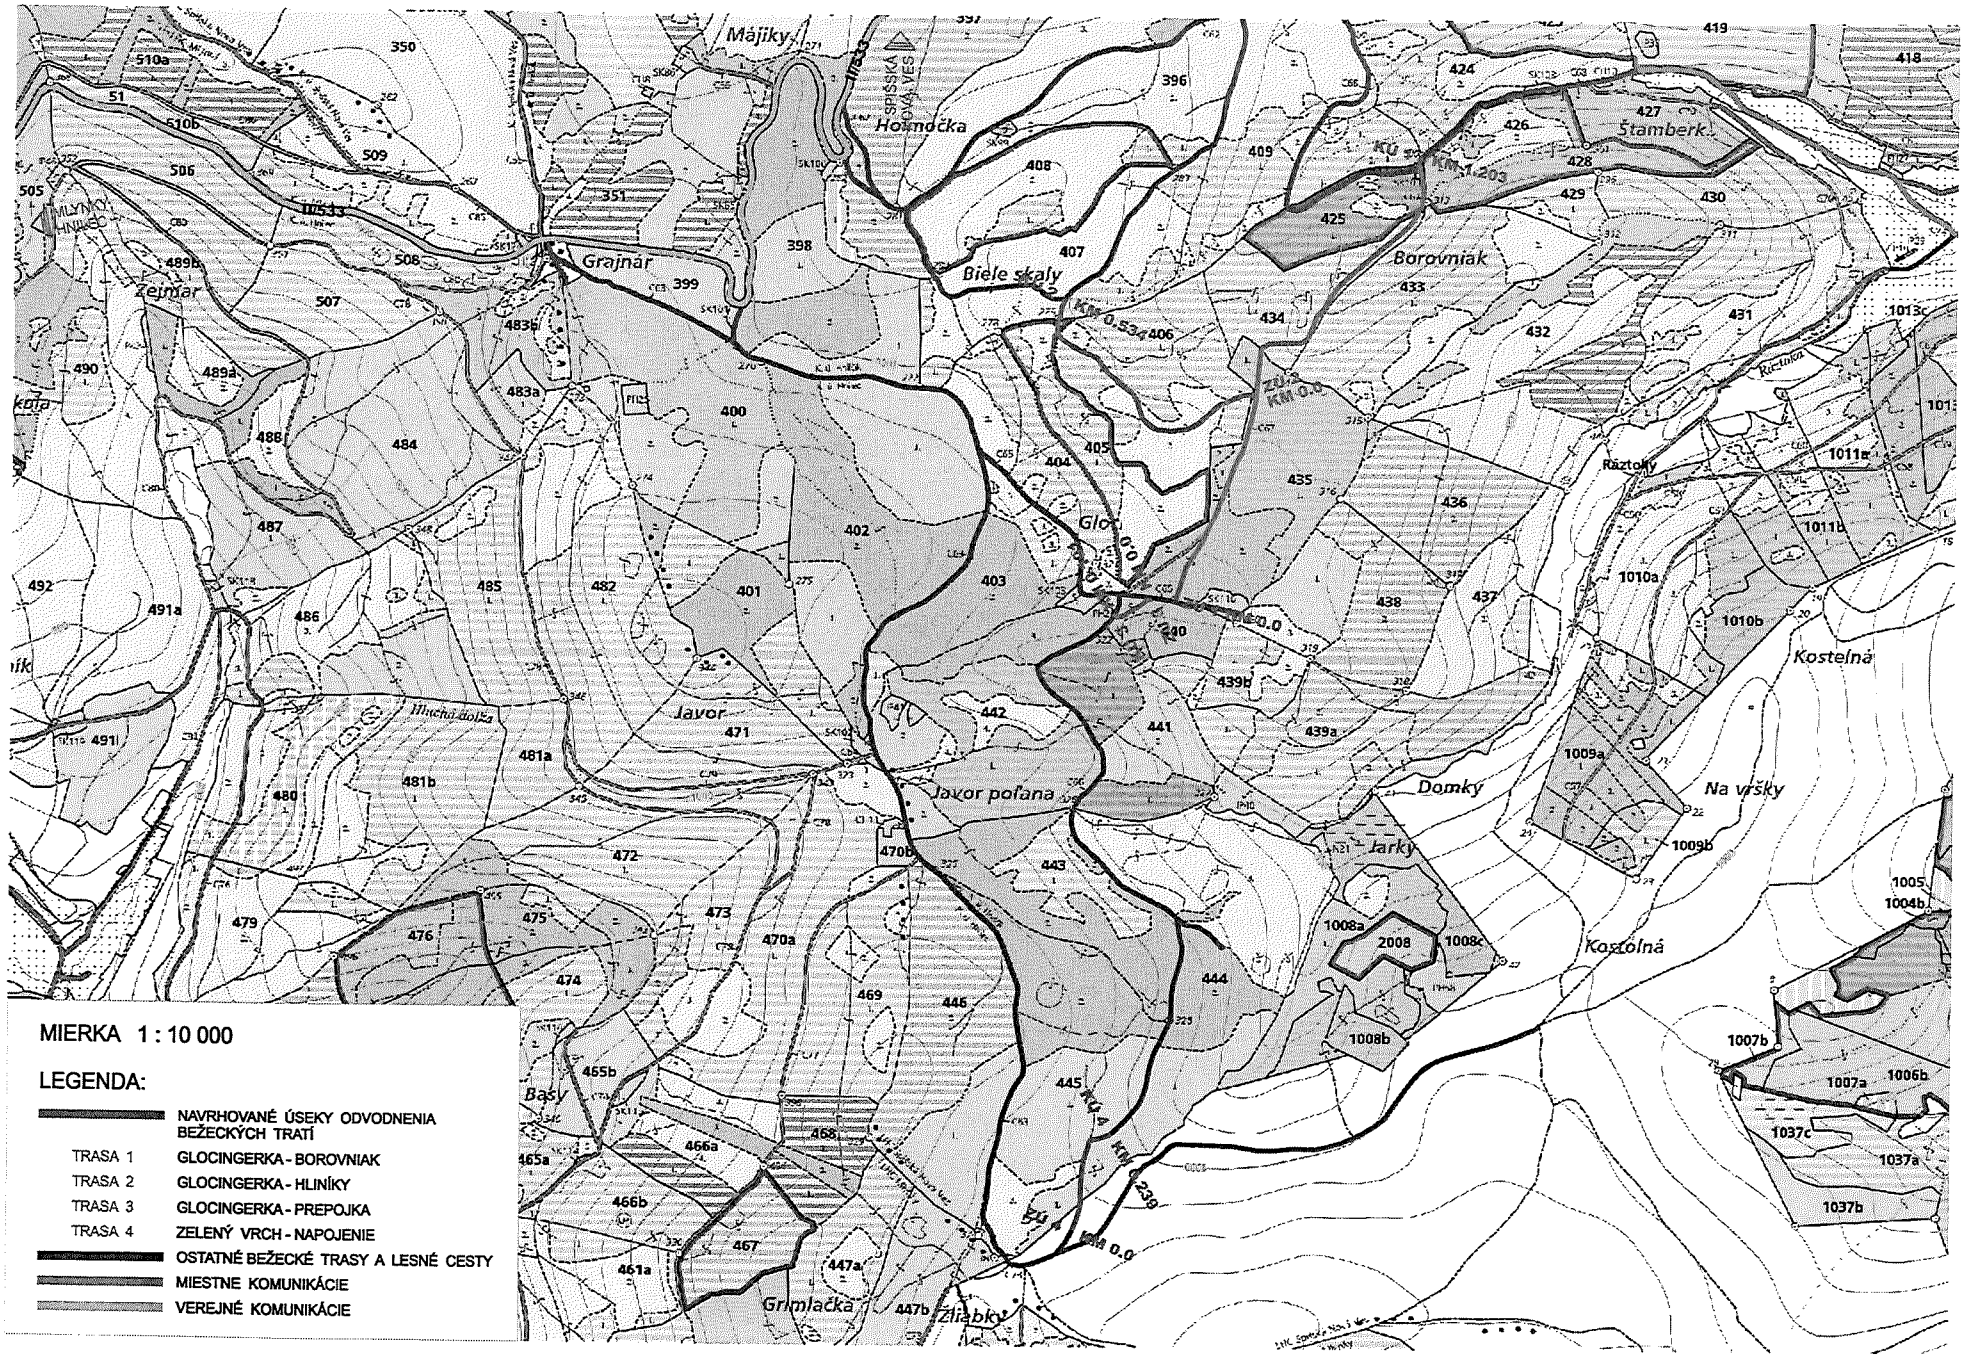
Majíky
Hôrnočka
Štamberk
Grajnár
Zejmar
Biele skaly
Borovniak
Javor
Javor poľana
Hlboká dolina
Kostelná
Domky
Na vŕšky
Jarky
Kostelná
Bašy
Grimlačka
Žľabky
MIERKA 1 : 10 000
LEGENDA:
NAVRHOVANÉ ÚSEKY ODVODNENIA BEŽECKÝCH TRATÍ
TRASA 1 GLOCINGERKA - BOROVNIAK
TRASA 2 GLOCINGERKA - HLINÍKY
TRASA 3 GLOCINGERKA - PREPOJKA
TRASA 4 ZELENÝ VRCH - NAPOJENIE
OSTATNÉ BEŽECKÉ TRASY A LESNÉ CESTY
MIESTNE KOMUNIKÁCIE
VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE

VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 1

TRASA GLOCINGERKA - BOROVNIAK V ÚSEKOCH: KM 0.000 - 0.068; KM 0.310 - 1.145 A KM 1.189 - 1.203
TRASA ZELENÝ VRCH V ÚSEKU: KM 0.000 - 0.239

M 1 : 50

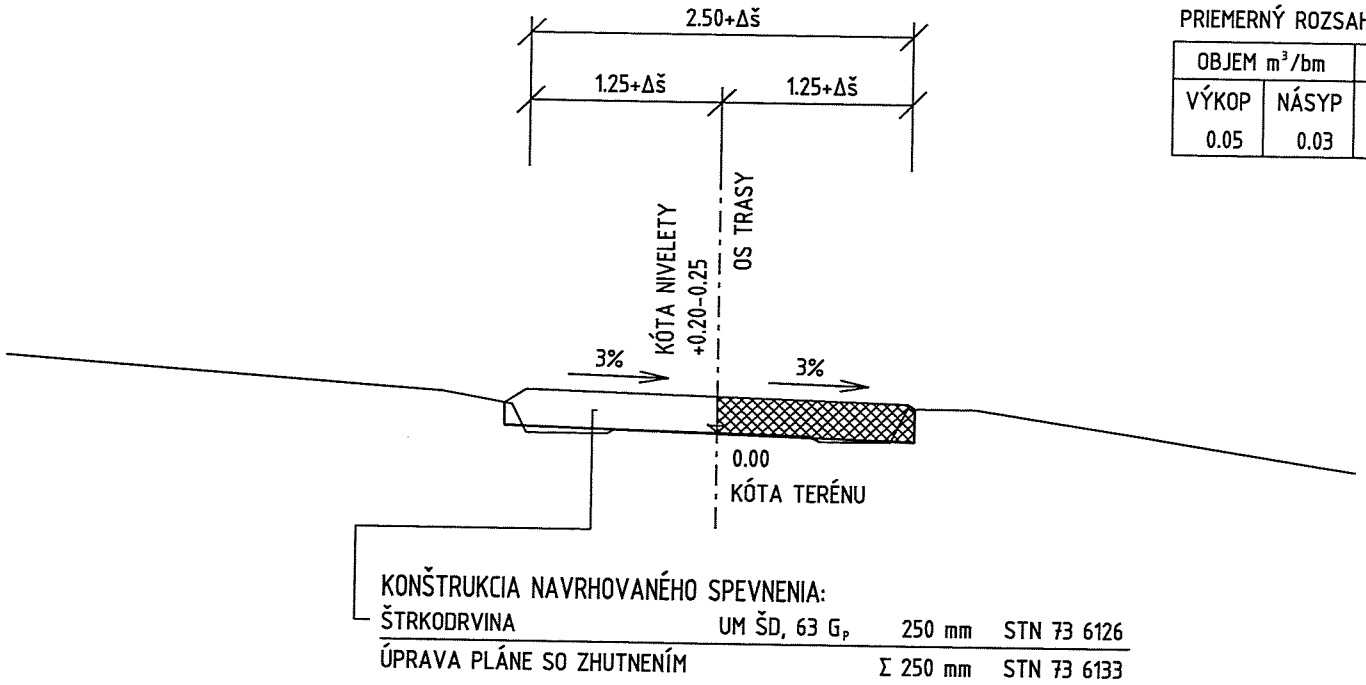

PRIEMERNÝ ROZSAH ZEMNÝCH PRÁC


OBJEM m^3/bm		PLOCHA m^2/bm		
VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP	NÁSYP	PLÁŇ
0.05	0.03	0.00	0.25	2.70

POZNÁMKY: 1. PRIEBEH ŠÍRKY VOZOVKY V ÚSEKOCH JENOTLIVÝCH TRÁS A VÝPOČET VÝMER JEJ KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV SÚ POPÍSANÉ V TAB. 2, PRÍLOHY 5 - VÝKAZ VÝMER.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 2

TRASA GLOCINGERKA - BOROVNIAK V ÚSEKOCH: KM 0.068 - 0.272 A KM 0.305 - 0.310

M 1 : 50

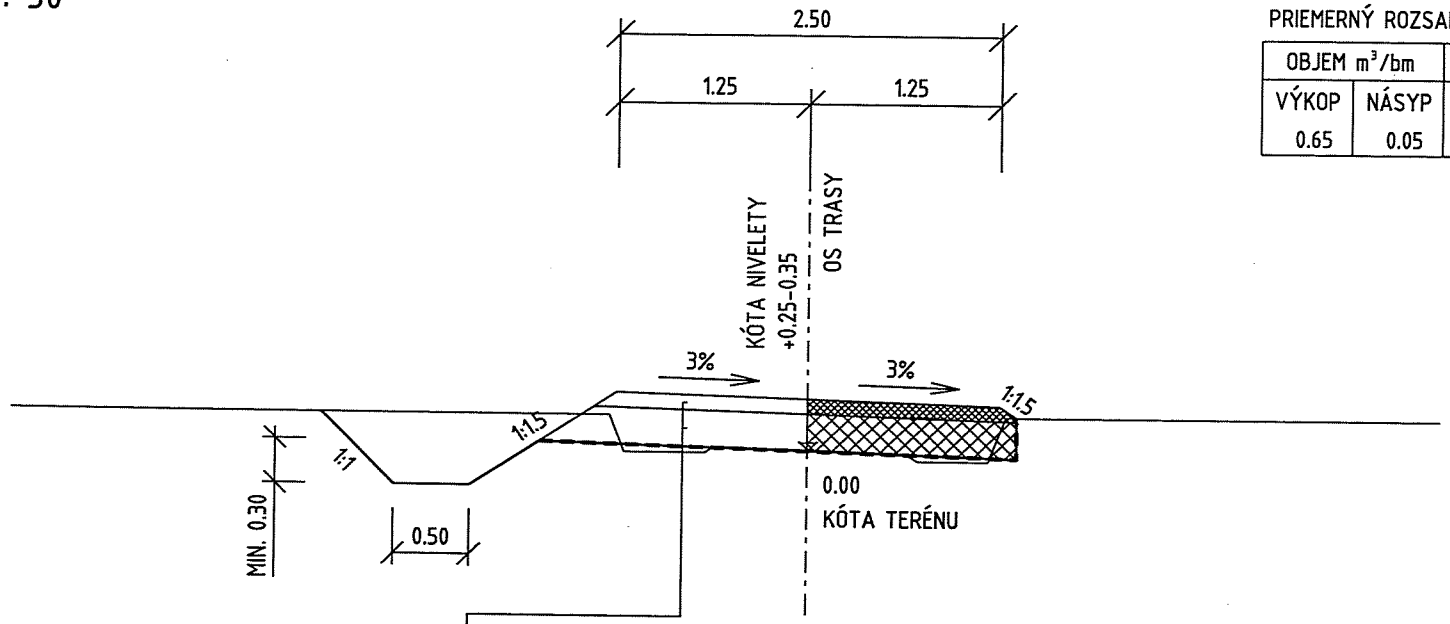

PRIEMERNÝ ROZSAH ZEMNÝCH PRÁC

OBJEM m^3/bm		PLOCHA m^2/bm		
VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP	NÁSYP	PLÁŇ
0.65	0.05	1.75	0.80	3.15

KONŠTRUKCIA NAVRHOVANÉHO SPEVNENIA:


KRYT ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 31.5 G_c	100 mm	STN 73 6126
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO	UM HDK 32-63	250 mm	STN 73 6126
VÝSTUŽNÁ DVOJOSÁ GEOMREŽA	ŤAHOVÁ PEVNOSŤ 30 kN/m		EN ISO 10319
SEPARAČNO-VÝSTUŽNÁ GEOTEXTÍLIA	25/25 kN/m, CBR MIN. 3.0 kN		EN ISO 10319
ÚPRAVA PLÁNE SO ZHUTNENÍM		Σ 350 mm	STN 73 6133

POZNÁMKY: 1. ŠÍRKA PREKRYTIA GEOTEXTÍLIE SA NAVRHUJE 500 mm A ŠÍRKA PREKRYTIA GEOMREŽE SA NAVRHUJE 300 mm,
2. PRESAH GEOTEXTÍLIE A GEOMREŽE PO STRANE VPRACO SA NARHUJE 250 mm.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 3

TRASA GLOCINGERKA - BOROVNIAK V ÚSEKU: KM 0.272 - 0.305

M 1 : 50

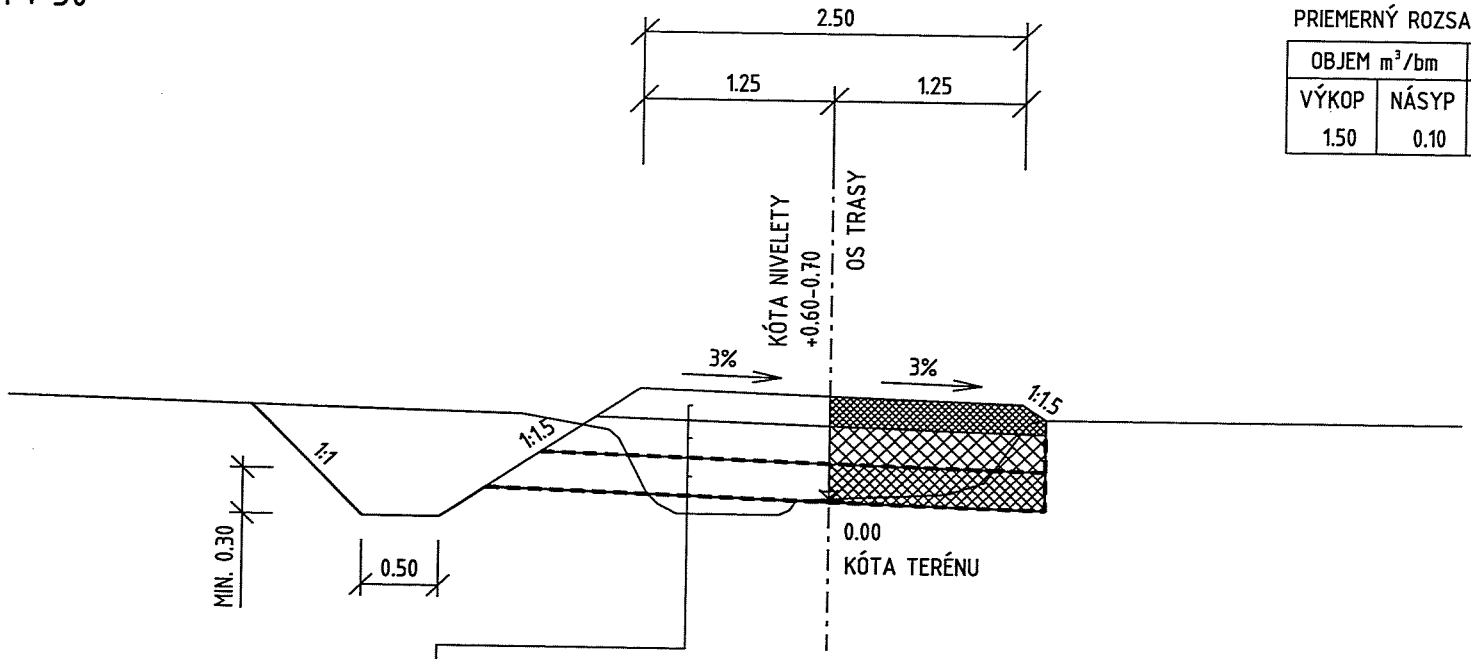

PRIEMERNÝ ROZSAH ZEMNÝCH PRÁC

OBJEM m^3/bm		PLOCHA m^2/bm		
VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP	NÁSYP	PLÁŇ
1.50	0.10	1.90	1.40	3.70

KONŠTRUKCIA NAVRHOVANÉHO SPEVNENIA:


KRYT ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 31.5 G_c	200 mm	STN 73 6126
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO	UM HDK 32-63	250 mm	STN 73 6126
VÝSTUŽNÁ DVOJOSÁ GEOMREŽA	ŤAHOVÁ PEVNOSŤ 30 kN/m		EN ISO 10319
OCHRANNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 63 G_p	250 mm	STN 73 6126
SEPARAČNO-VÝSTUŽNÁ GEOTEXTÍLIA	25/25 kN/m, CBR MIN. 3.0 kN		EN ISO 10319
ÚPRAVA PLÁNE SO ZHUTNENÍM		Σ 700 mm	STN 73 6133

POZNÁMKY: 1. ŠÍRKA PREKRYTIA GEOTEXTÍLIE SA NAVRHUJE 500 mm A ŠÍRKA PREKRYTIA GEOMREŽE SA NAVRHUJE 300 mm,
2. PRESAH GEOTEXTÍLIE A GEOMREŽE PO STRANE VPRACO SA NARHUJE 250 mm.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 4

TRASA GLOCINGERKA - BOROVNIAK V ÚSEKOCH: KM 1.145 - 1.156 A KM 1.181 - 1.189

M 1 : 50

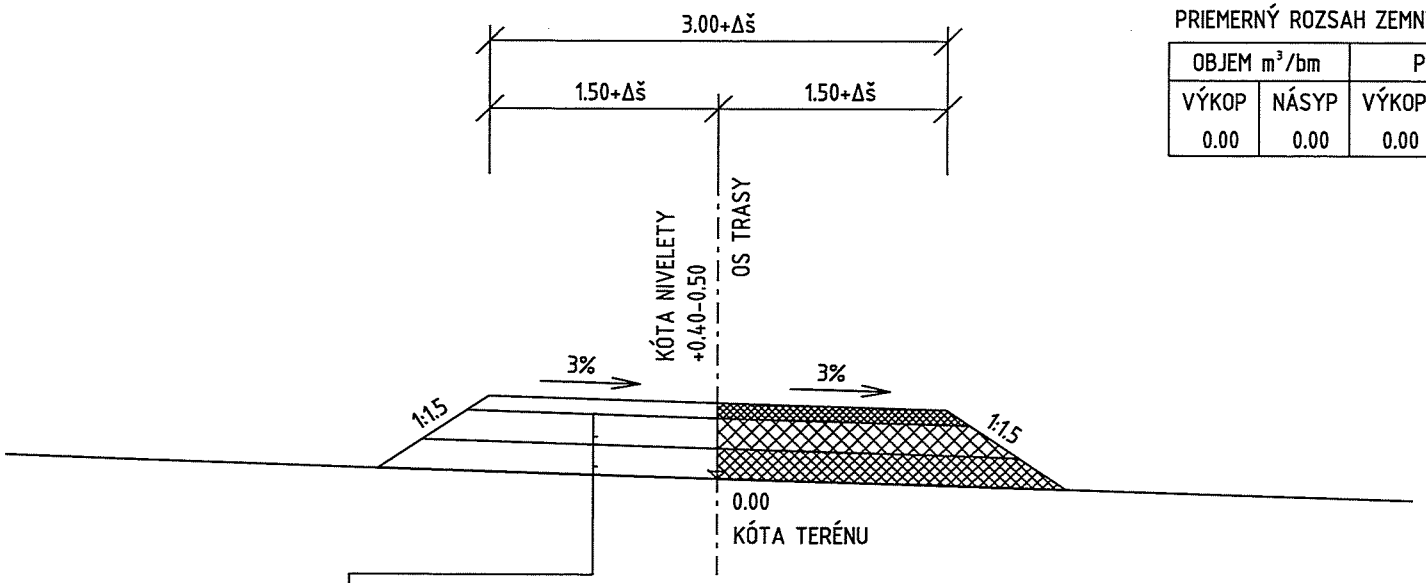

PRIEMERNÝ ROZSAH ZEMNÝCH PRÁC

OBJEM m^3/bm		PLOCHA m^2/bm		
VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP	NÁSYP	PLÁŇ
0.00	0.00	0.00	1.75	4.50

KONŠTRUKCIA NAVRHOVANÉHO SPEVNENIA:


KRYT ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 31.5 G_c	100 mm	STN 73 6126
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO	UM HDK 32-63	200 mm	STN 73 6126
OCHRANNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 63 G_p	200 mm	STN 73 6126
ÚPRAVA PLÁNE SO ZHUTNENÍM		Σ 500 mm	STN 73 6133

POZNÁMKY: 1. PRIEBEH ŠÍRKY VOZOVKY V ÚSEKOCH JENOTLIVÝCH TRÁS A VÝPOČET VÝMER JEJ KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV SÚ POPÍSANÉ V TAB. 2, PRÍLOHY 5 - VÝKAZ VÝMER.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 5

TRASA GLOCINGERKA - BOROVNIAK V ÚSEKU: KM 1.156 - 1.181

M 1 : 50

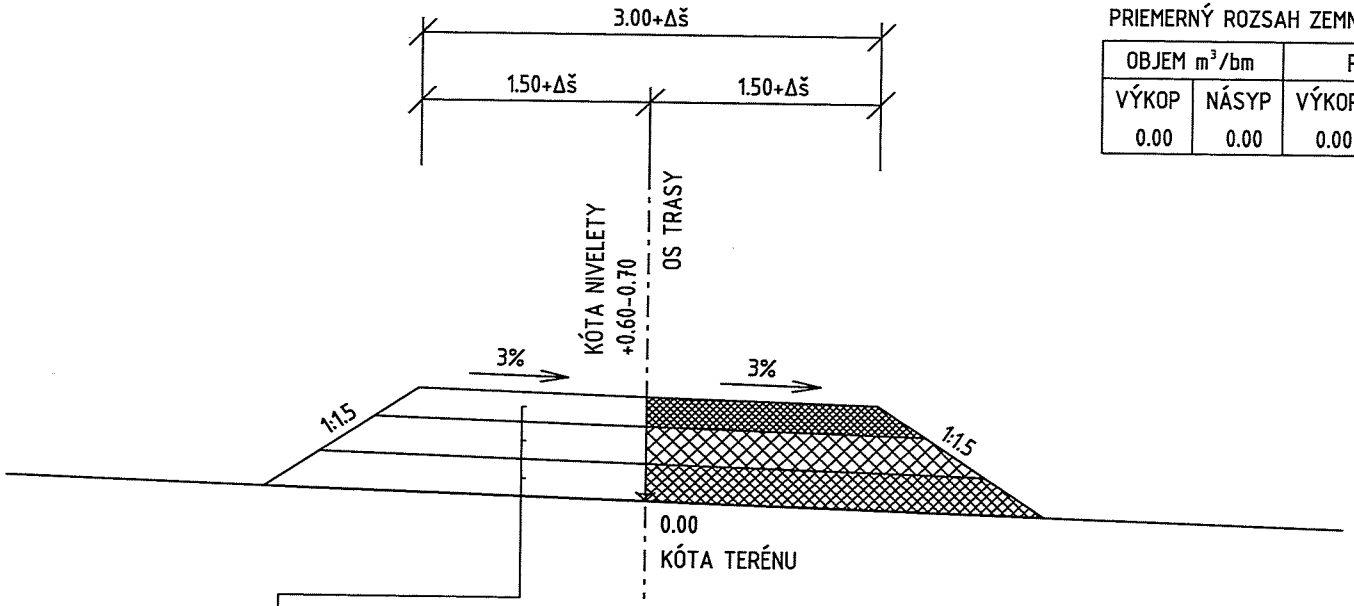

PRIEMERNÝ ROZSAH ZEMNÝCH PRÁC

OBJEM m^3/bm		PLOCHA m^2/bm		
VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP	NÁSYP	PLÁŇ
0.00	0.00	0.00	2.50	5.00

KONŠTRUKCIA NAVRHOVANÉHO SPEVNENIA:


KRYT ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 31.5 G_c	200 mm	STN 73 6126
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO	UM HDK 32-63	250 mm	STN 73 6126
OCHRANNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 63 G_p	250 mm	STN 73 6126
ÚPRAVA PLÁNE SO ZHUTNENÍM		Σ 700 mm	STN 73 6133

POZNÁMKY: 1. PRIEBEH ŠÍRKY VOZOVKY V ÚSEKOCH JENOTLIVÝCH TRÁS A VÝPOČET VÝMER JEJ KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV SÚ POPÍSANÉ V TAB. 2, PRÍLOHY 5 - VÝKAZ VÝMER.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 6

TRASA GLOCINGERKA - HLINÍKY V ÚSEKOCH: KM 0.116 - 0.193; KM 0.216 - 0.272; KM 0.283 - 0.303 A KM 0.432 - 0.502

M 1 : 50

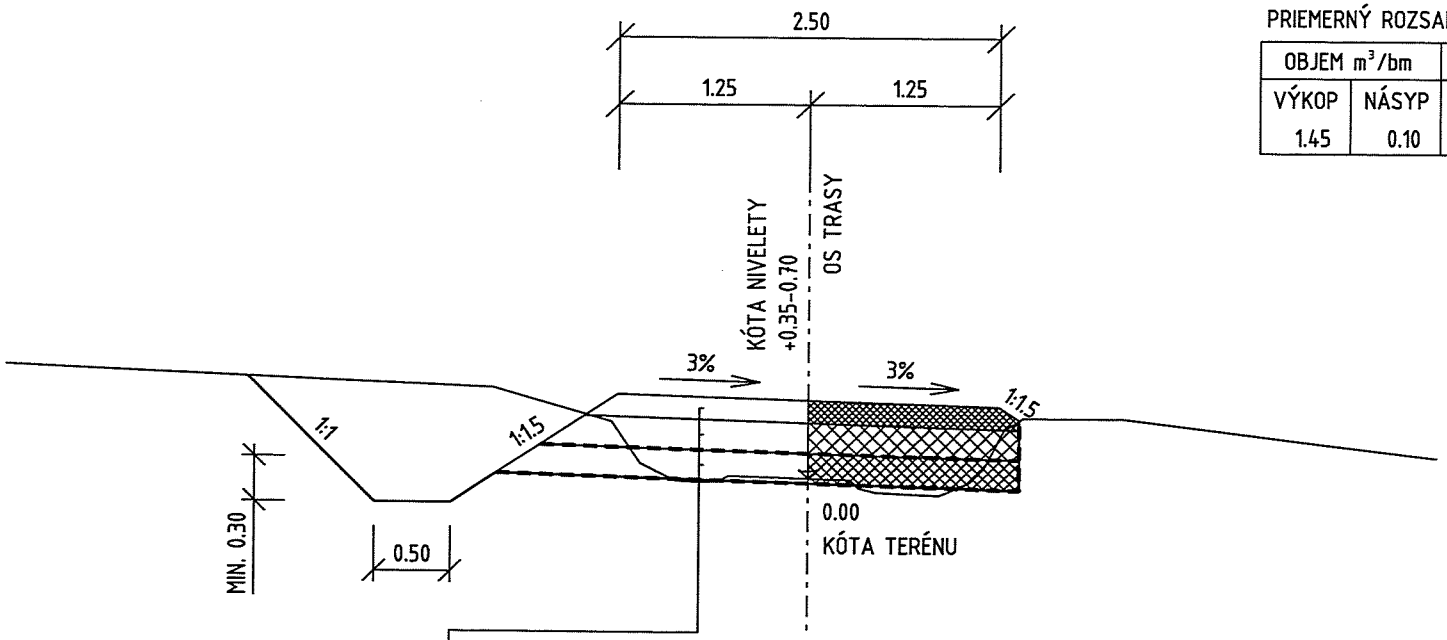

PRIEMERNÝ ROZSAH ZEMNÝCH PRÁC

OBJEM m^3/bm		PLOCHA m^2/bm		
VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP	NÁSYP	PLÁŇ
1.45	0.10	2.00	1.15	3.45

KONŠTRUKCIA NAVRHOVANÉHO SPEVNENIA:


KRYT ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 31.5 G_c	100-200 mm	STN 73 6126
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO	UM HDK 32-63	150-250 mm	STN 73 6126
VÝSTUŽNÁ DVOJOSÁ GEOMREŽA	ŤAHOVÁ PEVNOSŤ 30 kN/m		EN ISO 10319
OCHRANNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 63 G_p	150-250 mm	STN 73 6126
SEPARAČNO-VÝSTUŽNÁ GEOTEXTÍLIA	25/25 kN/m, CBR MIN. 3.0 kN		EN ISO 10319
ÚPRAVA PLÁNE SO ZHUTNENÍM		Σ 400-700 mm	STN 73 6133

POZNÁMKY: 1. ŠÍRKA PREKRYTIA GEOTEXTÍLIE SA NAVRHUJE 500 mm A ŠÍRKA PREKRYTIA GEOMREŽE SA NAVRHUJE 300 mm,
2. PRESAH GEOTEXTÍLIE A GEOMREŽE PO STRANE VPRACO SA NARHUJE 250 mm.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 7

TRASA GLOCINGERKA - PREPOJKA V ÚSEKU: KM 0.000 - 0.018

M 1 : 50

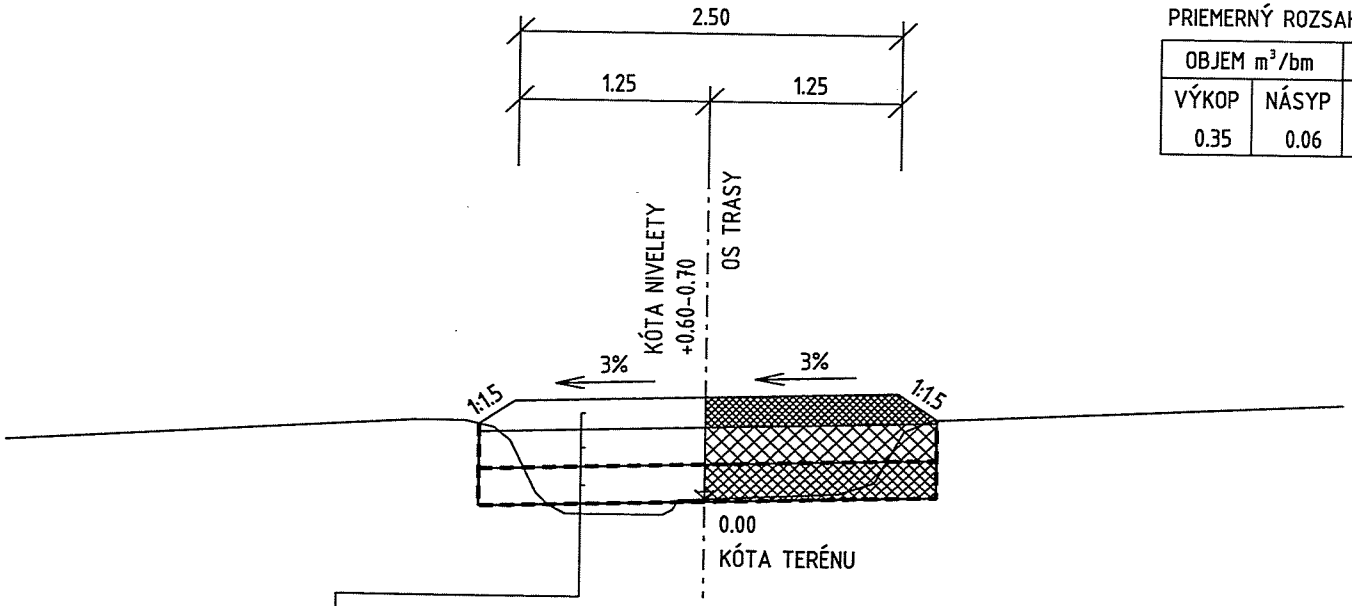

PRIEMERNÝ ROZSAH ZEMNÝCH PRÁC

OBJEM m^3/bm		PLOCHA m^2/bm		
VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP	NÁSYP	PLÁŇ
0.35	0.06	0.00	0.60	3.00

KONŠTRUKCIA NAVRHOVANÉHO SPEVNENIA:


KRYT ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 31.5 G_c	200 mm	STN 73 6126
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO	UM HDK 32-63	250 mm	STN 73 6126
VÝSTUŽNÁ DVOJOSÁ GEOMREŽA	ŤAHOVÁ PEVNOSŤ 30 kN/m		EN ISO 10319
OCHRANNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 63 G_P	250 mm	STN 73 6126
SEPARAČNO-VÝSTUŽNÁ GEOTEXTÍLIA	25/25 kN/m, CBR MIN. 3.0 kN		EN ISO 10319
ÚPRAVA PLÁNE SO ZHUTNENÍM		Σ 700 mm	STN 73 6133

POZNÁMKY: 1. ŠÍRKA PREKRYTIA GEOTEXTÍLIE SA NAVRHUJE 500 mm A ŠÍRKA PREKRYTIA GEOMREŽE SA NAVRHUJE 300 mm,
2. PRESAH GEOTEXTÍLIE A GEOMREŽE PO STRANE VPRACO SA NARHUJE 250 mm.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 8

TRASA GLOCINGERKA - PREPOJKA V ÚSEKU: KM 0.018 - 0.101

M 1 : 50

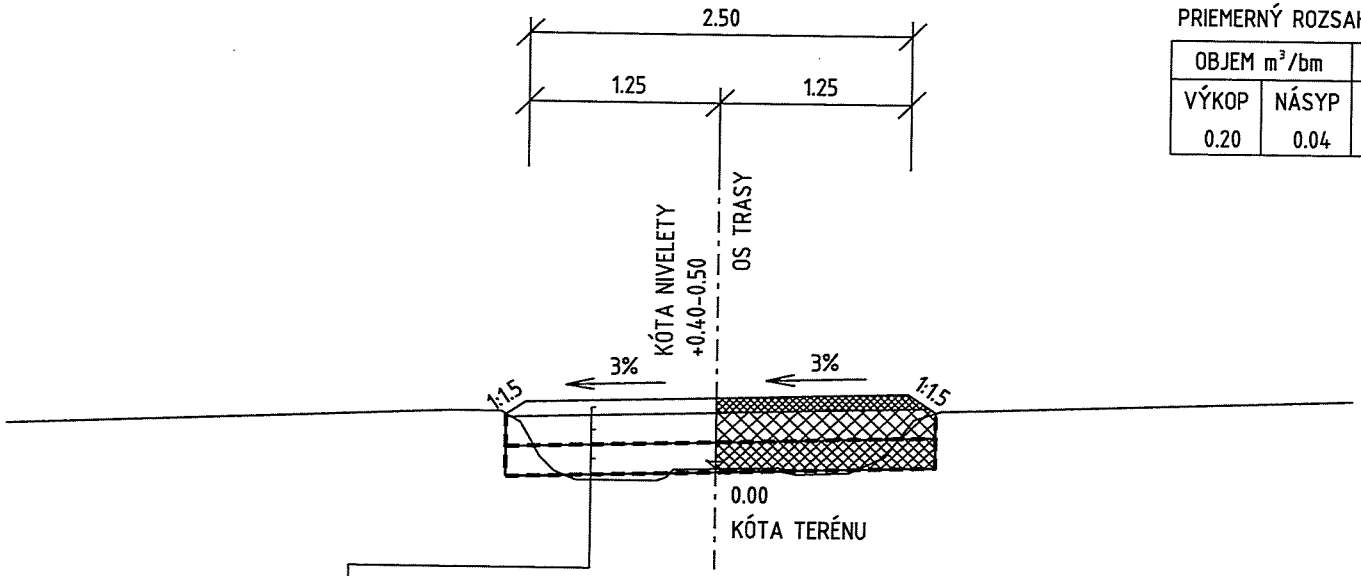

PRIEMERNÝ ROZSAH ZEMNÝCH PRÁC

OBJEM m^3/bm		PLOCHA m^2/bm		
VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP	NÁSYP	PLÁŇ
0.20	0.04	0.00	0.40	2.80


KONŠTRUKCIA NAVRHOVANÉHO SPEVNENIA:

KRYT ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 31.5 G_c	100 mm	STN 73 6126
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO	UM HDK 32-63	200 mm	STN 73 6126
VÝSTUŽNÁ DVOJOSÁ GEOMREŽA	ŤAHOVÁ PEVNOSŤ 30 kN/m		EN ISO 10319
OCHRANNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD, 63 G_P	200 mm	STN 73 6126
SEPARAČNO-VÝSTUŽNÁ GEOTEXTÍLIA	25/25 kN/m, CBR MIN. 3.0 kN		EN ISO 10319
ÚPRAVA PLÁNE SO ZHUTNENÍM		Σ 500 mm	STN 73 6133


POZNÁMKY: 1. PRIEBEH ŠÍRKY VOZOVKY V ÚSEKOCH JENOTLIVÝCH TRÁS A VÝPOČET VÝMER JEJ KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV SÚ POPÍSANÉ V TAB. 2, PRÍLOHY 5 - VÝKAZ VÝMER.

VZOROVÝ RÚROVÝ PRIEPUST Z RÚRY HDPE SN 8
RIEŠENIE PRIAMEHO VTOKU SO STÁLYM PRIETOKOM VODY BEZ NAPOJENIA PRIEKOPY


PÔDORYS M 1 : 100

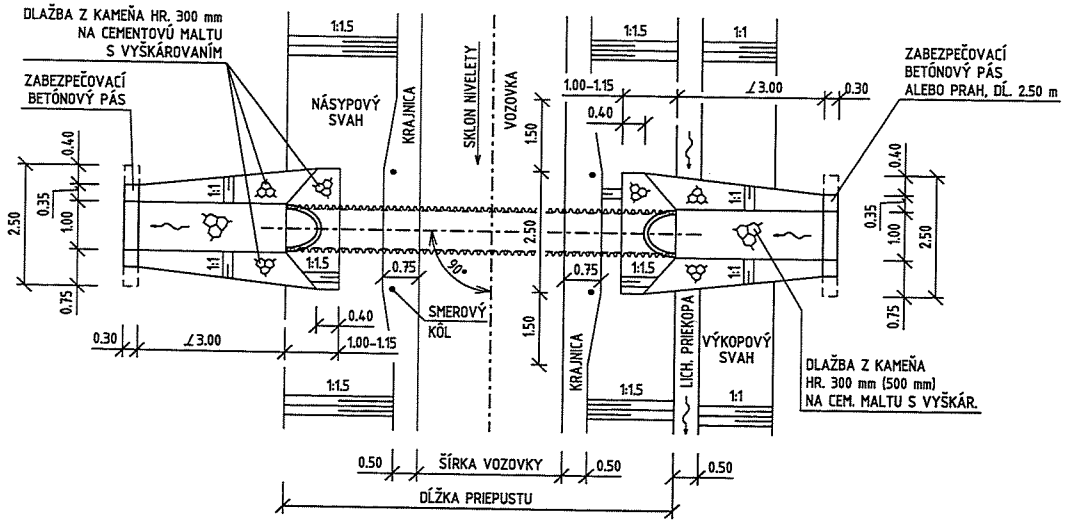


POHĽAD NA VTOK M 1 : 50

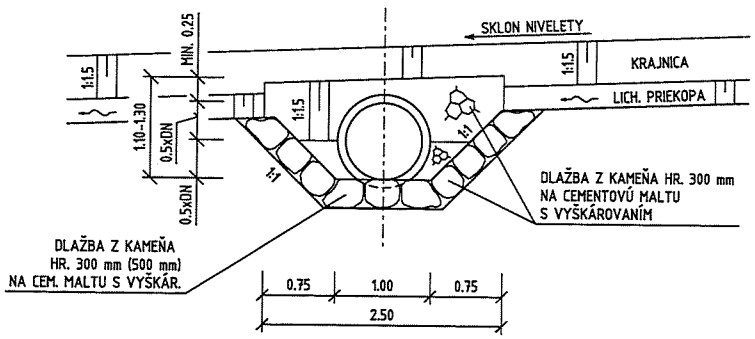

POHĽAD NA VÝTOK M 1 : 50

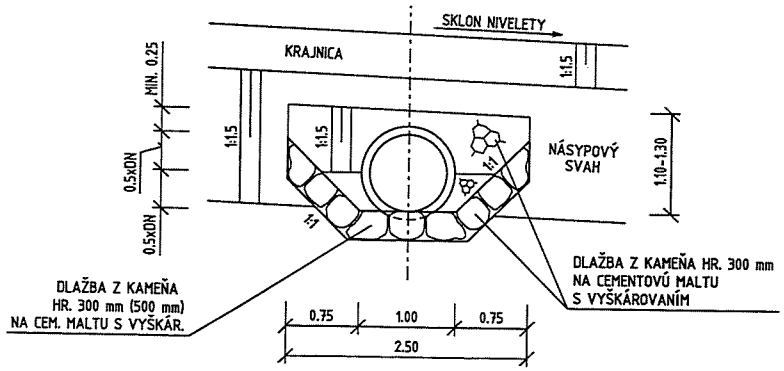

ULOŽENIE POTRUBIA M 1 : 25

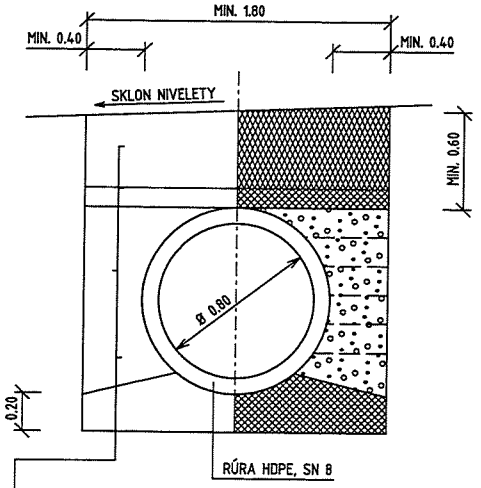

- KONŠTRUKCIA VOZOVKY PODĽA VZOROVÉHO PRIEČNEHO REZU
- PREKRYTIE RÚRY ŠTRKODRVINOU 0/32, HR. 100 mm
- OBSYP RÚRY ZEMINOU ALEBO KAMENIVOM, MAX. ZRNO Ø 32 mm
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY 0/32 mm, HR. 200 mm

PLOCHA DLAŽBOVÝCH ÚPRAV

PRE DĹŽKU ÚPRAVY 3.00 m:	VTOK	VÝTOK
DN 800 SPEVNENIE DNA:	3.00 m²	3.00 m²
DN 800 SPEVNENIE SVAHOV:	7.55 m²	7.55 m²
DN 1000 SPEVNENIE DNA:	3.00 m²	3.00 m²
DN 1000 SPEVNENIE SVAHOV:	9.35 m²	9.35 m²


ŠPECIFIKÁCIA A URČENIE TRIEDY BETÓNU (STN EN 206-1):

ZABEZPEČOVACÍ PÁS A PRAH C 30/37-XC4,XF3


POZNÁMKY: 1. SPÄTNÝ ZÁSYP RÚRY JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ ROVNOMERNE SYMETRICKY Z OBIDVOCH STRÁN PO VRSTVÁCH HRÚBKY MAX. 150 mm, ZHUTNENÝCH NA MIN 98 % PS, ZÁSYP POD RÚROU HUTNIŤ RUČNE!
2. 50 mm POD RÚROU NEHUTNIŤ, MINIMÁLNA HRÚBKA PODKLADU POD RÚROU MUSÍ BYŤ 150 mm,
3. SPEVNENIE DNA VTOKOVEJ A VÝTOKOVEJ ÚPRAVY V POZDĹŽNOM SKLONE ≤ 1.50 % SA NAVRHUJE DLAŽDICAMI TBM 2-50 DO LÔŽKA Z BETÓNU HR. 100 mm (VIĎ. POZDĹŽNE REZY PRIEPUSTOV).

VZOROVÝ RÚROVÝ PRIEPUST Z RÚRY HDPE SN 8
RIEŠENIE PRIAMEHO VTOKU Z LICHOBEŽNÍKOVEJ PRIEKOPY


PÔDORYS M 1 : 100

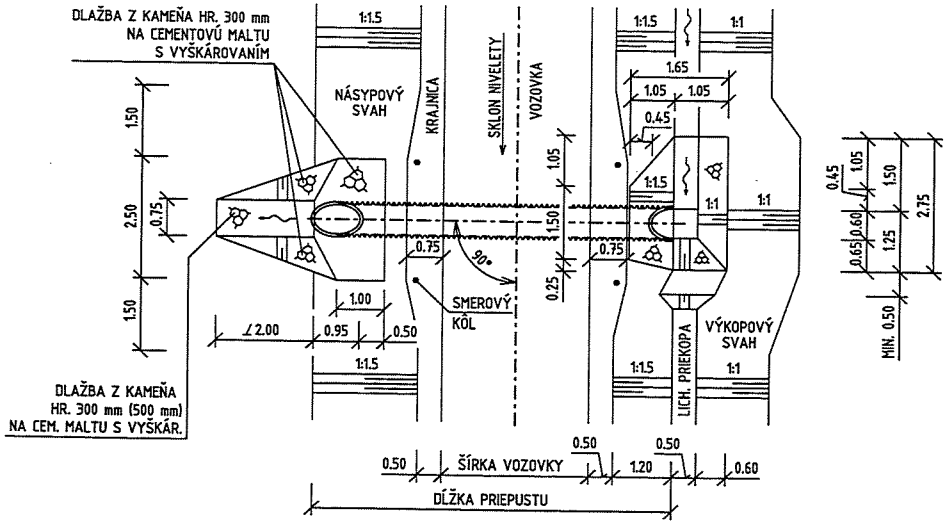


POHĽAD NA VTOK M 1 : 50

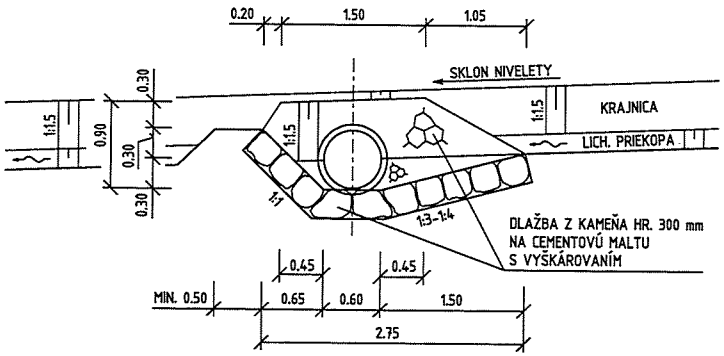

POHĽAD NA VÝTOK M 1 : 50

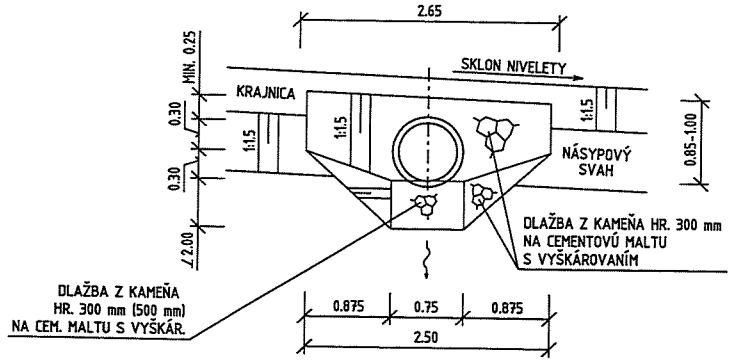

ULOŽENIE POTRUBIA M 1 : 25

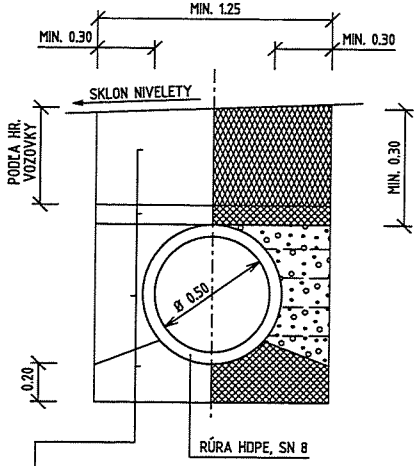

KONŠTRUKCIA VOZOVKY PODĽA VZOROVÉHO PRIEČNEHO REZU
PRESYPANIE RÚRY ŠTRKODRVINOU 0/32, HR. 100 mm
OBSYP RÚRY ZEMINOU ALEBO KAMENIVOM, MAX. ZRNO Ø 32 mm
PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY 0/32 mm, HR. 200 mm


POZNÁMKY:
1. SPÄTNÝ ZÁSYP RÚRY JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ ROVNOMERNE SYMETRICKY Z OBIDVOCH STRÁN PO VRSTVÁCH HRÚBKY MAX. 150 mm, ZHUTNENÝCH NA MIN 98 % PS, ZÁSYP POD RÚROU HUTNIŤ RUČNE!
2. 50 mm POD RÚROU NEHUTNIŤ, MINIMÁLNA HRÚBKA PODKLADU POD RÚROU MUSÍ BYŤ 150 mm,
3. ZÁVÄZNÉ VÝMERY DLAŽBOVÝCH ÚPRAV SÚ UVEDENÉ VO VÝKRESOCH PRIEPUSTOV.

VTOKOVÁ A VÝTOKOVÁ ÚPRAVA:
DLAŽBA Z KAMEŇA HR. 300 mm
NA CEMENTOVÚ MALTU S VYŠKÁROVANÍM


PLOCHA DLAŽBOVÝCH ÚPRAV:	VTOK	VÝTOK
SPEVNENIA DNA:	1.10 m²	1.50 m²
SPEVNENIA SVAHOV:	5.15 m²	5.85 m²

VZOROVÝ RÚROVÝ PRIEPUST Z RÚRY HDPE SN 8
RIEŠENIE OBOJSTRANNÉHO PRIAMEHO VTOKU Z LICHOBEŽNÍKOVEJ PRIEKOPY


PÔDORYS M 1 : 100

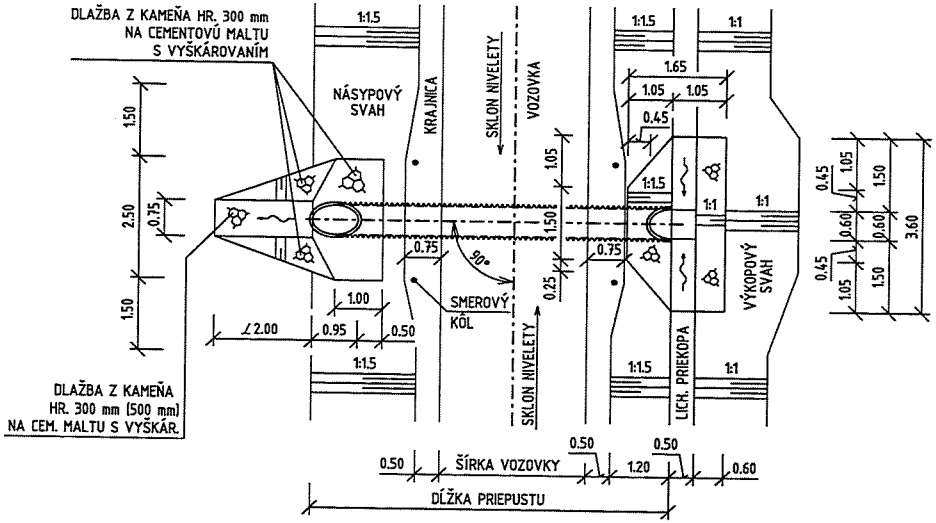


POHĽAD NA VTOK M 1 : 50

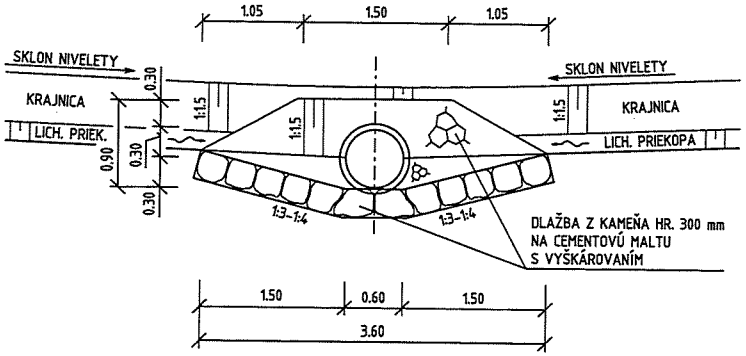

POHĽAD NA VÝTOK M 1 : 50

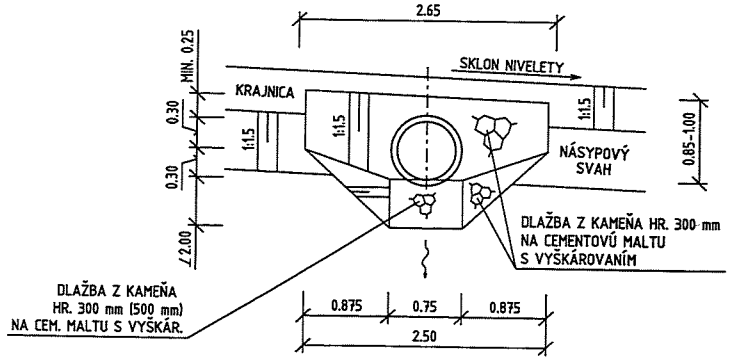

ULOŽENIE POTRUBIA M 1 : 25

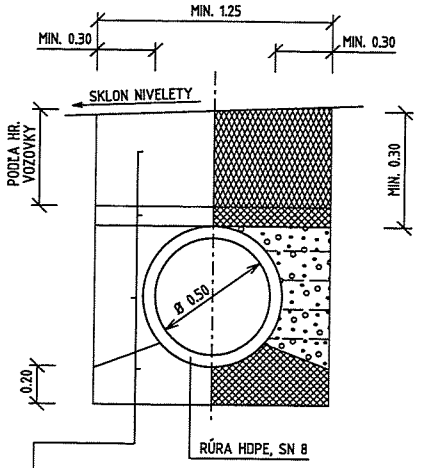

- KONŠTRUKCIA VOZOVKY PODĽA VZOROVÉHO PRIEČNEHO REZU
- PRESYPANIE RÚRY ŠTRKODRVINOU 0/32, HR. 100 mm
- OBSYP RÚRY ZEMINOU ALEBO KAMENIVOM, MAX. ZRNO Ø 32 mm
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY 0/32 mm, HR. 200 mm


POZNÁMKY:
1. SPÄTNÝ ZÁSYP RÚRY JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ ROVNOMERNE SYMETRICKY Z OBIDVOCH STRÁN PO VRSTVÁCH HRÚBKY MAX. 150 mm, ZHUTNENÝCH NA MIN 98 % PS, ZÁSYP POD RÚROU HUTNIŤ RUČNE!
2. 50 mm POD RÚROU NEHUTNIŤ, MINIMÁLNA HRÚBKA PODKLADU POD RÚROU MUSÍ BYŤ 150 mm.
3. ZÁVÄZNÉ VÝMERY DLAŽBOVÝCH ÚPRAV SÚ UVEDENÉ VO VÝKRESOCH PRIEPUSTOV.

VTOKOVÁ A VÝTOKOVÁ ÚPRAVA:
DLAŽBA Z KAMEŇA HR. 300 mm
NA CEMENTOVÚ MALTU S VYŠKÁROVANÍM


PLOCHA DLAŽBOVÝCH ÚPRAV:	VTOK	VÝTOK
SPEVNENIA DNA:	1.90 m²	1.50 m²
SPEVNENIA SVAHOV:	6.10 m²	5.85 m²

VZOROVÁ PREFABRIKOVANÁ ODRÁŽKA - BG LESNÝ ŽĽAB

PRIEČNY REZ M 1:10

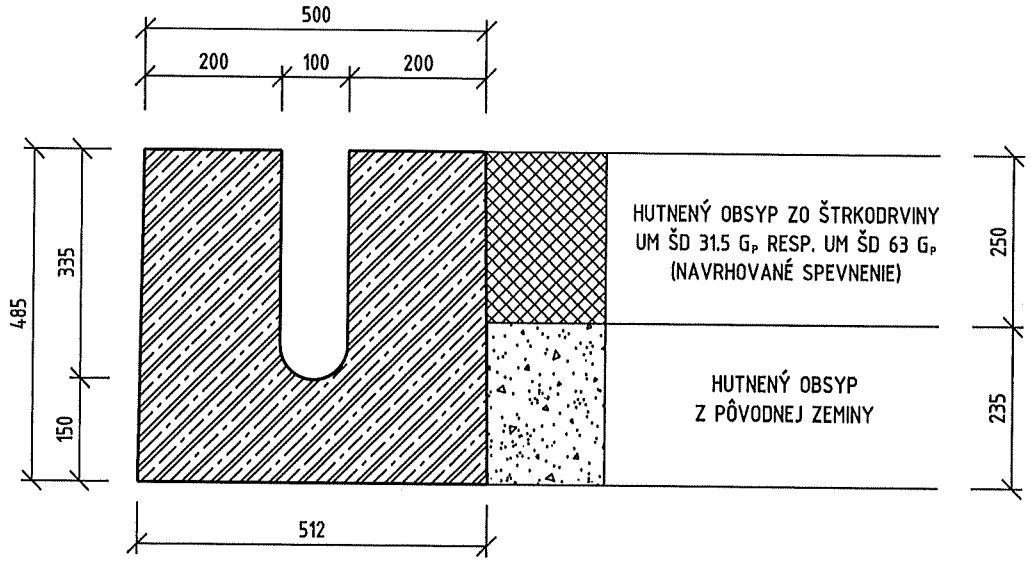


PÔDORYS M 1:50

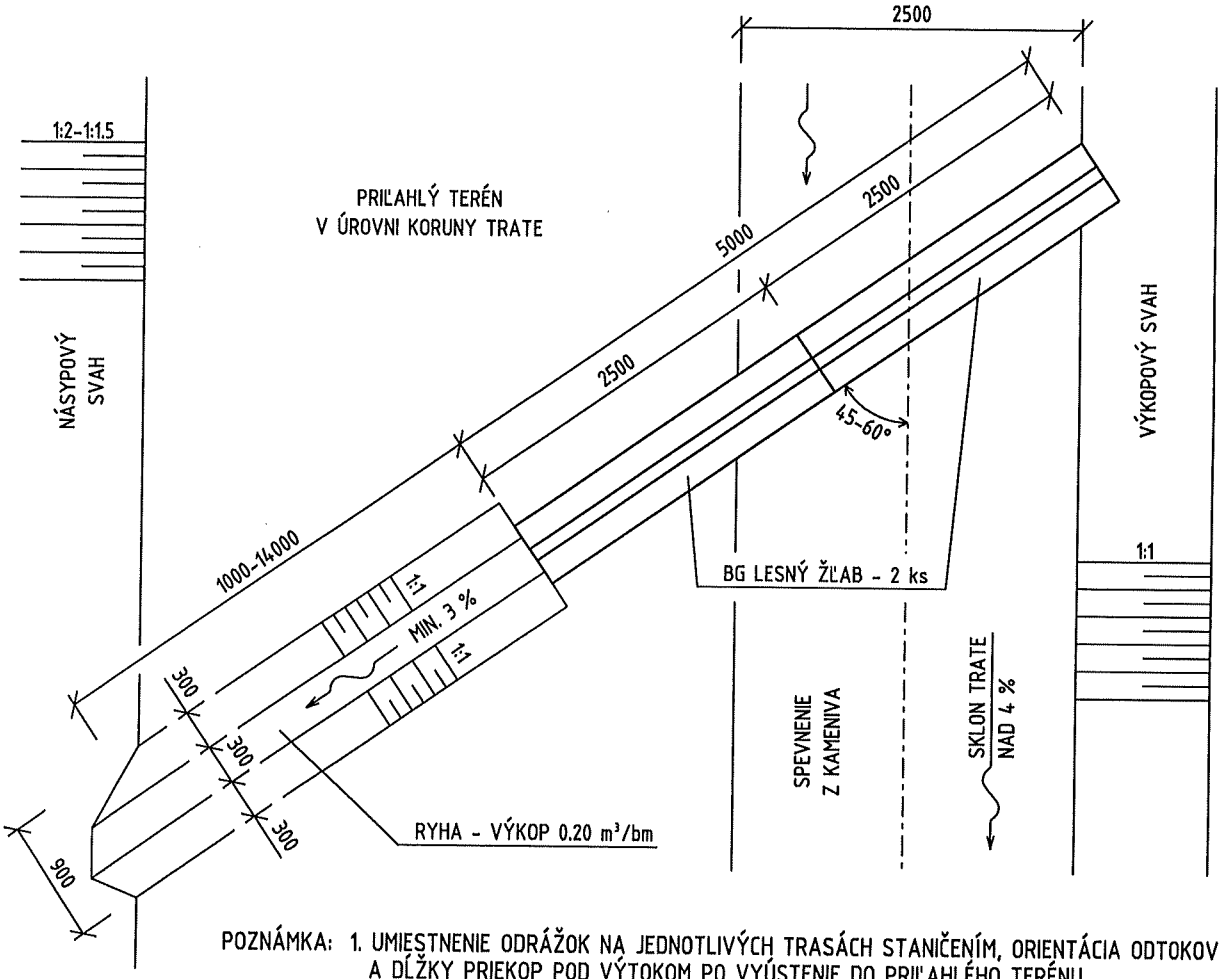

POZNÁMKA: 1. UMIESTNENIE ODRÁŽOK NA JEDNOTLIVÝCH TRASÁCH STANIČENÍM, ORIENTÁCIA ODTOKOV A DĹŽKY PRIEKOP POD VÝTOKOM PO VYÚSTENIE DO PRIĽAHLÉHO TERÉNU SÚ PODROBNE POPÍSANÉ V PRÍLOHE 1 - "SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA" (ČL. 4).


TRASA GLOCINGERKA - BOROVNIAK - RÚROVÝ PRIEPUST Č.1 - KM 0.305
Z RÚRY HDPE SN 8, DN 500 mm, DĹ. 5.0 m, α = 105°

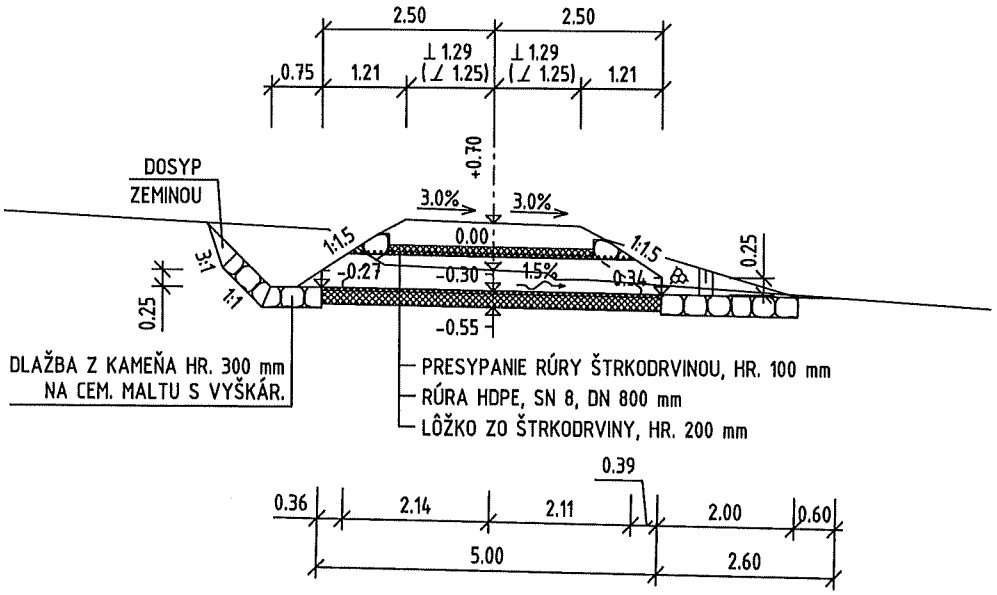

PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.45 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.35 m²

PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.50 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.85 m²

TRASA GLOCINGERKA - HLINÍKY - RÚROVÝ PRIEPUST Č.3 - KM 0.188
Z RÚRY HDPE SN 8, DN 500 mm, DĹ. 5.0 m, α = 100°

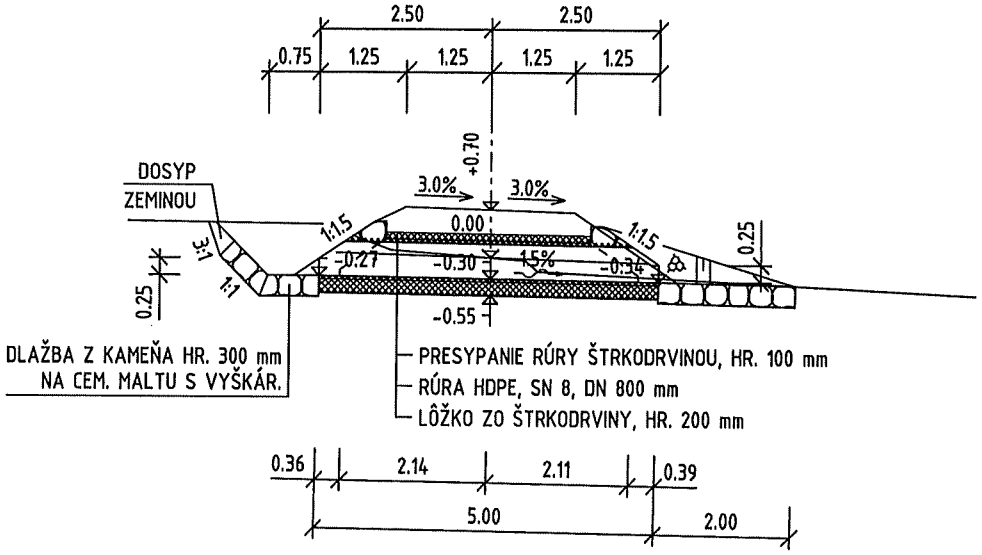


PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.45 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.35 m²


PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.50 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.85 m²

TRASA GLOCINGERKA - BOROVNIAK - RÚROVÝ PRIEPUST Č.2 - KM 1.171
Z RÚRY HDPE SN 8, DN 800 mm, DĹ. 13.0 m, α = 140°

M 1 : 100

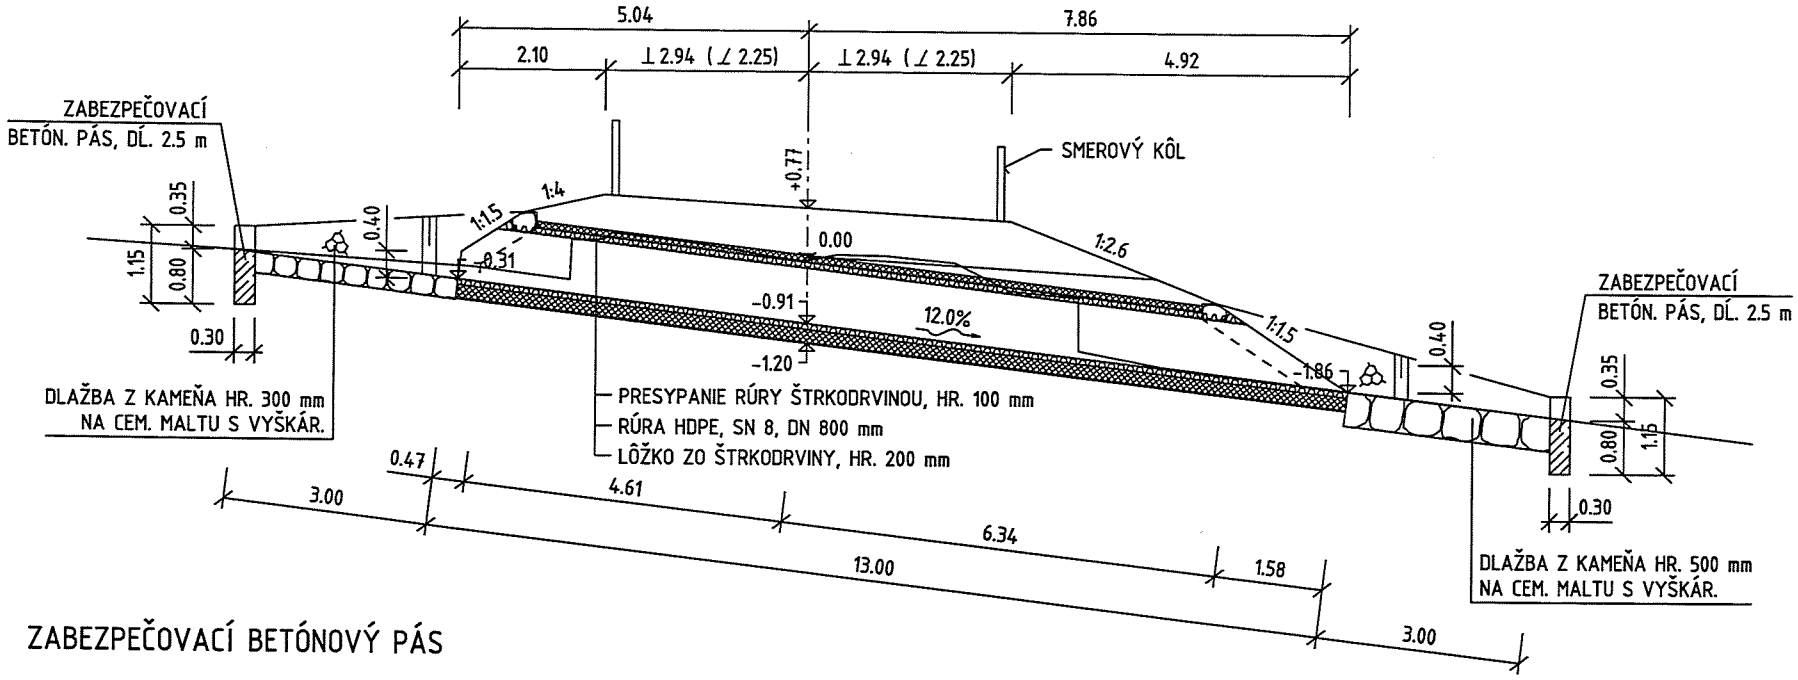

ZABEZPEČOVACÍ BETÓNOVÝ PÁS

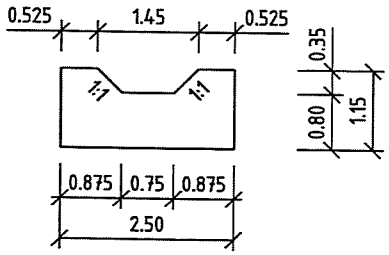


PLOCHA SPEVNENIA DNA: 3.00 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 7.55 m²

PLOCHA SPEVNENIA DNA: 3.00 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 7.55 m²

POZNÁMKY: 1. POTRUBIE SA NAVRHUJE Z 2 KUSOV RÚR DĹ. 6.0 m a DĹ. 7.0 m, SPOJENÝCH SPOJOVACÍM PRSTENCOM, KRATŠIA RÚRA SA ZARADÍ NA VTOKOVÚ STRANU,
2. BÚRANIE PRIEPUSTU Z RÚR TZP, DN 600 mm, DĹ. 6.0 m.


TRASA GLOCJNGERKA - HLINÍKY - RÚROVÝ PRIEPUST Č.4 - KM 0.263
Z RÚRY HDPE SN 8, DN 500 mm, DĹ. 5.0 m, α = 100°

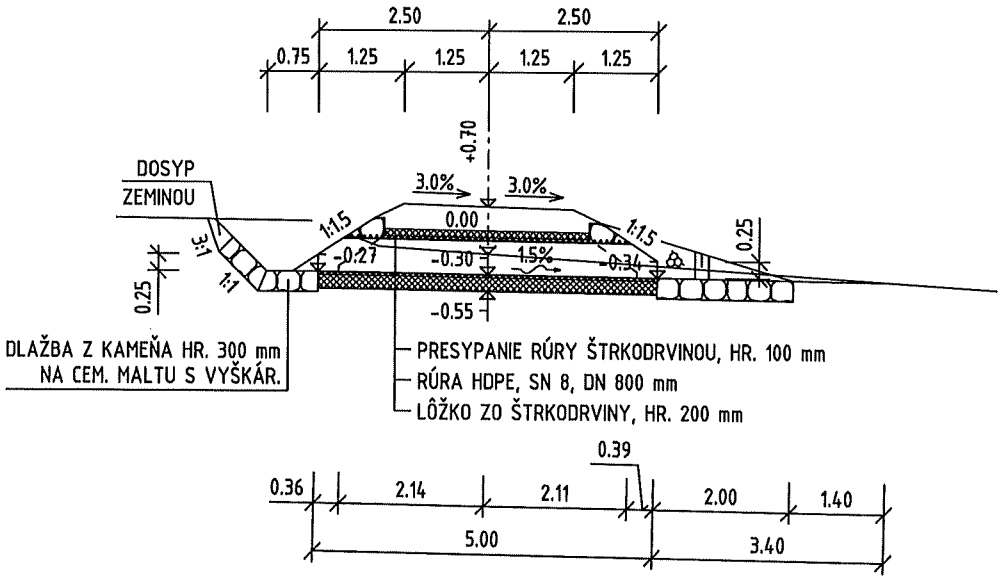

PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.45 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.35 m²

PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.50 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.85 m²


TRASA GLOCJNGERKA - HLINÍKY - RÚROVÝ PRIEPUST Č.5 - KM 0.291
Z RÚRY HDPE SN 8, DN 500 mm, DĹ. 5.0 m, α = 90°

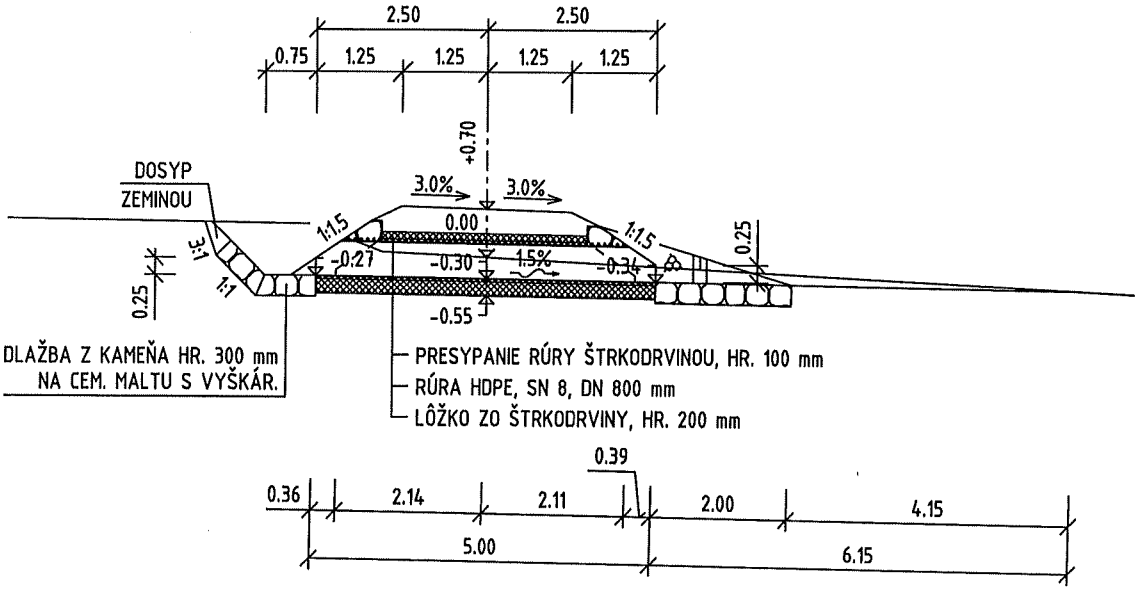

OBOJSMERNÉ NAPOJENIE VTOKU
PLOCHA SPEVNENIA DNA: 2.45 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 6.10 m²

PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.50 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.85 m²


TRASA GLOCJNGERKA - HLINÍKY - RÚROVÝ PRIEPUST Č.6 - KM 0.461
Z RÚRY HDPE SN 8, DN 500 mm, DĹ. 5.0 m, α = 90°

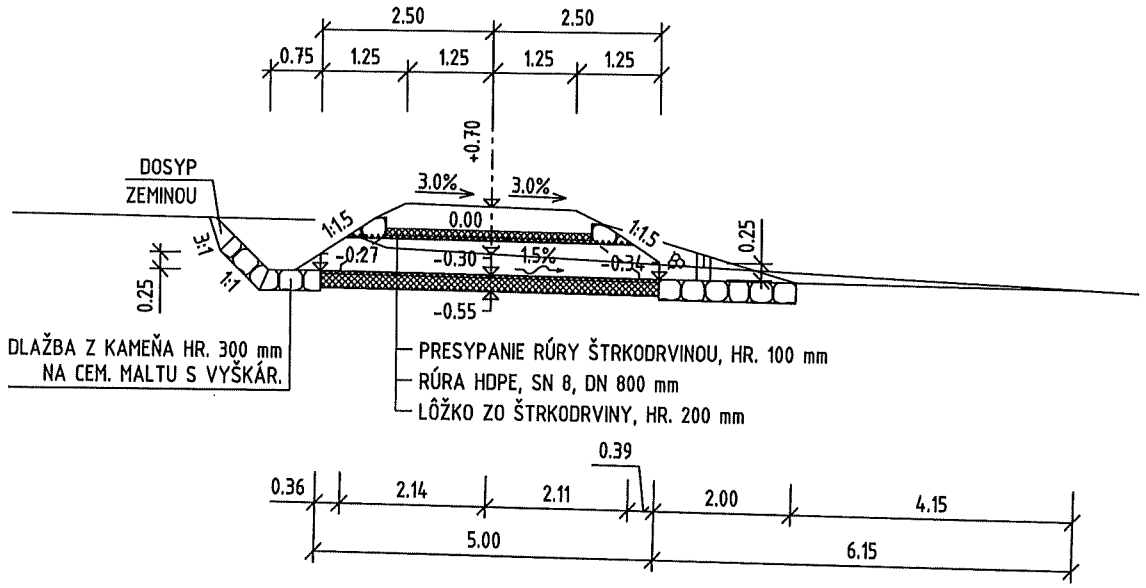

OBOJSMERNÉ NAPOJENIE VTOKU
PLOCHA SPEVNENIA DNA: 2.45 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 6.10 m²

PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.50 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.85 m²

TRASA GLOCJNGERKA - HLINÍKY - RÚROVÝ PRIEPUST Č.7 - KM 0.485
Z RÚRY HDPE SN 8, DN 500 mm, DĹ. 5.0 m, α = 90°

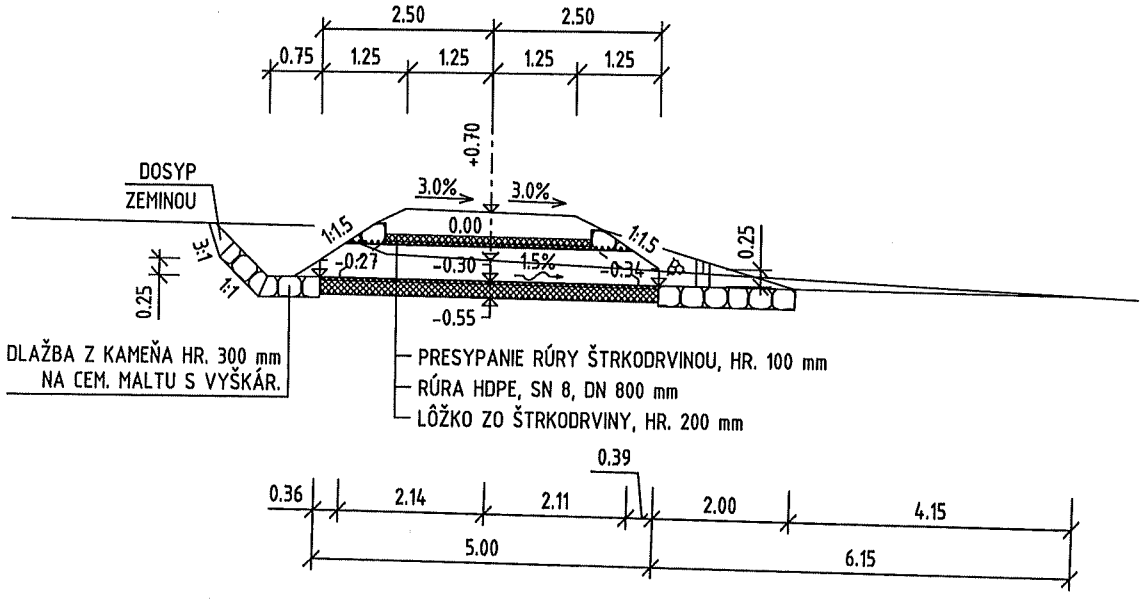

OBOJSMERNÉ NAPOJENIE VTOKU
PLOCHA SPEVNENIA DNA: 2.45 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 6.10 m²

PLOCHA SPEVNENIA DNA: 1.50 m²
PLOCHA SPEVNENIA SVAHOV: 5.85 m²

Tabuľka 1: VÝPOČET PLÔCH A KUBATÚR ZEMNÝCH PRÁC **Trasa: Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH – odvodnenie**

Číslo	Staničenie (km)	Plocha		Sírka			Plocha			Výkop podľa triedy ťažiteľnosti		Násyp	Bilancia	Súradnica hmotnice	Výrub krovia	Pne	
		výkop	násyp	svahovanie		úprava pláne	svahovanie		úprava pláne	4	5					10-30 cm	30-50 cm
		m^2		m			m^2			m^3		m^3	m^3	m^3	m^2	ks	ks
Glocingerka - Borovniak													0,00	0,00	475,0	47	9
1	0,000	0,05	0,03		0,25			17,00		3,40		2,04	1,36	1,36			
3	0,068	0,65	0,05	1,75	0,80		357,00	163,20		132,60		10,20	122,40	123,76			
8	0,272												0,00	123,76			
9	0,305	0,65	0,05	1,75	0,80		8,75	4,00		3,25		0,25	3,00	126,76			
10	0,310	0,05	0,03		0,25			199,00		39,80		23,88	15,92	142,68			
27	1,106				1,70			164,90					0,00	142,68			
34	1,203												0,00	142,68			
													0,00	142,68			
Glocingerka - Hliníky													0,00	142,68			
1	0,000												0,00	142,68			
2	0,166	1,45	0,10	2,00	1,15		44,00	25,30		31,90		2,20	29,70	172,38			
3	0,188	1,45	0,10	2,00	1,15		10,00	5,75		7,25		0,50	6,75	179,13			
4	0,193												0,00	179,13			
5	0,216	1,45	0,10	2,00	1,15		94,00	54,05		68,15		4,70	63,45	242,58			
6	0,263	1,45	0,10	2,00	1,15		18,00	10,35		13,05		0,90	12,15	254,73			
7	0,272												0,00	254,73			
8	0,283	1,45	0,10	2,00	1,15		16,00	9,20		11,60		0,80	10,80	265,53			
9	0,291	1,45	0,10	2,00	1,15		24,00	13,80		17,40		1,20	16,20	281,73			
10	0,303												0,00	281,73			
11	0,432	1,45	0,10	2,00	1,15		58,00	33,35		42,05		2,90	39,15	320,88			
12	0,461	1,45	0,10	2,00	1,15		48,00	27,60		34,80		2,40	32,40	353,28			
13	0,485	1,45	0,10	2,00	1,15		34,00	19,55		24,65		1,70	22,95	376,23			
14	0,502												0,00	376,23			
15	0,534												0,00	376,23			
													0,00	376,23			
Glocingerka - prepojka													0,00	376,23			
1	0,000	0,35	0,06		0,60			10,80		6,30		1,08	5,22	381,45			
2	0,018	0,20	0,04		0,40			33,20		16,60		3,32	13,28	394,73			
3	0,101												0,00	394,73			
													0,00	394,73			
Zelený vrch													0,00	394,73			
1	0,000	0,05	0,03		0,25			59,75		11,95		7,17	4,78	399,51			
6	0,239													399,51			
						Suma:	**711,75**	**850,80**		**464,75**		**65,24**		**399,51**	**475,0**	**47**	**9**
							1	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

Tab. 2: VÝPOČET VÝMER SPEVNENIA TRATÍ

Trasa: Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH – odvodnenie

Číslo bodu	Označenie bodu	Vzdial. bodov - dĺžka úseku (m)	Staničenie bodu (km)	Konštrukcia vozovky	Šírka vozovky	D - Celoplošný dosyp kamenivo (mm)							Úprava pláne so zhutnením	GEOMREŽA	GEOTEXTÍLIA
						ŠD 0/32	ŠD 0/32	ŠD 0/32	HDK 32-63	HDK 32-63	ŠD 0/63	ŠD 0/63			
						100	150	200	200	250	200	250			
						plocha (m^2)	plocha (m^2)	plocha (m^2)	plocha (m^2)	plocha (m^2)	plocha (m^2)	plocha (m^2)	plocha (m^2)	plocha (m^2)	plocha (m^2)
					(m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Glocingerka - Borovniak															
1	ZÚ	68,00	0,000	25	2,50							183,60	183,60		
3		204,00	0,068	135	2,50	530,40				591,60			642,60	693,60	693,60
8		33,00	0,272	170	2,50			92,40		103,95		115,50	122,10	118,80	130,35
9	**PR**	5,00	**0,305**	135	2,50	13,00				14,50			15,75	17,00	17,00
10		796,00	0,310	25	2,50							2149,20	2149,20		
27		32,00	1,106	25	**10,0**							328,00	348,80		
28		7,00	1,138	25	**6,00**							43,75	48,30		
29		11,00	1,145	50	**5,00**	56,10			61,60		68,20		77,00		
30		15,00	1,156	70	**4,00**			63,00		72,75		83,25	93,00		
31	**PR**	10,00	**1,171**	70	**3,50**			37,00		43,50		50,50	57,00		
32		8,00	1,181	50	**3,50**	28,80			32,80		37,60		44,00		
33		14,00	1,189	25	**3,00**							45,50	54,60		
34	KÚ		**1,203**												
Glocingerka - Hliníky															
1	ZÚ	166,00	0,000	0	2,50										
2		22,00	0,166	155	2,50		60,50		66,00		72,60		75,90	74,80	81,40
3	**PR**	5,00	**0,188**	155	2,50		13,75		15,00		16,50		17,25	17,00	18,50
4		23,00	0,193	0	2,50										
5		47,00	0,216	155	2,50		129,25		141,00		155,10		162,15	159,80	173,90
6	**PR**	9,00	**0,263**	155	2,50		24,75		27,00		29,70		31,05	30,60	33,30
7		11,00	0,272	0	2,50										
8		8,00	0,283	155	2,50		22,00		24,00		26,40		27,60	27,20	29,60
9	**PR**	12,00	**0,291**	155	2,50		33,00		36,00		39,60		41,40	40,80	44,40
10		129,00	0,303	0	2,50										
11		29,00	0,432	155	2,50		79,75		87,00		95,70		100,05	98,60	107,30
12	**PR**	24,00	**0,461**	155	2,50		66,00		72,00		79,20		82,80	81,60	88,80
13	**PR**	17,00	**0,485**	155	2,50		46,75		51,00		56,10		58,65	57,80	62,90
14		32,00	0,502	0	2,50										
15	KÚ		**0,534**		2,50										
					2,50										
Glocingerka - prepojka					2,50										
1	ZÚ	18,00	0,000	170	2,50			50,40		54,00		54,00	54,00	64,80	64,80
2		83,00	0,018	150	2,50	219,95			236,55		236,55		236,55	265,60	265,60
3	KÚ		**0,101**		2,50										
					2,50										
Zelený vrch					2,50										
1	ZÚ	239,00	0,000	25	2,50							645,30	645,30		
6	KÚ		**0,239**	0	2,50										
Spolu:						**848,25**	**475,75**	**242,80**	**849,95**	**880,30**	**913,25**	**3698,60**	**5368,65**	**1748,00**	**1811,45**
Číslo stĺpca:						**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

Tabuľka 3: VÝKAZ VÝMER PRIEPUSTOV

Číslo priepustu	Staničenie v km	Typové označenie	Dĺžka priepustu	Prevedenie vody	Rozobratie priepustu DN 600	Výkopy		Spätný zásyp zeminou	Svahovanie koryta	Plocha spevnenia dna hr. 300 mm	Plocha spevnenia dna hr. 500 mm	Plocha spevnenia svahov hr. 300 mm	Plocha spevnenia svahov hr. 500 mm	Podsypy	Základový betón	Obsyp potrubia kamenivom	Drevené smerové koly	Debnenie	Počet rúr			
						Ryhy do 600 mm	Ryhy do 2000 mm												HDPE DN 500	Spojocací prvok DN 500	HDPE DN 800	Spojocací prvok DN 800
			m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	ks	m^2	m	ks	m	ks
			1	2	4	10	11	13	14	15	16	19	20	21	22	24	27	28	35	36	39	40
1	0,305	HDPE DN 500, dl.	5,0				10,68	0,70	2,46	2,95		11,20		6,00		3,09			5			
2	1,171	HDPE DN 800, dl.	13,0	23,0	6,0	1,50	24,00	2,99	3,10	3,00	3,00	15,10		20,80	1,50	13,10	4	11,65			13	1
3	0,188	HDPE DN 500, dl.	5,0				10,21	0,70	1,78	2,95		11,20		6,00		3,09			5			
4	0,263	HDPE DN 500, dl.	5,0				10,42	0,70	3,51	2,95		11,20		6,00		3,09			5			
5	0,291	HDPE DN 500, dl.	5,0				12,06	0,70	6,70	3,95		11,95		6,00		3,09			5			
6	0,461	HDPE DN 500, dl.	5,0				12,06	0,70	6,70	3,95		11,95		6,00		3,09			5			
7	0,485	HDPE DN 500, dl.	5,0				12,06		6,70	3,95		11,95		6,00		3,09			5			
Spolu:			43,0	23,0	6,0	1,50	91,52	6,49	30,96	23,70	3,00	84,55		56,80	1,50	31,62	4	11,65	30		13	1
