

BBSK-32

**Príloha č. 4 – Zmluva o dielo.**

**ZMLUVA O DIELO č. ....**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov




<b>ev. č. objednávateľa:</b> 1052/2018/OPDI/PVT	<b>ev. č. zhotoviteľa:</b>
--	----------------------------

**na uskutočnenie stavebných prác s názvom:**



**„Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412“**

( ďalej iba „Zmluva“ )

medzi zmluvnými stranami:

<b>OBJEDNÁVATEĽ:</b>	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo :	Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO :	37828100
DIČ:	
Bankové spojenie :	
Číslo účtu :	
Telefón/ fax :	048/4325111, 048/4325523
Email:	
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach:	Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová, odborná referentka
Telefón/ fax :	048/4325111, 048/4325523
Email:	
(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)	

a

<b>ZHOTOVITEĽ:</b>	<b>Doprastav Asfalt, a.s.</b>
Sídlo:	Stráž 223, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán:	Ing. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva Monika Fízellová, člen predstavenstva
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	46120602
DIČ:	
IČ DPH:	

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

@doprastavasfalt.sk

Oprávnení konateľ

vo veciach zmluvy:

Ing. Rastislav Löffler, riaditeľ spoločnosti

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

### **Preambula**

1. Táto zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/ 2018 dňa 23.07.00202018 pod zn. oznámenia 10135 - WYP na predmet zákazky „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412.**“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“).

### **I.**

#### **Úvodné ustanovenia**

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest II. a III. triedy a mostov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a **Prílohách č. 1 až 10** k Zmluve (ďalej len „**Stavenisko**“ alebo „**Stavba**“). **Prílohy č. 1 až 10 Zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškani, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa súťažných podmienok verejného obstarávania disponuje a predložil objednávateľovi ku dňu podpisu Zmluvy:

- **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávateľom  
( Príloha č. 4 Zmluvy ),
- **Zoznam všetkých subdodávateľov** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,  
( Príloha č. 5 Zmluvy )
- **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho** v zmysle podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zadefinoval v rámci verejného obstarávania  
(Príloha č. 6 Zmluvy )
- **Certifikáty, vyhlásenia o zhode** vlastností a atesty zabudovaných materiálov (originál, resp. úradne osvedčená kópia), **Protokoly o vykonaných skúškach** podľa KSP, najmä **skúšky všetkých Asfaltových zmesí odobratých vo výrobní v súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20** (originál, resp. úradne osvedčená kópia),  
( Príloha č. 7 Zmluvy )
- **Potvrdenie o uzavretí poistných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,  
( Príloha č. 8 Zmluvy )
- **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky**, v prospech objednávateľa podľa časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov verejného obstarávania  
( Príloha č. 9 Zmluvy )
- **Doklad o vlastníctve vlastnej obalovacej súpravy alebo Dohodu o zmluvnom zabezpečení obalovacej súpravy**, pričom vzdialenosť obalovacej súpravy od Staveniska nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.  
( Príloha č. 10 Zmluvy )

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil, do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.

## II.

### Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným vo výkazoch výmer tvoriacich **Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2** k Zmluve a v projektovej dokumentácii k mostom tvoriacej **Prílohu č. 3** k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

## III.

### Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:
  - **II/578 vybrané úseky, staničenie v km: 0,000-19,685, dĺžka opravy v km: 11,227**
  - **III/2410 vybrané úseky, staničenie v km: 0,000-4,083, dĺžka opravy v km: 0,680**
  - **III/2433 vybrané úseky, staničenie v km: 0,000-1,263, dĺžka opravy v km: 0,553**
  - **III/2434 vybrané úseky, staničenie v km: 0,000-4,266, dĺžka opravy v km: 2,496**
  - **III/2411 vybrané úseky, staničenie v km: 0,000-0,198, dĺžka opravy v km: 0,176**
  - **III/2412 staničenie v km 0,000-1,200, dĺžka opravy v km: 1,200**v rozsahu a spôsobom podľa naceného výkazu výmer uvedeného v **Prílohe č. 1** Zmluvy a obnova týchto mostov na cestách:

#### **Mosty: na ceste II/578 v staničení**

578-01A	3,189
0578-02	4,838
0578-03	5,008
0578-04	5,769
0578-05	7,702
0578-07	15,862
0578-09	18,83
0578-10	19,597
0578-12	19,968

#### **Mosty na ceste III/2410 staničení**

2410-01	0,148
2410-03	0,64

#### **Mosty na ceste III/2434 staničení**

2434-01	1,624
---------	-------

v rozsahu a spôsobom podľa naceného výkazu výmer uvedeného v **Prílohe č. 2** a **projektovej dokumentácie vypracovanej Link projekt SK s.r.o., Kapitulská 313/12, 974 00 Banská Bystrica.**

Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť Diela vymedzená v článku III. ods. 1 Zmluvy ( vybrané úseky ciest a jednotlivé mosty ).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi ( zákonnými i podzákonnými ) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k Dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí , MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR



SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk)), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania Diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä stavebného zákona, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetky osoby podieľajúce sa na zhotovovaní Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi: a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti a c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.04.2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa a iných právnych predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré

objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

5. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor (v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za týmto účelom má prístup na Stavenisko. Stavebný dozor nariaďuje a zúčastňuje sa kontrolných dní na Stavbe. Termíny a podmienky kontrolných dní dohodnú zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní Staveniska. Stavebný dozor je oprávnený na náklady zhotoviteľa, na Stavenisku, počas zhotovovania Diela, odobrať alebo vyžiadať vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality - atesty a akékoľvek iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy za účelom kontroly a overenia plnenia povinnosti zhotoviteľa zhotovovať Dielo riadne. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zmluvné strany nedohodnú písomne iný postup.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - ohlásenie stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,
  - určenie dočasného dopravného značenia,
  - rozhodnutia príslušného orgánu o povolení čiastočnej uzávierky cesty,
  - odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybraných úsekov podľa príloh tejto Zmluvy,
  - projektovú dokumentáciu k jednotlivým mostom vypracovanú spol. HBH s r.o..
7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie aj v iných prípadoch, na písomnú odôvodnenú žiadosť zhotoviteľa, v lehote písomne dohodnutej zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
8. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný formou zápisov v stavebnom denníku, kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými prostriedkami dohodnutými písomnou formou.
9. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením ich kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva/poverenia.
10. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný o.i. zákonných povinností viesť na Stavenisku dokumentáciu:
  - a) stavebný denník
  - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
  - c) kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi,
  - d) knihu úrazov,
  - e) záznamy o školení pracovníkov.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka a súčasne ústne alebo písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa nedostaví na stavenisko, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v stavebných prácach pričom, objednávateľ je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli vykonané riadne, všetky náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
12. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo

vodu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak zhotoviteľ mal a/alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti, starostlivosti a maximálneho úsilia. Stavebný dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii Diela, okrem prípadu, že stavbyvedúci/jeho zástupca zhotoviteľa nie je včas dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Stavebný dozor je oprávnený za splnenia podmienky podľa predchádzajúceho ods. dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz ihneď prerušiť prácu.

13. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov ciest ( tvoriacich predmet Zmluvy ) pri zhotovovaní Diela. Kontrola vytýčenia začiatku a konca vybratých úsekov ciest vykonaná objednávateľom počas zhotovovania Diela nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť dodržiavania vytýčenia. Začiatky a konce vybratých úsekov ciest ( tvoriacich predmetu Zmluvy ) sú pre zhotoviteľa záväzné.
14. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci vydaných pred začatím a počas realizácie Diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenia povinností zhotoviteľom, objednávateľ má regresný nárok proti zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

#### IV.

##### Stavenisko a podmienky prevzatia staveniska

1. Staveniskom je priestor vybratých úsekov ciest a mostov tvoriacich predmet Zmluvy, ktorý je počas realizácie Diela určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, materiálov, dopravných a iných zariadení a strojov potrebných na vykonanie Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávateľa prevziať Stavenisko v deň určený objednávateľom vo výzve. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví zhotoviteľ Záznam/zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanú splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Odo dňa odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ sa povinný:
  - zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo Staveniska,
  - zabezpečiť a dodržiavať poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov, materiálov a stavebných mechanizmov a zariadení na Stavenisku,
  - zaistiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - zabezpečiť odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,
  - chrániť majetok objednávateľa pred poškodením alebo zničením.
  - organizovať, riadiť, koordinovať a niesť zodpovednosť za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku pri realizácii Diela,
  - sledovať spôsob a postup realizácie Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavenisku, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.

8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí Staveniska:
  - počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi použité na vybraté úseky ciest,
  - kontrolný súšobný plán v zmysle TKP MDVRR SR.

## V.

### Stavebný denník, Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

#### Stavebný denník:

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a v dvoch kópiách ( rovnopisoch ). Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom, vykonávacími predpismi. Stavebný denník musí obsahovať všetky potrebné údaje a skutočnosti, ktoré sú spôsobilé preukázať a overiť dodržiavanie povinností zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní Diela podľa článku ( kapitoly ) 10 ods. 10.2 a nasl. až kapitoly 12 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi účinných od 15.09.2015. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný pre oprávnené osoby. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
3. Minimálny rozsah denného zápisu v SD dohodli zmluvné strany nasledovne:
  - dátum (deň, mesiac, rok),
  - presné označenie vybratého úseku stavby, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú,
  - klimatické podmienky a pomery, maximálna a minimálna teplota vzduchu pri začiatku, počas a pri ukončení stavebných prác,
  - údaje o dobe výkonu stavebných prác, jej začiatok a koniec,
  - počet osôb vykonávajúcich práce s uvedením druhu práce, ktorú vykonávajú,
  - zoznam použitých strojov a zariadení,
  - časový postup a spôsob výkonu stavebných prác,
  - výkaz výmer dodávok materiálu s uvedením údajov podľa ods. 9.2 až 9.4 kapitoly 9, ods. 10.2 až 10.6 kapitoly 10, ods. 11.3, 11.4, 11.6 kapitoly 11 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi, v rozsahu v akom v daný deň prichádzajú do úvahy vzhľadom na druh vykonávanej stavebnej činnosti,
  - fotodokumentácia z priebehu stavebných prác zoradená chronologicky na CD,
  - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Denné záznamy sa píšú do SD – knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Záznamy sa píšú chronologicky za sebou bez vynechania voľného miesta.
5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne oprávnená osoba písomne poverená zhotoviteľom, stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, prípadne oprávnená osoba poverená objednávateľom, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné orgány verejnej moci.
6. SD a dokumentácia kvality sa vedie pre každý vybratý úsek ciest, ktoré tvoria predmet Diela, zvlášť.
7. Denné záznamy v jednom prepise dostane stavebný dozor objednávateľa osobne alebo v naskenovanej podobe na mailovú adresu objednávateľa uvedenú v nasl. ods. 9 tohto článku Zmluvy, najneskôr do 10.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa denný záznam týka.



Objednávateľ je prostredníctvom stavebného dozoru povinný sledovať obsah SD a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Na zápisy v SD musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume, kedy sa s nimi oboznámili. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v SD v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

#### **Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa:**

##### **8. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:**

Meno a Priezvisko: [REDACTED]

číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

mail: [REDACTED]@doprastavasfalt.sk

Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, pravidelnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní Diela, a iných úkonoch, na ktoré ho zhotoviteľ musí písomne poveriť.

9. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru osobu..... .V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje: ..... . Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.
10. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

## **VI.**

### **Termíny realizácie Diela**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia Staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa **Prílohy č. 1, stavebné práce na mostoch podľa Príloha č. 2**) objednávateľovi je najneskôr **do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska zhotoviteľom.**
3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela v **Harmonograme** postupu prác ( vecnom a časovom), ktorý je Prílohou tejto Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzný.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a podmienok podľa článku X, XI tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

## **VII.**

### **Cena Diela a platobné podmienky**

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 a č. 2 k Zmluve ( ďalej iba „cena Diela“ )**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na

Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	1 165 733,45	Eur
DPH 20 %	233 146,69	Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 398 880,14</b>	<b>Eur</b>

(slovom: milióntristodeväťdesiatosem tisíc osmstoosemdesiat Eur, 14/100 ) s DPH.

2. Preddavky objednávateľ neposkytuje vôbec.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zariadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude **jedna faktúra pre cesty a jedna faktúra pre mosty** vystavené zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ( poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č.1 čo do faktúry a z cesty a a posledného obnovovaného mosta podľa Prílohy č. 2 čo do faktúry za mosty** ) oprávnenou osobou objednávateľa.
6. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
7. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
  - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce na jednotlivých vybratých úsekoch ciest a mostoch podľa **Prílohy č. 1 a 2**, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na jednotlivých súpisoch minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“
  - faktúra musí byť dokladovaná súpisom vykonaných prác pre každý vybratý úsek cesty a stavebných prác na každom jednotlivom moste podľa **Prílohy č. 1 a 2** zvlášť, odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa a každý súpis vykonaných prác musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác, s uvedením jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty a mosta podľa **Prílohy č. 1 a 2** zvlášť,
  - faktúra vrátane jednotlivých súpisov vykonaných prác podľa **Prílohy č. 1 a 2** musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty zvlášť tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
8. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
9. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkazoch výmer, a to čo i len z neobľahosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť

faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.

10. Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadať je zhotoviteľ povinný aj preukázať, inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
11. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať riadne zhotovené Dielo včas ( v lehote podľa ods. 2 článku VI Zmluvy), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku VII Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
14. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
15. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.
16. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
17. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
18. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

## VIII.

### Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 5 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

## IX.

### Odovzdanie a prevzatie Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku VI ods. 2 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku VI ods. 2 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ktorý postup sú zmluvné strany povinné dohodnúť v písomnom Protokole pri odovzdaní Staviska zhotoviteľovi, sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela ( verejnej práce ) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku IX Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 článku IX Zmluvy s tým, že Dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť( vybratý úsek cesty, opravený most).
4. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenie § 555 ods. 2 Obch. zák. ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok, Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavebných prác, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:
  - vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výrobné, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavebných prác,
  - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
  - protokoly o vykonaných skúškach najmä ide o : skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobní, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa



TAB 20 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí, podľa TAB 17 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne (originál, resp. úradne osvedčená kópia), pri prácach menšieho rozsahu (napr. opravy) zhotoviteľ vykoná najmenej jednu skúšku uvedenú v TAB 16 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI na každý vybraný úsek ciest tvoriacich predmet Diela, ďalej preberacie skúšky hotovej vrstvy v TAB 22 a 23 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI. Pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m<sup>2</sup> podľa TAB 22 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhotoviteľ,

- listy odpadov, doklad o uložení na skládku.
5. Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27.
  6. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
  7. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
  8. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ( verejnej práce ), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
  9. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu ( vo forme Príloh ) sú najmä nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
    - dve kópie stavebného denníka,
    - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania
    - DSRS k jednotlivým mostom,
    - dokumentácia kvality Diela ( podľa ods. 4 tohto článku vrátane kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí )
    - doklady o uložení prebytočného materiálu zo staveniska na oficiálnu skládku,
    - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela.
  10. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 9 tohto článku je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
  11. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
    - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
    - názov zákazky, číslo Zmluvy,
    - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá ( konkrétne vybrané úseky ciest )
    - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
    - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
    - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
    - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
    - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
    - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá

- prípadne zoznam chýb a nedorobkov a lehoty ich odstránenia
- 12. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo ( príslušnú časť Diela ) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
- 13. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
- 14. Riadnym odovzdaním Diela ( príslušnej časti Diela ) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diela. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
- 15. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

## X.

### Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa ( najmä „Naviac práce“ ) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer.
3. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/VV musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných/nariadených naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu/VV v jednotlivých Prílohách tejto Zmluvy.
4. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
5. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené v písomnej forme osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou doručenou zástupcovi ore veci technické .
6. Kontaktné údaje osôb a okruh osôb oprávnených konať za zmluvnú stranu môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením zmluvnej strany, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy bez toho, aby zmluvné strany uzatvorili dodatok k zmluve. Oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy.
7. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

## XI. Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem ( najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach ).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
  - porušiť práce
  - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
  - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
  - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku XI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

15

## XII.

### Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách a požiadaviek objednávateľa lege artis.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa článku I, článku III, článku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, článku V ods. 2, ods. 3, , článku VI, článku XIII ods. 7 Zmluvy alebo ak sa počas realizácie Diela preukáže, že stavebné práce podľa výkazov výmer, čo do kvantitatívnych alebo kvalitatívnych požiadaviek Diela nezodpovedajú množstvu alebo kvalite vymienenej objednávateľom v Zmluve, súťažných podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podľa Harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,5% z celkovej ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a/alebo nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom protokole alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas odstrániť vady a oznámené - uplatnené objednávateľom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania

za každú takto reklamovanú vadu Diela zvlášť. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo ( každá jeho časť ) je zhotovené v kvalite podľa požiadaviek ods. 1 tohto článku XII Zmluvy a že tieto bude mať i počas plynutia záručnej doby.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). Záručná doba sa skráti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnene odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávateľom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Dielo spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
9. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným .
10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
11. Uplatnenie väd a nedorobkov v záručnej dobe musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia väd a nedorobkov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 3 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých alebo pokynov od objednávateľa a:
  - a/ ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
  - b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z väd Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.



### Čl. XIII. Zánik zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
  - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
  - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
  - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
    - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
    - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
  - a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy
  - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo, pričom zhotoviteľ má v prípade porušenie povinností podľa písm. c/ tohto ods. právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
  - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,

- e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
  - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
  - g) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
  - h) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
  - i) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
  - j) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. j/ ods. 6 tohto článku, inak má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy alebo
  - k) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela, pričom zhotoviteľ má právo v prípade preukázania skutočností podľa tohto písm. k/ na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
  - l) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedty vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

#### XIV.

##### Záverečné ustanovenia

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité v zmysle § 34 ods. 4 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti:
  - 1.....
  - 2.. ..
  3. ....(neuplatňuje sa)
2. Osoby uvedené v ods. 1. tohto čl. Zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka ( zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v ods. 1 tohto čl. Zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti

podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v v ods. 1 tohto čl. Zmluvy svoj spoločný záväzok so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.

3. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
4. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
6. Táto zmluva má **21 strán** a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
7. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
8. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 3 a § 34 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
13. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
14. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.



15. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
16. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
17. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
18. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:**
- Príloha č. 1: ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní – cesty
  - Príloha č. 2: ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní – mosty
  - Príloha č. 3: projektová dokumentácia – mosty (elektronicky na pamäťovom médiu)
  - Príloha č. 4: Záväzný časový a vecný Harmonogram prác
  - Príloha č. 5: Zoznam všetkých subdodávateľov
  - Príloha č. 6: Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho
  - Príloha č. 7: Certifikáty, vyhlásenia o zhode
  - Príloha č. 8: Potvrdenie o uzavretí poisťných zmlúv
  - Príloha č. 9: Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky
  - Príloha č. 10: Doklad o vlastníctve vlastnej obalovacej súpravy alebo Dohoda o zmluvnom zabezpečení obalovacej súpravy

V Banskej Bystrici dňa: 15. 10. 2018

Za obje

Ing. J.

p

Banskobystrickeno samospravneno kraja

Vo Zvolene dňa: 8. 10. 2018

Za zhot

Ing. Ra:

predseda

Monika Fízelová  
člen predstavenstva



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412  
Objekt:  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asphalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen  
Dátum: 26.07.2018

P.Č.	Popis	Merná jednotka	Výmera	Jednotková cena v €	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6
	<b>Rekonštrukcia ciest a mostov</b>				
	II/578 B.Bystrica -Tajov -Kordíky				1 165 733,45
	II/578 B.Bystrica, Tajovského ul.				157 760,55
	II/578 Skalka - Kremnica				44 584,40
	III/2434 Králiky spojka				359 044,01
	III/2433 Riečka spojka				182 660,56
	III/2410 Špania Dolina spojka				32 156,79
	III/2411 Uľanka spojka				116 251,64
	III/2412 Turecká spojka				19 045,88
578-001A	SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou Tajov				84 777,83
578-002	SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov				4 731,61
578-003	SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov				6 203,42
578-004	SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove				15 921,39
578-005	SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7				30 481,90
578-007	SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica				9 376,66
578-009	SO M 578-009 Most cez potok Skalaka v km 22,592 n meste Kremnica				17 667,34
578-010	SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste Kremnica				19 523,74
578-012	SO M 578-012 Most cez Kremnický potokv km 23,702 v meste Kremnica				8 975,93
2410-01	SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Uľanka				1 285,32
2410-03	SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina				20 619,00
2434-01	SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov				24 358,22
	<u>Spolu bez DPH</u>				10 307,25
	DPH				1 165 733,45
	<u>Spolu vrátane DPH</u>				233 146,69
					1 398 880,14

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/578 B.Bystrica -Tajov -Kordíky

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 10,038			
II/578 B.Bystrica -Tajov -Kordíky		vybraté úseky			
dĺžka úseku	2154,00	m			
šírka voz.m	5,85	m			
plocha úseku	12600,90	m <sup>2</sup>			
korekcie	300,00	m <sup>2</sup>			
		jednotk.cena		spolu bez DPH	
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	35,10	86,35
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	12 900,90	2 451,17
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	12 900,90	6 192,43
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky, konce, MK, MO )	m <sup>2</sup>	50 mm	3,940	123,40	486,20
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	7,560	12 900,90	97 530,80
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>L</sub> 16-II	t		58,990	604,84	35 679,70
vybudovanie rigola z beton.tvárníc TBM 50*30*10 do bet. lôžka	m		30,640	220,00	6 740,80
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m		65,000	80,00	5 200,00
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,550	2 189,10	3 393,11
<b>spolu</b>				<b>157 760,55</b>	
<b>CELKOM:</b>					€
					DPH 20%
					Spolu s DPH
					€ <b>31 552,11</b>
					<b>189 312,67</b>

výmena poškodených kusov a zábradlia z I profilov, vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane montáže, vrátane stĺpikov a hrncov a dodatočných vývrtov

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!


\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

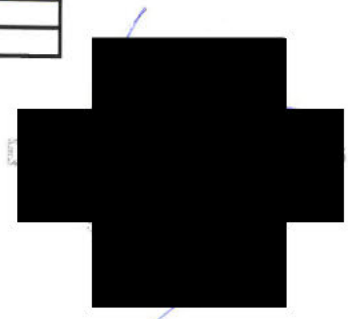

Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/578 B.Bystrica, Tajovského ul.

Číslo cesty/ Názov stavby II/578 B.Bystrica , Tajovského ul.		staničenie v km: 0,000 - 0,530 vybraté úseky a vetvy križovatky																																																			
dĺžka úseku	700,00	m																																																			
šírka voz.m	11,00	m																																																			
plocha úseku	7700,00	m <sup>2</sup>																																																			
korekcie	100,00	m <sup>2</sup>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>pol.</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk.cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>0,190</td> <td>7 800,00</td> <td>1 482,00</td> </tr> <tr> <td>Postrek spojovací</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>0,7 kg/m<sup>2</sup></td> <td>0,480</td> <td>7 800,00</td> <td>3 744,00</td> </tr> <tr> <td>frézovanie s naložením a odvozom do 10 km</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>30 mm</td> <td>3,810</td> <td>120,00</td> <td>457,20</td> </tr> <tr> <td>EMKS 16mm, dvojvrstvový</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>16mm</td> <td>4,600</td> <td>7 800,00</td> <td>35 880,00</td> </tr> <tr> <td>výškova úprava poklopov kanalizačných šácht a vpustí</td> <td>ks</td> <td></td> <td>104,500</td> <td>3,00</td> <td>313,50</td> </tr> <tr> <td>Vvyspravenie povrchu pneumatrysk</td> <td>t</td> <td></td> <td>270,770</td> <td>10,00</td> <td>2 707,70</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>spolu</b></td> <td><b>44 584,40</b></td> </tr> </tbody> </table>						pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	7 800,00	1 482,00	Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	7 800,00	3 744,00	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	30 mm	3,810	120,00	457,20	EMKS 16mm, dvojvrstvový	m <sup>2</sup>	16mm	4,600	7 800,00	35 880,00	výškova úprava poklopov kanalizačných šácht a vpustí	ks		104,500	3,00	313,50	Vvyspravenie povrchu pneumatrysk	t		270,770	10,00	2 707,70	<b>spolu</b>					<b>44 584,40</b>
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €																																																
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	7 800,00	1 482,00																																																
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	7 800,00	3 744,00																																																
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	30 mm	3,810	120,00	457,20																																																
EMKS 16mm, dvojvrstvový	m <sup>2</sup>	16mm	4,600	7 800,00	35 880,00																																																
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht a vpustí	ks		104,500	3,00	313,50																																																
Vvyspravenie povrchu pneumatrysk	t		270,770	10,00	2 707,70																																																
<b>spolu</b>					<b>44 584,40</b>																																																
<b>CELKOM:</b>					<table border="1"> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>Spolu s DPH</td> </tr> <tr> <td>€ 8 916,88</td> <td>53 501,28</td> </tr> </table>	DPH 20%	Spolu s DPH	€ 8 916,88	53 501,28																																												
DPH 20%	Spolu s DPH																																																				
€ 8 916,88	53 501,28																																																				

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača





## Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/578 Skalka - Kremnica (okr. ZH)

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 10,038-19,685			
III/578 Skalka - Kremnica					
dĺžka úseku	8543,00	m			
šírka voz.m	6,68	m			
plocha úseku	57067,24	m <sup>2</sup>			
korekcie	150,00	m <sup>2</sup>			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	43,36	106,67
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	57 217,24	10 871,28
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	57 217,24	27 464,28
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(zač.a konce)	m <sup>2</sup>	50 mm	6,740	67,00	451,58
Vvyspravenie povrchu pneumatrysk	t		270,770	20,00	5 415,40
EMKS 16mm, dvojvrstvový	m <sup>2</sup>	16mm	4,600	49 688,00	228 564,80
výroba, osadenie mreže vstupov šácht priepustov, so zaskrutkovaním, 2* email náter, základný + vrchný	ks	náter	270,000	33,00	8 910,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	8,240	7 529,00	62 038,96
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>t</sub> 16-II	t		65,290	30,00	1 958,70
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,550	8 556,36	13 262,36
<b>spolu</b>					<b>359 044,01</b>
<b>CELKOM:</b>					
					DPH 20%      Spolu s DPH
					<b>€ 71 808,80      430 852,82</b>

rozmery vid'. riadok 47 a nižšie; rozmery slúžia na výpočet materiálu, mrežu je nutné prispôbiť skutkovému stavu vstupného otvoru!

\*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V                      dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača



Príloha č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2434 Králiky spojka

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 4,266			
III/2434 Králiky spojka		vybraté úseky			
dĺžka úseku	2496,00 m				
šírka voz.m	6,00 m				
plocha úseku	14976,00 m <sup>2</sup>				
korekcie	200,00 m <sup>2</sup>				
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	24,00	59,04
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	15 176,00	2 883,44
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	15 176,00	7 284,48
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MK, MO )	m <sup>2</sup>	50 mm	3,550	144,00	511,20
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	7,560	15 176,00	114 730,56
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>16</sub> -II	t		58,990	718,85	42 404,84
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m		60,000	150,00	9 000,00
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht	ks		104,500	18,00	1 881,00
asfaltová zálievka pracovných spojov -N1/N2	m		1,550	2 520,00	3 906,00
spolu					<b>182 660,56</b>
<b>CELKOM:</b>					

výmena poškodených kusov a zábradlia z I profilov, vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane montáže, vrátane stĺpkov a hmcov a dodatočných vývrtov

DPH 20%	Spolu s DPH
€ 36 532,11	219 192,68

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!


\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača



Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2433 Riečka spojka

Číslo cesty/ Názov stavby  
III/2433 Riečka spojka

staničenie v km: 0,000 - 1,263  
vybraté úseky 0,022 - 0,384 = 0,362 km  
1,072 - 1,263 = 0,191 km

dĺžka úseku	553,00	m
šírka voz.m	5,00	m
plocha úseku	2765,00	m <sup>2</sup>
korekcie	20,00	m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	20,00	49,20
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	2 785,00	529,15
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	2 785,00	1 336,80
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	7,470	2 785,00	20 803,95
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>1</sub> 16-II	t		58,200	88,48	5 149,54
asfaltové zálievky pracovných spojov N1/N2	m		1,550	573,00	888,15
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m		68,000	50,00	3 400,00
<b>spolu</b>					<b>32 156,79</b>

výmena poškodených kusov a zábradlia z I profilov, vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane montáže, vrátane stĺpkov a hrncov a dodatočných vývrto

CELKOM:

DPH 20%	Spolu s DPH
€ 6 431,36	38 588,14

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača



**Príloha č. 6**

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2410 Špania Dolina spojka

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 4,083			
III/2410 Špania Dolina spojka		vybraté úseky: 130 + 132+ 417 = 680 m; EMKS na dl. 417 m			
dĺžka úseku	680,00	m			
šírka voz.m	6,41	m			
plocha úseku	4358,80	m <sup>2</sup>			
korekcie	150,00	m <sup>2</sup>			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	12,82	31,54
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	4 508,80	856,67
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0.7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	4 508,80	2 164,22
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce )	m <sup>2</sup>	50 mm	1,510	706,76	1 067,21
EMKS 16 mm dvojvrstvový	m <sup>2</sup>	16 mm	4,600	2 681,31	12 334,03
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	7,560	1 351,92	10 220,52
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>L</sub> 16-II	t		58,990	25,15	1 483,72
asfaltové zálievky pracovných spojov N1/N2	m		1,550	705,64	1 093,74
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m		58,000	1 500,00	87 000,00
spolu					<b>116 251,64</b>
<b>CELKOM:</b>					€ <b>23 250,33</b>
					Spolu s DPH <b>139 501,97</b>

výmena poškodených kusov a zábradlia z I profilov, vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane montáže, vrátane stĺpikov a hrncov a dodatočných vývrtov

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!


\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača



Príloha č. 7

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2411 Uľanka spojka

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 0,198			
III/2411 Uľanka spojka					
dĺžka úseku	176,00 m				
šírka voz.m	6,00 m				
plocha úseku	1056,00 m <sup>2</sup>				
korekcie	m <sup>2</sup>				
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	12,00	29,52
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	1 056,00	200,64
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	1 056,00	506,88
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO )	m <sup>2</sup>	50 mm	12,560	32,00	401,92
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	40 mm	6,690	1 351,92	9 044,34
AcI 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	6,340	1 351,92	8 571,17
asfaltové zálievky pracovných spojov N1/N2	m		1,550	188,00	291,40
<b>spolu</b>					<b>19 045,88</b>
<b>CELKOM:</b>					DPH 20% <b>3 809,18</b>
					Spolu s DPH <b>22 855,05</b>

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača





## Príloha č. 8

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2412 Turecká spojka

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 1,200			
III/2412 Turecká spojka		frezovanie úseku:			
dĺžka úseku	1200,00 m	1,200 - 0,750 = 0,450m x 6 = 2700 m <sup>2</sup>			
šírka voz.m	6,00 m				
plocha úseku	7200,00 m <sup>2</sup>				
korekcie	50,00 m <sup>2</sup>				
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zač. a konca úseku	m	50 mm	2,460	12,00	29,52
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	7 250,00	1 377,50
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	7 250,00	3 480,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky, konce, MK, MO )	m <sup>2</sup>	50 mm	1,060	2 712,00	2 874,72
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	7,640	7 250,00	55 390,00
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>L</sub> 16-II	t		59,780	129,60	7 747,49
asfaltové zálievky pracovných spojov N1/N2	m		1,550	1 212,00	1 878,60
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m		60,000	200,00	12 000,00
spolu					<b>84 777,83</b>
CELKOM:					€ <b>16 955,57</b> <b>101 733,39</b>

výmena poškodených kusov a zábradlia z I profilov, vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane montáže, vrátane slúpkov a hrncov a dodatočných vývrtov


\*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

p.č.	cesta	okres	dĺžka CK v km	vyhovujúci stav - súvislá údržba	nevyhovujúci stav -oprava	havarijný stav - rekonštrukcia	staničenie do	staničenie od	dĺžka opravy v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	II/578	BB	10,038	1,238	2,73	0	0	10,038	2,154	157 760,55	189 312,67
2		BB križovatka					0	0,53	0,530	44 584,40	53 501,28
3		ZH	9,953	7,413	1,127	0,078	10,038	19,685	8,543	359 044,01	430 852,82
4	III/2434	BB	4,266	0	2,496	0	0	4,266	2,496	182 660,56	219 192,68
5	III/2433	BB	1,975	0,552	0	0	0	1,263	0,553	32 156,79	38 588,14
6	III/2410	BB	4,083	0,416	0,132		0	4,083	0,680	116 251,64	139 501,97
7	III/2411	BB	0,198	0,019	0,157	0,000	0	0,198	0,176	19 045,88	22 855,05
8	III/2412	BB	2,824	0	1,200	0	0	1,200	1,200	84 777,83	101 733,39
	<b>Spolu</b>		<b>33,337</b>	<b>9,638</b>	<b>7,842</b>	<b>0,078</b>			<b>16,332</b>	<b>996 281,66</b>	<b>1 195 538,00</b>
									<b>oprava mostov</b>		
									<b>celkom</b>	<b>996 281,66</b>	<b>1 195 538,00</b>



# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BB18007

**Stavba:** REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA,  
III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	169 451,84
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>169 451,84</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	169 451,84	33 890,37

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>203 342,21</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BB18007  
**Stavba:** REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA,  
 III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
 Miesto: Dátum: 26. 6. 2018  
 Objednávateľ: Projektant:  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>169 451,84</b>	<b>203 342,21</b>
2410-01	SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Uíanka	20 619,00	24 742,80
2434-01	SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov	10 307,32	12 368,78
578-001A	SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou Tajov	4 731,61	5 677,93
578-002	SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov	6 203,42	7 444,10
578-003	SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov	15 921,39	19 105,67
578-004	SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove	30 481,90	36 578,28
578-005	SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7	9 376,66	11 251,99
578-007	SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica	17 667,34	21 200,81
578-009	SO M 578-009 Most cez potok Skalaka v km 22,592 n meste Kremnica	19 523,74	23 428,49
578-010	SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste Kremnica	8 975,93	10 771,12
578-012	SO M 578-012 Most cez Kremnický potok v km 23,702 v meste Kremnica	1 285,32	1 542,38
2410-03	SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina	24 358,21	29 229,85
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	I. Ostatné investície	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>169 451,84</b>	<b>203 342,21</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **578-001A - SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou  
Tajov**

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 731,61
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 731,61</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 731,61	946,32
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>5 677,93</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **578-001A - SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou  
Tajov**

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 731,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 011,61
1 - Zemné práce	841,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	514,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 654,87
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	720,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 731,61</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
**Objekt:** 578-001A - SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou Tajov

**Miesto:** \_\_\_\_\_ **Dátum:** 26. 6. 2018

**Objednávateľ:** \_\_\_\_\_ **Projektant:** \_\_\_\_\_  
**Zhotoviteľ:** Vyplň údaj **Spracovateľ:** \_\_\_\_\_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **4 731,606**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **4 011,606**

**1 - Zemné práce** **841,756**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	165,700	5,080	841,756
"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sut'ou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 165,7 <span style="float: right;">165,700</span>							

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **514,976**

2	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	13,300	38,720	514,976
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. príp. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy "vr. ochranného náteru jestvujúcej rímasy 13,3 <span style="float: right;">13,300</span>							

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **2 654,874**

3	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	21,700	92,000	1 996,400
"zábradelné časti jestvujúceho zábradelného zvodidla, vr. očistenia od hrdzi pieskom, veškerej manipulácie s pieskom, "vr. opatrenia súvrstvia PKO (2x syntetika+1x polyuretan) 21,7 <span style="float: right;">21,700</span>							
4	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	39,190	78,380
"pred a za mostom:" 2 <span style="float: right;">2,000</span>							
5	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	20,900	7,710	161,139
6	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	20,900	1,420	29,678
"vr. penetračného náteru 20,9 <span style="float: right;">20,900</span>							
7	K	936172121.R	Doplňkové oceľové konštrukcie	kg	5,000	6,480	32,400
"výmena poškodených kusov - deformačné hrnce zvodidla " vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového materiálu, vr. PKO a veškereho nutného materiálu "pre osadenie 5,0 <span style="float: right;">5,000</span>							
8	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	33,100	6,250	206,875

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulcie s odstraneným materiálom, príp. likvidácie 33,1		33,100		
9	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosů ručne "krajnic, rigolov, prílehlých spávnenných ploch, vr. veškere manipulácie s odstraneným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 35,8	m2	35,800	4,190	150,002
					35,800		

**VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady**

**720,000**

10	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletne zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000
					1,000		

**VP - Práce navyč**

**0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
Objekt: ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
578-002 - SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum: 26. 6. 2018  
Objednávateľ: IČO:  
IČO DPH:  
Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj  
Vyplň údaj IČO DPH: Vyplň údaj  
Projektant: IČO:  
IČO DPH:  
Spracovateľ: IČO:  
IČO DPH:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 203,42
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 203,42</b>
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	6 203,42
	1 240,68
<b>Cena s DPH</b>	<b>7 444,10</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 578-002 - SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 203,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 673,42
1 - Zemné práce	1 271,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 367,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 034,88
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 203,42</b>

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 578-002 - SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 203,424**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 673,424**

#### 1 - Zemné práce

**1 271,016**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	250,200	5,080	1 271,016
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 250,2 250,200							

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**2 367,526**

2	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	20,200	35,370	714,474
"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 20,2 20,200							
3	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	22,100	38,720	855,712
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 22,1 22,100							
4	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	13,700	58,200	797,340
"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 13,7 13,700							

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**1 034,882**

5	K	911131111.2R	Mostné zábradlie-oprava na mieste	m	21,500	17,220	370,230
" vr. demontáže, úprava stĺpikov pre montáž (privarenie nových patných dosiek), vr. očistenia od hrdzi pieskom, veškerej manipulácie s pieskom " vr. opatrenia súvrstvia PKO, osadenia do dodatečných vývrtov, vr. dodania veškereho nutného materiálu, vývrtov kotiev, podlití stĺpikou plastmaltou 21,5 21,500							
6	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	39,190	78,380
"pred a za mostom:" 2 2,000							
7	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	16,400	7,710	126,444
8	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	16,400	1,420	23,288

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"vr. penetračného náteru 16,4		16,400		
9	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	67,500	6,250	421,875
			"otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerych nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 67,5		67,500		
10	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne	m2	3,500	4,190	14,665
			"krajnic, rigolov, prílehlých spävnenných ploch, vr. veškere manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 3,5		3,500		

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

11	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	270,000	270,000
			"vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí 1		1,000		
12	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
			"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1		1,000		
13	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			"ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1		1,000		
14	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	720,000	720,000
			"kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1		1,000		

### VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt:

578-003 - SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatné náklady

15 921,39  
0,00

Cena bez DPH

15 921,39

DPH základná  
znižená

20,00%  
20,00%

z  
z

0,00  
15 921,39

0,00  
3 184,28

Cena s DPH

v EUR

19 105,67

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: **578-003 - SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov**

Miesto:

Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**15 921,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 391,39

1 - Zemné práce

2 080,27

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

318,07

4 - Vodorovné konštrukcie

1 893,67

5 - Komunikácie

163,64

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 125,06

8 - Rúrové vedenie

95,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 715,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,00

VP - Práce navyč

0,000

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

Zariadenia stav.

0,00

Mimostav. Doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkov vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**15 921,39**

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: **578-003 - SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov**

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 921,386**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**14 391,386**

#### 1 - Zemné práce

**2 080,269**

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	0,800	12,240	9,792
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------	--------	-------

"frézovanie obrusné vrstvy, vr. odstránenia podkladných vrstev, vr. naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku

"v mieste chodníka:" 0,8

0,800

2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	0,500	5,290	2,645
---	---	-------------	------------------------	----	-------	-------	-------

"odkop za mostom pre vybudovanie nového výškového napojenia jestvujúceho bet. obrubníka

"vr. odvozu sutiny na meziskládku pre spätné pioužitie alebo na skládku, vr. uloženia a poplatku  
0,5

0,500

3	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	406,600	5,080	2 065,528
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	-----------

"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sutou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)

406,6

406,600

4	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	0,800	2,880	2,304
---	---	-------------	------------------------------	----	-------	-------	-------

"dosypanie pre úpravu výškového napojenia bet. obrubníka na vozovku

"vhodného materiálu, dovozu, zhutnenia

0,8

0,800

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**318,074**

5	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,700	151,540	106,078
---	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

"vr. dodania betónu, kotvenia rímky do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru

"vr. tesnenia pracovných škár

0,7

0,700

6	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,100	1 342,260	134,226
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	---------

7	K	388994111.R	Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z tvrdého PVC	m	11,000	7,070	77,770
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

"nová plastová chránička pre jestvujúce el. vedenia pod mostom

"vr. pozdĺžneho narezania chráničky priem. 50 mm

"vr. prikotvenia ocel. prvky ku mostnej opere, vr. manipulácie s kábelom a dočasného vypnutia el. prúdu

11,0

11,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

1 893,672

8	K	465513217.R	Predláženie dlažieb z lomového kameňa "vr. rozobratia, očistenia, zriadenia vr. bet. lôžka C20/25 hr. 100 m, vyškárovani, vr. veľkorej manipulácie s materiálom, vr. úpravu podkladu "vr. príp. debnenia, príp. zemných prác, vr. príp. doplnenia chýbajúceho kameňa "vr. sťažených pracovných podmienok, práce pod mostom a vo vode 39,6	m3	39,600	47,820	1 893,672
					39,600		

#### 5 - Komunikácie

163,640

9	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy "obrusná, ložná vrstva, vr. spojovací emulze, vr. príp. úpravy podkladu 0,4	m3	0,400	409,100	163,640
					0,400		

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 125,056

10	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva "vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 62,4	m2	62,400	35,370	2 207,088
					62,400		
11	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm "vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy "na mostnej konštrukcii:" 45,7 "obrubní chodníku:" 0,2 Súčet 45,900	m2	45,900	38,720	1 777,248
					45,900		
12	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm "1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 19,6	m2	19,600	58,200	1 140,720
					19,600		

#### 8 - Rúrové vedenie

95,680

13	K	899623171.R	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope "monolitický betónový obrubník na vonkajšej strane chodníka, vytvarovaný podľa rímky mostu a terénu za mostom pre vytvorenie výškového napojenia na " jestvujúci stav, vr. debnenia 1,0	m3	1,000	95,680	95,680
					1,000		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 714,995

14	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena " vr. demontáže, naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového zábradlia, vr. PKO a veľkerého nutného materiálu "pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stĺpikou plastmaltou "zábradlie so zvislou výplňou:" 10,4	m	10,400	300,000	3 120,000
					10,400		
15	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu "pred a za mostom:" 2	ks	2,000	39,190	78,380
					2,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	16,500	7,710	127,215
17	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm "vr. penetračného náteru 16,5	m	16,500	1,420	23,430
18	K	936172121.R	Doplnkové ocelové konštrukcie "doplnenie chýbajúce zvislé výplne zábradlia, príp. výmena zdeformovaných prvkov " vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre montáž 50,0	kg	50,000	6,480	324,000
19	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie "otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistôt (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 134,0	m2	134,000	6,250	837,500
20	K	961051111.R	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu "vr. naloženia suti, odvozu, uloženia na skládku 25 km, poplatku "ríms:" 0,7	m3	0,700	292,100	204,470

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

21	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu "vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
22	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
23	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
24	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000

### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
 ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
 Objekt: **578-004 - SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				30 481,90
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 481,90</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 481,90	6 096,38
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>36 578,28</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 578-004 - SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**30 481,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

**28 951,90**

1 - Zemné práce

1 595,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 470,15

4 - Vodorovné konštrukcie

130,85

5 - Komunikácie

369,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 729,70

8 - Rúrové vedenie

95,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 560,48

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,00

VP - Práce navyše

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

Zariadenia stav.

0,00

Mimostav. Doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkov vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**30 481,90**

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 578-004 - SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**30 481,902**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**28 951,902**

#### 1 - Zemné práce

**1 595,548**

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	0,900	6,120	5,508
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

"frézovanie obrusné vrstvy, vr. odstránenia podkladných vrstev, vr. naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku

"hr. 40 mm:" 0,9

0,900

2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	313,000	5,080	1 590,040
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	-----------

"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)

313,0

313,000

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**2 470,153**

3	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	7,000	151,540	1 060,780
---	---	-------------	--	----	-------	---------	-----------

"vr. dodania betónu, kotvenia rímky do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru

"vr. tesnenia pracovných škár

7,0

7,000

4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,050	1 342,260	1 409,373
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**130,846**

5	K	462511111.R	Zahádzka z lomového kameňa	m3	1,000	44,770	44,770
---	---	-------------	----------------------------	----	-------	--------	--------

"doplňenie kameňmi jestvujúceho záhozu, vr. príp. úpravy podkladu, vr. príp. podklad. vrstev

1

1,000

6	K	465513217.R	Predláždenie dlažieb z lomového kameňa	m3	1,800	47,820	86,076
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

"vr. rozobratia, očistenia, zriadenia vr. bet. lôžka C20/25 hr. 100 m, vyškárovani, vr. veškerej manipulácie s materiálom, vr. úpravu podkladu

"vr. príp. debnenia, príp. zemných prác, vr.

príp. doplnenia chábajúceho kameňa

"vr. sťažených pracovných podmienok, práce pod mostom a vo vode

1,8

1,800

#### 5 - Komunikácie

**369,495**

7	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	0,900	410,550	369,495
---	---	--------------	------------------	----	-------	---------	---------

"obrusná, ložná vrstva, vr. spojovací emulze, vr. príp. úpravy podkladu

0,9

0,900



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

							<b>4 729,696</b>
8	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	48,800	38,720	1 889,536

"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí

"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy

48,8

48,800

9	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	48,800	58,200	2 840,160
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí

"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy

48,8

48,800

### 8 - Rúrové vedenie

							<b>95,680</b>
10	K	899623171.R	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	1,000	95,680	95,680

"sanácia okolo vyústenia rúry z múra, vr. debnenia

1,0

1,000

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

							<b>19 560,484</b>
11	K	911334121.2R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-výmena	m	49,600	350,000	17 360,000

" vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, vr. dodania nového zvodidla, vr. koncový dielov,

" vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stápkou plastmalto

" vr. zaberania stápkov mimo rímsu

49,6

49,600

12	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

13	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	71,600	7,710	552,036
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

14	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	49,600	2,810	139,376
----	---	-------------	------------------------------------	---	--------	-------	---------

"pozdĺž ríms vo vozovke, asf. modifikovanou záľivkou, vr. peneračného náteru, predtesnenia

49,6

49,600

15	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	71,600	1,420	101,672
----	---	-------------	-----------------------------------	---	--------	-------	---------

"vr. penetračného náteru

71,6

71,600

16	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	162,600	6,250	1 016,250
----	---	-------------	------------------------------	----	---------	-------	-----------

"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraneným materiálom, príp. likvidácie

162,6

162,600

17	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	84,000	4,190	351,960
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

"krajnic, rigolov, prilehlých spávnenných ploch, vr. veškere manipulácie s odstraneným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku

84,0

84,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

**1 530,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu "vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
19	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
20	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
21	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000

VP - Práce navyč

							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: 578-005 - SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 376,66
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>9 376,66</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 376,66	1 875,33
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>11 251,99</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: **578-005 - SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7**

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>9 376,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 386,66
1 - Zemné práce	1 230,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	751,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 404,61
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	990,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>9 376,66</b>



# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 578-005 - SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

9 376,661

### HSV - Práce a dodávky HSV

8 386,661

#### 1 - Zemné práce

1 230,884

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	242,300	5,080	1 230,884
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sut'ou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 242,3 242,300							

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

751,168

2	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	19,400	38,720	751,168
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. očistenia a vyplnenia škár, príp. trhlin trvalo pružným tmelom "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 19,4 19,400							

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 404,609

3	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	37,000	92,000	3 404,000
"jestvujúcich stĺpikov zábrad. zvodidla, vr. očistenia od hrdzi pieskom "veškerej manipulácie s pieskom, vr. opatrenia súvrstvia PKO dľa TP 60 "14 ks:" 37,0 37,000							
4	K	911334121.2R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-výmena	m	6,000	380,000	2 280,000
" vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, vr. dodania nového zvodidla, vr. koncový dielov, " vr. PKO a veškereho nutného materiálu pre osadenie, " vr. zaberania stĺpikov mimo rímsu 6,0 6,000							
5	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	39,190	78,380
"pred a za mostom, vr. príp. odstránenia jestvujúcej tabuľky 2 2,000							
6	K	935111211.R	Žlab z betónových priekopových tvárnic	m	5,000	4,580	22,900
"doplnenie chýbajúcich žlaboviek vr. dodania materiálu, zriadenia, vr. bet. ložka, zapravenia škár 5,0 5,000							
7	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	64,500	6,250	403,125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 64,5		64,500		
8	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne "krajnic, rigolov, prilehlých spávnenných ploch, vr. veškere manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 51,6	m2	51,600	4,190	216,204
					51,600		

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

990,000

9	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
					1,000		
10	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000
					1,000		

#### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **578-007 - SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica**

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				17 667,34
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 667,34</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 667,34	3 533,47
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>21 200,81</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: **578-007 - SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica**

Miesto:

Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**17 667,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

16 137,34

1 - Zemné práce

1 544,57

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 298,94

5 - Komunikácie

224,84

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 740,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 328,62

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,00

VP - Práce navyč

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

Zariadenia stav.

0,00

Mimostav. Doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkov vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**17 667,34**



# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410  
 ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
 Objekt: 578-007 - SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 667,341**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**16 137,341**

#### 1 - Zemné práce

**1 544,573**

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	0,500	9,650	4,825
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

"frézovanie obrusné vrstvy, vr. odstránenia podkladných vrstev, vr. naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku

"š. 1,0m, hr. 40 mm:" 0,5 0,500

2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	303,100	5,080	1 539,748
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	-----------

"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)

303,1 303,100

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**1 298,941**

3	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,700	151,540	560,698
---	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

"vr. dodania betónu, kotvenia rímky do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru

"vr. tesnenia pracovných škár

3,7 3,700

4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,550	1 342,260	738,243
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	---------

#### 5 - Komunikácie

**224,835**

5	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	0,500	449,670	224,835
---	---	--------------	------------------	----	-------	---------	---------

"obrusná, ložná vrstva, vr. spojovací emulze, vr. príp. úpravy podkladu

0,5 0,500

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**4 740,372**

6	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	78,800	35,370	2 787,156
---	---	-------------	---------------------------	----	--------	--------	-----------

"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu

78,8 78,800

7	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	28,800	38,720	1 115,136
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výstuže pieskom, reaktívneho náteru výstuže pri nedostatočnom krytí

"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy

28,8 28,800

8	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	14,400	58,200	838,080
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy		14,4		
							14,400

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 328,620

9	K	911334121.1R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-nové " vr. koncový dielov, vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov "vr. vývrtov, kotiev, podlití stĺpikou plastmalto	m	22,800	300,000	6 840,000
			22,8		22,800		
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
11	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	32,000	7,710	246,720
12	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm "pozdĺž ríms vo vozovke, asf. modifikovanou záľivkou, vr. peneračného náteru, predtesnenia	m	11,400	2,810	32,034
			11,4		11,400		
13	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm "vr. penetračného náteru	m	32,000	1,420	45,440
			32,0		32,000		
14	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie "otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie	m2	90,300	6,250	564,375
			90,3		90,300		
15	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne "krajnic, rigolov, prílehlých spávnenných ploch, vr. veškere manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku	m2	11,400	4,190	47,766
			11,4		11,400		
16	K	966005211.R	Rozobranie ocelového zábradlia " vr. naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom	m	20,900	24,550	513,095
			20,9		20,900		

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

17	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu "vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			1		1,000		
18	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP	eur	1,000	270,000	270,000
			1		1,000		
19	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia	eur	1,000	720,000	720,000
			1		1,000		

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **578-009 - SO M 578-009 Most cez potok Skalaka v km 22,592 n meste Kremnica**  
JKSO:  
Miesto: KS: Dátum: 26. 6. 2018  
Objednávateľ: IČO:  
IČO DPH:  
Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj  
Vyplň údaj IČO DPH: Vyplň údaj  
Projektant: IČO:  
IČO DPH:  
Spracovateľ: IČO:  
IČO DPH:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 523,74
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 523,74</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 523,74	3 904,75
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>23 428,49</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **578-009 - SO M 578-009 Most cez potok Skalaka v km 22,592 n meste Kremnica**

Miesto:

Dátum:

26. 6. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**19 523,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

17 993,74

1 - Zemné práce

822,96

2 - Zakladanie

101,87

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

253,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 459,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 355,66

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,00

VP - Práce navyč

0,000

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

Zariadenia stav.

0,00

Mimostav. Doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkov vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**19 523,74**



# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKKA-KREMKNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: **578-009 - SO M 578-009 Most cez potok Skalaka v km 22,592 n meste Kremnica**

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**19 523,739**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**17 993,739**

#### 1 - Zemné práce

**822,960**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	162,000	5,080	822,960
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) "vr. odstránenia smreka na výtokovej strane 162,0 162,000							

#### 2 - Zakladanie

**101,870**

2	K	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	1,000	101,870	101,870
"betonové pätky pre žb stĺpiky zábradlia, vr. zemných prác, kompletnej manipulácie so zemnou, odvozu na skládku, poplatku 1,0 1,000							

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**253,727**

3	K	317321119.R	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,700	151,540	106,078
"vr. dodania betónu, kotvenia rím do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotveného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru "vr. tesnenia pracovných škár 0,7 0,700							
4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,110	1 342,260	147,649

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**3 459,526**

5	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	33,000	35,370	1 167,210
"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 33,0 33,000							
6	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	33,800	38,720	1 308,736
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 33,8 33,800							
7	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	16,900	58,200	983,580
"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy

16,9

16,900

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 355,656

8	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	27,000	350,000	9 450,000
---	---	--------------	-------------------------	---	--------	---------	-----------

" vr. demontáže, naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového zábradlia, vr. PKO a veškerého nutného materiálu  
 "pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stĺpikou plastmaltou  
 "so zvislou výplňou:" 12,0  
 "dvojmadlové:" 15,0  
 Súčet

12,000

15,000

27,000

9	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	30,000	92,000	2 760,000
---	---	--------------	-----------------------------	---	--------	--------	-----------

"jestvujúceho zábradlia, vr. očistenia od hrdzi pieskom, veškerej manipulácie s pieskom, vr. opatrenia súvrstvia PKO (2x syntetika+1x polyuretan)  
 30,0

30,000

10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

11	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priechne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	24,700	7,710	190,437
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

12	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	27,700	1,420	39,334
----	---	-------------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------

"vr. penetračného náteru

27,7

27,700

13	K	936121121.R	Doplňkové betónové konštrukcie	m3	0,600	25,050	15,030
----	---	-------------	--------------------------------	----	-------	--------	--------

"výmena poškodených kusov - prefa žb stĺpiky zábradlia s výstužou

" vr. demontáže, naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku, vr. dodania nového dilca a veškerého nutného materiálu pre osadenie

"vr. osadenia do betonových pätiiek C25/30, vr. zemných prác

0,6

0,600

14	K	936172121.R	Doplňkové ocelové konštrukcie	kg	48,000	6,480	311,040
----	---	-------------	-------------------------------	----	--------	-------	---------

"výmena poškodených kusov zábradlia

" vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového materiálu, vr. PKO a veškerého nutného materiálu

"pre osadenie

48,0

48,000

15	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	88,100	6,250	550,625
----	---	-------------	------------------------------	----	--------	-------	---------

"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerych nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie

88,1

88,100

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

16	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	270,000	270,000
----	---	-------------	---	-----	-------	---------	---------

"vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí

1

1,000

17	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
----	---	-------------	---	-----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1		1,000		
18	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			"ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1		1,000		
19	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	720,000	720,000
			"kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1		1,000		

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **578-010 - SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste Kremnica**

JKSO: \_\_\_\_\_ KS: \_\_\_\_\_  
Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
IČO DPH: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ: \_\_\_\_\_ IČO: Vyplň údaj  
Vyplň údaj IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
IČO DPH: \_\_\_\_\_

Spracovateľ: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
IČO DPH: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

Náklady z rozpočtu				8 975,93
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 975,93</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 975,93	1 795,19
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>10 771,12</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **578-010 - SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste Kremnica**

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 975,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 445,93
1 - Zemné práce	1 104,39
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	56,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 213,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 072,45
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 975,93</b>



# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
 Objekt: **578-010 - SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste Kremnica**

Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: \_\_\_\_\_ Projektant: \_\_\_\_\_  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: \_\_\_\_\_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 975,927**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 445,927**

#### 1 - Zemné práce

**1 104,392**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	217,400	5,080	1 104,392
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 217,4							
					217,400		

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**56,070**

2	K	311301001.1	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnym tmelem	m	3,000	18,690	56,070
"injektážnym tmelem sílovo pôsobiaceho, vr. vyčistenia škáry, príp. rezania a prípravy podkladu, vr. dodania všetkého potrebného materiálu "vr. príp. lešenia 3,0							
					3,000		

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**2 213,015**

3	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	50,300	35,370	1 779,111
"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 50,3							
					50,300		
4	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	8,200	38,720	317,504
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 8,2							
					8,200		
5	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	2,000	58,200	116,400
"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 2,0							
					2,000		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**4 072,450**

6	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	7,700	300,000	2 310,000
"vr. demontáže, naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového zábradlia, vr. PKO a veškereho nutného materiálu "pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stápkou plastmaltou							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			7,7		7,700		
7	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO "jestvujúceho zábradlia, vr. očistenia od hrdzi pieskom, veškerej manipulácie s pieskom, vr. opatrenia súvrstvia PKO (2x syntetika+1x polyuretan) 18,6	m	18,600	92,000	1 711,200
8	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie "otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulcie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 8,2	m2	8,200	6,250	51,250
					8,200		

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

9	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu "vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
					1,000		
10	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
					1,000		
11	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
					1,000		
12	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000
					1,000		

### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **578-012 - SO M 578-012 Most cez Kremnický potokv km 23,702 v meste Kremnica**

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 285,32
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 285,32</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 285,32	257,06
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>1 542,38</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: **578-012 - SO M 578-012 Most cez Kremnický potokv km 23,702 v  
meste Kremnica**

Miesto:

Dátum:

26. 6. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 285,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 285,32
1 - Zemné práce	733,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	551,77
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 285,32</b>

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
 Objekt: **578-012 - SO M 578-012 Most cez Kremnický potokv km 23,702 v meste Kremnica**

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 285,324**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 285,324**

#### 1 - Zemné práce

**733,552**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	144,400	5,080	733,552
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	---------

"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sut'ou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)

144,4

144,400

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**551,772**

2	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	15,600	35,370	551,772
---	---	-------------	---------------------------	----	--------	--------	---------

"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu

15,6

15,600

#### VP - Práce navyč

**0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: 2410-01 - SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Uľanka

JKSO:  
Miesto: \*

KS:  
Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 619,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>20 619,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 619,00	4 123,80
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>24 742,80</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 2410-01 - SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Uľanka

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>20 619,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 089,00
1 - Zemné práce	1 991,53
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 482,09
5 - Komunikácie	383,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 589,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 641,80
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>20 619,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 2410-01 - SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Uľanka

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Vypĺň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 619,003**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**19 089,003**

#### 1 - Zemné práce

1	K	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstev	m3	1,000	7,400	1 991,525
"frézovanie obrusné vrstvy, vr. odstránenia podkladných vrstev, vr. naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku							7,400
"š. 0,5m, hr. 100 mm:"					1,0		
2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	240,500	8,250	1 984,125
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veľkorej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km							
"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)							
					240,5		
					240,500		

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3	K	317321119.R	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	4,200	151,540	1 482,092
"vr. dodania betónu, kotvenia rím do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru							
"vr. tesnenia pracovných škár							
					4,2		
					4,200		
4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,630	1 342,260	845,624

#### 5 - Komunikácie

5	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	1,000	383,700	383,700
"obrusná, ložná vrstva, vr. spojovací emulze, vr. príp. úpravy podkladu							
					1,0		
					1,000		

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	30,500	35,370	1 589,889
"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu							1 078,785
					30,5		
					30,500		
7	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	13,200	38,720	511,104
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí							
"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy							
					13,2		
					13,200		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	K	911334121.1R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-nové	m	18,700	300,000	13 641,797
							5 610,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"vr. koncový dielov, vr. PKO a veškerého  
nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia  
do dodatečných vývrtov

"vr. vývrtov, kotiev, podlití stĺpikou plastmalto

"vr. zaberanenia stĺpikov mimo rímsu

18,7

18,700

9	K	911334121.2R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-výmena	m	19,300	350,000	6 755,000
---	---	--------------	--	---	--------	---------	-----------

"vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na  
miesto určené zhotoviteľom, vr. dodania  
nového zvodidla, vr. koncový dielov,

"vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre  
osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov,  
vr. vývrtov kotiev, podlití stĺpikou plastmalto

"vr. zaberanenia stĺpikov mimo rímsu

19,3

19,300

10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
11	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priechne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	23,700	7,710	182,727
12	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	18,300	2,810	51,423

"pozdlž ríms vo vozovke, asf. modifikovanou  
zálivkou, vr. penetračného náteru, predtesnenia

18,3

18,300

13	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	23,700	1,420	33,654
----	---	-------------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------

"vr. penetračného náteru

23,7

23,700

14	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	89,500	6,250	559,375
----	---	-------------	------------------------------	----	--------	-------	---------

"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých  
nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej  
manipulcie s odstraným materiálom, príp.  
likvidácie

89,5

89,500

15	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	45,200	4,190	189,388
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

"krajnic, rigolov, prilehlých spävnenných ploch,  
vr. veškeré manipulácie s odstraným  
materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km,  
poplatku

45,2

45,200

16	K	966005211.R	Rozobranie ocelového zábradlia	m	9,000	24,560	221,040
----	---	-------------	--------------------------------	---	-------	--------	---------

"vr. naloženia, odvozu, uloženia na miesto  
určené zhotoviteľom

9,0

9,000

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

17	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	270,000	270,000
----	---	-------------	--	-----	-------	---------	---------

"vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky,  
meranie v priebehu výstavby, vr. príp.  
vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí

1

1,000

18	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
----	---	-------------	--	-----	-------	---------	---------

"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia  
skutočného provedenia, príp. Technologický  
postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP

1

1,000

19	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
----	---	-------------	---	-----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí				
			1		1,000		
20	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	720,000	720,000
			"kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia				
			1		1,000		

VP - Práce navyše

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt:

**2410-03 - SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

24 358,21

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

24 358,21

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	24 358,21

0,00

4 871,64

Cena s DPH

v EUR

29 229,85

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
Objekt: **2410-03 - SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina**

Miesto:

Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

	<b>24 358,21</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemné práce	22 828,21
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	674,12
4 - Vodorovné konštrukcie	1 129,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 701,83
8 - Rúrové vedenie	5 934,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	124,38
	12 264,25
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyše	0,00

## 2) Ostatné náklady

Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**24 358,21**

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY  
**Objekt: 2410-03 - SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina**

Miesto: Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**24 358,211**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**22 828,211**

#### 1 - Zemné práce

**674,116**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	132,700	5,080	674,116
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sut'ou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 132,7							
					132,700		

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**1 129,213**

2	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,200	151,540	484,928
"vr. dodania betríu, kotvenia rímky do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru "vr. tesnenia pracovných škár 3,2							
					3,200		
3	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,480	1 342,260	644,285

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**2 701,830**

4	K	465513217.R	Predláženie dlažieb z lomového kameňa	m3	56,500	47,820	2 701,830
"vr. rozobratia, očistenia, zriadenia vr. bet. lôžka C20/25 hr. 100 m, vyškárovani, vr. veškerej manipulácie s materiálom, vr. úpravu podkladu "vr. príp. debnenia, príp. zemných prác, vr. príp. doplnenia chábajúceho kameňa 56,5							
					56,500		

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**5 934,423**

5	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	23,100	35,370	817,047
"vr. škárovania a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 23,1							
					23,100		
6	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	52,800	38,720	2 044,416
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy "vr. ochranného náteru jestvujúcich rím 52,8							
					52,800		
7	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	52,800	58,200	3 072,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy		52,8		
							52,800

### 8 - Rúrové vedenie

8	K	899623171.R	Obetonovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	1,300	95,680	124,384
			"sanácia okolo zaústenia potrubia, obetonovanie päty krídel a klenby vr. debnenia		1,3		
							1,300

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	K	911334121.1R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-nové	m	36,300	300,000	12 264,245
			"vr. koncový dielov, vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov "vr. vývrtov, kotiev, podlití stĺpikou plastmalto "vr. zaberania stĺpikov mimo rímsu		36,3		10 890,000
							36,300
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	39,190	78,380
			"pred a za mostom:" 2		2,000		
11	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	118,800	6,250	742,500
			"otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistôt (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie		118,8		
							118,800
12	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	60,000	4,190	251,400
			"krajnic, rigolov, prilehlých spačenných ploch, vr. veškeré manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku		60,0		
							60,000
13	K	966005211.R	Rozobranie ocelového zábradlia	m	12,300	24,550	301,965
			"vr. naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom		12,3		
							12,300

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

14	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	270,000	1 530,000
			"vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí		1		270,000
							1,000
15	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
			"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP		1		
							1,000
16	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			"ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí		1		
							1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000
					1,000		

VP - Práce naviac

							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt:

2434-01 - SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

10 307,32

0,00

Cena bez DPH

10 307,32

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

10 307,32

0,00

2 061,46

Cena s DPH

v EUR

12 368,78

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 2434-01 - SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov

Miesto:

Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**10 307,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

**9 047,32**

1 - Zemné práce

1 931,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

414,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 701,60

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 260,00

VP - Práce navyše

0,000

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

Zariadenia stav.

0,00

Mimostav. Doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkov vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**10 307,32**

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, KALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLÍKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA-MOSTY

Objekt: 2434-01 - SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov

Miesto:

Dátum: 26. 6. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 307,315

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 047,315

#### 1 - Zemné práce

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	380,200	5,080	1 931,416
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 380,2							
					380,200		

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	10,700	38,720	414,304
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 10,7							
					10,700		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	K	911131111.4R	Mostné zábradlie-nové	m	20,800	300,000	6 701,595
"vr. dodanie nového zábradlia, vr. PKO a veškerého nutného materiálu "pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stípkou plastmaltou 20,8							
					20,800		
4	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
5	K	935111211.R	Žlab z betónových priekopových tvárnic	m	7,800	4,580	35,724
"doplnenie chýbajúcich žlaboviek vr. dodania materiálu, zriadenia, vr. bet. ložka, zapravenia škár 7,8							
					7,800		
6	K	936172121.R	Doplnkové ocelové konštrukcie	kg	10,000	6,480	64,800
"lokálna vyrovnanie pásnice na mieste "vr. PKO a dodania veškerého nutného materiálu 10,0							
					10,000		
7	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	21,400	6,250	133,750
"otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistôt (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstráneným materiálom, príp. likvidácie 21,4							
					21,400		
8	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	44,900	4,190	188,131

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"krajnic, rigolov, prílehlých spävnenných ploch, vr. veškeré manipulácie s odstraneným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 44,9		44,900		

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 260,000

9	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
10	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
11	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000

### VP - Práce navyč

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000












### Zoznam subdodávateľov.

P. č.	Obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, adresa, dátum narodenia)	Podiel subdodávky	Predmet subdodávky
1.			0,00 %	





Ing. Rastislav Löffler  
predseda predstavenstva



Monika Fízelová  
člen predstavenstva








**SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV**  
Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica


ul. Kollárova č.2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Vážený pán




# PROFESNÝ ŽIVOTOPIS

Titul, meno priezvisko




Miesto pôsobenia



Vo Zvolene 24.7.2018

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE



Doprastav Asphalt, a.s.


Telefón:  
E-mail:

Bankové spojenie  
UniCreditBank Slovakia, a.s. Bratislava  
IBAN SK31 1111 0000 0011 2702 8005  
SWIFT kód UNCRSKBX

IČO: 46 120 602  
DIČ: 2023231892  
IČ DPH:SK2023231892

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1010/S



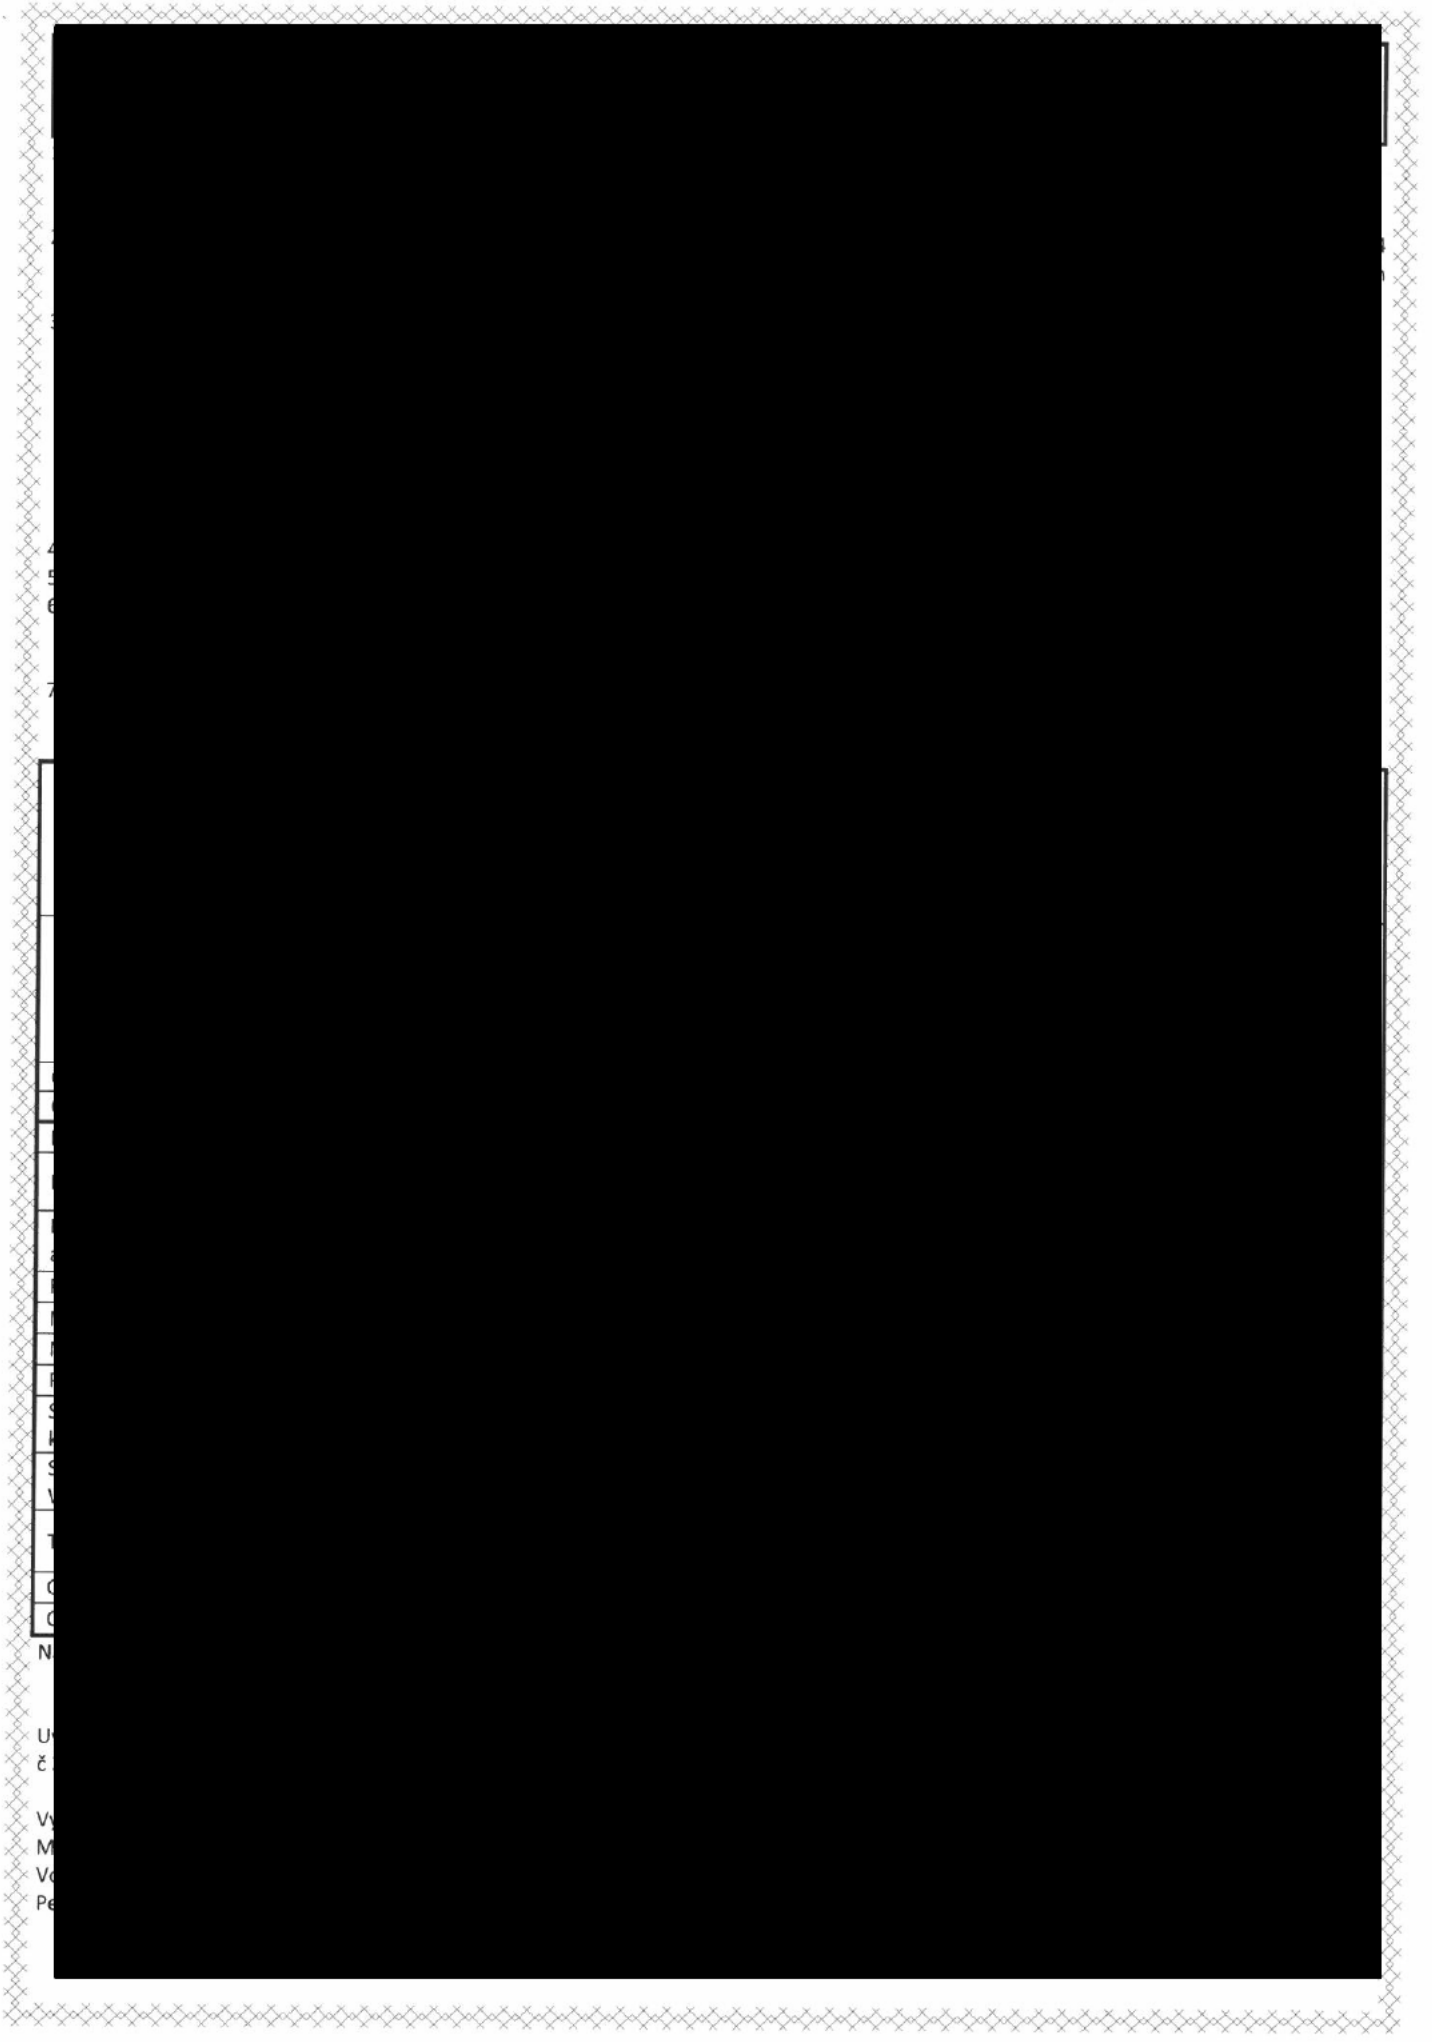

4  
5  
6


7


8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000


N

U  
c


V  
M  
V  
P






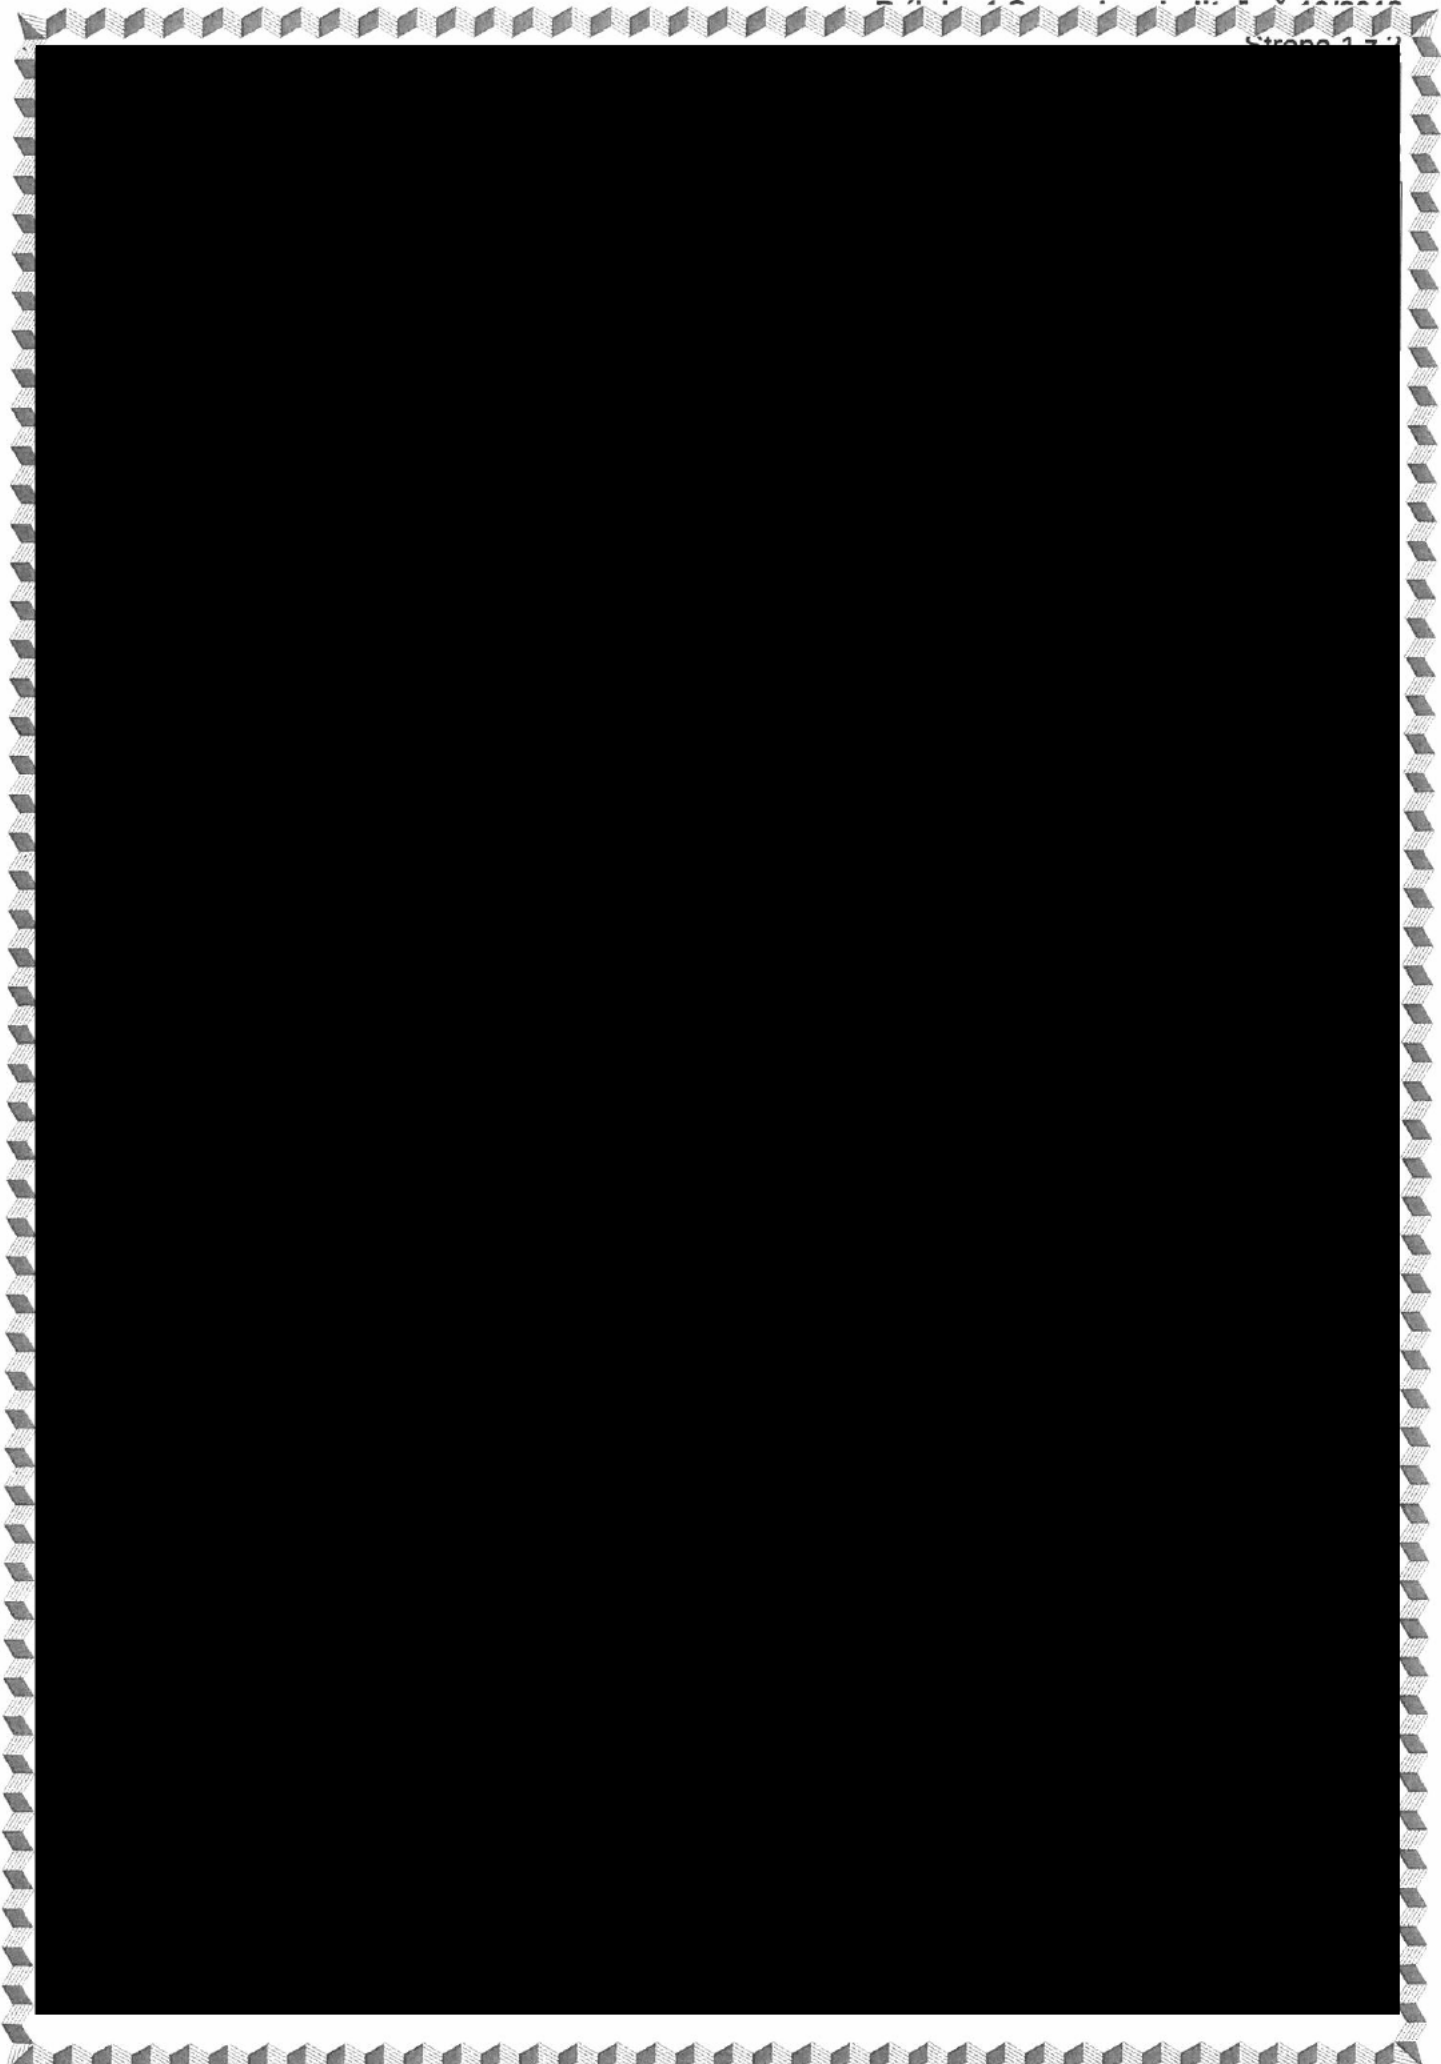

Doprastav Asphalt, a. s.  
Stráž 223/3  
960 01 Zvolen








OJ poisťovne: 184

Číslo získaťa: 43500000

**Dodatok číslo 1**

**zmeny v rámci majetkových poisťných zmlúv a poisťných zmlúv poistenia  
všeobecnej zodpovednosti za škodu uzatvorených v  
KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa)**




ORIGINAL

Banková záruka č. [REDACTED]

Bratislava, 04. októbra 2018

**VUIS - CESTY®**  
spol. s r. o.



088

VUIS - GESTY®

spol. s r. o.

