

ZMLUVA O DIELO č.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa: 1049/2018/ODD/PUV

ev. č. zhotoviteľa: 10000136847/3489

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská
Bystrica cez Brezno po obec Telgárt“

(ďalej iba „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objedávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený

zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

37828100

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová,
odborná referentka

048/4325111, 048/4325523

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel:Sa,
vložka č.: 5012/B

31 611 788

+421/2 48 295 111, +421/2 48 295 146

skanska@skanska.sk, jozef.roza@skanska.sk

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Táto zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 155 / 2018 dňa 07.08.2018 pod zn. oznámenia 11088 – WYP na predmet zákazky „**Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt**“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“).

I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest III. triedy, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a v **Prílohe č. 1** k Zmluve (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“). **Príloha č. 1 Zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa súťažných podmienok verejného obstarávania disponuje a predložil objednávateľovi ku dňu podpisu Zmluvy:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávateľom
(**Príloha č. 2 Zmluvy**),
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu

subdodávky,

(Príloha č. 3 Zmluvy)

- **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho** v zmysle podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zdefinoval v rámci verejného obstarávania (v prípade, ak sa jedná o inú osobu stavbyvedúceho ako tú, ktorú uchádzač uviedol vo svojej ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní)
- **Certifikáty, vyhlásenia o zhode** vlastností a atesty zabudovaných materiálov (originál, resp. úradne osvedčená kópia), **Protokoly o vykonaných skúškach** podľa KSP, najmä **skúšky všetkých Asfaltových zmesí odobratých vo výrobní v súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20** (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
- **Potvrdenie o uzavretí poisťných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,
(Príloha č. 4 Zmluvy)
- **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky**, v prospech objednávateľa podľa časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov verejného obstarávania

(Príloha č. 5 Zmluvy)

- **Doklad o vlastníctve vlastnej obalovacej súpravy alebo Dohodu o zmluvnom zabezpečení obalovacej súpravy**, pričom vzdialenosť obalovacej súpravy od Staveniska nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil, do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným vo výkazoch výmer tvoriacich **Prílohu č. 1** k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom

dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:
 1. III/2419 Kynceľová - Nemce staničenie v km: 0,000 – 7,567 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,962 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.1 Zmluvy
 2. III/2425 Podkonice staničenie v km: 0,000- 4,436 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 2,215 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.2 Zmluvy
 3. III/2426 Moštenica staničenie v km: 0,000- 3,773 (vybraté úseky), dĺžka úseku 3,773 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.3 Zmluvy
 4. III/2427 Slov. Ľupča - Lučatín staničenie v km: 0,000-12,300 (vybrané úseky), dĺžka úsekov spolu 1,363 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.4 Zmluvy
 5. III/2428 Križ s I/66 – Ľubietová staničenie v km: 0,000-12,513 (vybrané úseky), dĺžka úsekov spolu 3,418 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.5 Zmluvy
 6. III/2430 Brusno staničenie v km: 0,000-1,829 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,472 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.6 Zmluvy
 7. III/2431 Brusno - Pohronský Bukovec staničenie v km: 0,000-6,628 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 3,651 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.7 Zmluvy
 8. III/2372 Jasenie staničenie v km: 0,000-3,624 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,294 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.8 Zmluvy
 9. III/2379 Križ I/66 - Predajná staničenie v km: : 3,900-5,110 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,210 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.9 Zmluvy
 10. III/2375 Podbrezová- Hronec staničenie v km: 0,000- 5,004 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,227 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.10 Zmluvy
 11. III/2377 Hronec – Osrblie staničenie v km: 0,000- 6,715 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 2,305 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.11 Zmluvy
 12. III/2382 Beňuš - Bravčovo staničenie v km: 0,000- 1,557 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,387 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.12 Zmluvy
 13. III/2383 Bacúch staničenie v km: 0,000- 1,837 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,670 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.13 Zmluvy
 14. III/2389 Telgart staničenie v km: 0,000- 0,358, dĺžka úseku 0,358 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.14 Zmluvy
2. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
3. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť Diela vymedzená v článku III. ods. 1 Zmluvy (vybraté úseky ciest).
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi

sa k Dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí, MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KLAZ 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania Diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä stavebného zákona, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetky osoby podieľajúce sa na zhotovovaní Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi: a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti a c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.04.2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa a iných právnych predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

7. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor (v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za týmto účelom má prístup na Stavisko. Stavebný dozor nariaďuje a zúčastňuje sa kontrolných dní na Stavbe. Termíny a podmienky kontrolných dní dohodnú zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní Staviska. Stavebný dozor je oprávnený na náklady zhotoviteľa, na Stavisku, počas zhotovovania Diela, odobrať alebo vyžiadať vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality - atesty a akékoľvek iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy za účelom kontroly a overenia plnenia povinnosti zhotoviteľa zhotovovať Dielo riadne. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zmluvné strany nedohodnú písomne iný postup.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Staviska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - ohlásenie stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,
 - určenie dočasného dopravného značenia,
 - rozhodnutia príslušného orgánu o povolení čiastočnej uzávierky cesty,
 - odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa **prílohy č. 1** tejto Zmluvy,
9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie aj v iných prípadoch, na písomnú odôvodnenú žiadosť zhotoviteľa, v lehote písomne dohodnutej zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
10. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný formou zápisov v stavebnom denníku, kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými prostriedkami dohodnutými písomnou formou.
11. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením ich kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva/poverenia.
12. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný o.i. zákonných povinností viesť na Stavisku dokumentáciu:
 - a) stavebný denník
 - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
 - c) kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi,
 - d) knihu úrazov,
 - e) záznamy o školení pracovníkov.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka a súčasne ústne alebo písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa nedostaví na stavisko, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v stavebných prácach pričom, objednávateľ je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli vykonané riadne, všetky náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak zhotoviteľ mal a/alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti,

starostlivosti a maximálneho úsilia. Stavebný dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii Diela, okrem prípadu, že stavbyvedúci/jeho zástupca zhotoviteľa nie je včas dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Stavebný dozor je oprávnený za splnenia podmienky podľa predchádzajúceho ods. dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz ihneď prerušiť prácu.

15. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmet Zmluvy) pri zhotovovaní Diela. Kontrola vytýčenia začiatku a konca vybratých úsekov ciest vykonaná objednávateľom počas zhotovovania Diela nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť dodržiavania vytýčenia. Začiatky a konce vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmetu Zmluvy) sú pre zhotoviteľa záväzné.
16. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci vydaných pred začatím a počas realizácie Diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenia povinností zhotoviteľom, objednávateľ má regresný nárok proti zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

IV.

Stavenisko a podmienky prevzatia staveniska

1. Staveniskom je priestor vybratých úsekov ciest tvoriacich predmet Zmluvy, ktorý je počas realizácie Diela určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, materiálov, dopravných a iných zariadení a strojov potrebných na vykonanie Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávateľa prevziať Stavenisko v deň určený objednávateľom vo výzve. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví zhotoviteľ Záznam/zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanú splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Odo dňa odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ sa povinný:
 - zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo Staveniska,
 - zabezpečiť a dodržiavať poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov, materiálov a stavebných mechanizmov a zariadení na Stavenisku,
 - zaistiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - zabezpečiť odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,
 - chrániť majetok objednávateľa pred poškodením alebo zničením.
 - organizovať, riadiť, koordinovať a niesť zodpovednosť za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku pri realizácii Diela,
 - sledovať spôsob a postup realizácie Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavenisku, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí Staveniska:
- počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi použité na vybraté úseky ciest,
 - kontrolný súšobný plán v zmysle TKP MDVRR SR.

V.

Stavebný denník, Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Stavebný denník:

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a v dvoch kópiách (rovnopisoch). Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom, vykonávacími predpismi. Stavebný denník musí obsahovať všetky potrebné údaje a skutočnosti, ktoré sú spôsobilé preukázať a overiť dodržiavanie povinností zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní Diela podľa článku (kapitoly) 10 ods. 10.2 a nasl. až kapitoly 12 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi účinných od 15.09.2015. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný pre oprávnené osoby. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
3. Minimálny rozsah denného zápisu v SD dohodli zmluvné strany nasledovne:
 - dátum (deň, mesiac, rok),
 - presné označenie vybratého úseku stavby, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú,
 - klimatické podmienky a pomery, maximálna a minimálna teplota vzduchu pri začiatku, počas a pri ukončení stavebných prác,
 - údaje o dobe výkonu stavebných prác, jej začiatok a koniec,
 - počet osôb vykonávajúcich práce s uvedením druhu práce, ktorú vykonávajú,
 - zoznam použitých strojov a zariadení,
 - časový postup a spôsob výkonu stavebných prác,
 - výkaz výmer dodávok materiálu s uvedením údajov podľa ods. 9.2 až 9.4 kapitoly 9, ods. 10.2 až 10.6 kapitoly 10, ods. 11.3, 11.4, 11.6 kapitoly 11 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi, v rozsahu v akom v daný deň prichádzajú do úvahy vzhľadom na druh vykonávanej stavebnej činnosti,
 - fotodokumentácia z priebehu stavebných prác zoradená chronologicky na CD,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Denné záznamy sa píše do SD – knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Záznamy sa píše chronologicky za sebou bez vynechania voľného miesta.
5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne oprávnená osoba písomne poverená zhotoviteľom, stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, prípadne oprávnená osoba poverená objednávateľom, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné orgány verejnej moci.
6. SD a dokumentácia kvality sa vedie pre každý vybratý úsek ciest, ktoré tvoria predmet Diela, zvlášť.
7. Denné záznamy v jednom prepise dostane stavebný dozor objednávateľa osobne alebo v naskenovanej podobe na mailovú adresu objednávateľa uvedenú v nasl. ods. 9 tohto článku Zmluvy, najneskôr do 10.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa denný záznam týka.

Objednávateľ je prostredníctvom stavebného dozoru povinný sledovať obsah SD a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Na zápisy v SD musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume, kedy sa s nimi oboznámili. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v SD v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa:

8. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

Meno a Priezvisko: [REDACTED] J [REDACTED] F [REDACTED]

číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby: 10650

mobil: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, pravidelnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní Diela, a iných úkonoch, na ktoré ho zhotoviteľ musí písomne poveriť.

9. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora osobu Z [REDACTED] B [REDACTED] mobil [REDACTED] e-mail [REDACTED]@bbrsc.sk. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje: L [REDACTED] L [REDACTED] mobil [REDACTED] e-mail [REDACTED]@bbrsc.sk.

10. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

VI.

Termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia Staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa **Prílohy č. 1** objednávateľovi je najneskôr **do 50 kalendárnych dní odo dňa prevzatia prvého Staveniska** zhotoviteľom, jednotlivivo pre vybraté úseky ciest nasledovne:
 1. III/2419 Kynceľová - Nemce – do 16 dní odo dňa odovzdania staveniska
 2. III/2425 Podkonice – do 18 dní odo dňa odovzdania staveniska
 3. III/2426 Moštenica do 30 dní odo dňa odovzdania staveniska
 4. III/2427 Slov. Ľupča - Lučatín do 11 dní odo dňa odovzdania staveniska
 5. III/2428 Križ s I/66 – Ľubietová do 27 dní odo dňa odovzdania staveniska
 6. III/2430 Brusno do 4 dní odo dňa odovzdania staveniska
 7. III/2431 Brusno do 29 dní odo dňa odovzdania staveniska
 8. III/2372 Jasenie do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
 9. III/2379 Križ I/66 - Predajná do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
 10. III/2375 Podbrezová- Hronec do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
 11. III/2377 Hronec – Osrblie do 18 dní odo dňa odovzdania staveniska
 12. III/2382 Beňuš - Braväcovo do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska
 13. III/2383 Bacúch do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska
 14. III/2389 Telgárt do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska
3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý je Prílohou tejto Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.

5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a podmienok podľa článku X, XI tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

VII.

Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diela vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH :.....1 599 565,78 Eur

DPH 20 % :.....319 913,17 Eur

Cena s DPH :1 919 478,95 Eur

(slovom: jeden milión deväťstodevätnásť tisíc štyristosedemdesiatosem Eur, 95/100) s DPH.

10

2. Preddavky objednávateľ neposkytuje vôbec.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude **jedna faktúra** vystavené zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č. 1** oprávnenou osobou objednávateľa.
6. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
7. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
- zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce na jednotlivých vybratých úsekoch ciest podľa **Prílohy č. 1**, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na jednotlivých súpisoch

minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“

- faktúra musí byť dokladovaná súpisom vykonaných prác pre každý vybraný úsek cesty podľa **Prílohy č. 1** zvlášť, odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa a každý súpis vykonaných prác musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác, s uvedením jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybraný úsek cesty podľa **Prílohy č. 1** zvlášť,
 - faktúra vrátane jednotlivých súpisov vykonaných prác podľa **Prílohy č. 1** musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybraný úsek cesty zvlášť tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
8. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
 9. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkazoch výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
 10. Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadať je zhotoviteľ povinný aj preukázať, inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
 11. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
 12. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať riadne zhotovené Dielo včas (v lehote podľa ods. 2 článku VI Zmluvy), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku VII Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
 14. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
 15. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.
 16. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

17. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
18. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VIII Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odovzdanie a prevzatie Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku VI ods. 2 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku VI ods. 2 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ktorý postup sú zmluvné strany povinné dohodnúť v písomnom Protokole pri odovzdaní Staveniska zhotoviteľovi, sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každý vybraný úsek zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku IX Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 článku IX Zmluvy s tým, že Dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť(vybraný úsek cesty).
4. Objávateľ prevezme Dielo za splnenie § 555 ods. 2 Obch. zák. ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok, Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavebných prác, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:
 - vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výroby, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavebných prác,
 - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
 - protokoly o vykonaných skúškach najmä ide o : skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobni, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa TAB 20 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí, podľa TAB 17 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne (originál, resp. úradne osvedčená kópia), pri prácach menšieho rozsahu (napr. opravy) zhotoviteľ vykoná najmenej jednu skúšku uvedenú v TAB 16 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI na každý vybraný úsek ciest tvoriacich predmet Diela, ďalej preberacie skúšky hotovej vrstvy v TAB 22 a 23 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI. Pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m² podľa TAB 22 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhotoviteľ,
 - listy odpadov, doklad o uložení na skládke.
5. Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27.
6. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

7. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
8. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
9. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú najmä nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania
 - dokumentácia kvality Diela (podľa ods. 4 tohto článku vrátane kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí)
 - doklady o uložení prebytočného materiálu zo staveniska na oficiálnu skládku,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela.
10. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 9 tohto článku je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
11. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
 - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá (konkrétne vybraté úseky ciest)
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov a lehoty ich odstránenia
12. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
13. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
14. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
15. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

X

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové

požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer.
3. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/VV musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných/nariadených naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu/VV v jednotlivých Prílohách tejto Zmluvy.
4. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
5. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené v písomnej forme osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou doručenou zástupcovi pre veci technické .
6. Kontaktné údaje osôb a okruh osôb oprávnených konať za zmluvnú stranu môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením zmluvnej strany, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy bez toho, aby zmluvné strany uzatvorili dodatok k zmluve. Oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy.
7. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

XI

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - porušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku XI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

XII

Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách a požiadaviek objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa článku I, článku III, článku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, článku V ods. 2, ods. 3, článku VI ods. 1, ods. 3, článku XIII ods. 7 Zmluvy alebo ak sa počas realizácie Diela preukáže, že stavebné práce podľa výkazov výmer, čo do kvantitatívnych alebo kvalitatívnych požiadaviek Diela nezodpovedajú množstvu alebo kvalite vymienenej objednávateľom v Zmluve, súťažných podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podľa Harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,5% z celkovej ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a/alebo nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom protokole alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas odstrániť vady a oznámené - uplatnené objednávateľom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania za každú takto reklamovanú vadu Diela zvlášť. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v kvalite podľa požiadaviek ods. 1 tohto článku XII Zmluvy a že tieto bude mať i počas plynutia záručnej doby.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). Záručná doba sa skrúti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnene odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávateľom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Diela spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
9. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným .
10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
11. Uplatnenie vád a nedorobkov v záručnej dobe musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia vád a nedorobkov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 3 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a/ ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z vád Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.
16. V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená alebo vznikne škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, alebo bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu uhradiť objednávateľovi v plnom rozsahu.

Čl. XIII Zánik zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej

- primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/závazku a zhotoviteľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní,
- c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo, pričom objednávateľ má v prípade porušenia povinností podľa písm. c/ tohto ods. právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - h) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - i) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - j) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa

- o skutočnostiach podľa písm. j/ ods. 6 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy alebo
- k) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela, pričom objednávateľ má právo v prípade preukázania skutočností podľa tohto písm. k/ na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
 - l) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

XIV Záverečné ustanovenia

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité v zmysle § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti:
 - 1.....
 - 2.. ..
 3.
2. Osoby uvedené v ods. 1. tohto čl. Zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v ods. 1 tohto čl. Zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v v ods. 1 tohto čl. Zmluvy svoj spoločný záväzok so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.
3. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
4. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
6. Táto zmluva má **21 strán** a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).

7. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
8. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatelom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávatel'a úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávatel'a poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávatel'ovi pred podaním svojej ponuky.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
13. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
14. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
15. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

16. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
- Príloha č. 2: Harmonogram postupu prác
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/zložení zábezpeky na účet

V Banskej Bystrici dňa: 10. 10. 2018

Za objednávateľa:

[Redacted signature area]

Ing. Ján Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

V Bratislave dňa: 24.09.2018

Za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti

[Redacted signature area]

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

[Redacted signature area]

[Redacted area]

Stavba : Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Objednávateľ : Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Príloha č.1 k zmluve o dielo

- **Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní**

Príloha č. 1 súťažných podkladov - neocenené výkazy výmer

Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

P.č.	Číslo CK	Miestopis	Dĺžka CK v km	STS vyhovujúci	STS nevyhovujúci	STS havarijný	Dĺžka CK na opravu v km	cena bez DPH	cena s DPH
1.1	III/2419	Kynceľova- Nemce	7,567	0,187	1,775	0	1,962	150 229,14	180 274,97
1.2	III/2425	Podkonice	4,436	0	2,215	0	2,215	147 010,36	176 412,43
1.3	III/2426	Moštenica	3,773	0	3,773	0	3,773	137 662,88	165 195,46
1.4	III/2427	Slov.Ľupča - Lučatín - Hiadeľ	13,435	0	7,484	0	1,363	106 650,47	127 980,56
1.5	III/2428	križ. I/66 - Ľubietová	12,513	2,216	3,418	0	3,418	233 800,78	280 560,94
1.6	III/2430	Brusno	1,829	0,299	0,172	0	0,472	27 193,88	32 632,66
1.7	III/2431	Brusno - Pohronský Bukovec	6,628	0	3,651	0	3,651	219 209,46	263 051,35
1.8	III/2372	Jasenie	3,624	0	2,817	0	1,294	113 649,74	136 379,69
1.9	III/2379	križ. I/66 -Predajná	7,696	0,151	2,536	0	1,210	98 623,98	118 348,78
1.10	III/2375	Podbrezová -Hronec	5,004	0	1,642	0	1,227	81 577,78	97 893,34
1.11	III/2377	Hronec – Osrbľie	6,715	0,069	2,605	0	2,305	163 756,71	196 508,05
1.12	III/2382	Braváčovo	1,557	0	0,437	0	0,387	29 332,35	35 198,82
1.13	III/2383	Bacúch	1,837	0,189	0,670	0	0,670	45 533,66	54 640,39
1.14	III/2389	Telgárt	0,358	0	0,358	0	0,358	45 334,59	54 401,51
	Spolu vybraté úseky ciest III. triedy		76,972	3,111	33,553	0	24,305	1 599 565,78	1 919 478,95

V Košiciach, dňa 27.08.2018



na základe poverenia

Príloha č. 1.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2419 Kynceľová - Nemce

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 7,567 (vybraté úseky)			
III/2419 Kynceľová - Nemce		0,020-0,365 = 0,345 km , š. 10 m=3450 m ² 1,410 - 4,150 =1,617 km; š. 6 m= 9702 m ²			
dĺžka úseku	1962,00 m				
šírka voz.m	7,70 m				
plocha úseku	15107,40 m ²				
korekcie	m ²				
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	46,20	189,42
čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,110	15 107,40	1 661,81
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, do 10 km)	m ²	40 mm	1,240	3 850,00	4 774,00
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	15 107,40	5 589,74
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,430	15 107,40	112 247,98
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		47,150	483,44	22 794,05
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	2 008,20	2 972,14
spolu					150 229,14
CELKOM:					
					DPH 20% Spolu s DPH
					€ 30 045,83 180 274,97

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

.....
[redacted] na základe poverenia [redacted]

015

Príloha č. 1.2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2425 Podkonice

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 4,436 (vybraté úseky)			
III/2425 Podkonice					
dĺžka úseku	2215,00 m				
šírka voz.m	6,00 m				
plocha úseku	13290,00 m ²				
korekcie	20,00 m ²				
		jednotk.cena	spolu bez DPH		
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	24,00	98,40
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	13 310,00	1 464,10
zriadenie zvodidlo komplet NH4 na priepusty, úroveň zachytenia N2 (v zmysle TP 010), počet potrebných nábehov – 8 x nábehy (2 ks priepustov)	m		73,840	48,00	3 544,32
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK)	m ²	50 mm	1,240	48,00	59,52
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	13 310,00	4 924,70
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,690	13 310,00	102 353,90
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		48,990	637,92	31 251,70
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	2 239,00	3 313,72
				spolu	147 010,36
CELKOM:					
					DPH 20% Spolu s DPH
					€ 29 402,07 176 412,43

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Ing. Marián Čechovič, na základe poverenia

V Košiciach, dňa 27.08.2018

Príloha č. 1.3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2426 Moštenica

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 3,773 (vybraté úseky)				
III/2426 Moštenica						
dĺžka úseku	3773,00	m				
šírka voz.m	4,00	m				
plocha úseku	15092,00	m ²				
korekcie	50,00	m ²				
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	8,00	32,80	
čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,110	15 142,00	1 665,62	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce,	m ²	50 mm	1,240	36,00	44,64	
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	15 142,00	5 602,54	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	8,000	15 142,00	121 136,00	
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		51,220	70,00	3 585,40	
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	3 781,00	5 595,88	
spolu					137 662,88	
CELKOM:						
					DPH 20% Spolu s DPH	
					€ 27 532,58 165 195,46	

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

Ing. Marián Čechovič, na základe poverenia

Príloha č. 1.4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2427 Slov. Ľupča - Lučatín-Hiadeľ

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 12,300 (vybraté úseky)			
III/2427 Slov. Ľupča - Lučatín		0,285-0,543 = 0,258 km			
dĺžka úseku		8,950 - 9,540 = 0,590 km			
šírka voz.m		križovatka = 0,185 km			
plocha úseku		11,170 - 11,500 = 0,330 km			
korekcie					
			jednotk.cena		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	52,00	213,20
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	9 009,50	991,05
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK)	m ²	50 mm	1,240	98,00	121,52
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	9 009,50	3 333,52
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,790	9 009,50	70 184,01
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		49,660	425,26	21 118,21
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	1 402,00	2 074,96
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia NH4, úroveň zachytenia N2 (v zmysle TP 010), počet potrebných nábehov – 2 x nábehy (začiatok a koniec úseku).	m		43,070	200,00	8 614,00
spolu					106 650,47
CELKOM:					
					DPH 20% Spolu s DPH
					€ 21 330,09 127 980,56

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

.....
 [redacted] na základe poverenia [redacted]

018

Príloha č. 1.5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2428 Križ s I/66 - Ľubietová

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 12,513 (vybraté úseky)			
III/2428 Križ s I/66 - Ľubietová		EMKS plocha 3400 m ²			
dĺžka úseku	3418,00 m				
šírka voz.m	5,50 m				
plocha úseku	18799,00 m ²				
korekcie	50,00 m ²				
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	11,00	45,10
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	18 849,00	2 073,39
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, M.D. MK)	m ²	50 mm	1,240	22,00	27,28
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	18 849,00	6 974,13
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,810	18 849,00	147 210,69
vyrovnanie nerovnosti krytu z AC ₁ 16-II	t		49,860	902,35	44 991,27
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	3 429,00	5 074,92
EMKS 16mm dvojvrstvový	m ²	12mm	8,060	3 400,00	27 404,00
spolu					233 800,78
CELKOM:					€ 46 760,16
					DPH 20% Spolu s DPH
					280 560,94

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

Ing. Marián Čechovič, na základe poverenia

Príloha č. 1.6

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2430 Brusno

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 1,829 (vybraté úseky			
III/2430 Brusno		172 x 6 = 1032 m ² ACo 11			
		300 m x 6 = 1800 m ² EMK			
dĺžka úseku	472,00 m				
šírka voz.m	6,00 m				
plocha úseku	2832,00 m ²				
korekcie	70,00 m ²				
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	12,00	49,20
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	2 902,00	319,22
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK)	m ²	50 mm	1,240	24,00	29,76
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	2 902,00	1 073,74
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,770	1 032,00	8 018,64
vyrovnanie nerovnosti krytu z AC ₁ 16-II	t		49,580	50,00	2 479,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,480	484,00	716,32
EMKS 16mm dvojvrstvový	m ²	16mm	8,060	1 800,00	14 508,00
spolu					27 193,88
CELKOM:					
					DPH 20% Spolu s DPH
					€ 5 438,78 32 632,66

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

na základe poverenia

Príloha č. 1.7

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2431 Brusno - Pohronský Bukovec

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 6,628 (vybraté úseky)			
III/2431 Brusno - Pohronský Bukovec					
dĺžka úseku	3651,00	m			
šírka voz.m	5,25	m			
plocha úseku	19167,75	m ²			
korekcie	100,00	m ²			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	21,00	86,10
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	19 267,75	2 119,45
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK)	m ²	50 mm	1,240	102,00	126,48
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	19 267,75	7 129,07
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	8,120	19 267,75	156 454,13
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		52,010	920,05	47 851,90
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	3 677,25	5 442,33
spolu					219 209,46
CELKOM:					
					DPH 20%
					Spolu s DPH
					€ 43 841,89 263 051,35

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

M. C. na základe poverenia

Príloha č. 1.8

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2372 Jasenie

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 3,624 (vybraté úseky)			
III/2372 Jasenie		0,000 - 0,950=950 m 3,280 - 3,624=344 m			
dĺžka úseku	1294,00 m				
šírka voz.m	6,50 m				
plocha úseku	8411,00 m ²				
korekcie	60,00 m ²				
		jednotk.cena		spolu bez DPH	
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	13,00	53,30
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	8 471,00	931,81
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, ACO MK)	m ²	50 mm	1,240	146,00	181,04
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	8 471,00	3 134,27
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,880	8 471,00	66 751,48
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		50,360	807,46	40 663,48
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	1 307,00	1 934,36
				spolu	113 649,74
				CELKOM:	€ 22 729,95
					Spolu s DPH 136 379,69

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

M. Č. na základe poverenia

022

Príloha č. 1.9

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2379 Križ. I/66 - Predajná

Číslo cesty/ Názov stavby III/2379 Križ I/66 - Predajná		staničenie v km: 3,900 - 5,110 (vybraté úseky) 3,900-4,640 = 0,740 km 4,800 -5,110 = 0,310 km 4,640-4,800 = 0,160 km x 7,0= 1120 m ² EMKS			
dĺžka úseku	1210,00 m				
šírka voz.m	6,50 m				
plocha úseku	7865,00 m ²				
korekcie	140,00 m ²				
		jednotk.cena	spolu bez DPH		
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	39,00	159,90
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	8 005,00	880,55
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK)	m ²	50 mm	1,240	1 120,00	1 388,80
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	8 005,00	2 961,85
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,910	8 005,00	63 319,55
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		50,530	377,52	19 076,09
EMKS 16 mm dvojvrstvový	m ²	12mm	8,060	1 120,00	9 027,20
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	1 223,00	1 810,04
				spolu	98 623,98
				CELKOM:	€ 19 724,80 118 348,78
				DPH 20%	Spolu s DPH

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

.....
 [Redacted] na základe poverení [Redacted]
 [Redacted]

Príloha č. 1.10

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2375 Podbrezová- Hronec

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 5,004 (vybraté úseky)			
III/2375 Podbrezová- Hronec		0,080 - 0,507 = 427 m			
		1,345 - 2,560 = 1215 m (800 m)			
dĺžka úseku	1227,00 m				
šírka voz.m	6,00 m				
plocha úseku	7362,00 m ²				
korekcie	50,00 m ²				
		jednotk.cena		spolu bez DPH	
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	12,00	49,20
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	7 412,00	815,32
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO MK mosty)	m ²	50 mm	1,240	24,00	29,76
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	7 412,00	2 742,44
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,870	7 412,00	58 332,44
vyrovnanie nerovností krytu z AC _c 16-II	t		50,250	353,38	17 757,14
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	1 251,00	1 851,48
				spolu	81 577,78
CELKOM:					
				DPH 20%	Spolu s DPH
				€ 16 315,56	97 893,34

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

na základe poverenia

024

Príloha č. 1.11

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2377 Hronec - Osrblie

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 6,715 (vybraté úseky)			
III/2377 Hronec - Osrblie		Hronec -kanal po 1,035 km			
dĺžka úseku	2305,00 m				
šírka voz.m	5,26 m				
plocha úseku	12117,39 m ²				
korekcie	70,00 m ²				
		jednotk.cena		spolu bez DPH	
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	10,51	43,11
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	12 187,39	1 340,61
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MD, MK)	m ²	50 mm	1,240	42,06	52,15
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	12 187,39	4 509,33
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,870	12 187,39	95 914,72
vyrovnanie nerovností krytu z AC _c 16-II	t		50,250	1 163,27	58 454,27
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	2 326,03	3 442,52
				spolu	163 756,71
CELKOM:					
				DPH 20%	Spolu s DPH
				€ 32 751,34	196 508,05

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

M. Č. na základe poverenia

Príloha č. 1.12

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2382 Beňuš - Braváčovo

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 1,557 (výbraté úseky)			
III/2382 Beňuš - Braváčovo					
dĺžka úseku	387,00	m			
šírka voz.m	5,50	m			
plocha úseku	2128,50	m ²			
korekcie	50,00	m ²			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	11,00	45,10
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	2 178,50	239,64
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce. MO. MK)	m ²	50 mm	1,240	77,00	95,48
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	2 178,50	806,05
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,910	2 178,50	17 231,94
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		50,530	204,34	10 325,10
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	398,00	589,04
spolu					29 332,35
CELKOM:					DPH 20% Spolu s DPH € 5 866,47 35 198,82

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

na základe poverení

Príloha č. 1.13

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2383 Bacúch

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 1,837 (vybraté úseky)			
III/2383 Bacúch					
dĺžka úseku	670,00	m			
šírka voz.m	6,00	m			
plocha úseku	4020,00	m ²			
korekcie	20,00	m ²			
			jednotk.cena		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	12,00	49,20
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	4 040,00	444,40
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MD, MK)	m ²	50 mm	1,240	24,00	29,76
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	4 040,00	1 494,80
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,980	4 040,00	32 239,20
vyrovnanie nerovností krytu z AC _c 16-II	t		51,030	193,92	9 895,74
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht	ks		92,800	4,00	371,20
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	682,00	1 009,36
				spolu	45 533,66
CELKOM:					€ 9 106,73
					DPH 20% Spolu s DPH
					54 640,39

*pri pokládke všetky spoje opatříť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Košiciach, dňa 27.08.2018

na základe poverenia

Príloha č. 1.14

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Výkaz výmer

Uchádzač: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Názov stavby

III/2389 Telgárt

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 0,358			
III/2389 Telgárt					
dĺžka úseku	358,00	m			
šírka voz.m	5,50	m			
plocha úseku	1969,00	m ²			
korekcie	50,00	m ²			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	4,100	11,00	45,10
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,110	2 019,00	222,09
výmena zvodidla na moste - NH4	m		184,590	50,00	9 229,50
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatku a konce, MO, MK)	m ²	50 mm	1,240	22,00	27,28
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	2 019,00	747,03
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	8,390	2 019,00	16 939,41
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		53,930	189,02	10 194,06
výmena zvodidla NH4, N2 (v zmysle TP 010), počet potrebných nábehov – 2 x nábehy (koniec úseku).	m		73,840	100,00	7 384,00
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,480	369,00	546,12
spolu					45 334,59
CELKOM:					€ 9 066,92
					Spolu s DPH € 54 401,51

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územná a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

028

V Košiciach, dňa 27.08.2018

.....
M. Č. na základe poverenia

Stavba : Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Objednávateľ : Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Príloha č.2 k zmluve o dielo

- Harmonogram postupu prác

Stavba : Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Objednávateľ : Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Príloha č.3 k zmluve o dielo

- **Zoznam subdodávateľov**

Príloha č.3 k zmluve o dielo :

Predmet zmluvy:

**Rekonštrukcia ciest III. triedy – úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec
Telgárt**
uskutočnenie stavebných prác

Zoznam subdodávateľov

Por.č.	Identifikačné údaje subdodávateľa	Predmet subdodávky	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 Zvolen 960 01 IČO: 30 228 247	asfaltový postrek, emulzný mikrokoberec	Ing. Miroslav Šufliarský Ing. Mária Melichová	[REDAKOVANÉ]	
2.	FREKOMOS SK, s. r. o. Domové role 69/16516 Bratislava 821 05 IČO: 36 196 428	frézovanie	Ing. Dušan Klimo	[REDAKOVANÉ]	

Dátum: 24.09.2018

[REDAKOVANÉ]
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti

[REDAKOVANÉ]
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
070 00 Banská Bystrica
- 700 -

Číslo dožiadania : el-58931/2018/S

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA


Okresného súdu Banská Bystrica
k dátumu 18.09.2018


Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 574/S

I. Obchodné meno

BITUNOVA spol. s r.o.







Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

bcPWN+svxALjDI8qWaKaUtRpDP3NuGKnm+7QBLj6bhM=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

H

Príezvisko

B

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

* Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, príezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka





45

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.09.2018

Číslo vložky: 6802

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : BITUNOVA spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Neresnícka cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 3

c) **Názov obce**: Zvolen

d) **Psč**: 96001

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 30228247

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Ružička Csekes s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Vysoká

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2/B

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč**: 81106

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 36863360

Platnosť : od: 25.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : O ■■■ D ■■■■■

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: ■■■■■

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: ■■■■■

c) **Názov obce**: ■■■■■

d) **Psč**: ■■■■■

e) **Štát**: ■■■■■

Dátum narodenia : ■■■■■

Štátna príslušnosť : ■■■■■

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 25.07.2017

Meno : ■ T ■ B ■

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: ■

b) Súpisné/Orientačné číslo: ■

c) Názov obce: ■

d) Psč: ■

e) Štát: ■

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : ■

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 24.07.2017

Meno : ■ H ■ T ■

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: ■

b) Súpisné/Orientačné číslo: ■

c) Názov obce: ■

d) Psč: ■

e) Štát: ■

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : ■

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 24.07.2017

Meno : ■ P ■ K ■

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: ■

b) Súpisné/Orientačné číslo: ■

c) Názov obce: ■

d) Psč: ■

e) Štát: ■

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : ■

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 24.07.2017

Meno : ■ S ■ W ■

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: ■

b) Súpisné/Orientačné číslo: ■

c) Názov obce: ■

d) Psč: ■

e) Štát: ■

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : ■

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 24.07.2017

Meno : ■ C ■ H ■

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: [REDACTED]

b) Súpisné/Orientačné číslo: [REDACTED]

c) Názov obce: [REDACTED]

d) Psč: [REDACTED]

e) Štát: [REDACTED]

Dátum narodenia : .. [REDACTED]

Štátna príslušnosť : [REDACTED]

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 24.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.


Číslo dožiadania : el-206055/2018/B


VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 18.09.2018


Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 39836/B

I. Obchodné meno

FREKOMOS SK, s. r. o.

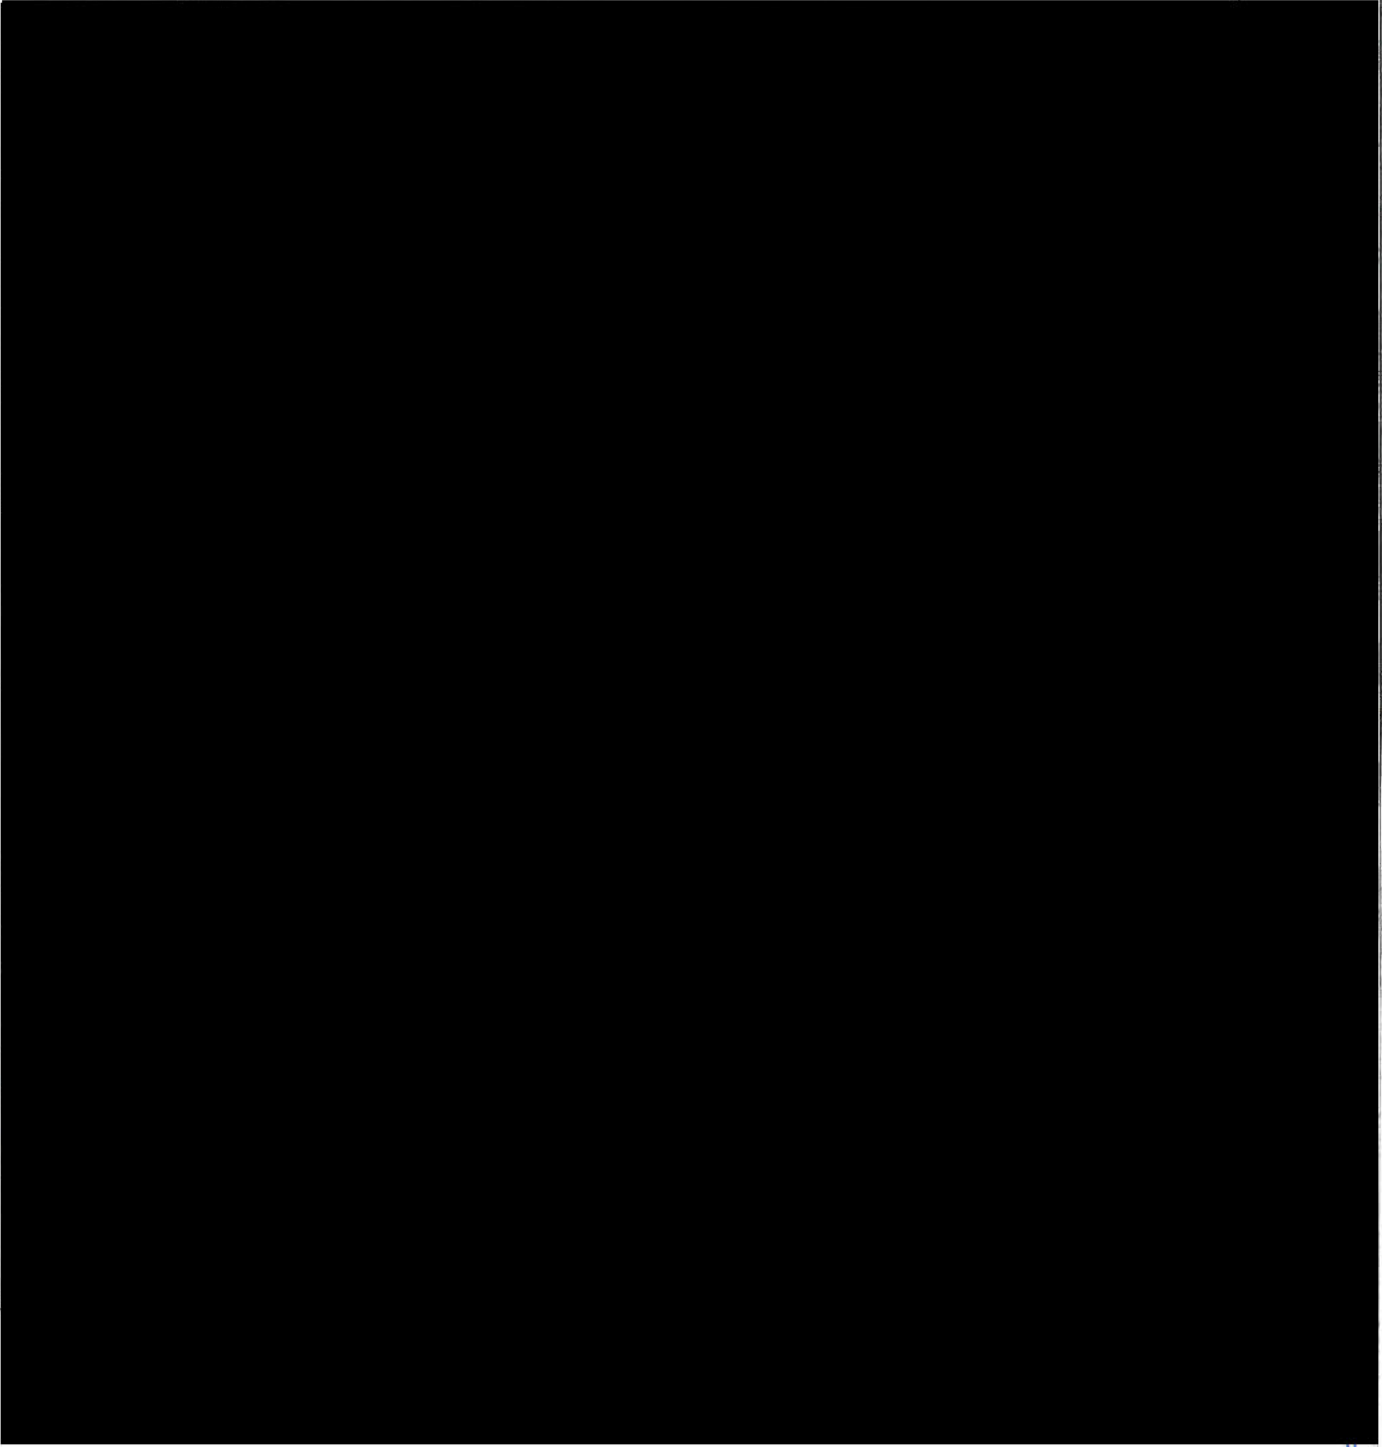

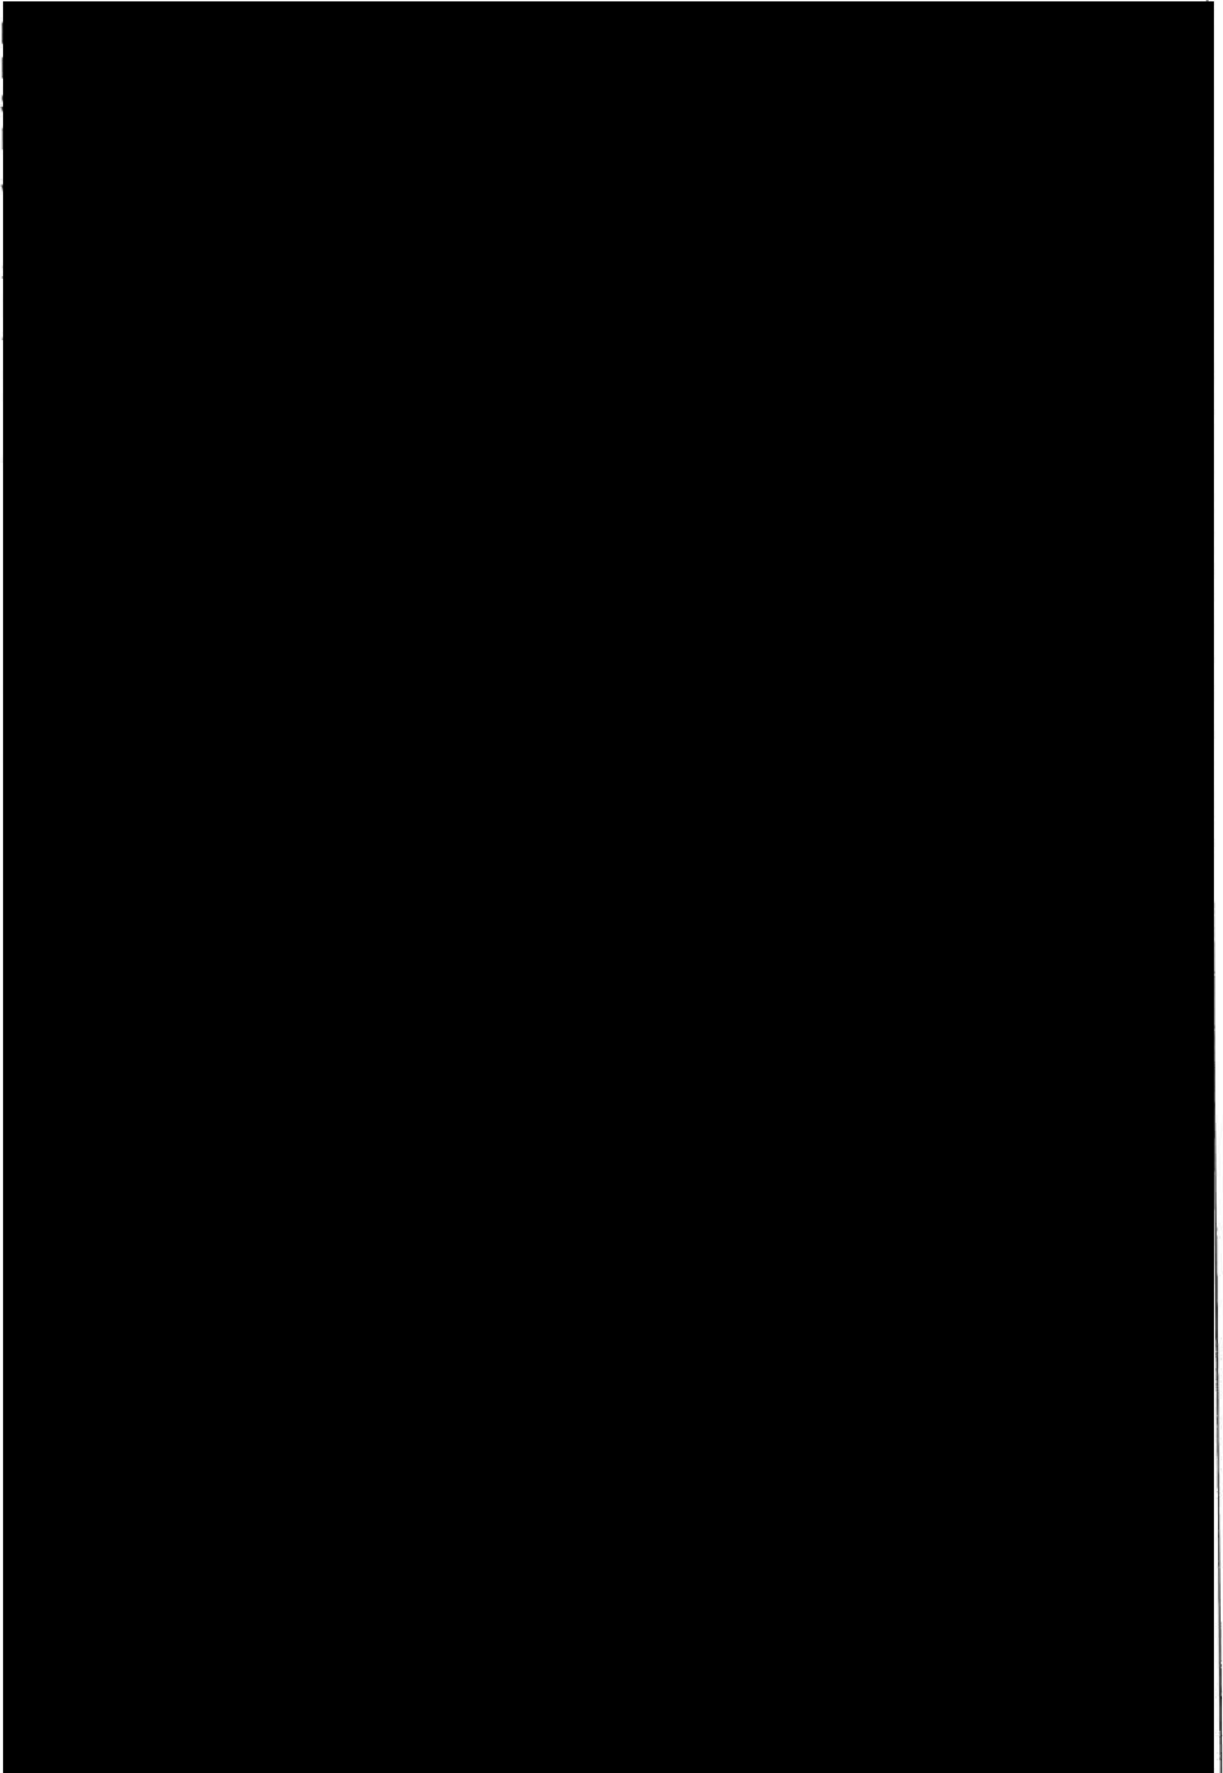



Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Hodnota elektronického odlačku pôvodného elektronického dokumentu

xiJG9T5nE9UvwAQT6hr0IMLBYkvLpN0yQCMiOsNw8tw=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

H

Priezvisko

B

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka





44

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.09.2018

Číslo vložky: 5926

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : FREKOMOS SK, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Domové role

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 69/16516

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82105

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36196428

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 13.07.2017

Obchodné meno : FREKOMOS SK, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Domové role

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 69/16516

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 82105

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36196428

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Marek Hanic

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Líščie údolie

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 68

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Karlova Ves

d) **Psč:** 84105

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42416728

Platnosť : od: 13.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : [redacted] D [redacted] C [redacted]

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]

b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]

c) Názov obce: [redacted]

d) Psč: [redacted]

e) Štát: [redacted]

Dátum narodenia : [redacted]

Štátna príslušnosť : [redacted]

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.07.2017

Meno : L [redacted] M [redacted] R [redacted]

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]

b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]

c) Názov obce: [redacted]

d) Psč: [redacted]

e) Štát: [redacted]

Dátum narodenia : [redacted]

Štátna príslušnosť : [redacted]

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.07.2017

Meno : F [redacted] E [redacted] T [redacted]

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]

b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]

c) Názov obce: [redacted]

d) Psč: [redacted]

e) Štát: [redacted]

Dátum narodenia : [redacted]

Štátna príslušnosť : [redacted]

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.07.2017

Meno : M [redacted] E [redacted] A [redacted] T [redacted]

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]

b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]

c) Názov obce: [redacted]

d) Psč: [redacted]

e) Štát: [redacted]

Dátum narodenia : [redacted]

Štátna príslušnosť : [redacted]

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.07.2017

Meno : C [redacted] M [redacted] T [redacted]

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]

b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]
c) Názov obce: [redacted]
d) Psč: [redacted]
e) Štát: [redacted]
Dátum narodenia : [redacted]
Štátna príslušnosť : [redacted]
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 13.07.2017

Meno : J [redacted] W [redacted] T [redacted]
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]
b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]
c) Názov obce: [redacted]
d) Psč: [redacted]
e) Štát: [redacted]
Dátum narodenia : [redacted]
Štátna príslušnosť : [redacted]
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 13.07.2017

Meno : [redacted] D [redacted] C [redacted]
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]
b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]
c) Názov obce: [redacted]
d) Psč: [redacted]
e) Štát: [redacted]
Dátum narodenia : .. [redacted]
Štátna príslušnosť : [redacted]
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

Meno : L [redacted] M [redacted] R [redacted]
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]
b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]
c) Názov obce: [redacted]
d) Psč: [redacted]
e) Štát: [redacted]
Dátum narodenia : .. [redacted]
Štátna príslušnosť : [redacted]
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

Meno : P [redacted] E [redacted] T [redacted]
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: [redacted]
b) Súpisné/Orientačné číslo: [redacted]
c) Názov obce: [redacted]
d) Psč: [redacted]
e) Štát: [redacted]



Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : ██████████
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

Meno : M ██████ E ██████ A ██████ T ██████

Sídlo :

- a) Názov ulice/verejného priestranstva: ██████████
b) Súpisné/Orientačné číslo: ██████████
c) Názov obce: ██████████
d) Psč: ██████████
e) Štát: ██████████

Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : ██████████
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

Meno : C ██████ M ██████ T ██████

Sídlo :

- a) Názov ulice/verejného priestranstva: ██████████
b) Súpisné/Orientačné číslo: ██████████
c) Názov obce: ██████████
d) Psč: ██████████
e) Štát: ██████████

Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : ██████████
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

Meno : J ██████ W ██████ T ██████

Sídlo :

- a) Názov ulice/verejného priestranstva: ██████████
b) Súpisné/Orientačné číslo: ██████████
c) Názov obce: ██████████
d) Psč: ██████████
e) Štát: ██████████

Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : ██████████
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

Stavba : Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Objednávateľ : Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica


Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava


Príloha č.4 k zmluve o dielo


- **Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka**



Potvrdenie o zriadení vinkulácie poistného plnenia







Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným edpisom, skladujúcim sa z ... listov (strán) Ide o odpis úplný (čiastočný). Zmeny a doplnky

V Bratislave dňa 17.09.2018

Vykonaním legalizácie alebo vidlímácie notár nezodpovedá za obsah listiny



Věř
práci



Stavba : Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Objednávateľ : Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Príloha č.5 k zmluve o dielo

- **Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/zložení zábezpeky na účet**

