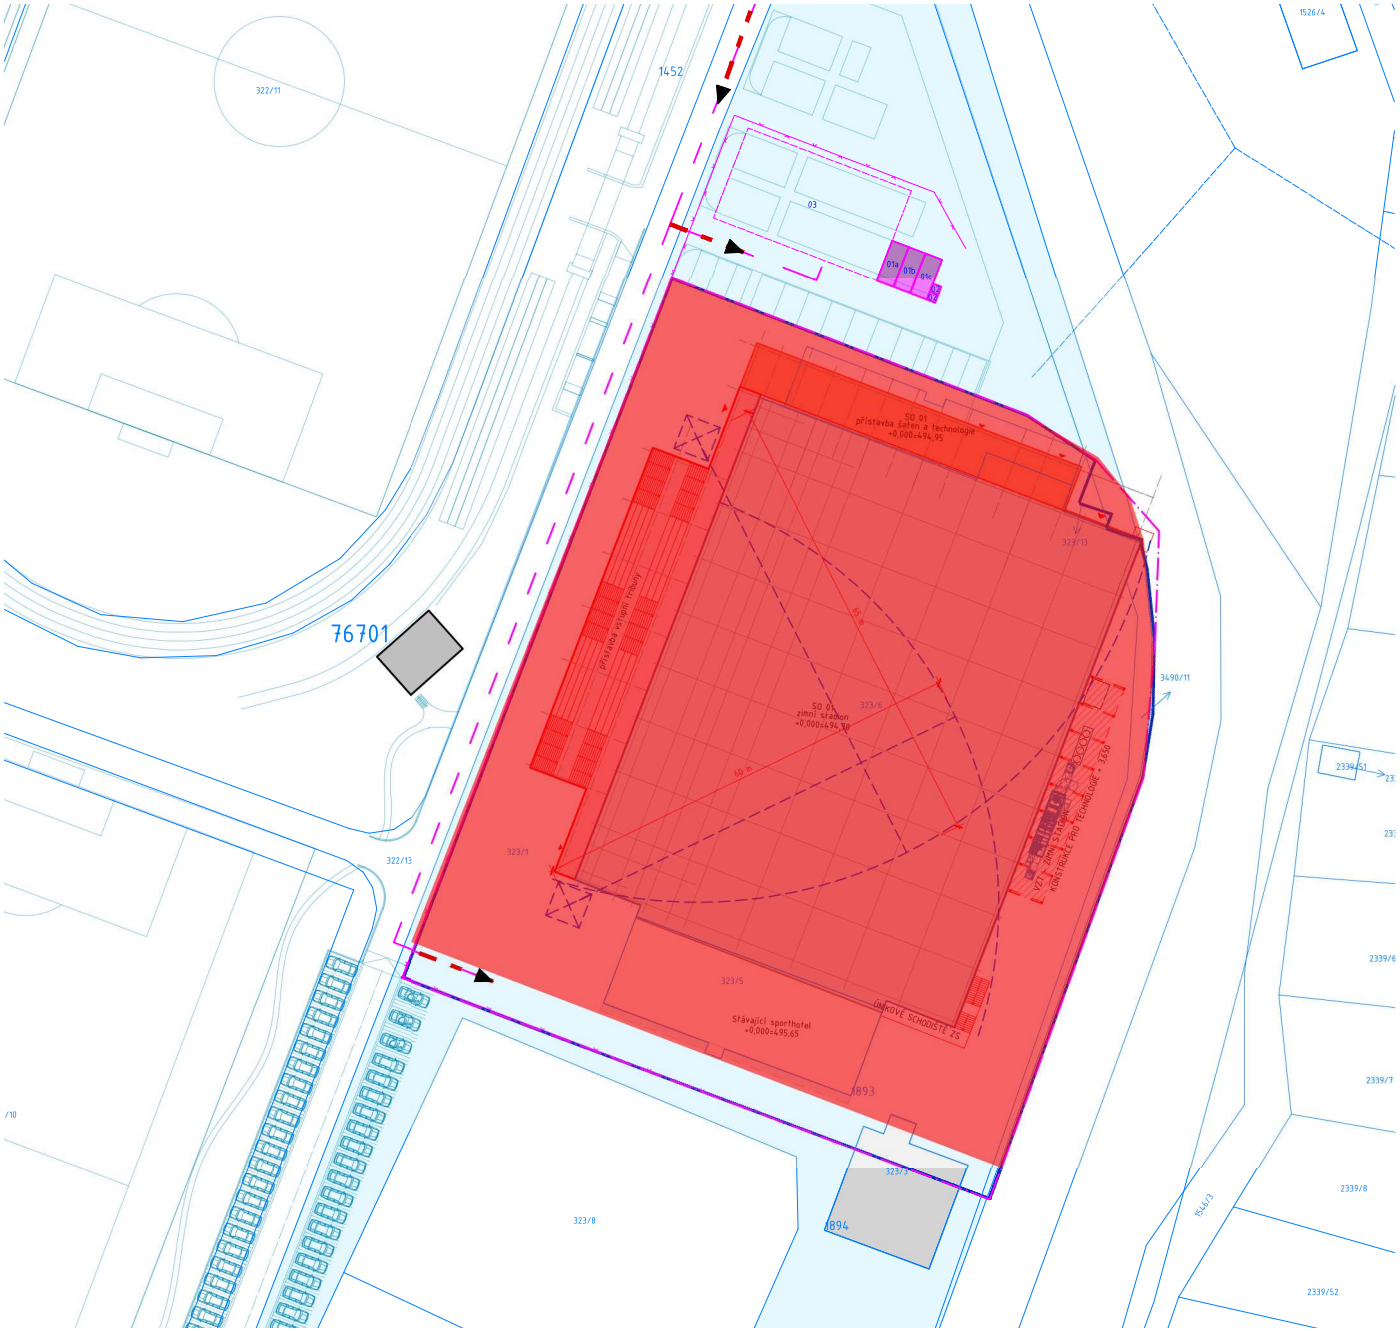

	DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU - VE VLASTNICTVÍ INVESTORA
	STUDIE NAVAZUJÍCÍCH ETAP VÝSTAVBY VE SPORTOVNÍM AREÁLU (NENÍ PŘEDMĚTEM PD)

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

	PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
	VĚŽOVÝ JEŘÁB - STŘEDNÍ
	ZÁKLADNÍ HRANICE ROZSAHU STAVENIŠTĚ (MŮŽE BÝT DÁLE ROZŠIŘOVÁNO DLE POTŘEB DODAVATELE STAVBY)
	DOČASNÉ MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ, VČ. VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK
	HLAVNÍ TRASY STAVENIŠTNÍ DOPRAVY
01a	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - MOBILNÍ UZAMYKATELNÁ STAVEBNÍ BUŇKA - STAVBYVEDOUCÍ
01b	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - MOBILNÍ UZAMYKATELNÁ STAVEBNÍ BUŇKA - ZAMĚSTNANCI STAVBY
01c	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - MOBILNÍ UZAMYKATELNÁ STAVEBNÍ BUŇKA - NÁŘADÍ
02	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - MOBILNÍ CHEMICKÁ TOALETA
03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLÁDKA MATERIÁLŮ

STAVENIŠTĚ

-ROZSAH STAVENIŠTĚ A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ JE V POUZE ORIENTAČNÍ

-UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE KONZULTOVÁNO S VYBRANÝM DODAVATELEM STAVBY TAK, ABY BYL CO NEJMÉNĚ OMEZEN PROVOZ SPOROTVNÍHO AREÁLU A ZIMNÍHO STADIONU

Rozsah staveniště po 12 měsících od termínu zahájení plnění.

(Okolní plochy budou zhotovitelem díla uvolněny a budou prosté překážek).
